SERVITEC SYS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 7165215-0

INFORME FINAL

CONTRATO IEJSRESO_ N°22 _5/10/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 16 EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER

PRESENTACION DE ACTIVIDADES

La empresa Servitec SYS, nit. 7165215-0, constituida legalmente prestadora de servicios de seguridad industrial, se permite presentar a ustedes informe de las actividades del contrato que tiene como objeto: LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 16 EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER

OCTUBRE 2026

1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

   a. Limpieza y lubricación de válvulas y vástagos retenedores de presión.
   b. Revisión de manómetros y sifones de expulsión.
   c. Cambio de empaques de neopreno (ORING), colocación de anillo de verificación de recarga año 2026-2027 (ROJO).
   d. Llenado cilindros con agente químico
   e. Recarga y/o Mantenimiento de extintores de CO2, Agua a presión y Tipo K Acetato de Potasio.
   f. Presurización con nitrógeno gaseoso (Agente expulsor).
   g. Prueba de sensibilidad (verificación de fugas)
   h. Lavado y remoción de etiquetas
   i. Rotulado con etiqueta informativa.
   j. Colocación de sellos plásticos de seguridad

Todas las anteriores actividades se realizaron teniendo en cuenta las normas NFPA 10 y NTC 2885, Vigentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	PROPIEDAD EQUIPOS-SEDE	CANT	Descripcion Tecnica
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO BC - 10 LIBRAS DE CAPACIDAD PRESURIZADO CON NITROGENO, CAMBIO DE EMPAQUES Y REVISION GENERAL.	*INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER-TUNJA*	***9***	*Se efectuó Mantenimiento y recarga de extintores teniendo en cuenta las normas NFPA 10 Y NTC 2885.*
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR SOLKAFLAM 123 GAS LICUADO ESPECIAL PARA EQUIPO ELECTRICO CONECTADO, PRESURIZADO CON NITROGENO, CAMBIO DE EMPAQUES Y REVISION GENERAL.	*INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER-TUNJA*	***7***	*Se efectuó Mantenimiento y recarga de extintores teniendo en cuenta las normas NFPA 10 Y NTC 2885.*

OBSERVACIONES

- Servitec SYS, Garantiza que en todos los equipos a los que se les realizo mantenimiento, recarga y suministro, se tuvieron en cuenta las Normas Icontec, y Normas Internacionales NFPA 10, vigentes al momento de esta actividad.
- Servitec sys Garantiza el Suministro, servicio y mantenimiento de los equipos extintores, así como la materia prima, accesorios y repuestos utilizados en la recarga.
- Así mismo garantiza que los equipos fueron recargados con Polvo químico seco, y Solkaflam 123 gas licuado.

- Se rotularon todos los equipos a los cuales se les efectuó mantenimiento y recarga, mediante etiqueta informativa, donde se anota, fecha de Recarga, fecha próxima recarga, empresa responsable del mantenimiento, tipo de extintor y capacidad de extintor.
- Los equipos se entregaron debidamente recargados a la persona encargada de su recepción.

- GARANTIA DE SERVICIO:


Al momento de encontrar la evidencia de que algún equipo a el cual se le hizo recarga y mantenimiento, por parte de la empresa SERVITEC SYS, favor comunicar al correo electrónico servitec.boyaca@hotmail.com.co, a al Celular 3213016524, el tipo de novedad, tipo de extintor, y demás características de servicio y equipo para iniciar el proceso de garantía de servicio por parte de nuestra empresa, la cual se comunicara con ustedes las 24r horas siguientes de recibida la novedad, para la cual se les informara la Técnico encargado de retirar el equipo para aplicar la garantía de servicio, una vez aplicada la garantía, este será entregado dentro de las 24 horas siguientes de haberse retirado de sus instalaciones.

Tunja, Octubre de 2026.

JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA
SERVITEC SYS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
Contratista

Scanned by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

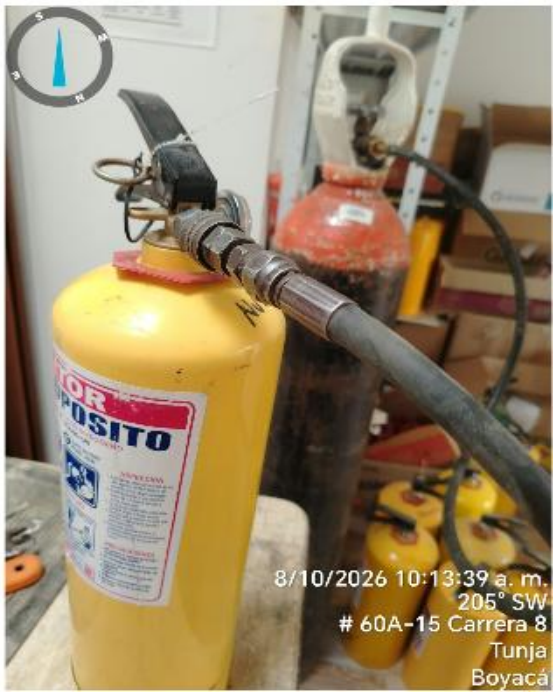








7/10/2026 10:28:43 a. m.
100° E
9-16 Calle 64
Tunja
Boyacá


DEPOSITAR
BOTELLAS
AQUI
7/10/2026 10:26:52 a. m.
355° N
9 25 Calle 64
Tunja
Boyacá


7/10/2026 10:26:32 a. m.
168° S
64-15 Carrera 10
Tunja
Boyacá


7/10/2026 10:26:19 a. m.
94° E
9 25 Calle 64
Tunja
Boyacá


EXTINTOR
7/10/2026 10:26:05 a. m.
29° NE
9 25 Calle 64
Tunja
Boyacá


AQUI
7/10/2026 10:23:47 a. m
50° NE
64A-29 Carrera 10
Tunja
Boyacá


7/10/2026 10:23:44 a. m.
36° NE
64A-29 Carrera 10
Tunja
Boyacá
