ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	26 DE OCTUBRE DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	3047 de 03 de julio de 2026
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J
C.C. o N.I.T.	902.081.361-2
REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Hernando Tenjo Contreras
N.I.T	88.266.610
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA- CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.216.212.779,00
PLAZO O DURACIÓN	Tres (03) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vía secundaria La Esperanza- Corregimiento Veinte de Julio, Municipio La Esperanza en el Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. FUENTE DEL RECURSO 1.2.3.3.01- PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIAL LEGAL
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino, Profesional Especializado de la Secretaría de Vías, designado mediante memorando del 21 de julio de 2026
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE JULIO DE 2026
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	N/A

OBSERVACIONES:

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Vías del Departamento, se reunieron los suscritos a saber: Mary Fabiana Leal Garay, Secretaria de Vías, Jorge Enrique Arias Sanguino, Supervisor del Departamento y Jaime Hernando Tenjo Contreras, representante legal de UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J, Contratista, con el fin de suspender la ejecución del Contrato

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

No.SA-SV-3047-2026 del 03 de julio de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Por medio de oficio de fecha 19 de octubre de 2026 de UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J, solicitan la suspensión de la ejecución del contrato de obra por el término de un (1) mes con el fin de estudiar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de la solicitud realizada por la comunidad *beneficiaria de las Veredas Campo Alegre y Veinte de Julio, que incide en el alcance del proyecto y que tiene por objeto mejorar la conectividad y transitabilidad en el sector.*
2. Solicitudes realizadas por la comunidad de las veredas beneficiadas Campo Alegre y Veinte de Julio a través de comités y/o acta de seguimiento.
3. Desde el componente técnico, la supervisión ejercida por el Departamento Norte de Santander establece la necesidad de estudiar y analizar la solicitud de la comunidad que incide en el alcance del proyecto con el fin de atender los puntos críticos en el sector Campo Alegre- Veinte de Julio, lo cual, permite subsanar las fallas menores de banca y mejorar la conectividad vial.
4. Lo anterior, con el fin de atender la aplicación del principio de planeación, resulta necesario adelantar previamente, entre otras actuaciones, la identificación y priorización de la necesidad, determinación del alcance de la intervención, elaboración del presupuesto, definición de la fuente de financiación, viabilidad y ajuste del proyecto, además de los trámites administrativos y presupuestales que resulten aplicables.
5. El supervisor del Departamento del contrato de obra No. SA-SV-03047-2026, considera razonable y emite CONCEPTO FAVORABLE para suspender los términos de ejecución del contrato por el término de UN (01) MES, con el fin de permitir el estudio y análisis de la viabilidad técnica, jurídica y financiera sobre la intervención de otros puntos críticos en el sector Campo Alegre- Veinte de Julio y de esta manera cumplir con la observancia de los principios que rigen la contratación estatal que implican determinar el alcance de la intervención, elaboración de presupuestos, definición de fuentes de financiación y recursos financieros que amparan el ajuste del proyecto.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

Atendiendo a lo anterior, el Departamento aprueba suspender los términos del contrato de obra No. SA-SV-03047-2026 por UN (01) MES, a partir del día veintiséis (26) de octubre de 2026, acordándose igualmente reiniciar los términos del contrato el día veinticinco (25) de noviembre de 2026, o antes si las causas que dieron origen a esta suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS
RL/ UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J
Contratista

JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO
Supervisor

MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías

COPIA CONTROLADA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Oscar Yovany Rojas Depablo	Profesional contratado-apoyo supervisión	
Revisión jurídica:	Clanivel Vergel Badillo	Profesional contratado	
Aprobación Jurídica:	Sergio Rojas Landinez	Profesional contratado	
Revisión área técnica:	Jorge Enrique Arias Sanguino	Profesional Especializado	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes: y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE VÍAS

San José de Cúcuta, 22 de octubre de 2026

Arquitecta
MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías
Departamento Norte de Santander

Referencia: Contrato de Obra No. SA-SV-03047-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA- CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Aprobación suspensión No.01 al contrato de obra No. SA-SV-03047-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA- CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

Cordial saludo,

Informe de supervisor sobre la ejecución de las actividades contractuales del Contrato de obra No. 03047 del 3 de julio de 2026 y solicitud sobre la ejecución contractual:

Antecedentes:

1. Por medio de oficio de fecha 19 de octubre de 2026 de UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J, solicitan la suspensión de la ejecución del contrato de obra por el término de un (1) mes con el fin de estudiar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de la solicitud realizada por la comunidad *beneficiaria de las Veredas Campo Alegre y Veinte de Julio, que incide en el alcance del proyecto y que tiene por objeto mejorar la conectividad y transitabilidad en el sector.*
2. Solicitudes realizadas por la comunidad de las veredas beneficiadas Campo Alegre y Veinte de Julio a través de comités y/o acta de seguimiento.

TRAZABILIDAD CONTRACTUAL

CONTRATO No. - FECHA	No. 03047 del 03 de julio de 2026
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J
C.C. o N.I.T.	902.081.361-2

REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Hernando Tenjo Contreras
C.C. o N.I.T.	88.266.610
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA- CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.216.212.779,00
PLAZO O DURACIÓN	Tres (03) meses
ACTA DE INICIO	27 DE JULIO DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vía secundaria La Esperanza- Corregimiento Veinte de Julio, Municipio La Esperanza en el Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. FUENTE DEL RECURSO 1.2.3.3.01- PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIAL LEGAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00003419 del 11 de Mayo de 2026 - $ 1.228.783.848,75
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino, Profesional Especializado de la Secretaría de Vías, designado mediante memorando del 21 de julio de 2026
APROBACION DE GARANTIAS	27 DE JULIO DE 2026
PORCENTAJE DE AVANCE	90%

ANALISIS TECNICO

Desde el componente técnico, la supervisión ejercida por el Departamento Norte de Santander establece la necesidad de estudiar y analizar la solicitud de la comunidad que incide en el alcance del proyecto con el fin de atender los puntos críticos en el sector Campo Alegre- Veinte de Julio, lo cual, permite subsanar las fallas menores de banca y mejorar la conectividad vial.

Lo anterior, con el fin de atender la aplicación del principio de planeación, resulta necesario adelantar previamente, entre otras actuaciones, la identificación y priorización de la necesidad, determinación del alcance de la intervención, elaboración del presupuesto, definición de la fuente de financiación, viabilidad y ajuste del proyecto, además de los trámites administrativos y presupuestales que resulten aplicables.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

El supervisor del Departamento del contrato de obra No. SA-SV-03047-2026, considera razonable y emite CONCEPTO FAVORABLE para suspender los términos de ejecución del contrato por el término de UN (01) MES, con el fin de permitir el estudio y análisis de la viabilidad técnica, jurídica y financiera sobre la intervención de otros puntos críticos en el sector Campo Alegre- Veinte de Julio y de esta manera cumplir con la observancia de los principios que rigen la contratación estatal que implican determinar el alcance de la intervención, elaboración de presupuestos, definición de fuentes de financiación y recursos financieros que amparan el ajuste del proyecto.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO
Supervisor
Secretaria de Vías de Norte de Santander

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Oscar Yovany Rojas Depablo	Profesional Contratista	
Revisión Jurídica:	Clarivel Vergel Badillo	Profesional Contratista	
Revisión Técnica:	Jorge Enrique Arias Sanguino	Profesional Especializado	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J

Cúcuta, 19 de Octubre de 2026

UTLE20J-015-19-10-2026

Señores
Gobernación de Norte de Santander
Atte.
Arq. MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaría de Vías
Ciudad

Asunto: Solicitud formal de suspensión temporal de actividades de obra.
Referencia: Proyecto "Mantenimiento de la vía secundaria La Esperanza – Corregimiento Veinte de Julio, Municipio La Esperanza, Departamento Norte de Santander" (Código BPIN 2024004540039).

Cordial saludo,

En mi condición de Representante Legal de la UT LA ESPERANZA 20J, contratista de obra del proyecto de la referencia, me dirijo a usted con el propósito de solicitar respetuosamente la SUSPENSIÓN TEMPORAL del citado contrato por el término de un (1) mes, contado a partir de la firma del acta respectiva.

Esta solicitud técnica y jurídica encuentra su fundamento en las siguientes consideraciones:

1. FUNDAMENTO TÉCNICO Y SOCIAL: En respuesta a la reunión de seguimiento realizada y a las peticiones manifestadas por la comunidad beneficiaria de las Veredas Campo Alegre y Veinte de Julio de fecha 18 de agosto de 2026, se evidenció la necesidad prioritaria de extender el alcance de ejecución del proyecto con el objeto de mejorar la conectividad y transitabilidad en el sector.
2. Viabilidad y respuesta a la comunicación dirigida a la Gobernación del Departamento con fecha 13 de octubre de 2026 de solicitud de recursos adicionales.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración a la presente solicitud

Atentamente,

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS
R/L UT LA ESPERANZA 20J

Calle 10 #5-50 Lc 27 Edificio Centro Agrobancario • Celular:3102547893
Correo: utlaesperanza20j@gmail.com

UNION TEMPORAL LA ESPERANZA 20J

Cúcuta, 13 de Octubre de 2026

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-08400-043631-2
2026-10-13 14:38 -ARCHIVO1
Destino: 4000
cc:
Rem/D: JAIME HERNANDO TENJO
Asunto: SOLICITUD DE RECURSO
Folios: 4
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Señores
Gobernación de Norte de Santander
Atte.
Arq. MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaría de Vías
Ciudad

Asunto: Solicitud de recursos adicionales para atención de puntos críticos – Proyecto BPIN 2024004540039

Respetados señores:

En calidad de Contratista de obra del proyecto "Mantenimiento de la vía secundaria La Esperanza – Corregimiento Veinte de Julio, Municipio La Esperanza, Departamento Norte de Santander", identificado con Código BPIN 2024004540039, me permito remitir la presente solicitud con fundamento en el Acta de Socialización y solicitud de recursos por adición de puntos críticos No. 1, suscrita el día 18 de agosto de 2026, en la cual se identificaron puntos críticos adicionales que requieren intervención urgente.

El recorrido técnico realizado permitió consolidar un diagnóstico que evidencia la necesidad de atender un volumen total de 1440 m³ de afirmado, indispensable para garantizar la transitabilidad de la vía. La falta de intervención en estos tramos afecta la conectividad vial, la salida de productos agrícolas y ganaderos, y genera sobrecostos en el transporte, impactando negativamente la calidad de vida de los habitantes.

Detalle de puntos críticos contratados:

INICIO	FIN	LONG	ALTO	ANCHO	VOL	VOL ACUM
K0+680.00	K0+725.00	45	0.7	2	63.00	63.00
K0+725.00	K0+830.00	105	0.15	5.2	81.90	144.90
K1+090.00	K1+200.00	110	0.15	4.5	74.25	219.15
K1+853.00	K1+950.00	97	0.15	4.5	65.48	284.63
K2+015.00	K2+115.00	100	0.15	4.4	66.00	350.63
K2+471.00	K2+613.00	142	0.15	3.5	74.55	425.18
K3+000.00	K3+024.00	24	0.4	2	19.20	444.38
K3+100.00	K3+150.00	50	0.15	5	37.50	481.88
K3+150.00	K3+220.00	70	0.15	4	42.00	523.88
K3+220.00	K3+260.00	40	0.15	4.5	27.00	550.88
K3+260.00	K3+450.00	190	0.15	4	114.00	664.88
K3+450.00	K3+650.00	200	0.2	4	160.00	824.88

K3+650.00	K3+870.00	220	0.15	4.5	148.50	973.37
K4+000.00	K4+300.00	300	0.15	4.5	202.50	1175.87
K4+400.00	K4+500.00	100	0.15	4.5	67.50	1243.37
K4+600.00	K4+900.00	300	0.15	4.5	202.50	1445.87
K5+000.00	K5+400.00	400	0.15	4.5	270.00	1715.87
K5+400.00	K5+900.00	500	0.15	4.5	337.50	2053.37
K6+000.00	K6+300.00	300	0.15	4.5	202.50	2255.87
K6+300.00	K6+600.00	300	0.15	4.5	202.50	2458.37
K6+800.00	K7+000.00	200	0.15	4.5	135.00	2593.37
K7+100.00	K7+200.00	100	0.15	4.5	67.50	2660.88
K7+700.00	K7+900.00	200	0.20	4.5	180.00	2840.87
K8+150.00	K8+450.00	300	0.20	4.5	270.00	3110.87
K8+900.00	K9+000.00	100	0.20	4.5	90.00	3200.88
K9+200.00	K9+444.00	244	0.20	4.5	219.60	3420.48
K9+444.00	K9+500.00	56	0.20	4.5	50.40	3470.88

Detalle de puntos críticos adicionales solicitados:

INICIO	FIN	LARGO	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN	VOL ACUM
K9+444,00	K9+500,00	56	0,20	4,5	50.4	50.4
K9+600.00	K10+000.00	400	0.20	4.5	360.00	410.40
K10+000.00	K10+300.00	300	0.20	4.5	270.00	680.40
K10+300.00	K10+500.00	200	0.20	4.5	180.00	860.40
K10+900.00	K11+400.00	500	0.20	4.5	450.00	1310.40
K11+800.00	K11+944.00	144	0.20	4.5	129.60	1440.00

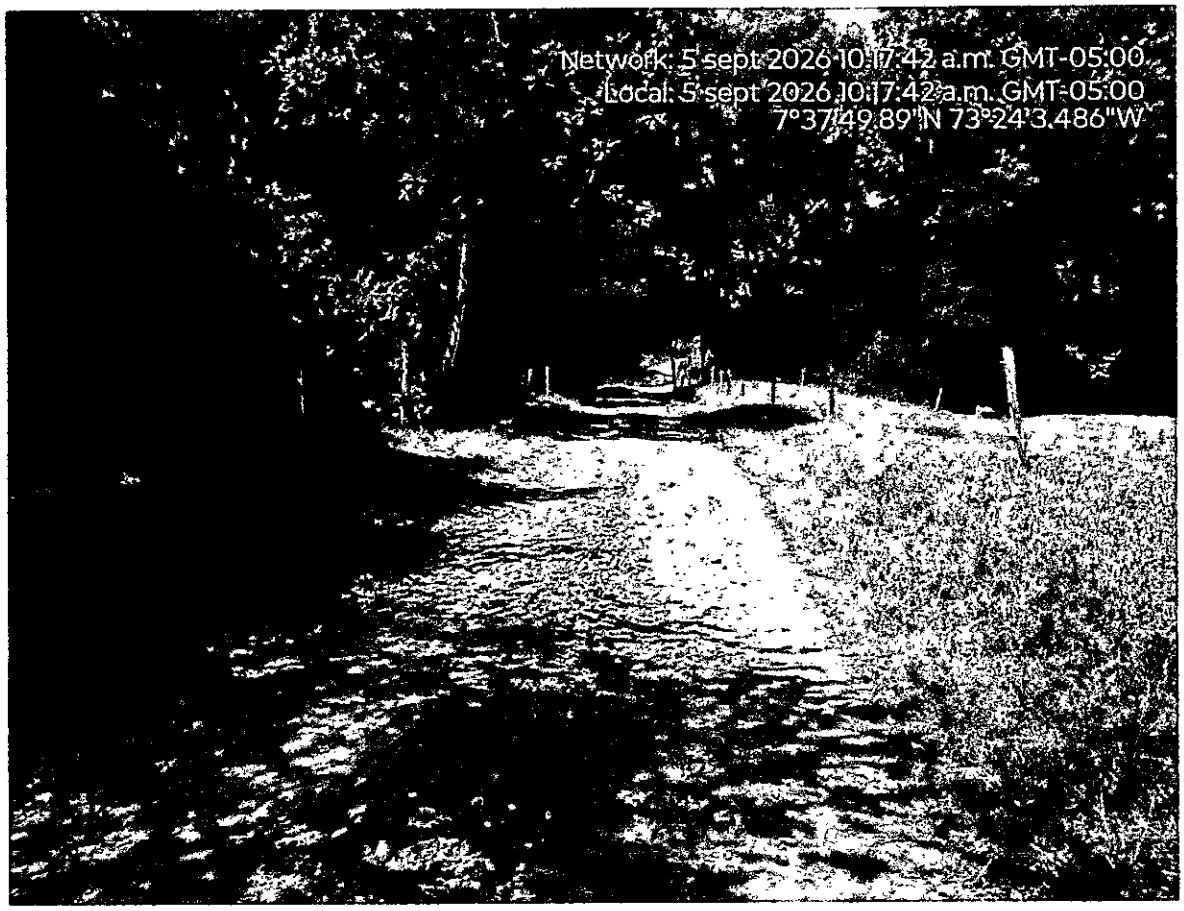
Valor del adicional conforme a condiciones del contrato inicial:

ITEM		DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
1.2	APU1302	MATERIAL DE AFIRMADO	M3	1,440.00	$ 128,531.11	$ 185,084,800
		SUBTOTAL DE OBRAS				$ 185,084,800
		ADMINISTRACIÓN (30%)				$ 55,525,440
		UTILIDADES (5%)				$ 9,254,240
		COSTO TOTAL				**$ 249,864,480**

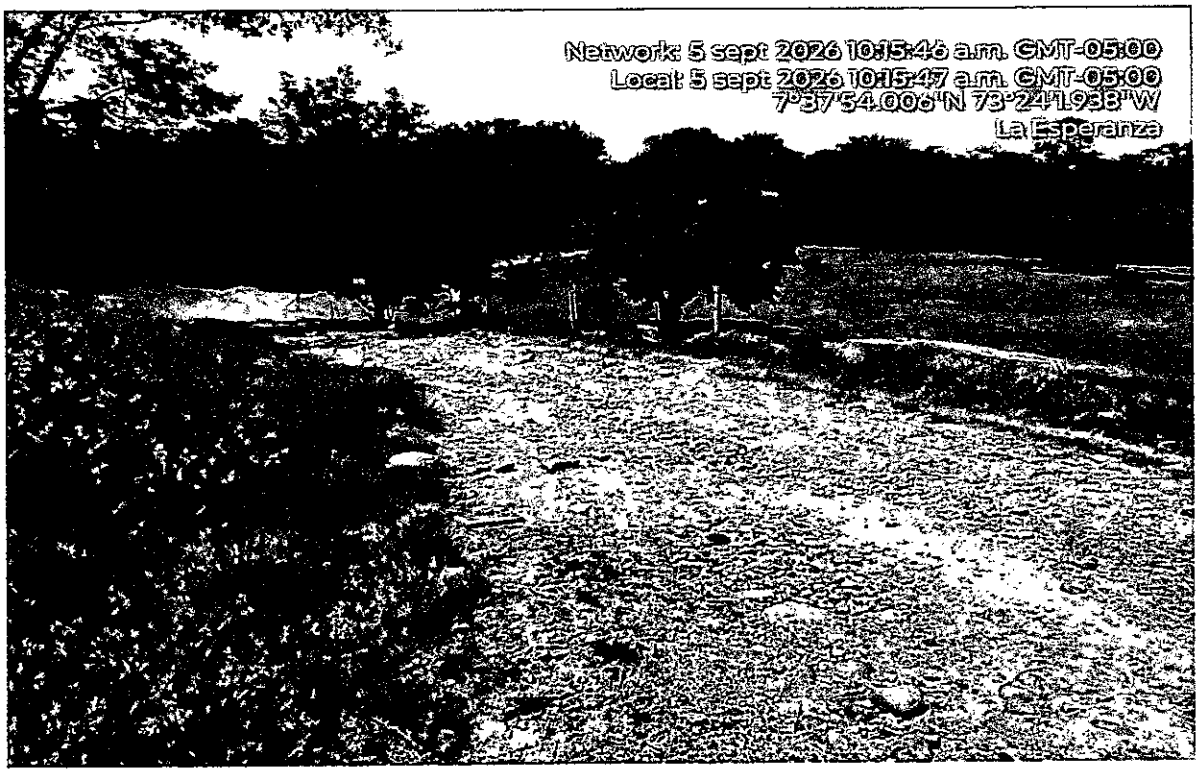
En concordancia con las condiciones del contrato inicial, el valor correspondiente a la atención de los puntos críticos adicionales asciende a **$249.864.480**. Dicho cálculo se realizó con base en el precio unitario previamente estipulado para el ítem **APU1302 – Material de afirmado**, de acuerdo con lo establecido en el contrato vigente.

Anexo fotográfico:

Las imágenes se encuentran georreferenciadas y disponibles en archivo digital, como evidencia técnica del recorrido realizado.




Network: 5 sept 2026 10:16:46 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:16:47 a.m. GMT-05:00

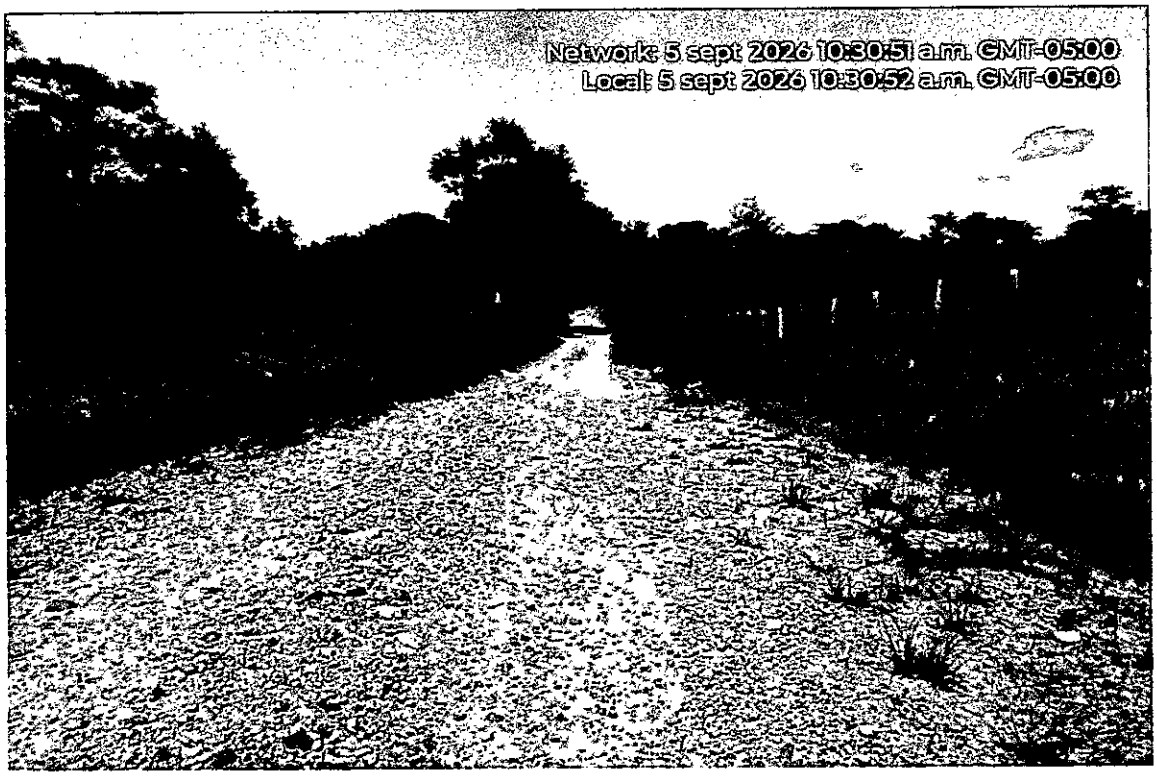

Network: 5 sept 2026 10:15:46 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:15:47 a.m. GMT-05:00
7°37'54.006"N 73°24'19.938"W
La Esperanza

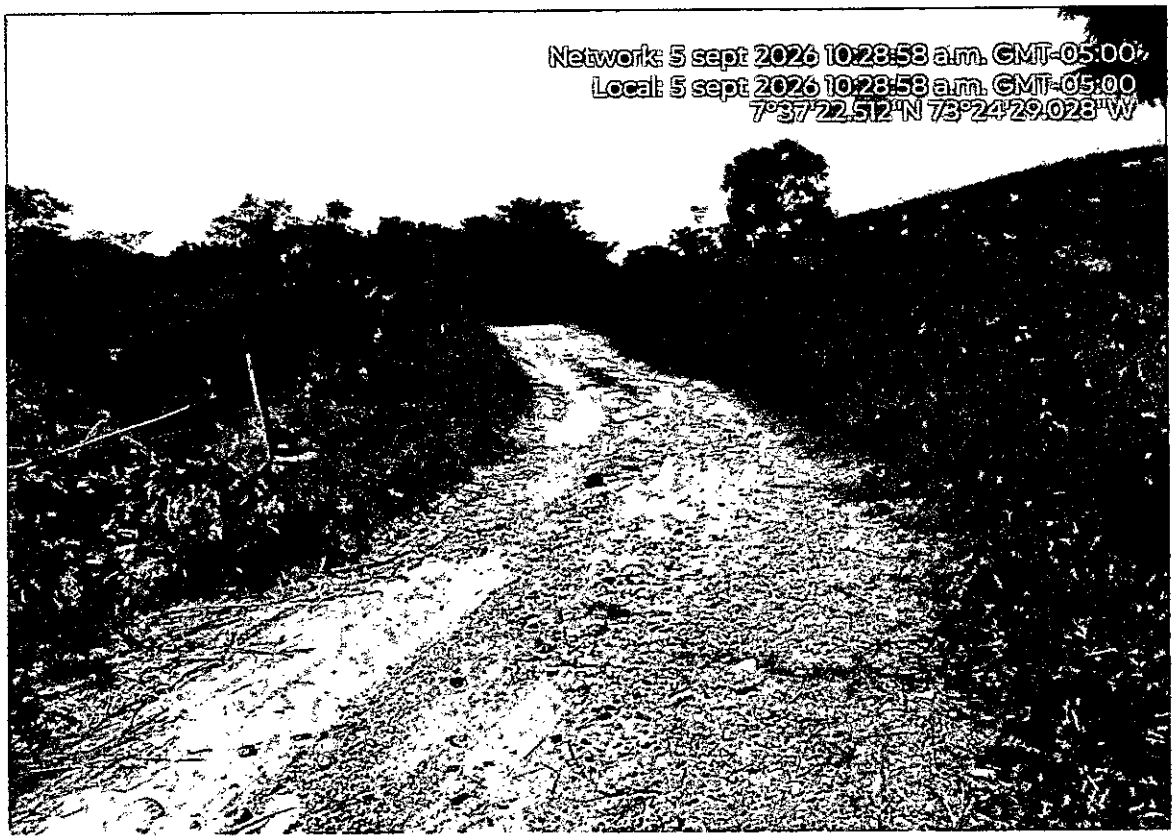

Network: 5 sept 2026 10:15:39 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:15:39 a.m. GMT-05:00
7°37'54"N 73°24'2.262"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:07:21 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:07:22 a.m. GMT-05:00
7°37'55.543"N 73°24'1.368"W
La Esperanza


Local: 5 sept. 2026 10:07:12 a.m. GMT-05:00
7°37'56.52"N 73°23'58.602"W
La Esperanza


Local: 5 sept. 2026 10:32:00 a.m. GMT-05:00
7°37'16.902"N 73°24'35.562"W


Network: 5 sept 2026 10:30:51 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:30:52 a.m. GMT-05:00

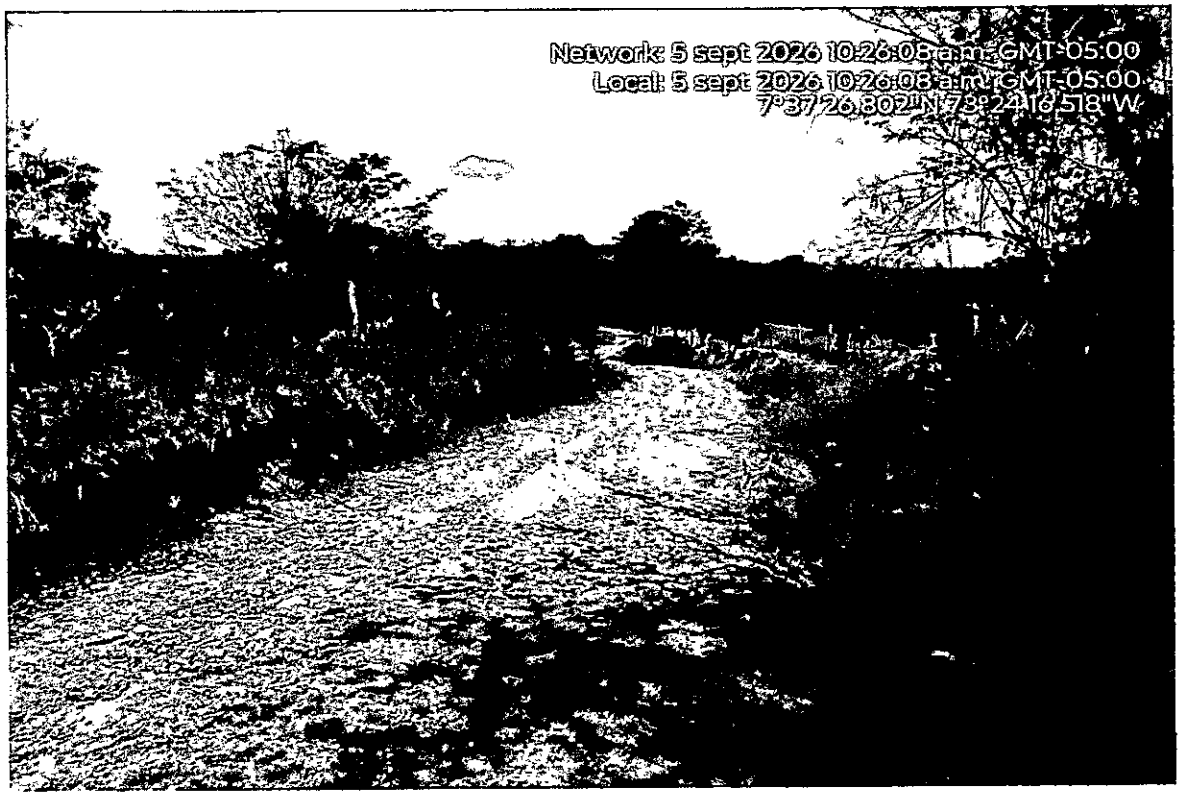

Network: 5 sept 2026 10:28:58 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:28:58 a.m. GMT-05:00
7°3'7'22.512"N 73°24'29.028"W


Network: 5 sept 2026 10:28:34 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:28:34 a.m. GMT-05:00

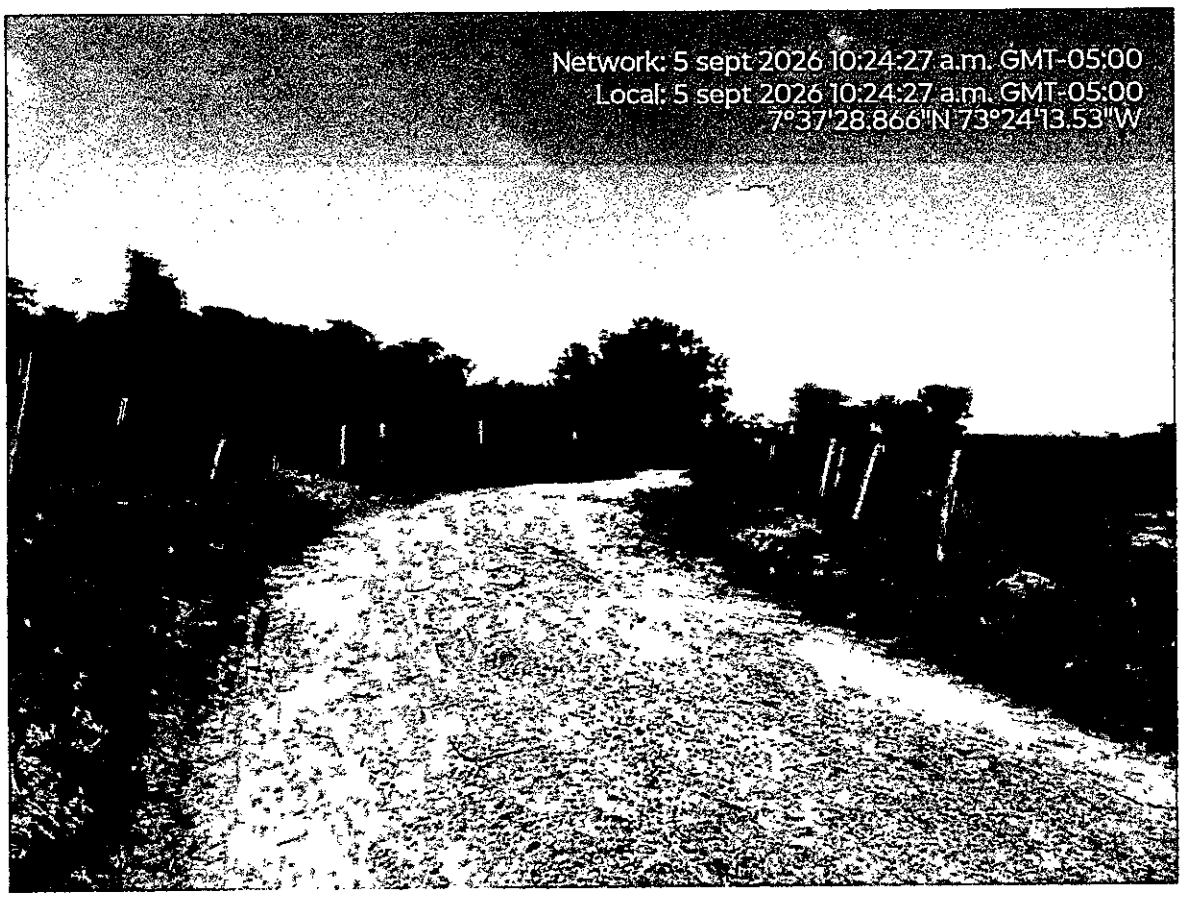

Network: 5 sept 2026 10:28:17 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:28:18 a.m. GMT-05:00
7°37'22.078"N 73°24'26.[illegible]"W

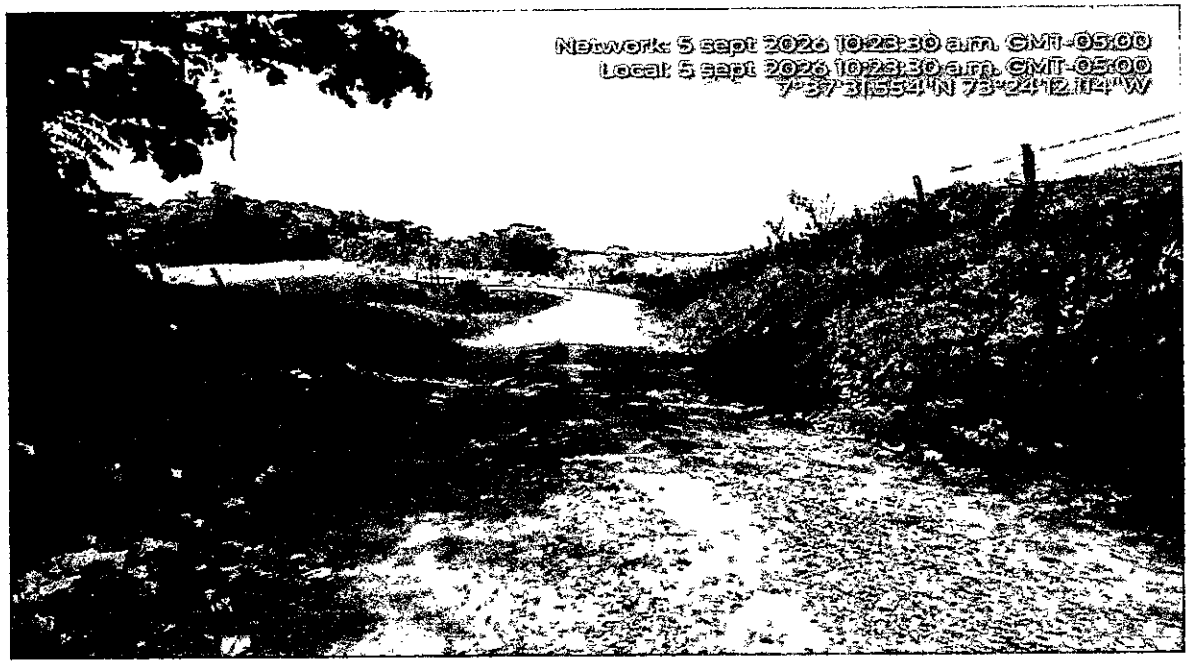

Network: 5 sept 2026 10:27:41 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:27:42 a.m. GMT-05:00
7°37'25.926"N 73°24'23.484"W
La Esperanza

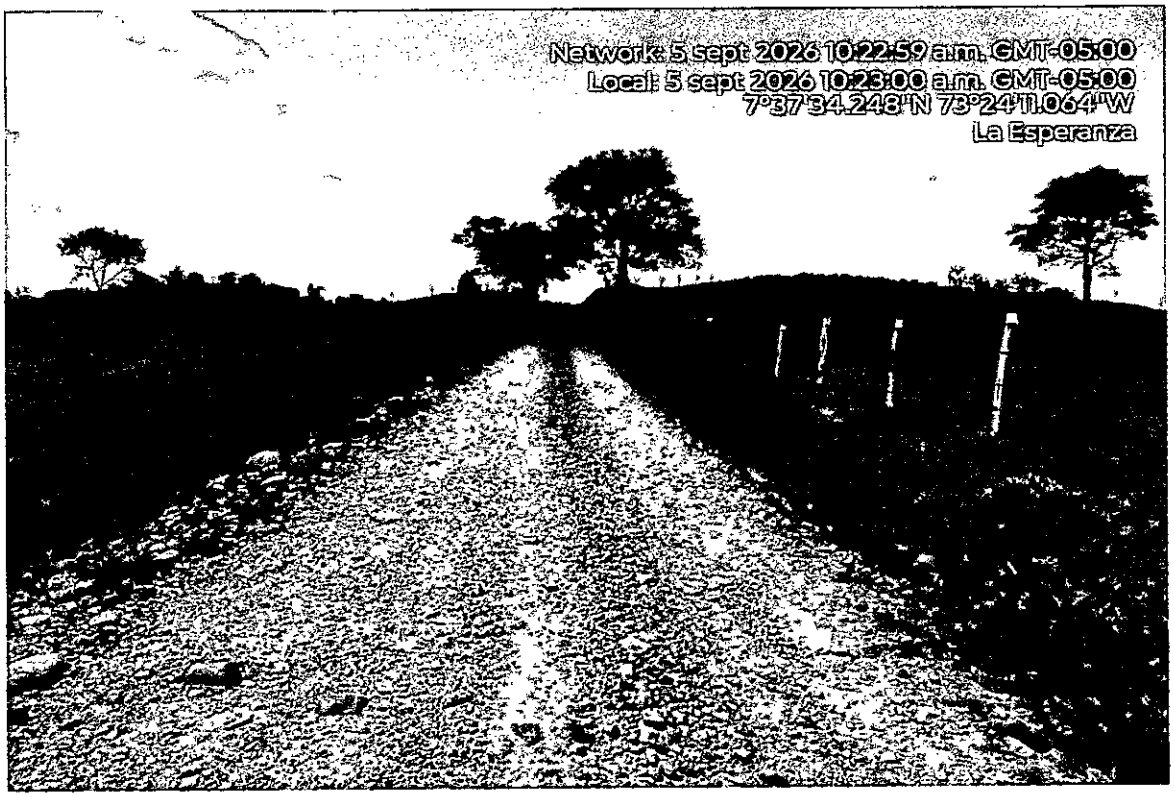

Network: 5 sept 2026 10:27:00 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:27:00 a.m. GMT-05:00
7°37'26.988"N 73°24'20.664"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:26:08 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:26:08 a.m. GMT-05:00
7°37'26.802"N 73°24'18.518"W


Network: 5 sept 2026 10:25:25 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:25:25 a.m. GMT-05:00
7°37'27.282"N 73°24'15.018"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:24:27 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:24:27 a.m. GMT-05:00
7°37'28.866"N 73°24'13.53"W


Network: 5 sept 2026 10:23:30 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:23:30 a.m. GMT-05:00
7°37'31.554"N 73°24'12.114"W


Network: 5 sept 2026 10:22:59 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:23:00 a.m. GMT-05:00
7°37'34.248"N 73°24'11.064"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:22:29 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:22:29 a.m. GMT-05:00
7°37'36.774"N 73°24'10.158"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:21:33 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:21:33 a.m. GMT-05:00
7°37'40.716"N 73°24'8.616"W

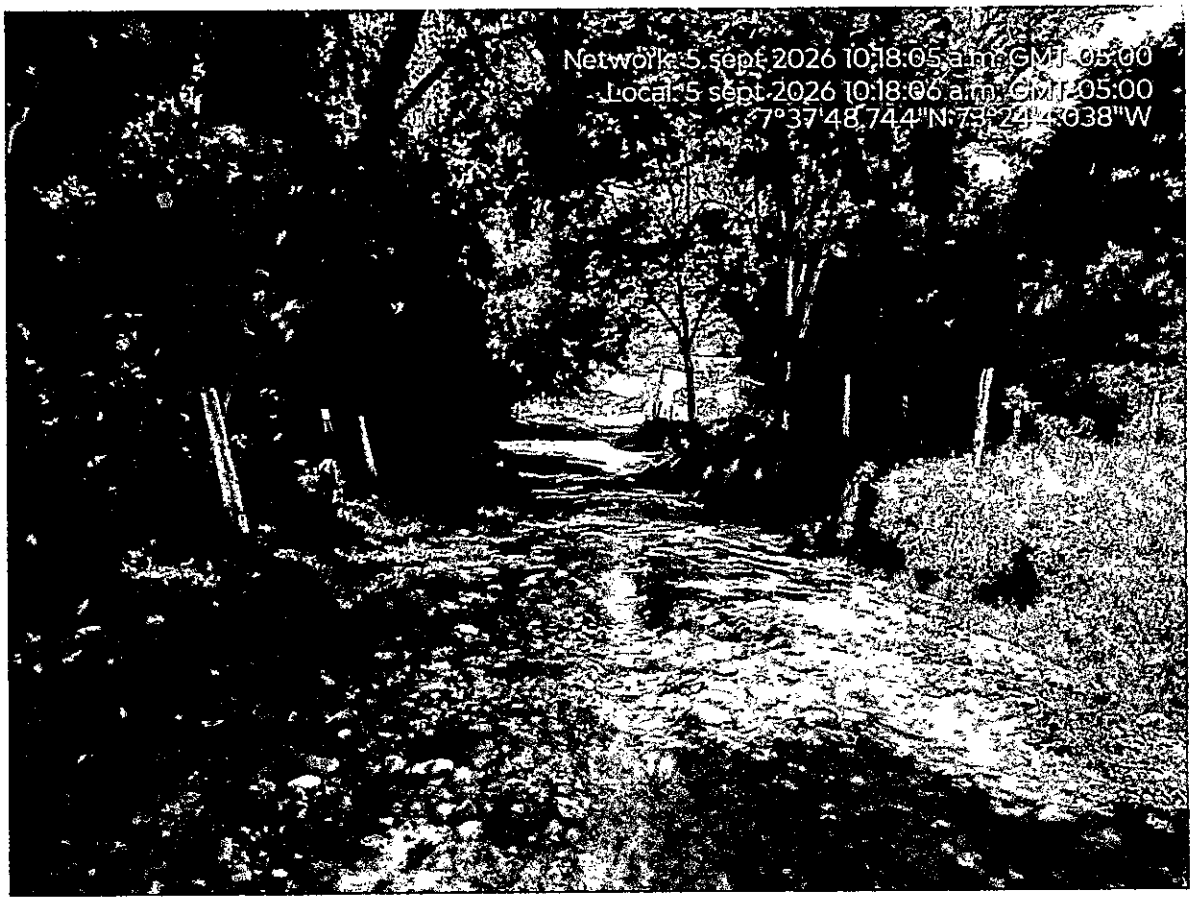

Network: 5 sept 2026 10:21:07 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:21:08 a.m. GMT-05:00
7°37'40.716"N 73°24'8.616"W


Network: 5 sept 2026 10:20:38 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:20:39 a.m. GMT-05:00
7°37'42.132"N 73°24'8.07"W

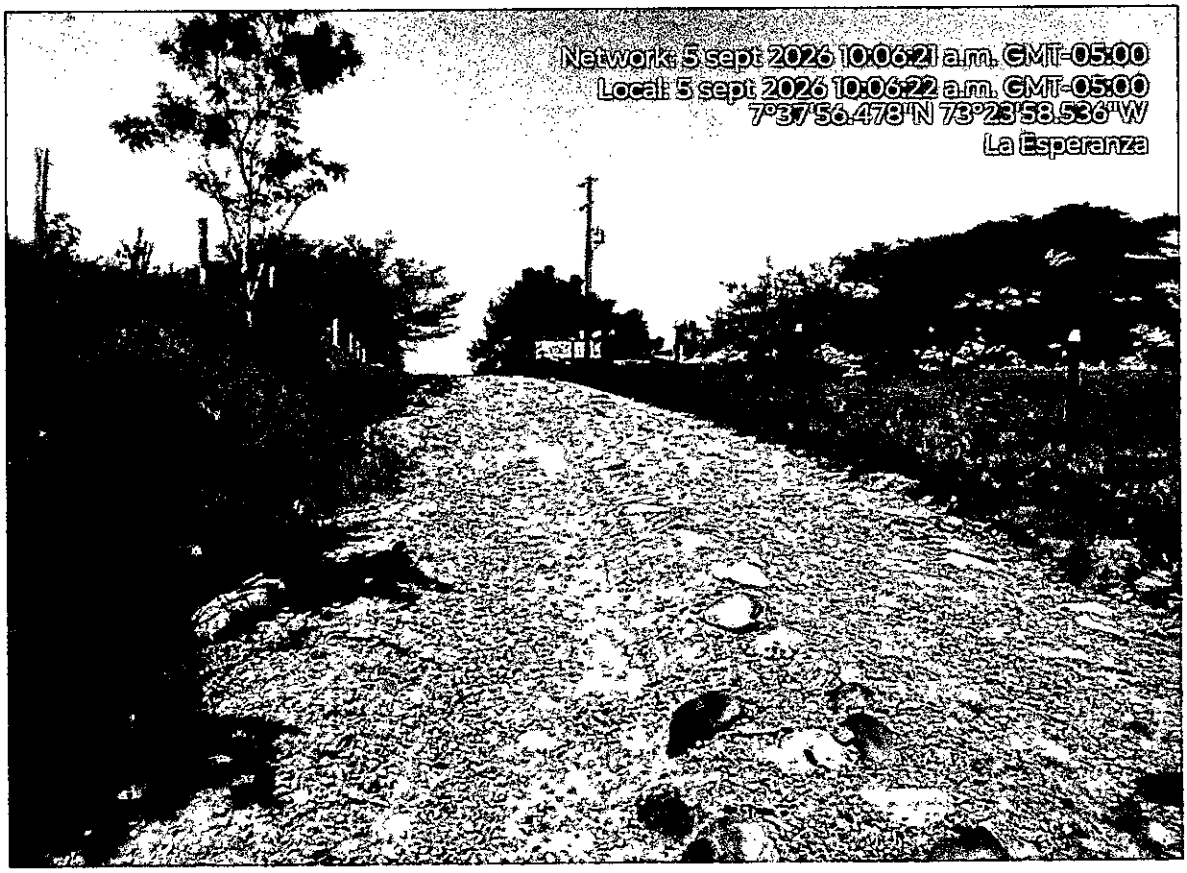

Network 5 sept 2026 10:20:09 a.m. GMT-05:00
Local 5 sept 2026 10:20:10 a.m. GMT-05:00
7°37'45.176"N 78°24'7.542"W


Network 5 sept 2026 10:19:42 a.m. GMT-05:00
Local 5 sept 2026 10:19:43 a.m. GMT-05:00
7°37'43.956"N 73°24'7.236"W


Network: 5 sept 2026 10:19:07 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:19:08 a.m. GMT-05:00
7°37'46.2"N 73°24'5.706"W


Network: 5 sept 2026 10:18:05 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:18:06 a.m. GMT-05:00
7°37'48.744"N 73°24'5.038"W


Network: 5 sept 2026 10:16:46 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:16:47 a.m. GMT-05:00


Network: 5 sept 2026 10:06:21 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:06:22 a.m. GMT-05:00
7°37'56.478"N 73°23'58.536"W
La Esperanza

Por lo anterior, solicito de manera formal a la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Vías, adelantar las gestiones necesarias para la asignación de los recursos adicionales requeridos, con el fin de subsanar las fallas menores de la banca y asegurar la adecuada prestación del servicio de movilidad en la zona.

Adjunto a la presente:

- Acta de Socialización y solicitud de recursos por adición de puntos críticos No. 1.

Agradezco su atención y apoyo a esta solicitud, que responde a una necesidad urgente de la comunidad y al cumplimiento de los objetivos del contrato de obra.

Atentamente,

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS
R/L UT LA ESPERANZA 20J

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SOLICITUD DE RECURSOS POR ADICION DE PUNTOS CRITICOS ADICIONALES PROYECTO:

"MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA - CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"
Código BPIN: 2024004540039

ACTA No. 1

En el municipio de la Esperanza, departamento de Norte de Santander, a los 18 días del mes de agosto de 2026, siendo las 10:00 a.m., se llevó a cabo la reunión de socialización y solicitud de recursos por adición de puntos críticos adicionales del proyecto denominado **"MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA - CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**, identificado con Código BPIN 2024004540039, con la participación de representantes de la comunidad, autoridades municipales y demás asistentes relacionados con el desarrollo del proyecto.

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

A solicitud de la comunidad, las partes interesadas se reunieron con el fin de realizar un recorrido técnico por la vía La Esperanza – 20 de Julio para evaluar los puntos críticos que no pudieron ser atendidos o abocados en el marco del Contrato de obra N.º 3047, debido a la limitación de recursos presupuestales.

2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE PUNTOS CRÍTICOS

Durante el recorrido se identificaron y georreferenciaron las intervenciones requeridas, respaldadas con registro fotográfico y estimación de volúmenes:

Resumen de Volumetría (Consolidado):

INICIO	FIN	LARGO	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN	VOL ACUM
K9+444,00	K9+500,00	56	0,20	4,5	50.4	50.4
K9+600.00	K10+000.00	400	0.20	4.5	360.00	410.40
K10+000.00	K10+300.00	300	0.20	4.5	270.00	680.40
K10+300.00	K10+500.00	200	0.20	4.5	180.00	860.40
K10+900.00	K11+400.00	500	0.20	4.5	450.00	1310.40
K11+800.00	K11+944.00	144	0.20	4.5	129.60	1440.00

3. PETICIÓN Y CONCLUSIONES DE LA COMUNIDAD

Dado que el volumen total de 1440 m³ de Afirmado es indispensable para garantizar la transitabilidad de la vía, la comunidad acuerda de manera unánime:

Solicitud Formal: Tramitar la presente acta y sus anexos ante la Secretaría de Vías del Departamento (entidad contratante) para que adelante las gestiones necesarias con el fin de asignar los recursos adicionales requeridos.

Justificación de Impacto: La atención de estos puntos críticos permitirá subsanar las fallas menores de la banca, mejorar la conectividad vial, facilitar la salida de los productos agrícolas y ganaderos de la zona, y reducir los costos de flete, garantizando una mejor calidad de vida para los habitantes.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada la socialización siendo las 12:00 m. del mismo día, firmando los asistentes en constancia.

FIRMAN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-CG-CI-07	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 29/06/2018	VERSIÓN 4
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Página ___ de ___	

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA

Fecha:	Hora de inicio: 10:00 AM	Hora de finalización: 12:00 M
Lugar: Municipio de La Esperanza		
Tema: socialización puntos críticos adicionales al contrato de obra pública No 03047 del 03 de julio de 2026		Responsable: Gobernación de Norte de Santander

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
01	Jesus montaño tovar	1090488931	Juntico	jesusmontanotovar09@hotmail.com	3158234409	
02	Diego Armando Trujillo	13276864	Contratista	diegot55@hotmail.com	3105668140	
	Jeiner andres Pabón	1097494565	Representante Junta	jeinerpabon06@gmail.com	3124151106	
	Avelino Pabón C	91289547	Docente Horrocoyes	avelino_73@hotmail.com	3175891293	
	Julio cesar millan Reyes	1098876796	Ruta de leche		3173199725	
	Jose Alexsis Ballesteros	13834087	Rumbon Alto		3228609251	
	Carmen Rosa Duarte H.	39716362	Representante legal Asoleches		3228148206	
	Adriano Lasso Roja	79283104	Asociado Asolaleches		3172803463	
	Gilberto Pabon	13891.182	Bajo Rumbon		3222925830	
	Claudetto Moreno B.	1081788599	Asociado Asolaches	Claudellumarinos210@gmail.com	3185890946	

*Nota: Marcar con una X en la columna final, si NO autoriza el uso de sus datos y la publicación de fotografías donde aparezca, en documentos que desarrollen el objetivo de este taller/evento. Teniendo en cuenta la normatividad vigente en Colombia respecto a la protección, tratamiento y manejo de datos personales. Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Gobernación pone a su consideración la presente información con el fin de solicitar su autorización con respecto a los datos e imágenes que usted suministrara. Los datos personales e imágenes suministrados por usted como titular serán utilizados por la Gobernación para fines relacionados con la información de nuestra entidad.

Powered by CamScanner

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Jose lain Rodriguez Paez	1091133749	Asociado a ASOALES	joselain Rodriguez Paez@gmail.com	3185890946	Jose lain Rodriguez P.
	Lucio Rubio	5727.056	Monocoyes V.		3156351163	Lucio Rubio
	Tsolina López B	63374504	monocoyes		3156351163	Tsolina López
	Yancarlos DUQUE ROJAS	7097734958	Finca Versayes		3703797499	Yancarlos DUQUE
	Miguel orozco	75141150	Con Algre		3159957104	orozco
	Jeffrey Alexander Pinilla Ch.	1005324743	Ayudante		3226173158	Jeffrey Alexander P. Ch.
	[redacted]					
	Moises Cuños	73285362	Ayudante		3212677486	Moises Cuños
	Jhonatan Vergel	1091132154	Ayudante		3218933300	Jhonatan Vergel
	Julieth paola FLOREZ C.	1098770479	SISO		3196487752	JULIETH FLOREZ.
	Maira Alejandra Laza	1098770412				
	Maira Alejandra Laza	1003590212	Miembro de la junta		3107960324	Maira Alejandra
	Leonor Bahamonde A	36458270	Campo adjunto miembro de la junta		3107960324	x Leonor Ba

*Nota: Marcar con una X en la columna final, si NO autoriza el uso de sus datos y la publicación de fotografías donde aparezca, en documentos que desarrollen el objetivo de este taller/evento. Teniendo en cuenta la normatividad vigente en Colombia respecto a la protección, tratamiento y manejo de datos personales. Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Gobernación pone a su consideración la presente información con el fin de solicitar su autorización con respecto a los datos e imágenes que usted suministrara. Los datos personales o imágenes suministrados por usted como titular serán utilizados por la Gobernación para fines relacionados con la información de nuestra entidad.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SOLICITUD DE RECURSOS POR ADICION DE PUNTOS CRITICOS ADICIONALES PROYECTO:

"MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA - CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"
Código BPIN: 2024004540039

ACTA No. 1

En el municipio de la Esperanza, departamento de Norte de Santander, a los 18 días del mes de agosto de 2026, siendo las 10:00 a.m., se llevó a cabo la reunión de socialización y solicitud de recursos por adición de puntos críticos adicionales del proyecto denominado **"MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA LA ESPERANZA - CORREGIMIENTO VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO LA ESPERANZA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**, identificado con Código BPIN 2024004540039, con la participación de representantes de la comunidad, autoridades municipales y demás asistentes relacionados con el desarrollo del proyecto.

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

A solicitud de la comunidad, las partes interesadas se reunieron con el fin de realizar un recorrido técnico por la vía La Esperanza – 20 de Julio para evaluar los puntos críticos que no pudieron ser atendidos o abocados en el marco del Contrato de obra N.º 3047, debido a la limitación de recursos presupuestales.

2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE PUNTOS CRÍTICOS

Durante el recorrido se identificaron y georreferenciaron las intervenciones requeridas, respaldadas con registro fotográfico y estimación de volúmenes:

Resumen de Volumetría (Consolidado):

INICIO	FIN	LARGO	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN	VOL ACUM
K9+444,00	K9+500,00	56	0,20	4,5	50.4	50.40
K9+600.00	K10+000.00	400	0.20	4.5	360.00	410.40
K10+000.00	K10+300.00	300	0.20	4.5	270.00	680.40
K10+300.00	K10+500.00	200	0.20	4.5	180.00	860.40
K10+900.00	K11+400.00	500	0.20	4.5	450.00	1310.40
K11+800.00	K12+200.00	400	0.20	4.5	360.00	1670.40
K12+200.00	K12+580.00	380	0.20	4.5	342.00	2012.40

3. PETICIÓN Y CONCLUSIONES DE LA COMUNIDAD

Dado que el volumen total de 3470,88 m³ de Afirmado es indispensable para garantizar la transitabilidad de la vía, la comunidad acuerda de manera unánime:

Solicitud Formal: Tramitar la presente acta y sus anexos ante la Secretaría de Vías del Departamento (entidad contratante) para que adelante las gestiones necesarias con el fin de asignar los recursos adicionales requeridos.

Justificación de Impacto: La atención de estos puntos críticos permitirá subsanar las fallas menores de la banca, mejorar la conectividad vial, facilitar la salida de los productos agrícolas y ganaderos de la zona, y reducir los costos de flete, garantizando una mejor calidad de vida para los habitantes.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada la socialización siendo las 12:00 m. del mismo día, firmando los asistentes en constancia.

FIRMAN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-CG-CI-07	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 29/06/2018	VERSIÓN 4
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Página de	

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA

Fecha:	Hora de inicio: 10:00 AM	Hora de finalización: 12:00 M	Lugar: Municipio de La Esperanza
Tema: socinlización puntos críticos adicionales al contrato de obra pública No 03047 del 03 de julio de 2026		Responsable: Gobernación de Norte de Santander	

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
01	Jesus Monroy Torres	1090488931	Juridico	jesusmonroytorres@hotmail.com	3138739409	
02	Diego Armando Toro	13276864	Contratista	diegot55@hotmail	3105268170	
	Jeiner andres Pabón	1097494565	Representante Junta	jeinerpabon06@gmail.com	3124151106	
	Aurelino Pabón C	91289547	Docente Horracoyes	aurelino_73@hotmail.com	3175891293	
	Julio Cesar Villan Reyes	1098876796	Ruta de leche		3133199725	
	JOEL ALEXSIS BALLES	13834087	RUMBON Alto		3228609251	JOEL ALEXSIS BALLE
	Carmen Rosa Duarte H	39716362	Representante legal Asocales		3228148206	
	Adriana Lucia Boya	79283104	Asociado Asalud		3172803163	
	Gilberto Pabon	13891182	Byo Rumbon		3222925830	Gilberto Pabón
	Claudetto Moreno B	1081788599	Asociado ASOALNES	Claudellimarinos21@gmail.com	3185890946	Claudetto Moreno B

*Nota: Marcar con una X en la columna final, si NO autoriza el uso de sus datos y la publicación de fotografías donde aparezca, en documentos que desarrollen el objetivo de este taller/evento. Teniendo en cuenta la normatividad vigente en Colombia respecto a la protección, tratamiento y manejo de datos personales. Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Gobernación pone a su consideración la presente información con el fin de solicitar su autorización con respecto a los datos e imágenes que usted suministrara. Los datos personales e imágenes suministrados por usted como titular serán utilizados por la Gobernación para fines relacionados con la información de nuestra entidad.

Powered by CamScanner

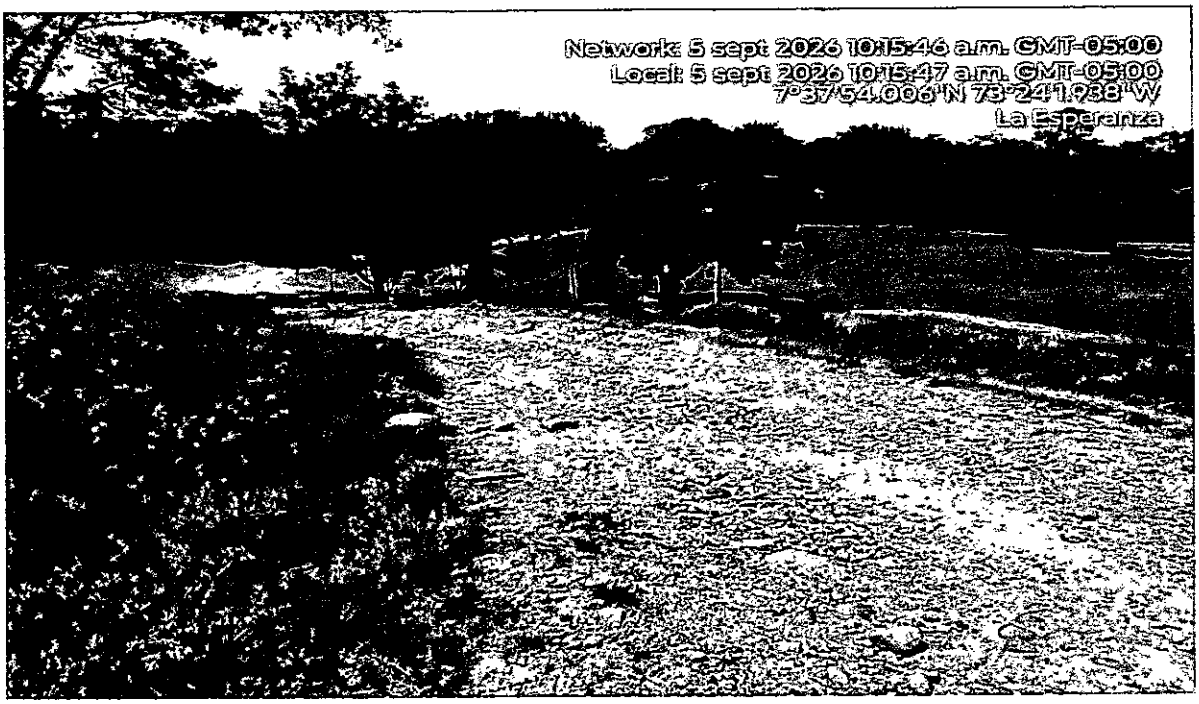
#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
	Jose lain Rodriguez Paez	1091133749	Asociado a Asoalmes	joselain Rodriguez Paez @gmail.com	3185900946	Jose lain Rodriguez P.
	Lucio Rubio	5727.056	Morrocoyes V.		3156351163	Lucio Rubio
	Isolina Lopez B	63374507	morrocoyes		3156351163	Isolina Lopez
	Yancarlos Duque Rojas	7097734958	Finca versayes		3703797499	Yancarlos Duque
	Miguel arazco	75141150	Con Alegre		3159957104	Miguel arazco
	Jeffrey Alexander Padilla	1005324743	Ayudante		3226173158	Jeffrey Alexander Padilla
	Yoss cuñas	73285362	Ayudante		3126274486	Yoss cuñas
	Jhonatan Vergel	1091132154	Ayudante		3218933300	Jhonatan vergel
	Juliet paola Florez C.	1098770479	SISO		3196487752	Juliet Florez
	Maria Alejandra Lora	1098770412				
	Maria Alejandra Lora	1003590212	Miembro de la junta		3107960324	Maria Alejandra
	Leonor Barragera A	36158270	Cargo de apoyo y miembro de la junta		3107960324	x Leonor Ba

*Nota: Marcar con una X en la columna final, si NO autoriza el uso de sus datos y la publicación de fotografías donde aparezca, en documentos que desarrollen el objetivo de este taller/evento. Teniendo en cuenta la normatividad vigente en Colombia respecto a la protección, tratamiento y manejo de datos personales. Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Gobernación pone a su consideración la presente información con el fin de solicitar su autorización con respecto a los datos e imágenes que usted suministrara. Los datos personales e imágenes suministrados por usted como titular serán utilizados por la Gobernación para fines relacionados con la información de nuestra entidad.

Powered by CamScanner


Network: 5 sept 2026 10:17:42 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:17:42 a.m. GMT-05:00
7°37'49.89"N 73°24'3.486"W

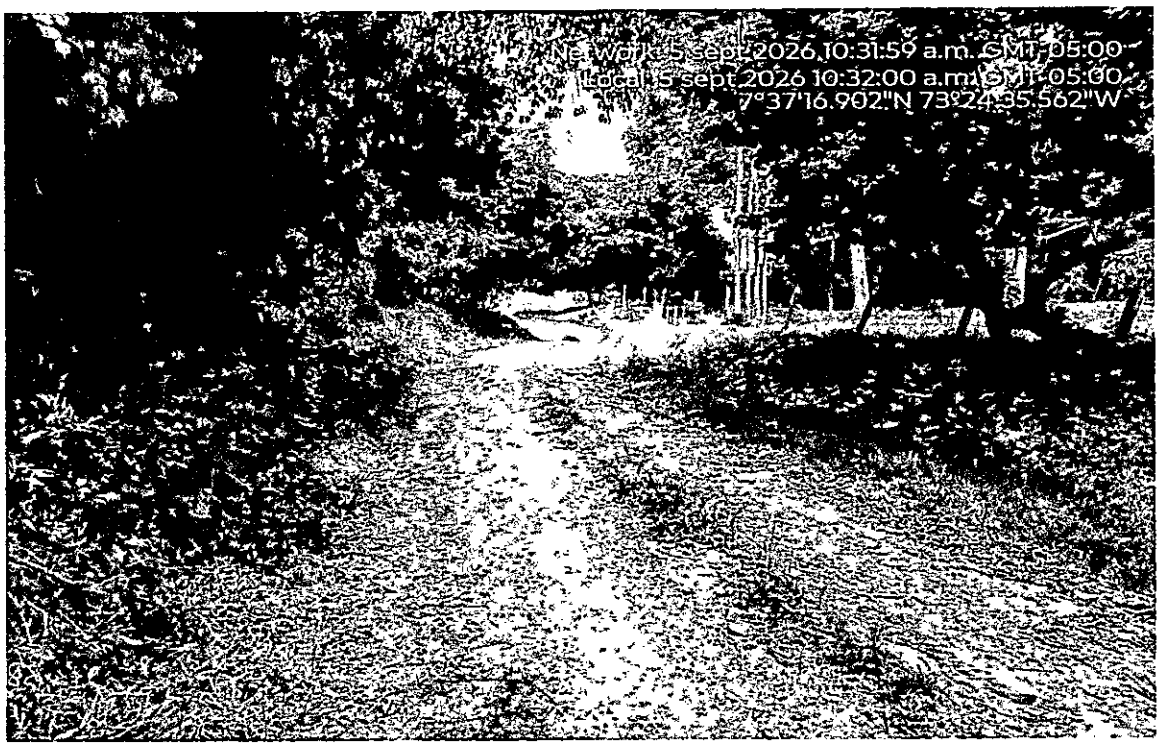

Network: 5 sept 2026 10:16:46 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:16:47 a.m. GMT-05:00


Network: 5 sept 2026 10:15:46 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:15:47 a.m. GMT-05:00
7°37'54.006" N 73°24'1.938" W
La Esperanza

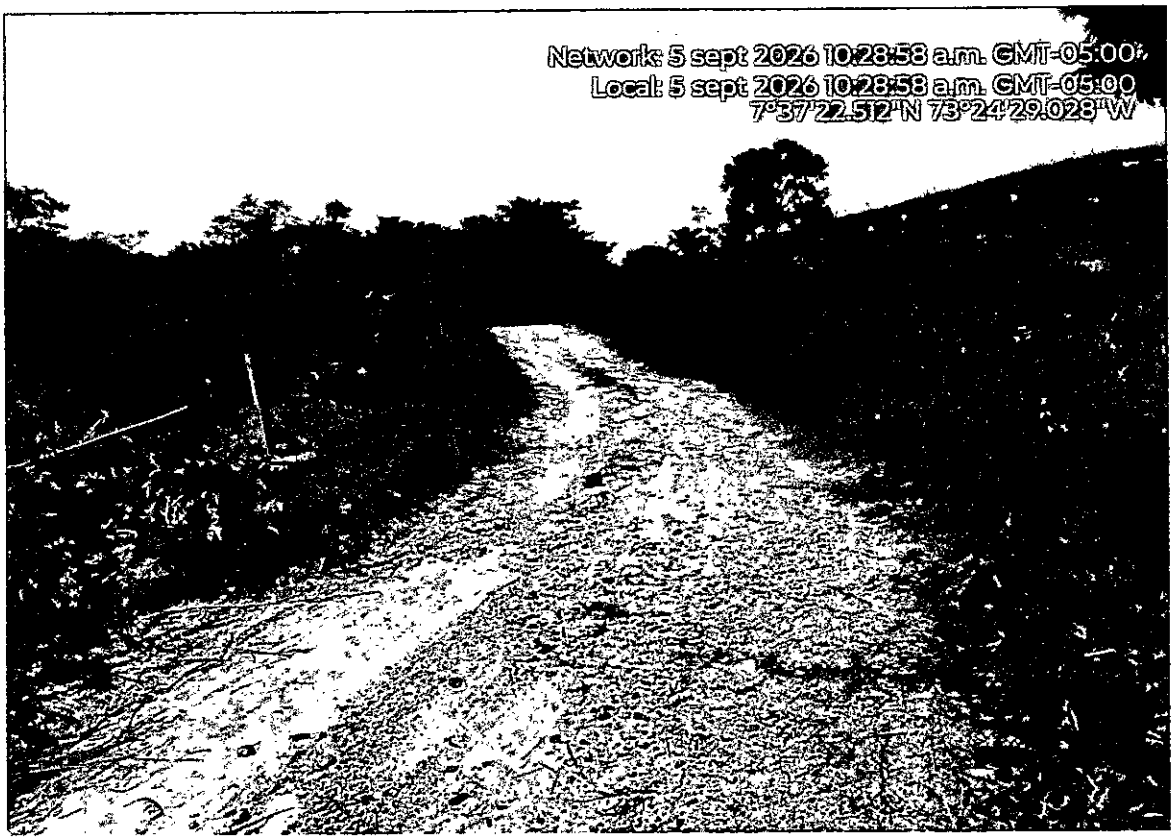

Network: 5 sept 2026 10:15:39 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:15:39 a.m. GMT-05:00
7°37'54" N 73°24'2.26" W
La Esperanza


Network: 5 sept. 2026 10:07:21 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept. 2026 10:07:22 a.m. GMT-05:00
7°37'55.548"N 73°24'1.368"W
La Esperanza

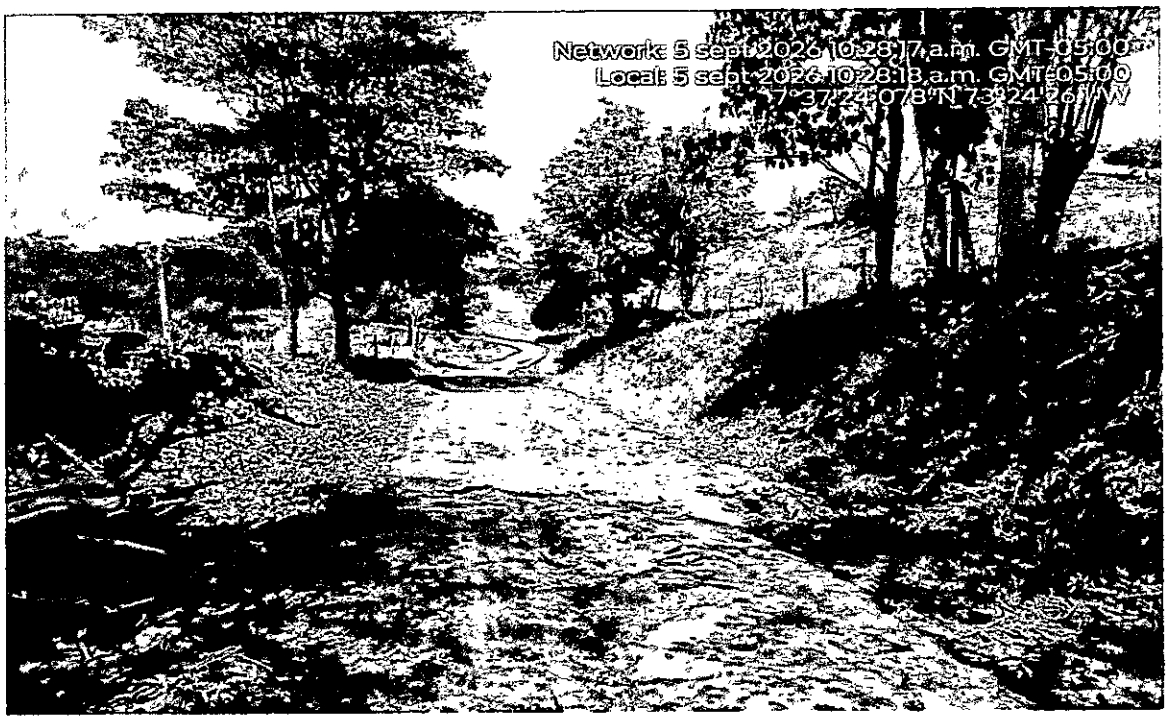

Network: 5 sept. 2026 10:07:11 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept. 2026 10:07:12 a.m. GMT-05:00
7°37'56.52"N 73°23'58.602"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:31:59 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:32:00 a.m. GMT-05:00
7°37'16.902"N 73°24'35.562"W


Network: 5 sept 2026 10:30:51 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:30:52 a.m. GMT-05:00


Network: 5 sept 2026 10:28:58 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:28:58 a.m. GMT-05:00
7°37'22.512"N 73°24'29.028"W


Network: 5 sept 2026 10:28:34 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:28:34 a.m. GMT-05:00

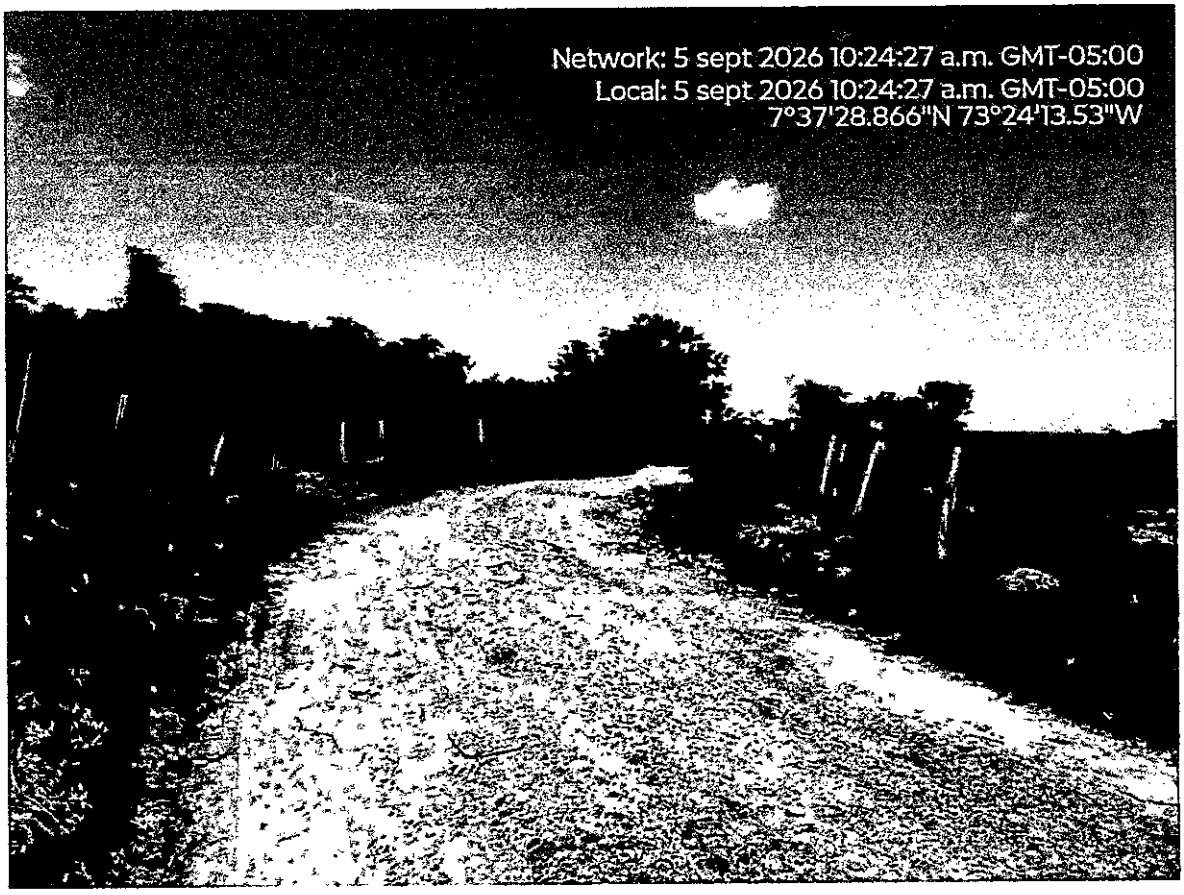

Network: 5 sept 2026 10:28:17 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:28:18 a.m. GMT-05:00
7°37'24.078"N 73°24'26.1"W


Network: 5 sept 2026 10:27:41 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:27:42 a.m. GMT-05:00
7°37'25.926"N 73°24'23.484"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:27:00 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:27:00 a.m. GMT-05:00
7°37'26.988"N 73°24'20.664"W
La Esperanza

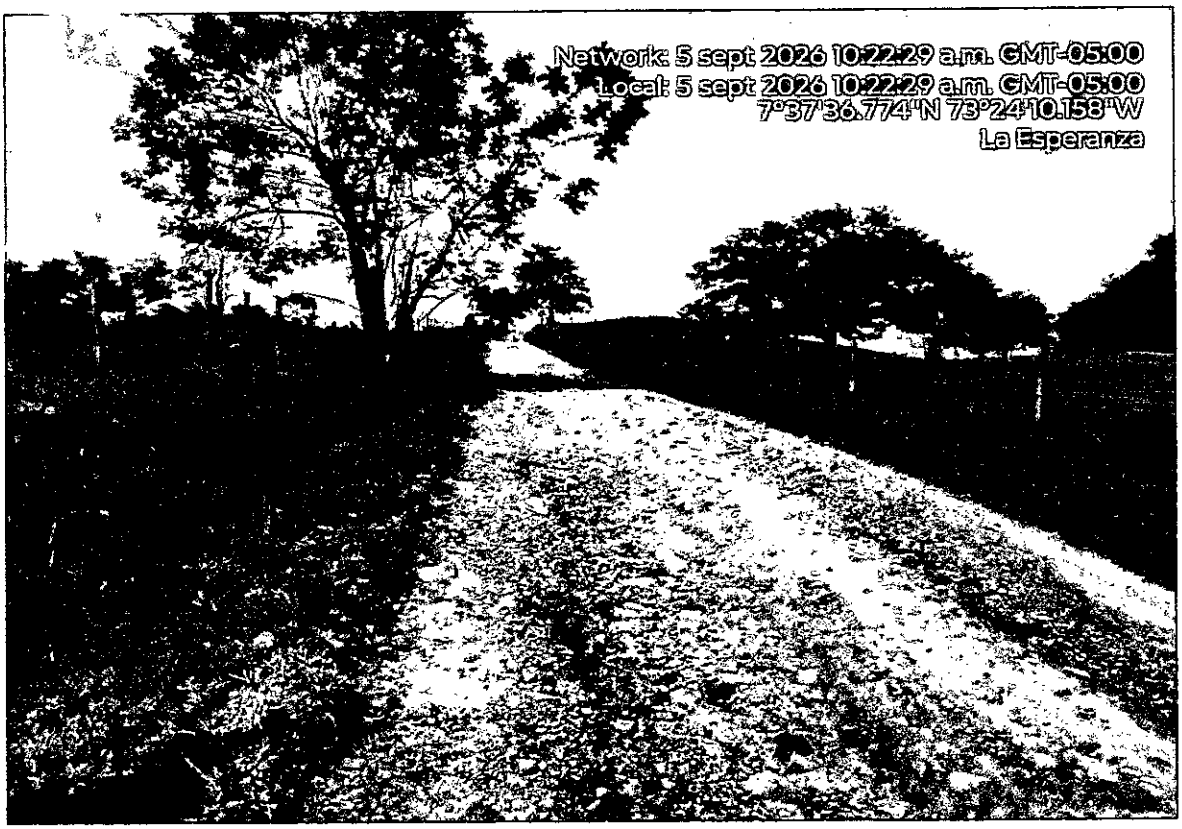

Network: 5 sept 2026 10:26:08 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:26:08 a.m. GMT-05:00
7°37'26.802"N 73°24'16.518"W

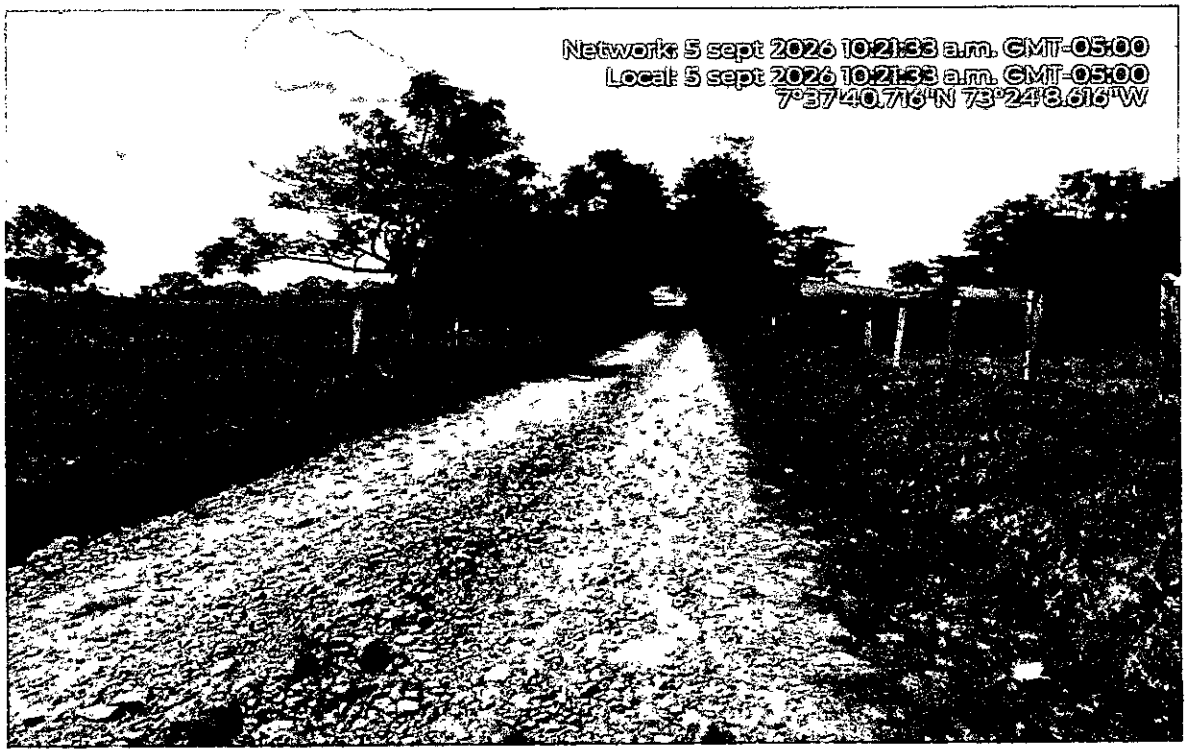

Network: 5 sept 2026 10:25:25 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:25:25 a.m. GMT-05:00
7°37'27.282"N 73°24'15.018"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:24:27 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:24:27 a.m. GMT-05:00
7°37'28.866"N 73°24'13.53"W

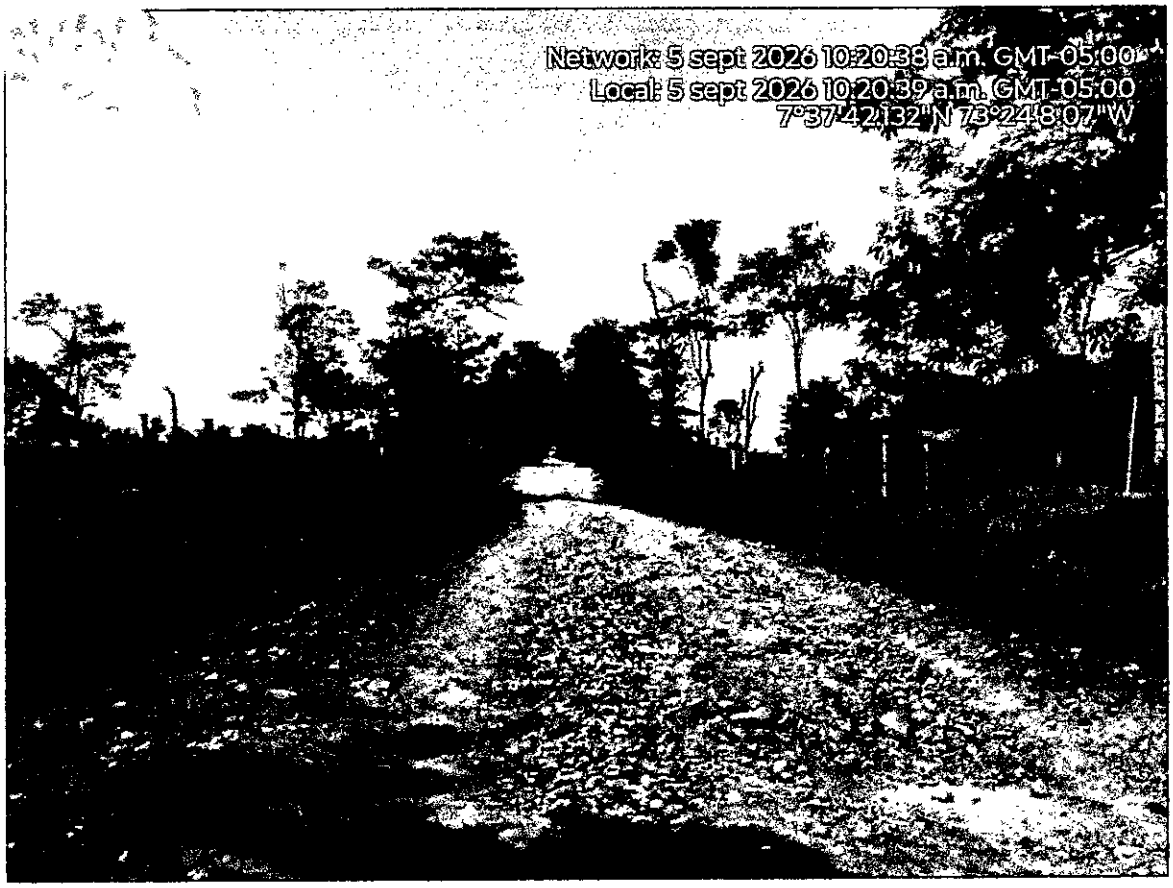

Network: 5 sept 2026 10:23:30 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:23:30 a.m. GMT-05:00
7°37'31.554"N 73°24'12.114"W


Network: 5 sept 2026 10:22:59 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:23:00 a.m. GMT-05:00
7°37'34.248"N 73°24'11.064"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:22:29 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:22:29 a.m. GMT-05:00
7°37'36.774"N 73°24'10.158"W
La Esperanza


Network: 5 sept 2026 10:21:33 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:21:33 a.m. GMT-05:00
7°37'40.716"N 73°24'8.616"W

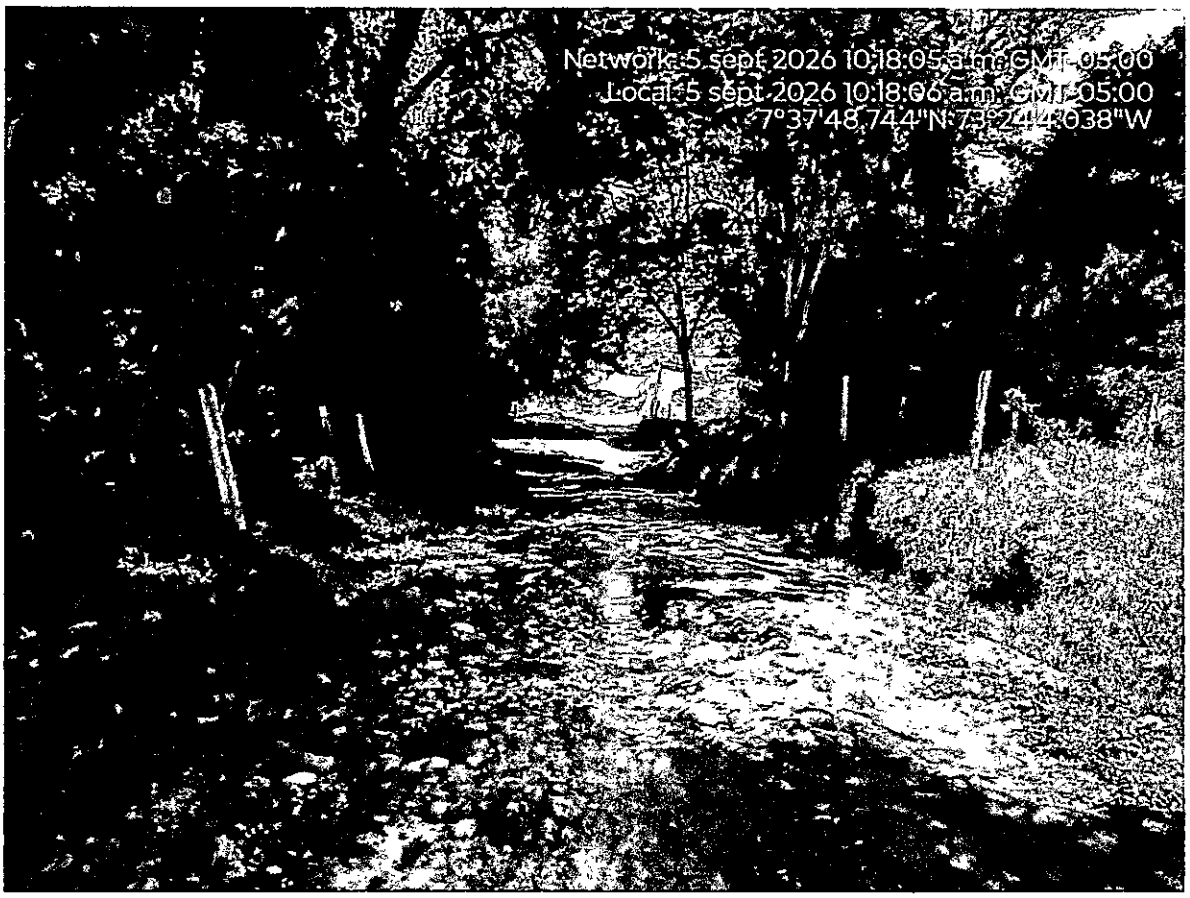

Network: 5 sept 2026 10:21:07 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:21:08 a.m. GMT-05:00
7°37'40.716"N 73°24'8.616"W

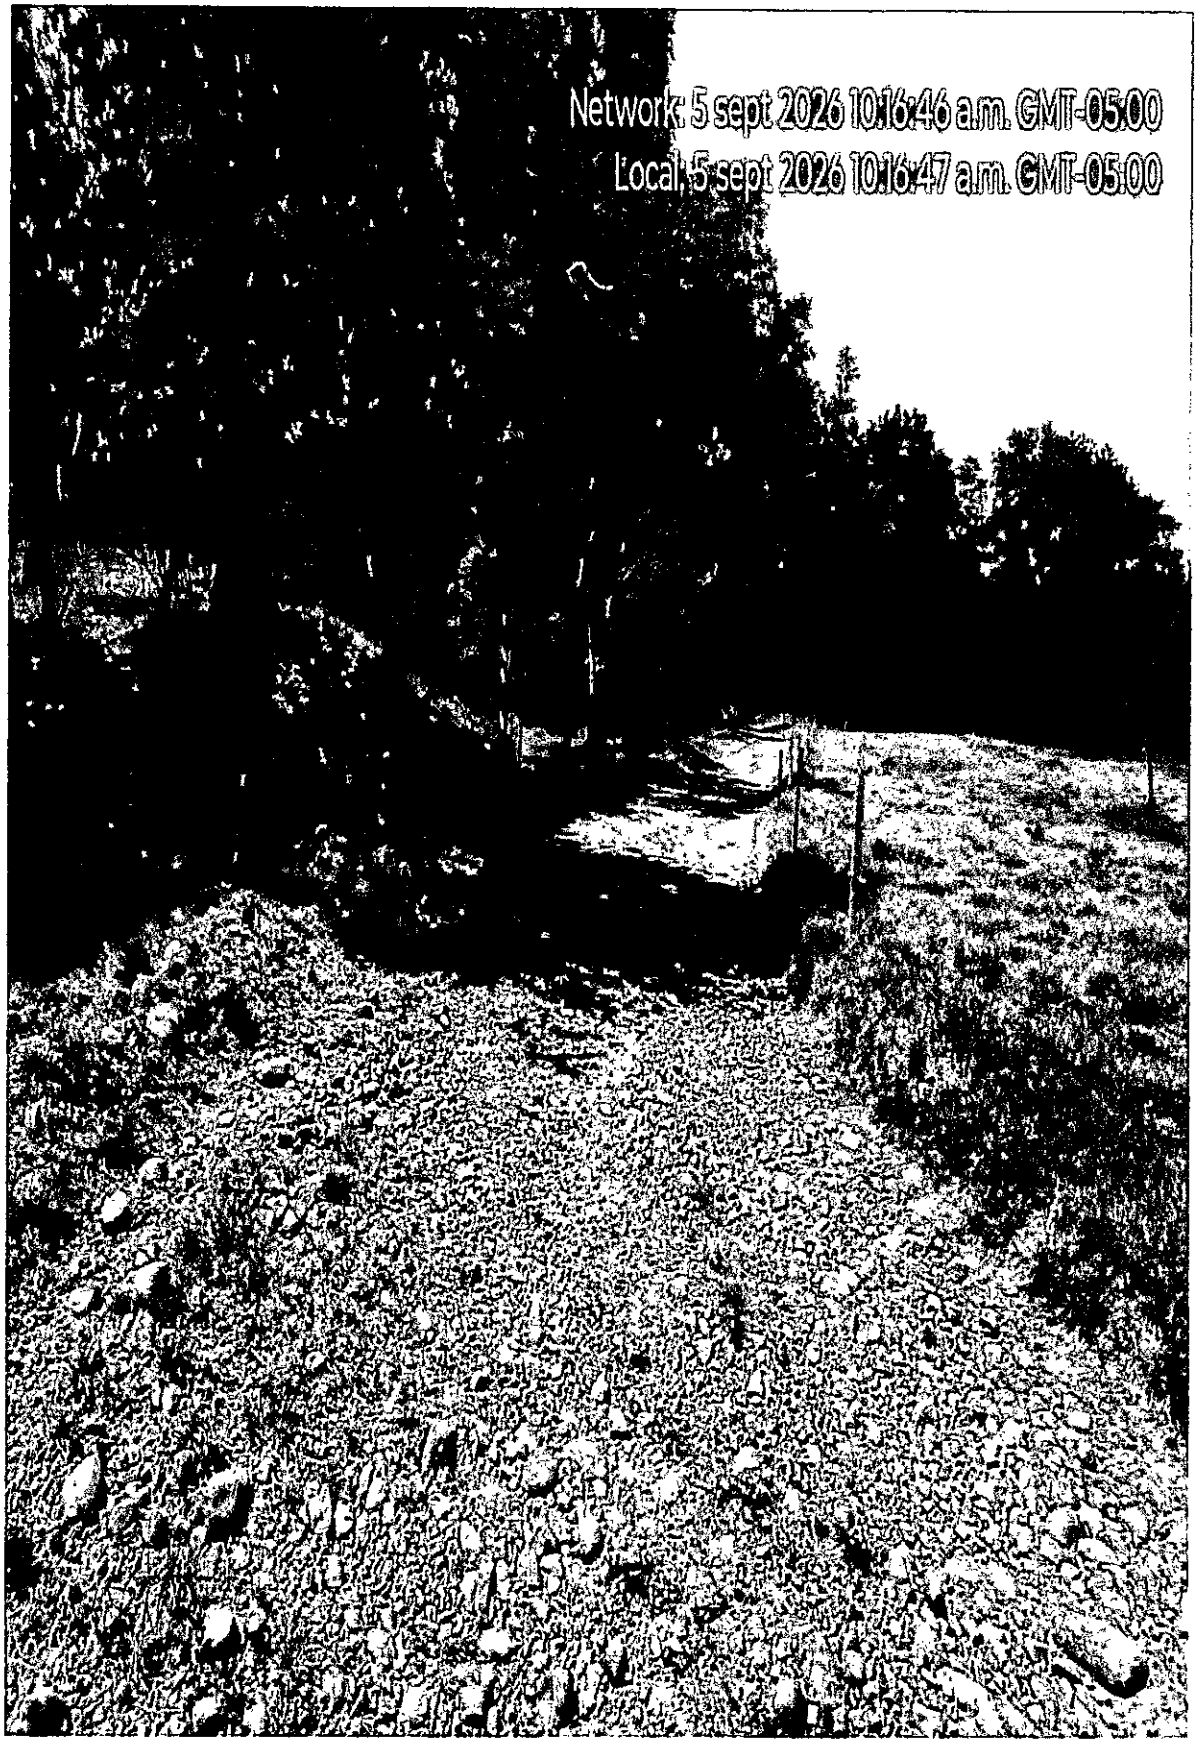

Network: 5 sept 2026 10:20:38 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:20:39 a.m. GMT-05:00
7°37'42.132"N 73°24'8.07"W


Network: 5 sept 2026 10:20:09 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:20:10 a.m. GMT-05:00
7°37'43.176"N 73°24'7.542"W


Network: 5 sept 2026 10:19:42 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:19:43 a.m. GMT-05:00
7°37'43.956"N 73°24'7.236"W


Network: 5 sept 2026 10:19:07 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:19:08 a.m. GMT-05:00
7°37'46.2"N 73°24'5.706"W


Network: 5 sept 2026 10:18:05 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:18:06 a.m. GMT-05:00
7°37'48.744"N 73°24'4.038"W


Network: 5 sept 2026 10:16:46 a.m. GMT-05:00
Local: 5 sept 2026 10:16:47 a.m. GMT-05:00
