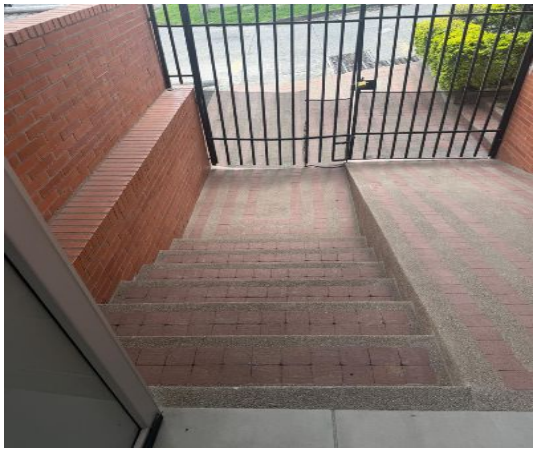
Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 01

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	1

FOTO No 1	FOTO No 2
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 1/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 1/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Desmonte de cielo raso en sótano 2 (Nivel 1)	COMENTARIOS: Desmonte de placa de yeso para crear una circulación entre el sótano 1 y sótano 2 del nivel 1 de la edificación

FOTO No 3	FOTO No 4
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 2/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 5/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza visita a la rampa de acceso del almacén para evaluar la posibilidad de crear una plataforma de carga en dicho espacio	COMENTARIOS: Instalación de muro en placa yeso para dividir el almacén de los nuevos espacios generados para la mesa de ayuda, el jazgado 001 y 002 de pequeñas causas y competencias múltiples

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 0

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	2

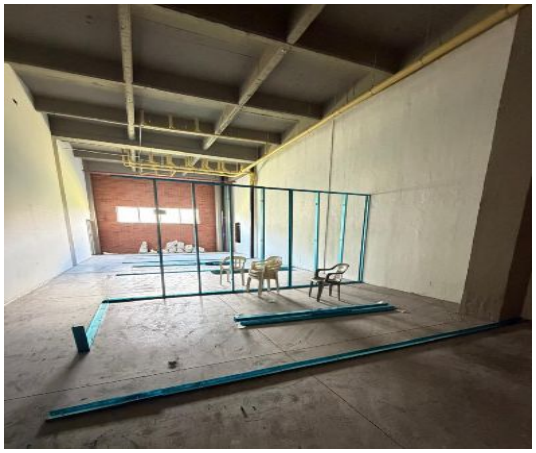
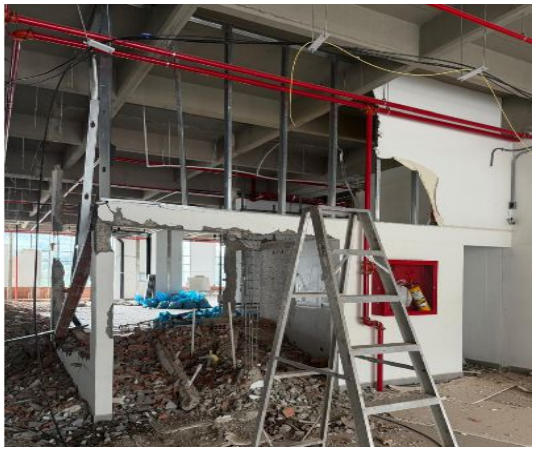
FOTO No 5	FOTO No 6
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 5/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 5/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza el replanteo y la instalación de la estructura metálica para los muros en placa yeso en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1	COMENTARIOS: Se inicia la demolición de los muros en mampostería (parte inferior) y de la placa de yeso (parte superiors) de los baños del antiguo centro de servicios administrativos ubicada en el nivel 2

FOTO No 7	FOTO No 8
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 6/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 6/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa la demolición de los muros en mampostería (parte inferior) y de la placa de yeso (parte superiors) de los baños del antiguo centro de servicios administrativos	COMENTARIOS: Se finaliza la instalación de placas de yeso por la cara del muro que colinda con el almacén

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 0

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	3

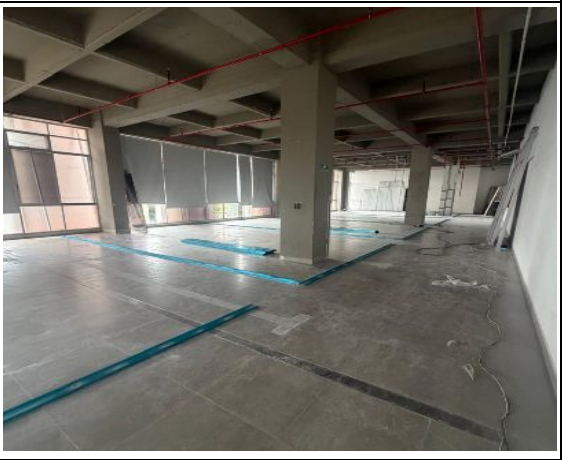
FOTO No 9	FOTO No 10
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 7/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 7/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia el replanteo y la instalación de la estructura para los muros divisorios en placa yeso que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se inicia el replanteo y la instalación de la estructura para los muros divisorios en placa yeso que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2

FOTO No 11	FOTO No 12
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 8/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 8/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia la instalación de los aires acondicionados desmontados en el antiguo datacenter ubicado en el nivel 2	COMENTARIOS: Se inicia la instalación de las condensadoras de los aires acondicionados desmontados en el antiguo datacenter ubicado en el nivel 2

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	4

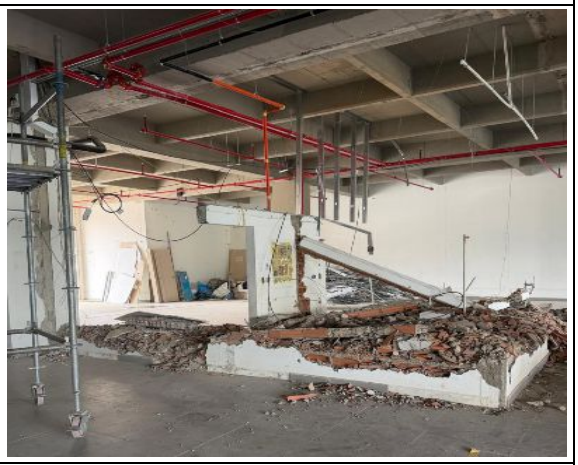
FOTO No 13	FOTO No 14
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 8/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 9/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa instalación de la estructura para los muros divisorios en placa yeso que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se continúa la demolición de los muros en mampostería (parte inferior) y de la placa de yeso (parte superiors) de los baños del antiguo centro de servicios administrativos ubicada en el nivel 2

FOTO No 15	FOTO No 16
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 9/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 9/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia el levantamiento del muro en mampostería ubicado en el nuevo espacio designado al data center en el nivel 2	COMENTARIOS: Se fenaliza la demolición del muro divisorio del antiguo call center y el antiguo centro administrativo y se procede con la recolección de escombros

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	5

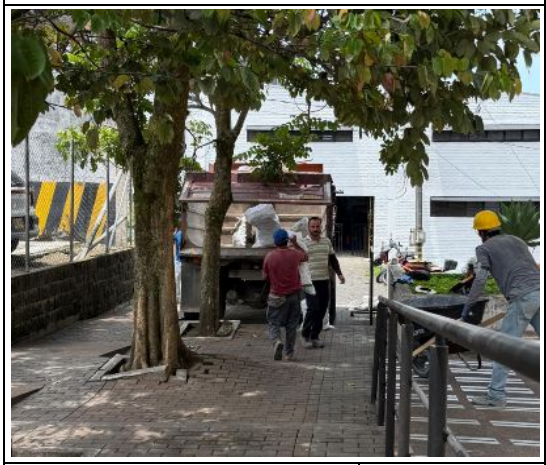
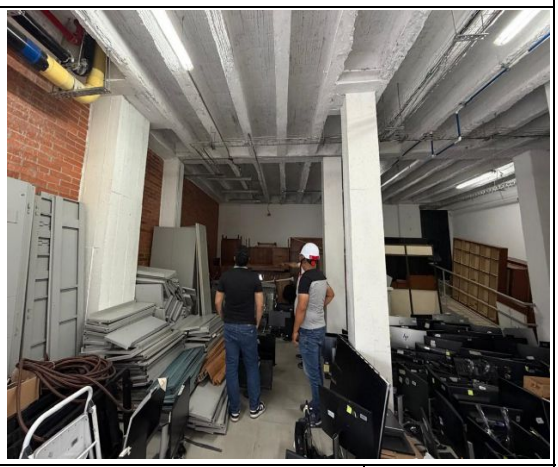
FOTO No 17	FOTO No 18
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 9/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 9/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia con el cargue y retiro de material generado de las demoliciones para ser transportado a la escombrera autorizada y certificada para su correcta disposición	COMENTARIOS: Se lleva a cabo visita para evaluar las actividades a realizar en el espacio donde se adecuará una sala de audiencias temporal

FOTO No 19	FOTO No 20
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 9/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de la estructura metálica y se inicia la instalación de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1	COMENTARIOS: Se continúa instalación de la estructura y con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 0

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	6

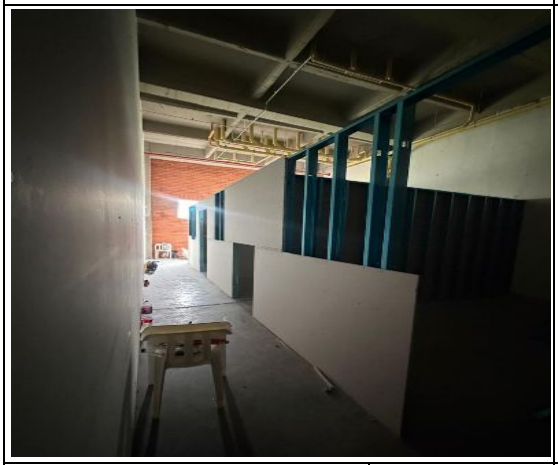
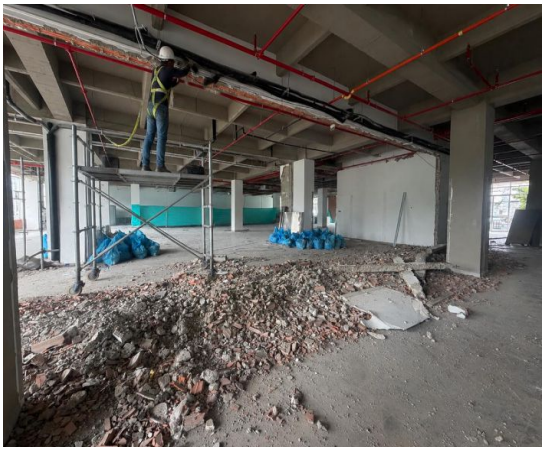
FOTO No 21	FOTO No 22
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1	COMENTARIOS: Se procede con el anclaje del acero para columnetas del muro de la nueva ubicación del data center ubicado en el nivel 2

FOTO No 23	FOTO No 24
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza la desinstalación de los ductos de los aires acondicionados que se encontraban en el antiguo centro de servicios administrativos ubicado en el nivel 2	COMENTARIOS: Se realiza la demolición de la placa yeso de la parte superior del anterior cuarto eléctrico ubicado en el sótano 2 del nivel 1

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 0

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	7

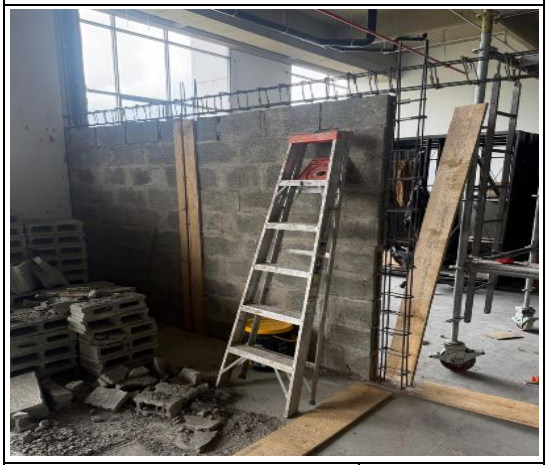
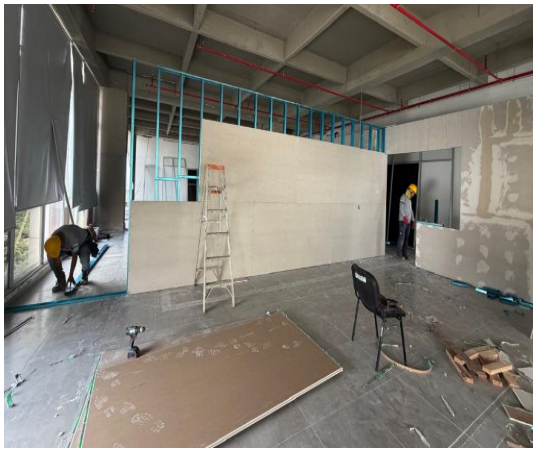
FOTO No 25	FOTO No 26
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se procede con el anclaje del acero para la viga de amarre del muro de la nueva ubicación del data center ubicado en el nivel 2, así como la instalación de la formaleta en columnetas	COMENTARIOS: Desmonte de placa de yeso para crear una circulación entre el sótano 1 y sótano 2 del nivel 1 de la edificación

FOTO No 27	FOTO No 28
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 13/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 14/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con el cargue y retiro de material generado de las demoliciones para ser transportado a la escombrera autorizada y certificada para su correcta disposición	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	8

FOTO No 29	FOTO No 30
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 14/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 14/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia con la aplicaicón de pintura en el espacio destinado por la entidad para la ubicación de la oficina del contratista y la interventoría	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2

FOTO No 31	FOTO No 32
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se realiza la instalación de tubería de aires acondicionados ubicados en el cuarto de monitoreo en el nivel -1

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	9

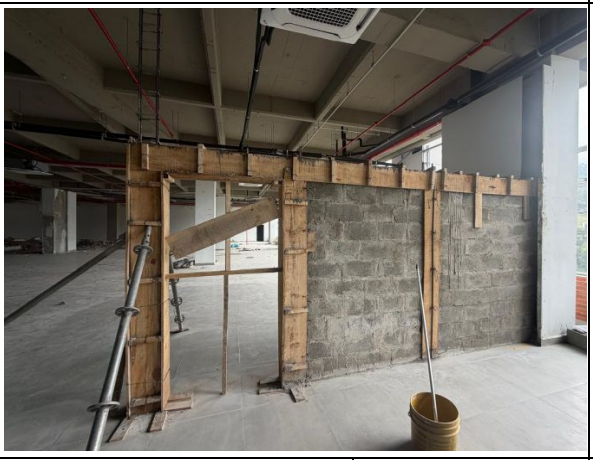
FOTO No 33	FOTO No 34
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 15/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza la instalación de tubería de aires acondicionados ubicados en el cuarto de monitoreo en el nivel -1	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1

FOTO No 35	FOTO No 36
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 16/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 16/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se continúa con la aplicaicón de pintura en el espacio destinado por la entidad para la ubicación de la oficina del contratista y la interventoría

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	10

FOTO No 37	FOTO No 38
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 20/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 20/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se realiza el primer despacho de los elementos a entregar en donación con la fundación aprovada con anterioridad por la interventoría

FOTO No 39	FOTO No 40
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con el encofrado de columnetas y viga de amarre del muro del data center, ubicado en el nivel 2	COMENTARIOS: Se realiza vaciado de columnetas y viga de amarre del muro del data center, ubicado en el nivel 2

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	11

FOTO No 41	FOTO No 42
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso y del aislamiento termoacústico para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de las placas de yeso y del aislamiento termoacústico para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1

FOTO No 43	FOTO No 44
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza la demolición de la placa yeso de la oficina grande ubicada en el sótano 1 del nivel 1	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	12

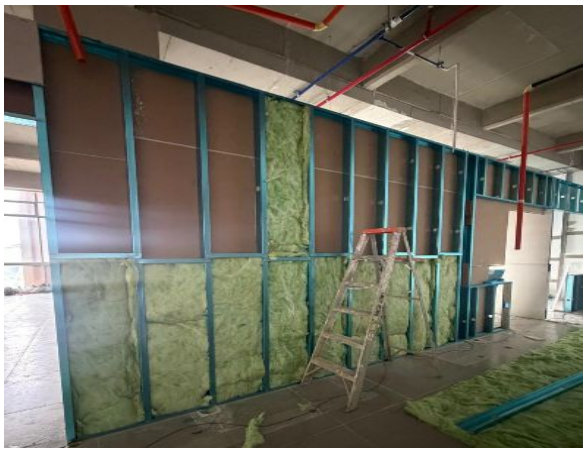
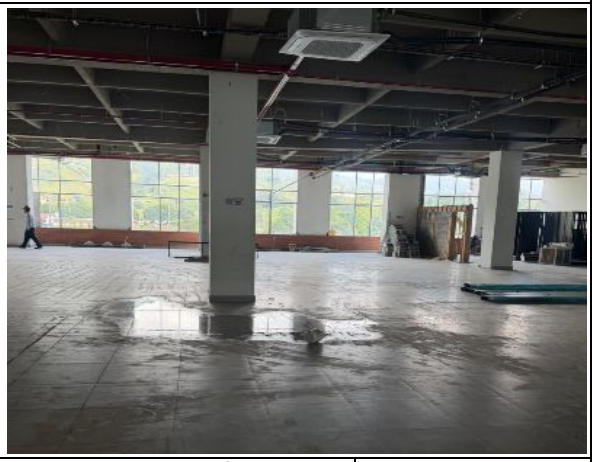
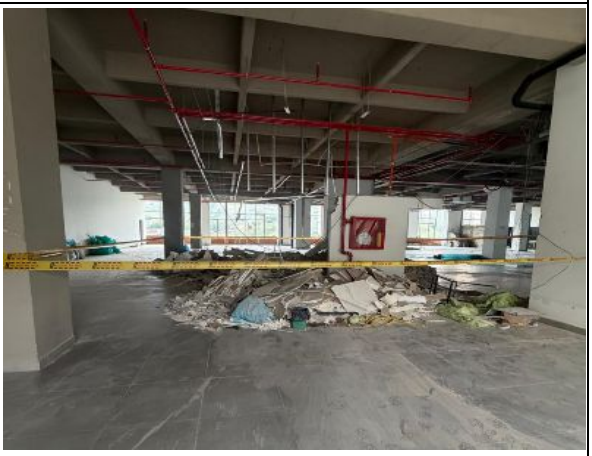
FOTO No 45	FOTO No 46
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 21/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 22/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza el segundo despacho de los elementos a entregar en donación con la fundación aprovada con anterioridad por la interventoría	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso y del aislamiento termoacústico para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2

FOTO No 47	FOTO No 48
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 22/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 23/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juszgado 7 civil circuito de pereira ubicados en el nivel 1	COMENTARIOS: Se evidencia la presencia de agua en el nivel 2, se identifica que proveniente de las aguas lluvias ya que esta situación solo se genera cuando se presentan fuertes lluvias

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	13

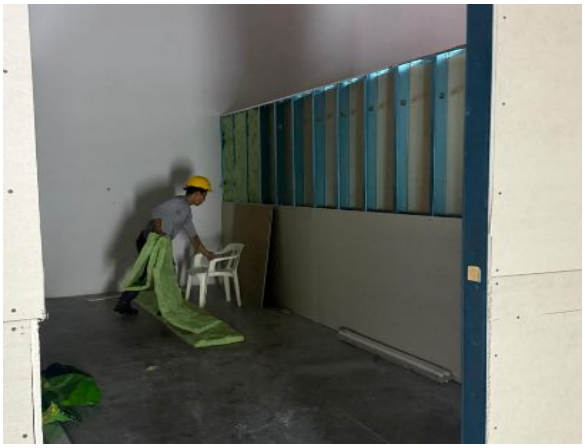
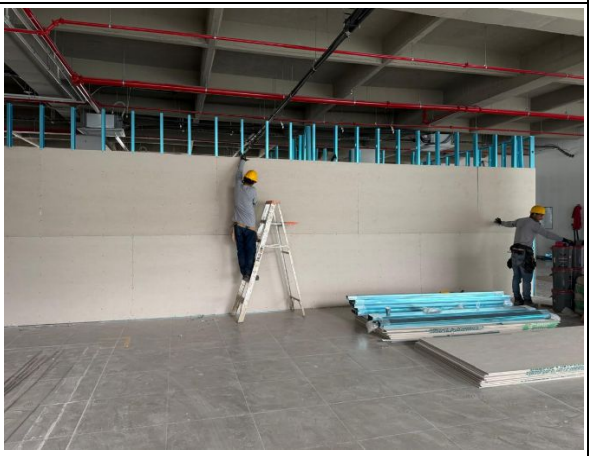
FOTO No 49	FOTO No 50
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 23/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 23/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se evidencia la presencia de agua en el nivel 2, se identifica que proveniene de las aguas lluvias ya que esta situación solo se genera cuando se presentan fuertes lluvias	COMENTARIOS: Se inicia con la instalación de estructura metálica y de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juzgado 5 civil municipal de pereira ubicados en el nivel 1

FOTO No 51	FOTO No 52
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 23/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 23/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza desencogrado de viga de amarre y columnetas del muro del data center ubicado en el nivel 2	COMENTARIOS: Se realiza jornada de orden de aseo y se delimita el espacio de acopio de escombros y de gabinete de la red contra incendio que será retirado posteriormente sea aprobado por la entidad y la interventoría

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	14

FOTO No 53	FOTO No 54
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 24/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 24/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de estructura metálica y de las placas de yeso para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juzgado 5 civil municipal de pereira ubicados en el nivel 1	COMENTARIOS: Se inicial el replanteo y la instalación de la estructura metálica de los juzgados del 1 al 5 en la zona del antiguo call center en el nivel 3

FOTO No 55	FOTO No 56
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 26/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 26/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de las placas de yeso y el aislamiento termoacústico para los muros ubicados en la zona del juzgado 1 al juzgado 5 civil municipal de pereira ubicados en el nivel 1	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de la estructura metálica y las placas de yeso de los juzgados del 1 al 5 en la zona del antiguo call center en el nivel 3

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	15

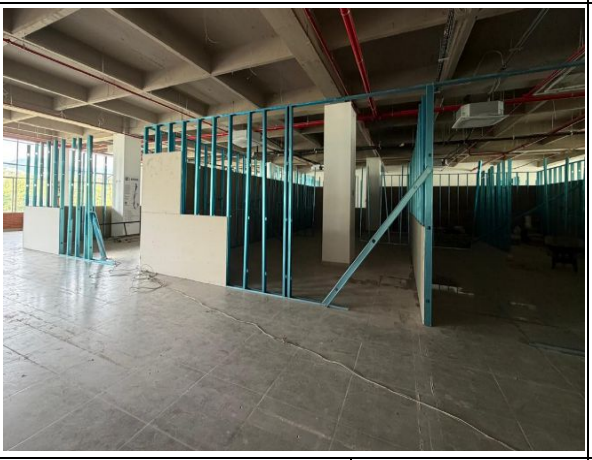
FOTO No 57	FOTO No 58
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 26/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza desmonte de división en vidrio templado en el nivel -1 en la ubicación de la sala de audiencias temporal	COMENTARIOS: Se continúa con instalación de la estructura metálica y de las placas de yeso de los juzgados del 1 al 7 en la zona del antiguo call center en el nivel 3

FOTO No 59	FOTO No 60
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza la ampliación de una de las circulaciones entre el sótano 1 y sótano 2 del nivel 1 de la edificación	COMENTARIOS: Se realiza la instalación de estructura metálica, placa yeso y aislamiento termoacústico en en el nivel -1 en la ubicación de la sala de audiencias temporal

Reingeniería Integral	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	16

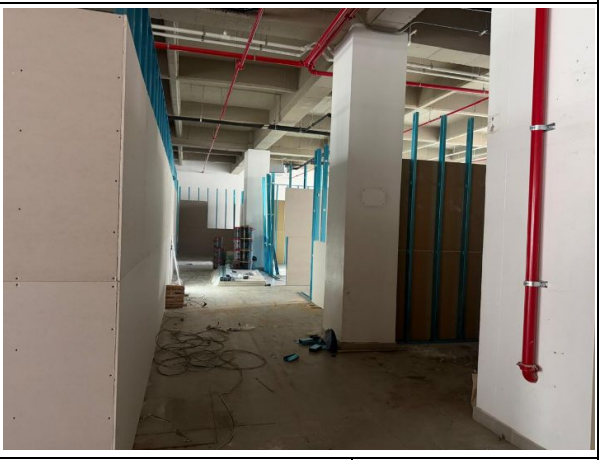
FOTO No 61	FOTO No 62
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de bloque estructural en el muro del data center ubicado en el nivel 2	COMENTARIOS: Se continúa con instalación de la estructura metálica y de las placas de yeso de los juzgados del 1 al 7 en la zona del antiguo call center en el nivel 3

FOTO No 63	FOTO No 64
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con instalación de la estructura metálica y de las placas de yeso de los juzgados del 1 al 7 en la zona del antiguo call center en el nivel 3	COMENTARIOS: Se finaliza con la instalación de bloque estructural en el muro del data center ubicado en el nivel 2

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	17

FOTO No 65	FOTO No 66
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia con el replanteo y la instalación de estructura metálica en la zona donde se ubican los juzgados 7 al 9 civil municipal de pereira ubicado en el nivel 1	COMENTARIOS: Se realiza la demolición para la creación de los vanos para las puertas del juzgado 6 y 8 civil municipal de pereira ubicado en el nivel 1

FOTO No 67	FOTO No 68
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 29/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se realiza la instalación de estructura metálica y placa de yeso en el juzgado 6 civil municipal de pereira ubicado en el nivel 1	COMENTARIOS: Se continúa con instalación de la estructura metálica y de las placas de yeso de los juzgados del 1 al 7 en la zona del antiguo call center en el nivel 3

Reingeniería Integral	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO**	Versión: 02

OBRA:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, el Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el anexo 1 adscritas al distrito Judicial de Pereira	No CONSECUTIVO	18

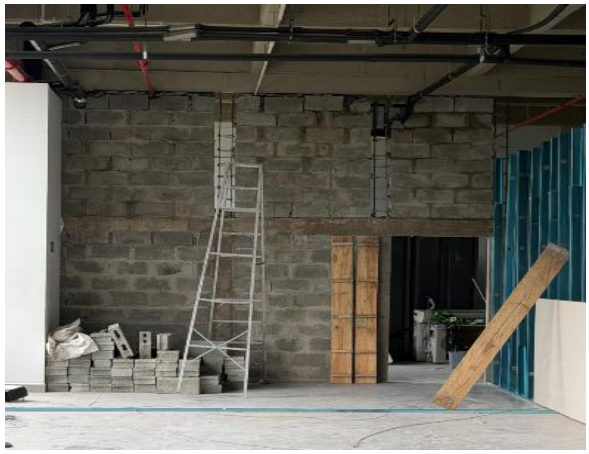
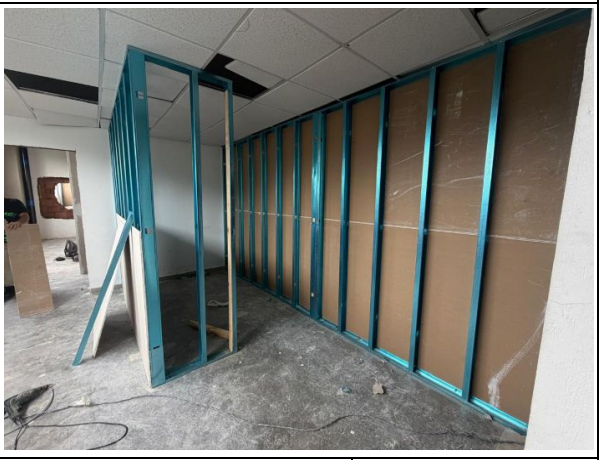
FOTO No 69	FOTO No 70
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 29/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 29/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se inicia con el encofrado de las columnetas superiores del muro en mamportería del data center ubicado en el nivel 2	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placa yeso y de aislamiento termoacústico en la zona donde se ubican los juzgados 7 al 9 civil municipal de pereira ubicado en el nivel 1

FOTO No 71	FOTO No 72
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: 27/10/2026
UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA	UBICACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placas de yeso para los muros divisorios que están ubicados en la antigua fiscalía ubicada en el nivel 2	COMENTARIOS: Se continúa con la instalación de placa yeso en la zona donde se ubican los juzgados 7 al 9 civil municipal de pereira, y del cuarto útil ubicado en el nivel 1
