ACTA DE VISITA
FDT02-03
Versión: 5

Siendo las 06:30 am, del día 10 del mes de octubre de 2026, asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
Manuel Andres Suarez Fernández	Alcaldía Municipal
Lino Rodríguez Ochoa	Alcaldía Municipal
Antonio Talero	Alcaldía Municipal

OBJETO DE LA VISITA

Por directriz del Secretario de Infraestructura, se realizó visita técnica a línea de conducción del acueducto urbano del rio chitamena, para evaluar el reemplazo de tubería en PVC por tubería en polietileno, tendiendo en cuenta que está a presentado problemas por movimientos de remoción en masa.

SITUACION OBSERVADA

Durante el recorrido realizado se evidencia que la línea del acueducto se encuentra en una zona con topografía ondulada en la cual se evidencia que ha tenido movimientos de remoción en masa el material mismo de la ladera (arcilloso) por lo cual se han realizado trabajos para mantener el servicio pero continua con el riesgo latente de que en cualquier momento se sigan presentando estos movimientos y puedan causar una emergencia en la línea de conducción del acueducto, por lo que se plantea el reemplazo (180 metros aprox entre ventosa 4 y 5) de la tubería y la reubicación del alineamiento de la misma, por lo que es necesario realizar replanteo y localización de tubería, excavaciones, rellenos, y realizar la instalación de la nueva tubería con sus respectivos acoples o uniones a la tubería existente en PVC, además se logra evidenciar que el ingreso al sitio donde se encuentra la tubería no tiene carretera transitable por lo que se debe realizar el transporte de materiales a lomo de mula.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS


COMPROMISO	NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

FIRMAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	**IDENTIFICACION**	**REPRESENTATE DE:**	**FIRMA**
Manuel Andres Suarez Fernández	**1.115.916.610**	Sec. Infraestructura	
Antonio Talero	80472326	Sec. Infraestructura	
APROBÓ: Lino Rodríguez Ochoa		Sec. Infraestructura	


ANEXOS	**SI** [X] **NO** [ ]	**TIPO DE ANEXO: Anexo Fotográfico**	**NUMERO DE FOLIOS:**	**2**

ANEXO FOTOGRAFICO


Medicion de tramo a reemplazar

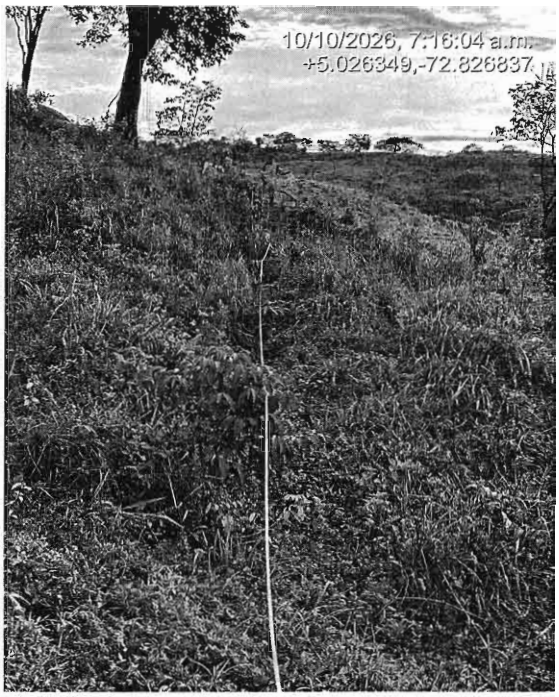


Sitio de reparaciones recientes

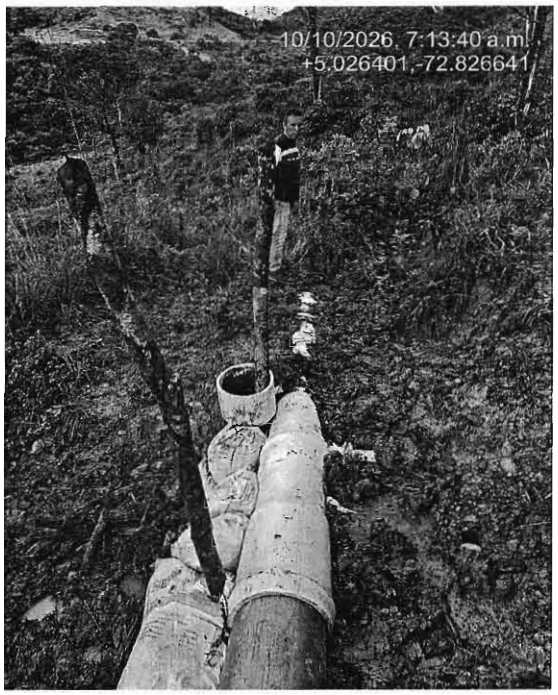

Sitio donde se encuentra tuberia (ondulado)

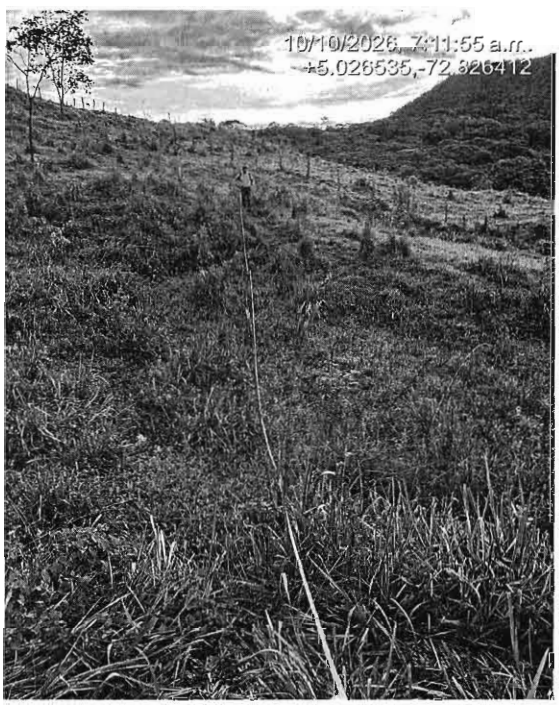


Sitio de ladera saturado

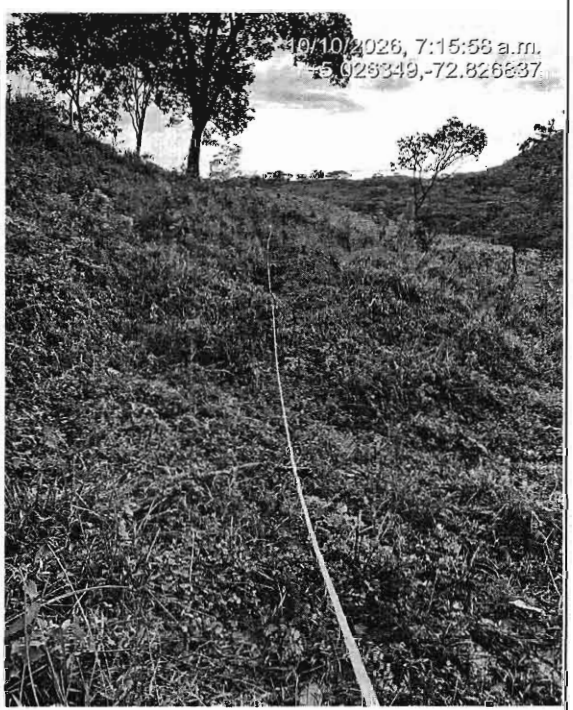


ANEXO FOTOGRAFICO


Estado actual acceso

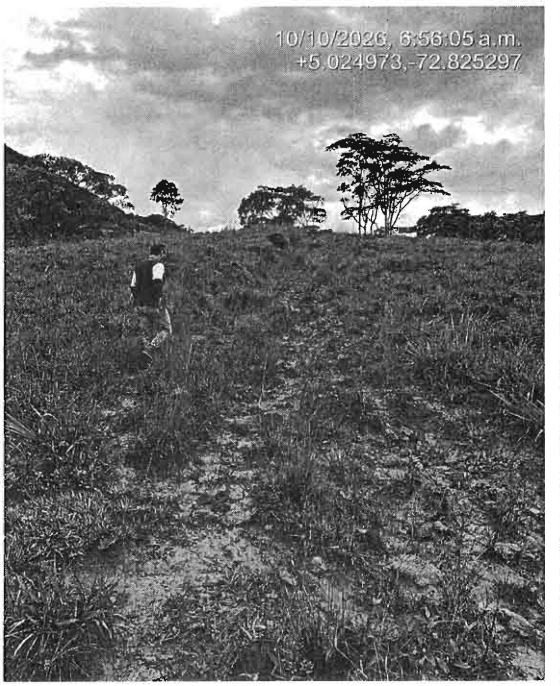

Estado actual acceso

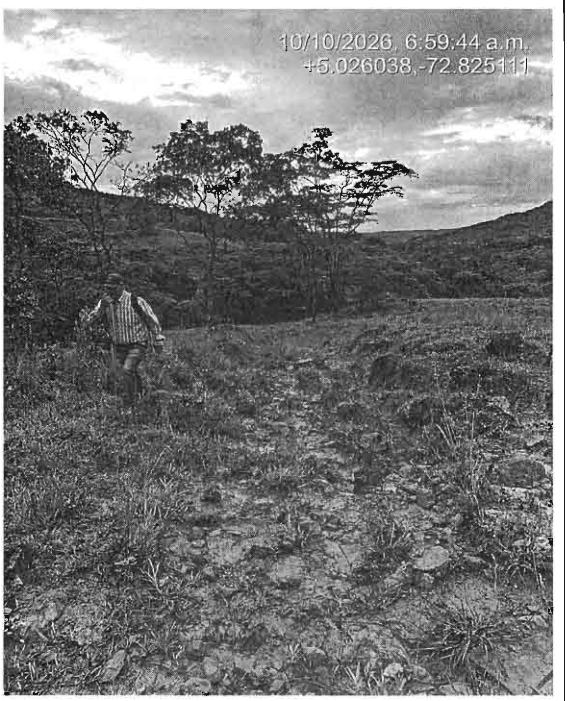

Topografia ondulada donde se encuentra tuberia

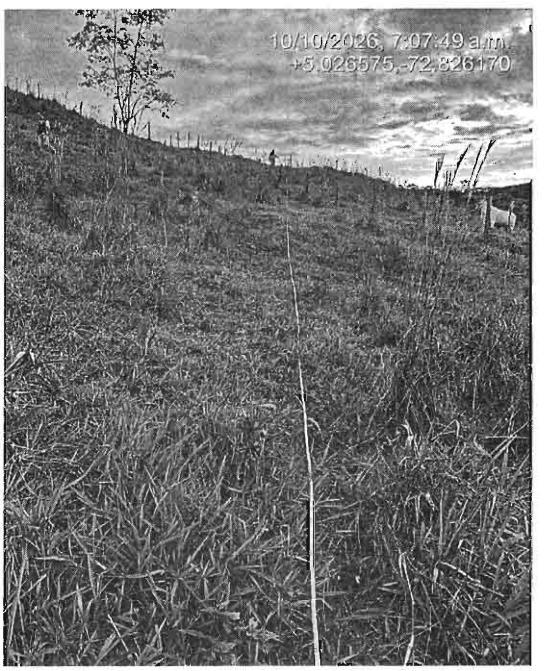

Estado actual canal rincon de piñal
