GRUPO

ABC MEDIA SAS

INFORME DE ENTREGA

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADAS

CONTRATISTA: GRUPO ABC MEDIA SAS
ENTIDAD: RED DE SALUD ORIENTE
COTIZACIÓN No.: 099
FECHA DE COTIZACIÓN: 08 de junio de 2026
OBJETO: Fabricación, suministro e instalación de fachadas institucionales para las diferentes sedes de la Red de Salud Oriente.
NÚMERO DE CONTRATO / ORDEN DE SUMINISTRO: 100.23.21.20260038
PERIODO DE INSTALACION : Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2026
FECHA DE ENTREGA : 30 de septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la fabricación, suministro y entrega de las fachadas institucionales destinadas a las diferentes sedes de la **Red de Salud Oriente**, de acuerdo con los requerimientos establecidos y la cotización No. 099 presentada por **GRUPO ABC MEDIA SAS**.

Los trabajos comprendieron la elaboración de las estructuras, fabricación de los elementos correspondientes y la instalación completa de las fachadas en las sedes relacionadas en el requerimiento.

La propuesta contempló igualmente la elaboración de avisos por sede en acero inoxidable, con cantonera en 3D, corte láser y dos logos, así como las diferentes fachadas institucionales.

2. OBJETO DEL INFORME

Documentar la entrega de las fachadas fabricadas y suministradas por **GRUPO ABC MEDIA SAS** para las diferentes sedes de la **Red de Salud Oriente**, dejando registro de los trabajos realizados, las características generales de los elementos entregados y las sedes intervenidas.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos comprendió:

- Fabricación de las estructuras requeridas para las fachadas.
- Elaboración de las fachadas de acuerdo con las dimensiones establecidas.
- Utilización de lámina galvanizada para la estructura de pared.
- Aplicación de pintura poliuretano.
- Fabricación de los elementos gráficos e institucionales correspondientes.
- Instalación completa de las fachadas en las sedes relacionadas.
- Verificación de la correcta instalación de los elementos.
- Entrega de los trabajos terminados a la entidad.

De acuerdo con la cotización, la estructura de pared de las fachadas fue contemplada en **lámina galvanizada y pintura poliuretano**, incluyendo la instalación completa.

4. RELACIÓN DE FACHADAS ENTREGADAS

Las fachadas fueron contempladas con las siguientes características generales:

IPS COMUNEROS II

Tablero de 4.5 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 14 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 40 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

IPS CALIPSO

Tablero de 7.5 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 10 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 50 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

NOTA: SE REALIZA ESTRUCTURA DE 2.80 METROS DE ALTURA PARA LA INSTALACIÒN DEL AVISO

GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS INTERVENIDAS

Tablero de 7.15 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 15 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 50 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

IPS MANUELA BELTRAN

Tablero de 9 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 17 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 50 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

GRUPO

ABC MEDIA SAS

RICARDO BELALCAZAR

Tablero de 9 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 18 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 50 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

NOTA: SE REALIZA ESTRUCTURA DE 2.80 METROS DE ALTURA PARA LA INSTALACIÒN DEL AVISO

IPS ULPIANO LLOREDA

Tablero de 7.98 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 17 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 50 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidadTablero de 7.98 metros elaborado en lámina galvanizada calibre 18, perforada según su diseño con aplicación de pintura electrostática en los colores institucionales. Estructura de soporte elaborado en tubo galvanizado de 2" x 1". proyecto, El aviso de la sede

corresponde a elemento en acero inoxidable, que se compone de 17 letras de 45 cm de alto por con cantonera efecto 3D de 7 cm, corte laser y un logo de 80 cm de diámetro.

IPS POBLADO II

Tablero de 5.7 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 12 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 45 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

IPS VERGEL T **IPS EL VERGEL**

Tablero de 5.7 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 11 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 50 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS POTRERO GRANDE

Tablero de 9 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 16 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 60 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

IPS ALFONSO BONILLA ARAGON

Tablero de 7.98 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 23 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 40 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS VALLADO

Tablero de 9 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 12 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 60 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

IPS RETIRO

Tablero de 6.84 mt x 1.07 mt en lámina galvanizada calibre 18, perforada según diseño, con pintura electrostática con los colores institucionales, con estructura en tubo galvanizado de 2" x 1". 11 Letras en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 60 cm de alto con 7 cm de cantonera; atornilladas al tablero base con anclajes.

Logo de la Red de Salud del Oriente E.S.E. en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 83 cm de ancho, con 7 cm de cantonera con fondo en acrílico blanco de 3 mm; atornillado al tablero base con anclajes.

Escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en acero inoxidable 304 satinado calibre 18 de 80 cm de alto x 110 cm de ancho, con 7 cm de cantonera; atornillado al tablero base con anclajes. Letras de "ALCALDÍA DE" de 7.2 cm y letras "SANTIAGO DE CALI" de 9 cm; letras con base de acrílico cristal de 4 mm anclados al tablero base con Sikaflex 221. El escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali en su conjunto mide 80 cm de alto.

La instalación del aviso completo de realiza con chazos y/o platinas según la necesidad.

5. MANTENIMIENTO

Para conservar la apariencia y el acabado de los avisos, se recomienda realizar el siguiente procedimiento de mantenimiento:

Tablero: Lavar la superficie con shampoo y enjuagar con agua.

Letras: Limpiar con fibra abrasiva de abrasión media, realizando movimientos únicamente en sentido vertical y siguiendo la dirección del satinado. Aplicar varsol, secar y dar brillo con un paño de algodón seco.

Frecuencia: Realizar este procedimiento una vez al año.

6. PROCESO DE EJECUCION

Para la ejecución de los trabajos se desarrollaron las siguientes actividades:

6.1. Verificación de requerimientos

Se tomaron como referencia las características y dimensiones establecidas para cada una de las sedes relacionadas en la cotización.

6.2. Fabricación

Se realizó la fabricación de las estructuras y elementos correspondientes a las fachadas, utilizando los materiales establecidos para el proyecto.

6.3. Acabados

Se realizaron los procesos de acabado de las estructuras mediante aplicación de pintura poliuretano.

6.4. Instalación

Se efectuó el traslado e instalación de las fachadas en las sedes correspondientes, realizando el montaje y fijación de los elementos.

6.5. Verificación final

Una vez instalados los elementos, se realizó una revisión visual de los trabajos con el propósito de verificar su correcta disposición y terminación.

7. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA

GRUPO ABC MEDIA SAS hace entrega de las fachadas relacionadas en el presente informe, correspondientes a las diferentes sedes de la Red de Salud Oriente.

Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo con las características, cantidades y dimensiones contempladas en el contrato de suministro 100.23.21.20260038

La cotización estableció que el tiempo de entrega quedaba sujeto a programación.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Como soporte de la ejecución y entrega de los trabajos, se anexará el registro fotográfico correspondiente a cada una de las fachadas instaladas.

GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS COMUNEROS II

Fotografía Antes / fachada durante:



Fotografía Después:

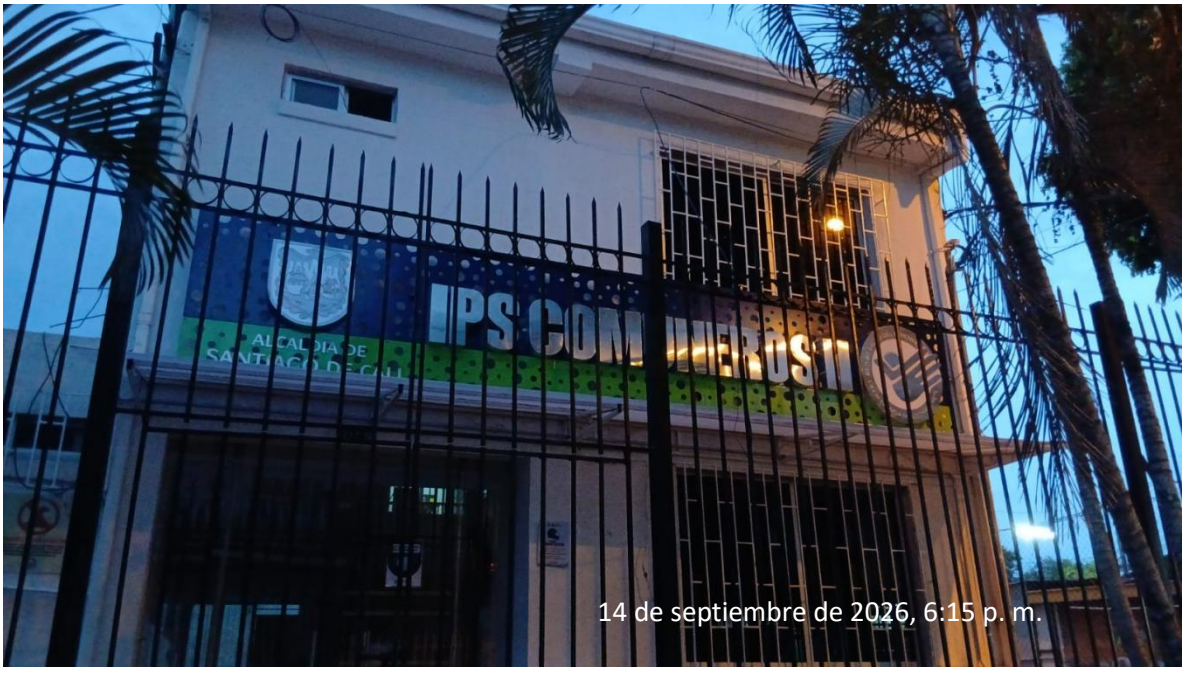

GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS CALIPSO

Fotografía antes:



Fotografía durante:



GRUPO

ABC MEDIA SAS



IPS INTERVENIDAS

Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS MANUELA BELTRÁN

Fotografía durante:



Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS RICARDO BALCAZAR

Fotografía durante:

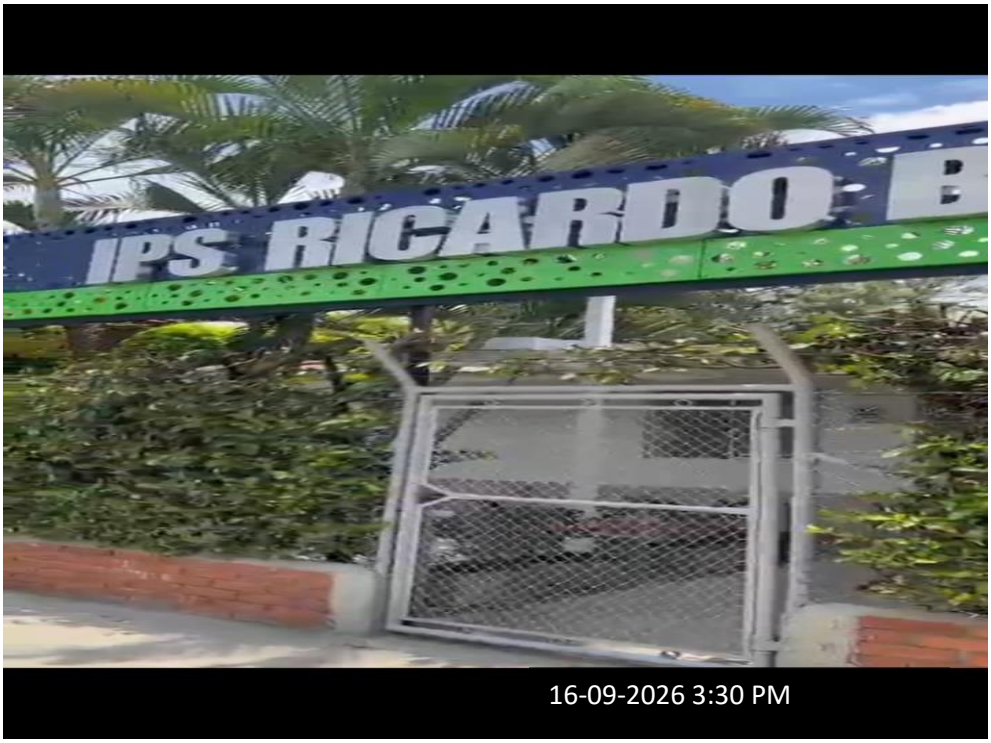

Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS UPIANO LLOREDA

Fotografía Antes:



Fotografía durante:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS POBLADO II

Fotografía durante:

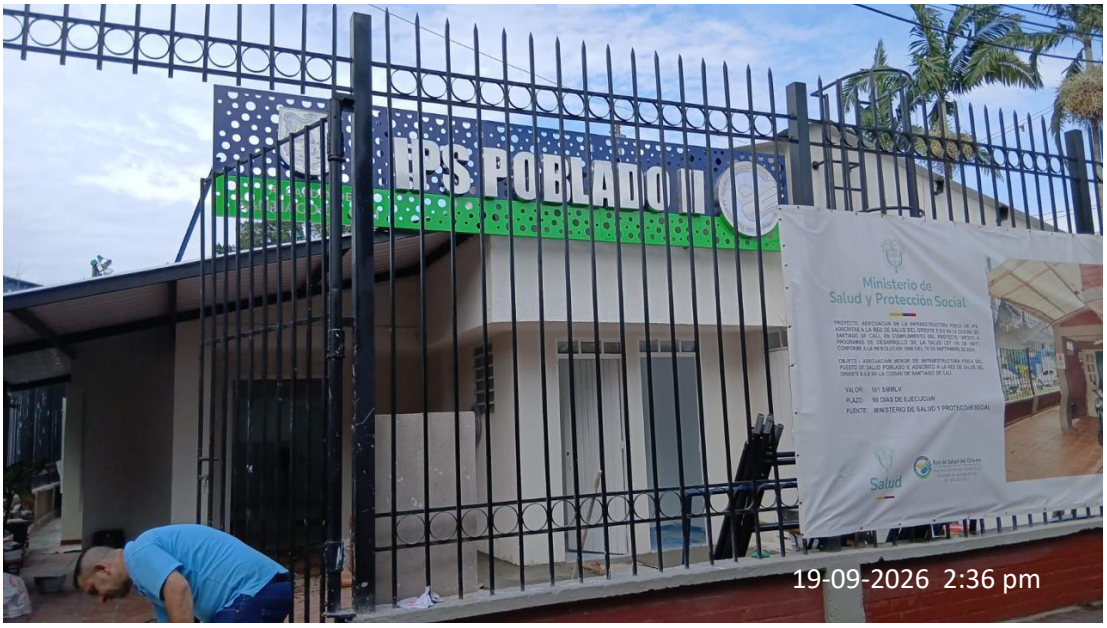

Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS VERGEL

Fotografía antes:



Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS POTRERO GRANDE



Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS ALFONSO BONILLA ARAGÓN

Fotografía antes:



Fotografía durante:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

Fotografía después / fachada instalada:

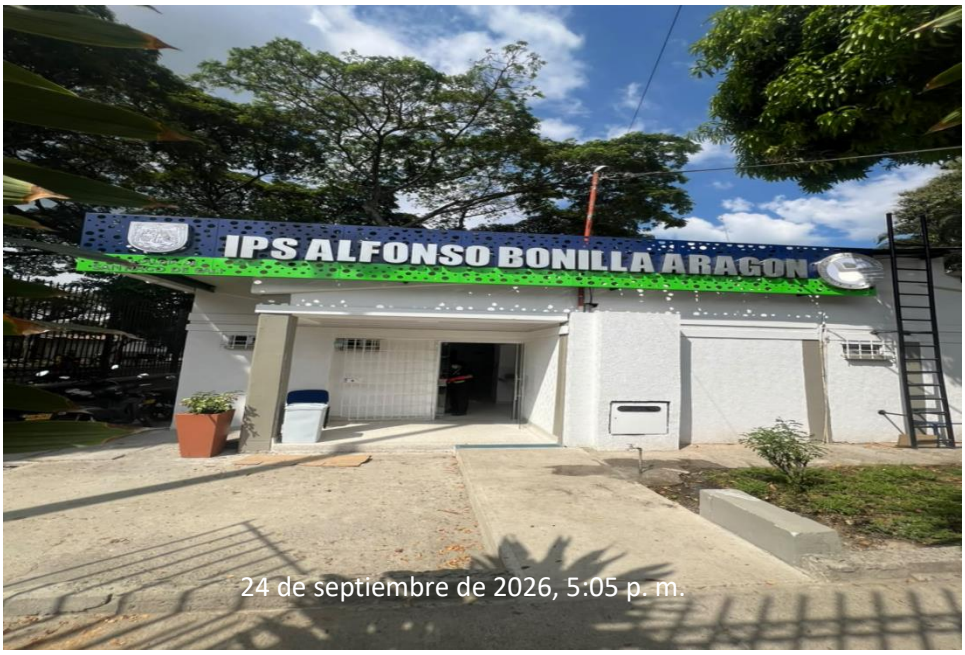

IPS VALLADO

Fotografía antes:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

Fotografía durante:



Fotografía después / fachada instalada:



GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS RETIRO

Fotografía Antes:



Fotografía durante:



Fotografía final:



9. OBSERVACIONES

Los trabajos correspondientes a la fabricación, suministro e instalación de las fachadas fueron desarrollados tomando como referencia las especificaciones relacionadas en el contrato de suministro 100.23.21.20260038

Se deja constancia de que el valor económico relacionado en la cotización para el conjunto de las fachadas corresponde a los valores individuales establecidos para cada sede. El subtotal general de la cotización es de **$159.610.000**, con un IVA de **$30.325.900**, para un total de **$189.935.900**.

GRUPO

ABC MEDIA SAS

10. CONCLUSIÓN

GRUPO ABC MEDIA SAS deja constancia de la entrega de los trabajos correspondientes a la fabricación, suministro e instalación de las fachadas destinadas a las diferentes sedes de la Red de Salud Oriente.

Los elementos fueron elaborados de acuerdo con las características contempladas en la cotización No. 099, contrato de suministro 100.23.21.20260038, incluyendo las estructuras en lámina galvanizada, acabados en pintura poliuretano e instalación completa.

Con la entrega de las fachadas y el correspondiente registro fotográfico, se presenta el soporte de las actividades ejecutadas para conocimiento y verificación de la entidad.

Cordialmente,



Carlos Eduardo Rodríguez Arias

Representante legal

Cel.: 3016209000

gerencia@grupoabc.com.co
