VICTOR MONTERO OROZCO

NIT. No. 1042446403-9

Soledad Octubre 15 del 2026

INFORME DEL TRABAJO REALIZADO A LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS

1. El día miércoles 7 de octubre de 2026, el contratista dio inicio a la obra lavando toda la

superficie con ácido nítrico para levantar cualquier impureza que impida que la pintura se adhiera a la misma.se retiro con espátulas algunos elementos (chicles y otros) que estaban adheridos a la superficie. Se aplicó un producto sellador en las grietas y orificios que tenía la superficie.

2. El día 8 de octubre se inició con la pintura de las columnas con pintura de color blanco y la pared de fondo de la tarima, para hacer esto inicialmente se limpiaron las superficies y se retiró cualquier elemento que estuviera adherido a ella.
3. El día 9 de octubre se inició con el empapelado de la demarcación de las líneas que bordean la cancha, y los escudos tanto de la tarima como del centro de la cancha, estas líneas se pintaron con pintura tráfico blanco y amarillo de acuerdo al requerimiento.

   Se aplicó una segunda mano a las columnas.
4. El día 10 de octubre se aprovechó que no había ningún tipo de público en la institución y se inició a aplicar la pinta para pisos y canchas en color azul y rojo de acuerdo a los requerimientos de la institución, se siguió con los patrones establecidos con anterioridad
5. El día 11 de octubre el contratista terminó de aplicar la pintura y se hicieron los retoques necesarios. Se dejó todo el lugar acordonado para evitar el paso y se dejó secando. Se recibió la obra por la institución de la obra.
6. El día 12 de octubre se revisó que todo estuviera correctamente pintado, se hizo la limpieza de la obra y se retiró de la institución, sugirió se dejara cerrado por tres días más para que el secado fuera correcto.

Atentamente:

VICTOR MONTERO OROZCO
C. C. 1042446403 DE SOLEDAD

Calle 24 No. 13 - 28
Cel.: 301 785 0514
E-mail: monterovictor_@hotmail.com
Soledad - Atlántico













LAVADO DE LA CANCHA




RASPADO Y RESANE DE LA CANCHA

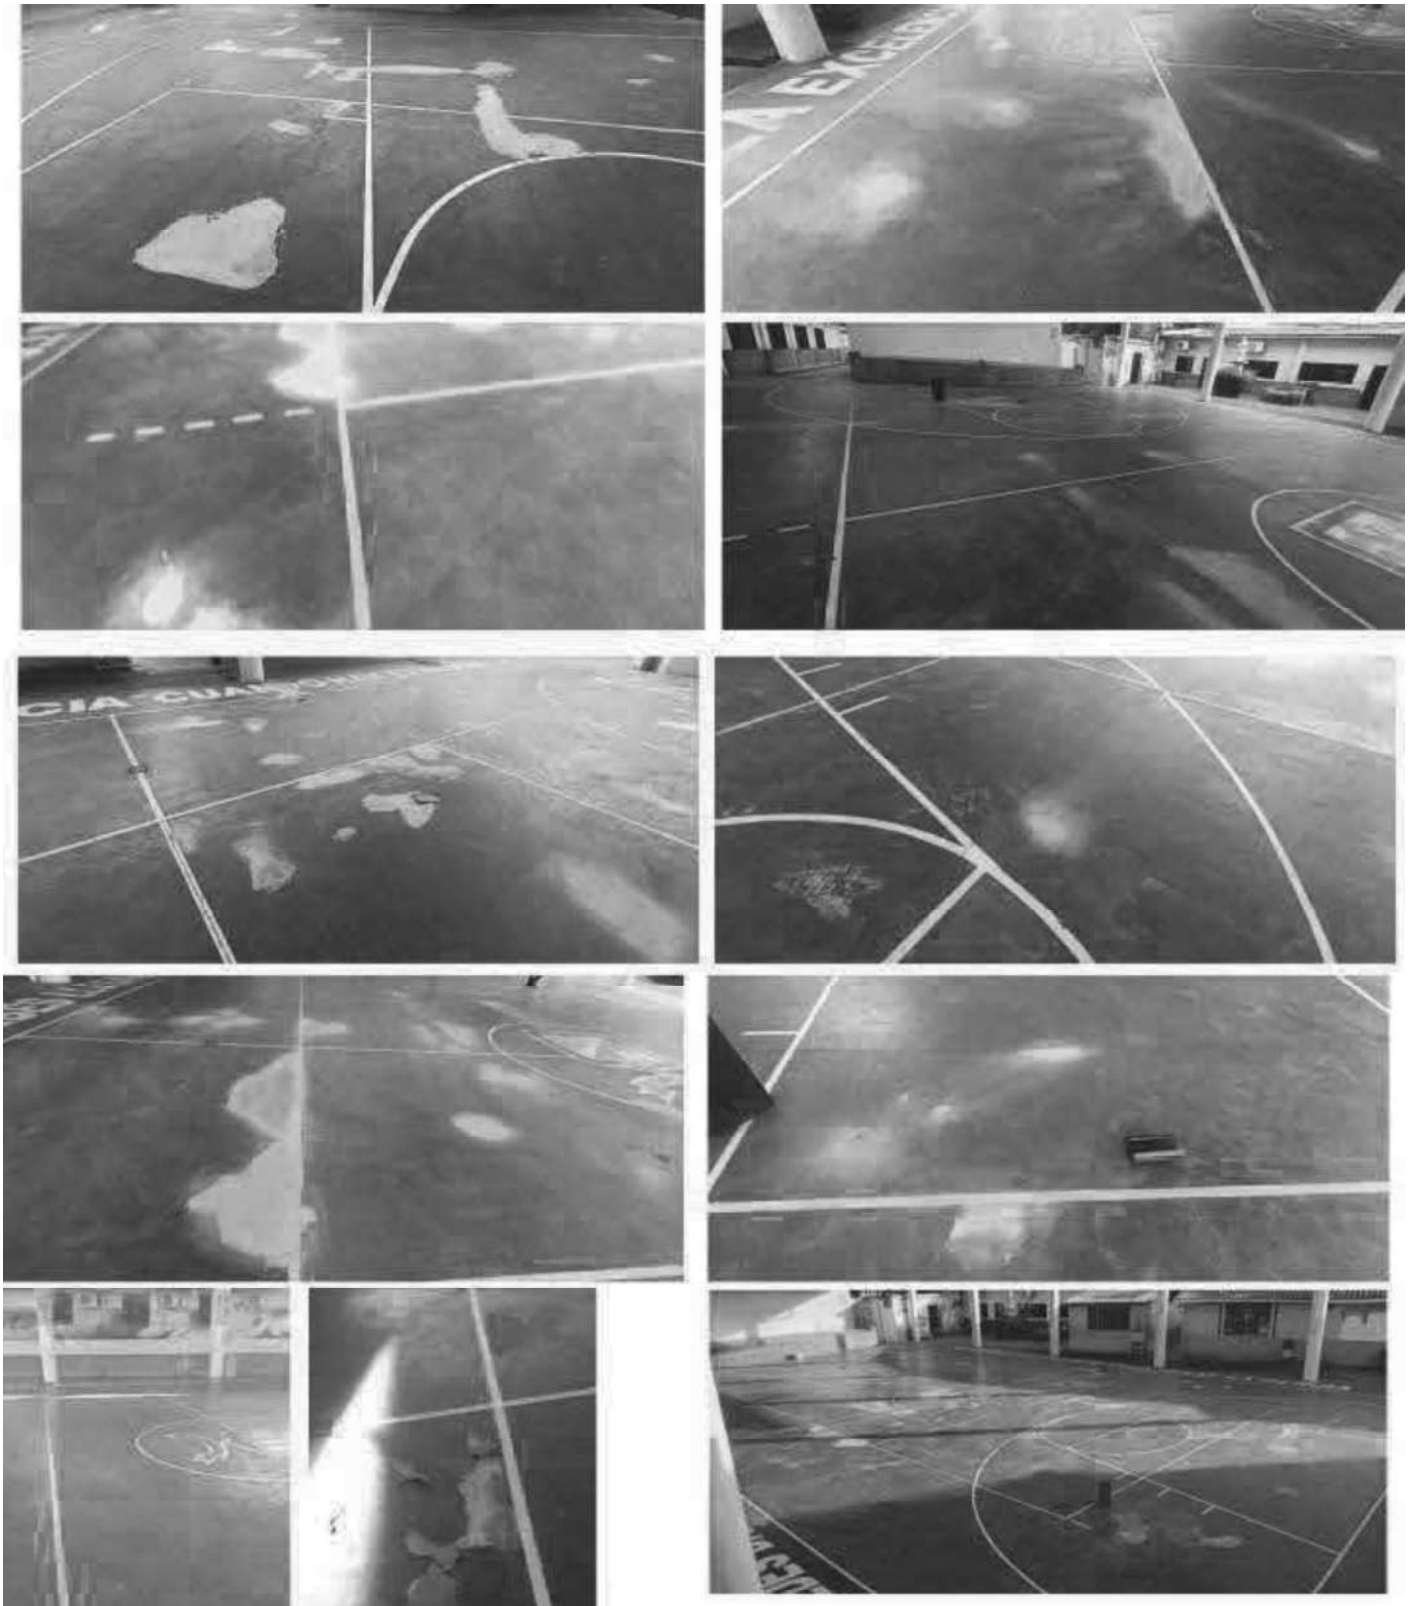

RESANE DE LA CANCHA




RESANE DE LA CANCHA

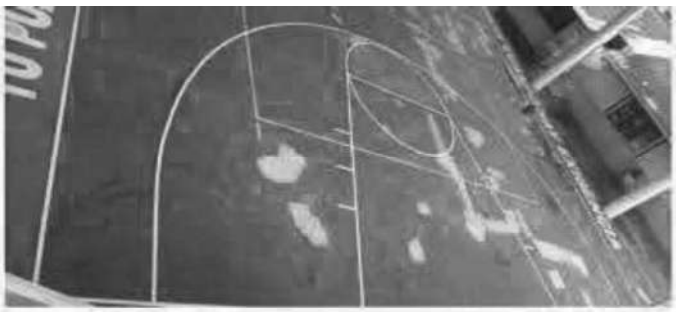

PINTADA CON RÁPIDO SECADO MATERIAL EPÓXICO



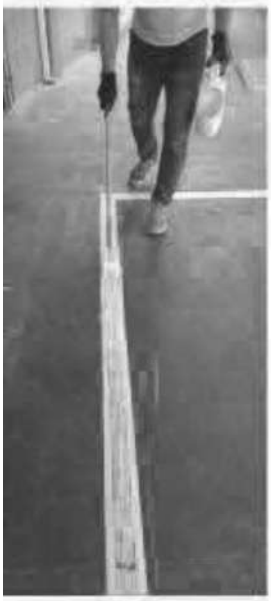





DEMARCACIÓN DE LAS CANCHAS BASQUET Y VOLEIBOL











LAVADA, RASPE Y PINTADA DE LAS COLUMNAS





PINTADA DEL PISO DE LA CANCHA CON LOS COLORES BASE



PINTADA DE LAS FRASES INSTITUCIONALES (ZONAS LATERALES DE LA CANCHA)





PRESENTACIÓN FINAL

CANCHA MÚLTIPLE

I. E. C.

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

2026

MATERIALES UTILIZADOS







