Manizales, noviembre 4 de 2026

CE-0857-HCC-024-2026

Señor(es):
ALCALDIA DE MANIZALES
Atn: Ing. Natalia Molina Garcés
Supervisora contrato.
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2606190875 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE

ASUNTO: Remisión informe No. 2 contrato 2606190875 y aval acta de obra No. 2

Una vez recibido el informe de obra No. 2 del contrato de obra por parte de HCC INGENIERÍA SAS, y una vez realizada la revisión del mismo; esta interventoría encuentra que el contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales en los siguientes componentes:

Componente técnico: Se verificó la correcta ejecución de las actividades de obra, utilizando materiales y realizando procesos constructivos que cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto. En el informe mensual se adjuntan soportes de laboratorio que verifican dichos procesos

Gestión social: el contratista ha dado cumplimiento al plan de gestión social, realizando las respectivas actas de vecindad y atención de PQRS

Seguridad y salud en el Trabajo: el contratista ha dado cumplimiento al SG-SST, Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizó los pagos de aportes a la seguridad social


Componente Ambiental: el contratista ha dado cumplimiento al Plan de Manejo cumpliendo con los requerimientos realizados

Por lo anterior y una vez validadas todas las cantidades de obra ejecutadas; esta interventoría otorga concepto favorable y avala el acta de obra No. 2 para su respectivo trámite y pago por parte de la entidad

Dentro de los documentos se encuentran:

1. Acta-preacta parcial de obra N.º 2 firmada.
2. Bitácora
3. Registro fotográfico de avance físico.
4. Parafiscales al día (Planilla PILA).
5. Aportes de seguridad social
6. Autorización de descuentos contractuales y tributarios.
7. Liquidación personal
8. Paz y salvo proveedores
9. Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789 de 2002).
10. Seguimiento plan de calidad
11. Resultados de ensayos de laboratorio certificados.
12. Informes de obra presentados por el residente de obra y validados por la interventoría
13. Acta de Precios No previstos

Quedo atento a sus comentarios



ING. RICARDO TABARES GONZALEZ
RL CONSORCIO RT

Copia: HCC INGENIERIA SAS

1_1

APROBACION ACTA OBRA

1_2

INF SUPERVISION

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**30/09/2026**		
CONTRATO N °	**2606190875**		
INFORME Nº	1 (UNO)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.		
FECHA DE INICIO:	09 DE JULIO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	08 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 MESES		
VALOR:	$ 1,383,000,000.00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	**HCC INGENIERIA SAS**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**CONSORCIO RT**		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros X Cuales Espacio Público

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	20%	$ 256,600,000.00	5	3500	BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS	28
Acta Parcial Nº 1	43%	$ 596,818,124.00				
Acta Parcial Nº 2	47%	$ 645,113,372.00				
Saldo no ejecutado						

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	Nº de folios
El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	Nº

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
CONSORCIO RT
NIT: 902.070.982-9
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

1

ACTA PREACTA

Manizales, septiembre 28 de 2026

CE-0857-HCC-021-2026

Señor(es):
ALCALDIA DE MANIZALES
Atn: Ing. Natalia Molina Garcés
Supervisora contrato.
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2606190875 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE

ASUNTO: ACTA DE CONVENIO PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega para su revisión del acta de convenio de los siguientes precios unitarios no previstos del contrato de la referencia los cuales una vez entregados por el contratista el día 14 de septiembre fueron revisados y aprobados por esta interventoría:

- Suministro, transporte e instalación barrera con bombones plásticos y cinta de seguridad
- Localización y replanteo de vías incluye eje de vía y laterales con andenes

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**07 de octubre de 2026**
CONTRATO №:	**2606190875**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS, ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDÍN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.**
FECHA INICIO:	**09/07/2026**
FECHA TERMINACIÓN:	**08/10/2026**
PLAZO (MESES O DÍAS):	**Tres (03) meses**
VALOR:	**$ 1,383,000,000.0**

En Manizales, a los 07 días del mes de octubre de 2026 se reunieron contratista e interventor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial. Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO SIN AIU
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1.00	$ 10,674
NP-2	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1.00	$ 4,349

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

NP-1 Se requiere la implementación de barreras con bombones plásticos y cinta de seguridad para realizar la adecuada delimitación y señalización de las zonas de intervención durante la ejecución de las obras. El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado y presupuestado en la etapa precontractual fue formulado con base en los volúmenes de tránsito, ancho de calzada y condiciones de entorno registrados en los estudios y diseños. Dicho plan preveía esquemas de señalización con conos y control manual, suficientes bajo las condiciones allí estimadas.

Durante la ejecución se verificó que las condiciones reales de flujo vehicular y peatonal en los frentes intervenidos difieren sustancialmente de las supuestas en el diseño, generándose zonas sin separación física efectiva entre el área de trabajo y los corredores de circulación pública. Bajo esas condiciones, la señalización con conos no garantiza la contención de terceros ni la protección del personal, configurándose un riesgo estructural no identificado en la etapa de planeación.

En consecuencia, se requiere implementar una barrera física continua mediante bombones plásticos y cinta de seguridad, que constituye un nivel de protección adicional no contemplado en el PMT original. La actividad no duplica el ítem de señalización contractual, sino que responde a una condición de riesgo sobreviniente y verificable en campo.

NP-2 La actividad de localización y replanteo se requiere para trasladar al terreno las dimensiones, alineamientos, niveles y demás elementos geométricos necesarios para la correcta ejecución de las intervenciones viales y peatonales. El replanteo previsto en el contrato original se estructuró sobre la base de un sistema de referencia topográfico definido en los diseños, apoyado en puntos de control (BM) que se presumían estables y compatibles con la red geodésica municipal. Al iniciar la ejecución se estableció que dichos puntos de referencia no son compatibles con la red de control existente en el sector y que algunos han perdido vigencia por las intervenciones concurrentes de terceros en el área.

Esta circunstancia obliga a construir un sistema de control geométrico propio, con el cual se trasladen al terreno el eje, los bordes laterales y la ubicación precisa de andenes, vías y barandas, garantizando que la obra se ejecute conforme a las dimensiones y alineamientos de diseño y dentro de las tolerancias admisibles.

El trabajo requerido excede en alcance y complejidad al replanteo ordinario presupuestado, y su origen no es una omisión de planeación, sino la pérdida sobreviniente de aplicabilidad de las condiciones de referencia sobre las cuales se estructuró el ítem contractual..

Para cada uno de los items se anexa su respectivo análisis de precios unitarios

FIRMA
NOMBRE: HCC INGENIERIA SAS
NIT 860.038.553
REP.LEGA: CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. 80.858.047 DE BOGOTA
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ORDENADORA DE L GASTO

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO RT
NIT: 902.070.982-9
REP.LEGAL: Ricardo Tabares Gonzales
C.C. 75.076.406
INTERVENTOR/SUPERVISOR

APU-ITEMS NO PREVISTOS

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS, ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDÍN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

001.057	**NP-1**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD**	**Actividad**	**ML**			**$ 14,510**
	CODIGO	**INSUMO**	**TIPO**	**UNIDAD**	**REND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.05	$ 36,962	$ 1,848
	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.00101	$ 183,067	$ 185
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.05	$ 3,540	$ 177
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.053	$ 1,847	$ 98
	I451	ALQUILER DE DELINEADOR PLASTICO (8 USOS)	Insumos	UND	0.13	$ 61,471	$ 7,991
	I452	CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD (2 HILERAS)	Insumos	M	2.3	$ 163	$ 375
		COSTOS DIRECTOS					**$ 10,674**
		AU				**35.940%**	$ 3,836

	NP-2	**LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES**	**Actividad**	**ML**			**$ 5,912**
	CODIGO	**INSUMO**	**TIPO**	**UNIDAD**	**REND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.050	$ 3,540	$ 177
	I1015	PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO TIPO PINTUCO (PINTUTRÁFICO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO.	Insumos	GAL	0.008	$ 157,529	$ 1,260
	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	Cuadrilla	HR	0.062	$ 36,962	$ 2,292
	I425	PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumos	LB	0.01	$ 5,304	$ 53
	I998	LATA DE GUADUA	Insumos	UND	1	$ 567	$ 567
		COSTOS DIRECTOS					**$ 4,349**
		AU				**35.940%**	$ 1,563

CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
HCC INGENIERIA SAS
C.C. 8.858.047 DE BOGOTA

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Version 05

ACTA Nº	2
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO Nº	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 1,283,000,000.00
FORMA DE PAGO	ANTICIPIO Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N / A
SUSPENSIONES	N / A
ADICIONES	$ 100,000,000.00
VALOR ANTICIPO	$ 256,600,000.00
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	SI	EDUCACIÓN	NO	SANEAMIENTO	NO
PARQUES	NO	ACCIÓN COMUNAL	NO	ESTABILIDAD	NO
OTROS	SI	CUALES	ESPACIO PUBLICO	OBSERVACIONES	NO

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1	$ 4,538.00		0.00			0.00	$ -					
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 20,833.00		1801.00		1801.00	0.00	$ -					
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$ 16,376.00		0.00			0.00	$ -					
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1	$ 8,837.00		0.00			0.00	$ -					
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3-HM	1	$ 225,113.00		0.00	6.10		6.10	$ 1,373,189.00	**6.10**	**$ 1,373,189.00**	6.10	$ 1,373,189.00	**100.00%**
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIÓNETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$ 302,950.00		68.00			68.00	$ 20,600,600.00	**26.00**	**$ 7,876,700.00**	61.00	$ 18,479,950.00	**89.71%**
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1	$ 6,556.00		2338.39		2338.39	0.00	$ -					
001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1	$ 341,405.00		40.00		16.00	24.00	$ 8,193,720.00			24.00	$ 8,193,720.00	**100.00%**
MOVIMIENTO DE TIERRAS															

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 012 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO Nº	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$	59,427.00		0.00			0.00	$ -					
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$	18,324.00		0.00	51.86		51.86	$ 950,283.00	**51,86**	**$ 950,283.00**	51.86	$ 950,283.00	**100.00%**
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$	64,408.00		311.89	58.98		370.87	$ 23,886,995.00	**214.33**	**$ 13,804,567.00**	362.56	$ 23,351,764.00	**97.76%**
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$	91,919.00		83.16		16.52	66.64	$ 6,125,482.00	**3.25**	**$ 298,737.00**	66.64	$ 6,125,482.00	**100.00%**
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1	$	57,091.00		0.00			0.00	$ -					
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$	45,957.00		251.00		134.80	116.20	$ 5,340,203.00			116.20	$ 5,340,203.00	**100.00%**
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$	59,263.00		451.00	122.51		573.51	$ 33,988,180.00	**351.27**	**$ 20,817,314.00**	509.82	$ 30,213,463.00	**88.89%**
CIMIENTOS																
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1	$	43,116.00		0.00			0.00	$ -					
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$	1,302,477.00		0.00			0.00	$ -					
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1	$	1,220,576.00		0.00			0.00	$ -					
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																
003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1	$	256,323.00		0.00			0.00	$ -					
003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1	$	217,018.00		0.00			0.00	$ -					
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA																
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1	$	1,475,710.00		0.00			0.00	$ -					
MAMPOSTERIA																
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	M3	1	$	13,018.00		0.00			0.00	$ -					
CARPINTERIA METALICA																
17.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	1	$	254,640.00		319.27			319.27	$ 81,298,913.00			319.27	$ 81,298,913.00	**100.00%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Version 05
ACTA Nº	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO Nº	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1	$ 211,373.00		54.62			108.62	$ 22,959,335.00			24.62	$ 5,204,003.00	**22.67%**
OBRAS EXTERIORES																
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1	$ 175,701.00		0.00			0.00	$ -					
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 119,430.00		428.79		226.09	202.70	$ 24,208,461.00	**66.51**	**$ 7,943,289.00**	139.20	$ 16,624,656.00	**68.67%**
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1	$ 24,931.00		0.00			0.00	$ -					
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 236,158.00		0.00			0.00	$ -					
021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1	$ 141,700.00		0.00			0.00	$ -					
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1	$ 851,526.00		0.00			0.00	$ -					
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTÁLACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 130,732.00		230.00		5.79	224.21	$ 29,311,422.00	**81.20**	**$ 10,615,438.00**	186.61	$ 24,395,899.00	**83.23%**
VIAS																
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3		$ 1,690,085.00		0.00	66.52		66.52	$ 112,424,454.00	**34.21**	**$ 57,817,808.00**	34.21	$ 57,817,808.00	**51.43%**
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2		$ 8,342.00		1922.00	101.88		2023.88	$ 16,883,207.00	**865.21**	**$ 7,217,582.00**	2023.91	$ 16,883,457.00	**100.00%**
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3		$ 1,911,407.00		0.00			0.00	$ -					
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3		$ 168,151.00		11.40	14.53		25.93	$ 4,360,155.00	**8.54**	**$ 1,436,010.00**	24.17	$ 4,064,210.00	**93.21%**
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3		$ 269,134.00		0.00	51.86		51.86	$ 13,957,289.00	**51.86**	**$ 13,957,289.00**	51.86	$ 13,957,289.00	**100.00%**
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3		$ 284,949.00		90.23		90.23	0.00	$ -					
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3		$ 279,775.00		268.10	87.35		355.45	$ 99,446,024.00	**279.07**	**$ 78,076,809.00**	349.22	$ 97,703,026.00	**98.25%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 264,821.00		0.00			0.00	$ -						
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1,210,096.00		124.52	50.25		174.77	$ 211,488,478.00	**102.35**	**$ 123,853,326.00**	174.71	$ 211,415,872.00	**99.97%**
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO	M3-SUELTO	1	$ 2,077,603.00		186.12		1.34	184.78	$ 383,899,482.00	**76.15**	**$ 158,209,468.00**	184.78	$ 383,899,482.00	**100.00%**
023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1	$ 24,585.00		783.25		379.90	403.35	$ 9,916,360.00	**403.35**	**$ 9,916,360.00**	403.35	$ 9,916,360.00	**100.00%**
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1	$ 14,123.00		782.02		125.06	656.96	$ 9,278,246.00	**399.47**	**$ 5,641,715.00**	414.47	$ 5,853,560.00	**63.09%**
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1	$ 16,305.00		0.00	303.44		303.44	$ 4,947,589.00					
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1	$ 34,521.00		1192.84	64.21		1257.05	$ 43,394,623.00	**803.58**	**$ 27,740,385.00**	1257.03	$ 43,393,933.00	**100.00%**
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 25,110.00		169.20	47.75		216.95	$ 5,447,615.00	**95.30**	**$ 2,392,983.00**	148.60	$ 3,731,346.00	**68.50%**
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 22,150.00		916.27	50.66		966.93	$ 21,417,500.00	**460.50**	**$ 10,200,075.00**	719.27	$ 15,931,831.00	**74.39%**
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2		$ 102,562.00		27.00		27.00	0.00	$ -					
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML		$ 12,621.00		321.00	453.00		774.00	$ 9,768,654.00	**774.00**	**$ 9,768,654.00**	774.00	$ 9,768,654.00	**100.00%**
023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND		$ 95,381.00		0.00			0.00	$ -					
023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND		$ 127,172.00		0.00			0.00	$ -					

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PGI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2		$ 29,757.00		323.73		182.88	140.85	$ 4,191,273.00	**140.85**	**$ 4,191,273.00**	140.85	$ 4,191,273.00	**100.00%**
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML		$ 16,966.00		0.00			0.00	$ -					
023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3		$ 289,829.00		0.00			0.00	$ -					
023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3		$ 238,172.00		0.00			0.00	$ -					
023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO		$ 159,247.00		27.00		6.00	21.00	$ 3,344,187.00	**10.00**	**$ 1,592,470.00**	20.00	$ 3,184,940.00	**95.24%**
ALCANTARILLADO																
024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3		$ 969,352.00		0.00			0.00	$ -					
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND		$ 1,654,494.00		0.00			0.00	$ -					
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND		$ 1,002,139.00		0.00			0.00	$ -					
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND		$ 292,892.00		0.00			0.00	$ -					
024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML		$ 629,351.00		0.00			0.00	$ -					
024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND		$ 276,182.00		0.00			0.00	$ -					

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJR-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND		$ 3,087,281.00		0.00			0.00	$ -						
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND		$ 1,222,377.00		1.00			1.00	$ 1,222,377.00			1.00	$ 1,222,377.00	**100.00%**	
024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML		$ 38,628.00		1.00			1.00	$ 38,628.00			1.00	$ 38,628.00	**100.00%**	
ESTABILIDAD DE TALUDES																
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,424,310.00		0.00			0.00	$ -						
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML		$ 271,891.00		0.00			0.00	$ -						
027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3		$ 1,598,060.00		0.00			0.00	$ -						
DESMONTES																
028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML		$ 30,234.00		0.00			0.00	$ -						
DESMONTES																
29,007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3		$ 167,351.00		24.51		5.24	19.27	$ 3,224,854.00	**7.34**	**$ 1,228,356.00**	17.56	$ 2,938,684.00	**91.13%**	
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 144,902.00		143.32	5.95		149.27	$ 21,629,522.00	**59.71**	**$ 8,652,098.00**	148.71	$ 21,548,376.00	**99.62%**	
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 169,671.00		190.32	4.67		194.99	$ 33,084,148.00	**76.83**	**$ 13,035,823.00**	189.20	$ 32,101,753.00	**97.03%**	
JORNALES																

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA Nº	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190875	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 141,649.00		0.00			0.00	$ -						
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA		$ 187,102.00		248.00		59.00	189.00	$ 35,362,278.00	**80.00**	**$ 14,968,160.00**	163.00	$ 30,497,626.00	**86.24%**	
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS																
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3		$ 202,664.00		0.00			0.00	$ -						
032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2		$ 384,361.00		50.00		8.01	41.99	$ 16,139,318.00			34.94	$ 13,429,573.00	**83.21%**	
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML		$ 12,659.00		51.65		24.00	27.65	$ 350,021.00			22.65	$ 286,726.00	**81.92%**	
32,016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2		$ 163,666.00		0.00			0.00	$ -						
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML		$ 101,374.00		0.00			0.00	$ -						
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO		$ 161,034.00		0.00			0.00	$ -						
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR		$ 30,922.00		0.00			0.00	$ -						
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR		$ 19,325.00		0.00			0.00	$ -						
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR		$ 23,191.00		0.00			0.00	$ -						
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR		$ 14,494.00		0.00			0.00	$ -						
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS																
033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3		$ 288,747.00		5.00		4.53	0.47	$ 135,711.00			0.47	$ 135,711.00	**100.00%**	
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3		$ 57,873.00		3.60			3.60	$ 208,343.00			3.60	$ 208,343.00	**100.00%**	

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-S.JM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO №	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.

033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML		$ 197,249.00		0.00			0.00	$ -					
033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2		$ 28,395.00		199.09		95.58	103.51	$ 2,939,166.00			103.51	$ 2,939,166.00	**100.00%**
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3		$ 1,440,250.00		90.23		90.23	0.00	$ -					
ANALISIS BÀSICOS															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG		$ 10,672.00		2562.98	508.99		3071.97	$ 32,784,064.00	**821.26**	**$ 8,764,487.00**	988.31	$ 10,547,244.00	**32.17%**
ANALISIS BÀSICOS															
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML		$ 14,510.00		0.00	1217.23		1217.23	$ 17,662,007.00	**1168.51**	**$ 16,955,080.00**	1168.51	$ 16,955,080.00	**96.00%**
NP-2	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML		$ 5,912.00		0.00	984.04		984.04	$ 5,817,644.00	**984.04**	**$ 5,817,644.00**	984.04	$ 5,817,644.00	**100.00%**
												$ -			
TOTAL										**$ 1,383,000,000.00**		**$ 645,113,372.00**		**$ 1,241,931,497.00**	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-S.JM-FR 018 Estado Vigente Version 05
ACTA N°	2	
FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO №	2606190675	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.	

CONTROL FINANCIERO

REBUMEN DEL CONTRATO			REBUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1,283,000,000.00		VALOR ANTICIPO	$ 256,600,000.00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 596,818,124.00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 119,363,624.80	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 645,113,372.00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 137,236,375.20	
VALOR ADICIONES	$ 100,000,000.00		SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 141,068,504.00				
SUMAS IGUALES			SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 645,113,372.00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 137,236,375.20			
VALOR A PAGAR	$ 507,876,996.80			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ

C.C. 80.858.047

HOC INGENIERIA S.A.S

NIT 860.038.553-8

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ING. RICARDO TABARES GONZALEZ

C.C. 75.076.406

CONSORCIO RT

NIT 902.070.982-9

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTJEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

Nº ITEM	001.083	DESCRIPCIÓN ITEM	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	Unidad de Medida	M3-HM

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 46										
1	Calle 20B Frente al No. 31-03	12.00	1.13	0.100				1.23	1.67	1.67	
		4.00	1.50	0.600				1.23	4.43	6.10	
								TOTAL ACTA	6.10		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

C.C. 10.297.972

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	001.084	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE**	**Unidad de Medida**	**DIA**

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	martes, 1 de septiembre de 2026							1.00	1.00	1.00	
2	miércoles, 2 de septiembre de 2026							1.00	1.00	2.00	
3	jueves, 3 de septiembre de 2026							1.00	1.00	3.00	
4	viernes, 4 de septiembre de 2026							1.00	1.00	4.00	
5	sábado, 5 de septiembre de 2026							1.00	1.00	5.00	
6	lunes, 7 de septiembre de 2026							1.00	1.00	6.00	
7	martes, 8 de septiembre de 2026							1.00	1.00	7.00	
8	miércoles, 9 de septiembre de 2026							1.00	1.00	8.00	
9	jueves, 10 de septiembre de 2026							1.00	1.00	9.00	
10	viernes, 11 de septiembre de 2026							1.00	1.00	10.00	
11	sábado, 12 de septiembre de 2026							1.00	1.00	11.00	
12	lunes, 14 de septiembre de 2026							1.00	1.00	12.00	
13	martes, 15 de septiembre de 2026							1.00	1.00	13.00	
14	miércoles, 16 de septiembre de 2026							1.00	1.00	14.00	
15	jueves, 17 de septiembre de 2026							1.00	1.00	15.00	
16	viernes, 18 de septiembre de 2026							1.00	1.00	16.00	
17	sábado, 19 de septiembre de 2026							1.00	1.00	17.00	
18	lunes, 21 de septiembre de 2026							1.00	1.00	18.00	
19	martes, 22 de septiembre de 2026							1.00	1.00	19.00	
20	miércoles, 23 de septiembre de 2026							1.00	1.00	20.00	
21	jueves, 24 de septiembre de 2026							1.00	1.00	21.00	
22	viernes, 25 de septiembre de 2026							1.00	1.00	22.00	
23	sábado, 26 de septiembre de 2026							1.00	1.00	23.00	
24	lunes, 28 de septiembre de 2026							1.00	1.00	24.00	
25	martes, 29 de septiembre de 2026							1.00	1.00	25.00	
26	miércoles, 30 de septiembre de 2026							1.00	1.00	26.00	
								TOTAL ACTA	26.00		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

C.C. 10.297.972

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	002.015	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	38.00	4.61	0.080					14.01	**14.01**	
	PUNTO 9										
2	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales	36.55	4.15	0.090					13.65	**27.67**	
	PUNTO 22										
3	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	30.00	7.42	0.065					14.47	**42.13**	
	PUNTO 23										
4	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana	42.40	3.82	0.060					9.72	**51.86**	

TOTAL ACTA **51.86**

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

C.C. 10.297.972

FIRMA

NOMBRE: ARDIZÓN ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

FSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	002.016	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 2										
3	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	1.10	1.50	0.100					0.17	**0.17**	
		1.90	2.05	0.100					0.39	**0.55**	
		6.00	1.50	0.150					1.35	**1.90**	
	PUNTO 5										
2	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03	0.70	0.075					1.21	**3.11**	
	PUNTO 6										
3	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	6.70	0.97	0.080					0.68	**3.79**	
	PUNTO 7										
4	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	8.72	1.56	0.180					2.45	**6.24**	
		2.00	1.03	0.180					0.37	**6.61**	
		9.53	1.40	0.180					2.40	**9.01**	
	PUNTO 10										
6	Carrera 33 Calle 10D	12.30	3.75	0.20					9.23	**18.23**	
		3.27	4.11	0.20					2.69	**20.92**	
		7.18	3.07	0.20					4.41	**25.33**	
		13.43	3.65	0.20					9.80	**35.13**	
		6.15	3.75	0.15					3.46	**38.59**	
		1.64	4.11	0.15					1.01	**39.61**	
		3.59	3.07	0.15					1.65	**41.26**	
		6.72	3.65	0.15					3.68	**44.94**	
	PUNTO 11										
6	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	46.10	3.71	0.20					34.21	**79.14**	
		23.05	3.71	0.15					12.83	**91.97**	
	PUNTO 18										
7	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	59.40	2.90	0.487					83.89	**175.86**	
		60.00	3.00	0.147					-26.46	**149.40**	Cantidad Acta 001
	PUNTO 29										
8	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	21.15	2.70	0.20					11.42	**160.82**	
		9.00	2.90	0.38					9.79	**170.61**	
	PUNTO 30										
9	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.38					11.36	**181.97**	
		10.20	3.00	0.20					-6.12	**175.85**	Cantidad Acta 001
	PUNTO 32										
10	Carrera 45 Calle 10	25.90	3.12	0.20					16.16	**192.01**	
	PUNTO 36										
11	Carrera 38A Calle 10A	5.73	8.02	0.20	0.64				9.06	**201.08**	
	PUNTO 40										
12	Calle 9 Via Villa Kempis	11.00	3.65	0.33					13.25	**214.33**	

TOTAL ACTA 214.33

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 16.297.972

FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	002.017	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 3										
1	Carrera 25 Calle 18	8.10	1.50	0.08					0.97	**0.97**	
		6.73	1.55	0.08					0.83	**1.81**	
	PUNTO 18										
2	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	59.40	2.90	0.063					10.85	**12.66**	
		60.00	3.00	0.063					-11.34	**1.32**	Cantidad Acta 001
	PUNTO 30										
3	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.08					2.27	**3.59**	
		10.20	3.00	0.08					-2.30	**1.30**	Cantidad Acta 001
	PUNTO 29										
4	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	9.00	2.90	0.08					1.96	**3.25**	

TOTAL ACTA 3.25

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTEREVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDIA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PBS.SJM.FR.22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2608190875
OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA: HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR: CONSORCIO RT

N° ITEM	002.089	DESCRIPCIÓN ITEM	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	Unidad de Medida	M3-Suelto

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro/	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	38.00	4.61	0.080				1.30	18.22	18.22	
	PUNTO 2										
2	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	1.10	1.50	0.100				1.30	0.21	18.43	
		1.90	2.05	0.100				1.30	0.51	18.94	
		6.00	1.50	0.150				1.30	1.78	20.89	
	PUNTO 3										
3	Carrera 26 Calle 18	8.10	1.50	0.08				1.30	1.26	21.96	
		6.73	1.55	0.08				1.30	1.08	23.04	
	PUNTO 5										
4	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03	0.70	0.075				1.30	1.57	24.61	
	PUNTO 6										
5	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	6.70	0.97	0.080				1.30	0.88	25.49	
	PUNTO 7										
6	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	6.72	1.56	0.180				1.30	3.18	28.68	
		2.00	1.03	0.180				1.30	0.48	29.16	
		9.53	1.40	0.180				1.30	3.12	32.28	
	PUNTO 9										
7	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Via alterna Nogales	36.55	4.15	0.090				1.30	17.75	50.03	
	PUNTO 10										
8	Carrera 33 Calle 10D	12.30	3.75	0.20				1.30	11.99	62.02	
		3.27	4.11	0.20				1.30	3.49	65.51	
		7.16	3.07	0.20				1.30	5.73	71.24	
		13.43	3.65	0.20				1.30	12.75	83.99	
		6.15	3.75	0.15				1.30	4.50	88.49	
		1.64	4.11	0.15				1.30	1.31	89.80	
		3.59	3.07	0.15				1.30	2.15	91.95	
		6.72	3.65	0.15				1.30	4.78	96.73	
	PUNTO 11										
9	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	48.10	3.71	0.20				1.30	44.47	141.20	
		23.05	3.71	0.15				1.30	16.68	157.88	
	PUNTO 18										
10	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	59.40	2.90	0.550				1.30	123.17	281.04	
		60.00	3.00	0.147				1.30	34.40	246.84	Cantidad Acta 001
		60.00	3.00	0.063				1.30	14.74	231.90	Cantidad Acta 001
	PUNTO 22										
11	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	30.00	7.42	0.065				1.30	18.81	250.71	
	PUNTO 23										
12	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana	42.40	3.82	0.060				1.30	12.64	263.35	
	PUNTO 29										
13	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	21.15	2.70	0.20				1.30	14.85	278.20	
		9.00	2.90	0.38				1.30	12.72	290.92	
		9.00	2.90	0.08				1.30	2.54	293.47	
	PUNTO 30										
14	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.45				1.30	17.73	311.19	
		10.20	3.00	0.25				1.30	9.95	301.26	Cantidad Acta 001
	PUNTO 32										
15	Carrera 45 Calle 10	25.90	3.12	0.20				1.30	21.01	322.28	
	PUNTO 36										
16	Carrera 38A Calle 10A	5.73	8.02	0.20	0.64			1.30	11.76	334.04	
	PUNTO 40										
17	Calle 9 Via Villa Kempis	11.00	3.65	0.33				1.30	17.22	351.27	
									TOTAL ACTA	351.27	

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.267.972

FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875

OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	021.016	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 16										
1	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	19.26							19.26	**19.26**	
	PUNTO 19										
2	Carrera 43 entre Calle 12 y 12A	2.75							2.75	**22.01**	
	PUNTO 29										
3	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	20.50							20.50	**42.51**	
	PUNTO 30										
4	Carrera 42B No. 10A-04	2.00							2.00	**44.51**	
	PUNTO 40										
6	Calle 9 Vía Villa Kempis	22.00							22.00	**66.51**	
									TOTAL ACTA	**66.51**	

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	021.052	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 4										
1	Carrera 25 Calle 17	12.53	1.69						21.18	21.18	
	PUNTO 5										
2	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	8.10	1.50						12.15	33.33	
		6.73	1.55						10.43	43.76	
	PUNTO 6										
3	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	8.70	0.97						8.44	67.86	
	PUNTO 7										
4	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	8.72	1.56						13.60	57.36	
		2.00	1.03						2.06	59.42	
		9.53	1.40						13.34	72.76	

TOTAL ACTA 81.20

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	023.001	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 11										
1	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	46.10	3.71	0.20					34.21	34.21	

TOTAL ACTA 34.21

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.002	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA**	**Unidad de Medida**	**M2**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANT. PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 5										
1	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03	0.70						16.12	**16.12**	
	PUNTO 22										
2	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	7.42	78.58						583.06	**599.18**	
		8.08	10.30						83.22	**682.41**	
		10.65	2.25					2.00	11.98	**694.39**	
	PUNTO 2										
3	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	49.50	2.70						133.65	**828.04**	
		7.50	0.96						7.20	**835.24**	
		1.10	1.50						1.65	**836.89**	
		1.90	2.05						3.90	**840.78**	
		6.00	1.50						9.00	**849.78**	
		9.52	1.62						15.42	**865.21**	
									TOTAL ACTA	**865.21**	

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.008	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES**	**Unidad de Medida**	**M3**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANT. PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 4										
1	Carrera 25 Calle 17	12.53	1.69	0.12					2.54	**2.54**	
	PUNTO 5										
2	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	8.10	1.50	0.10					1.22	**3.76**	
		6.73	1.55	0.10					1.04	**4.80**	
	PUNTO 6										
3	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	8.70	0.97	0.10					0.84	**5.64**	
	PUNTO 7										
4	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	8.72	1.56	0.10					1.36	**7.00**	
		2.00	1.03	0.10					0.21	**7.21**	
		9.53	1.40	0.10					1.33	**8.54**	

TOTAL ACTA **8.54**

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

C.C. 10.297.972

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.009	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
3	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	38.00	4.61	0.080					14.01	**14.01**	
	PUNTO 9										
2	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales	36.55	4.15	0.090					13.65	**27.67**	
	PUNTO 22										
3	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	30.00	7.42	0.065					14.47	**42.13**	
	PUNTO 23										
4	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana	42.40	3.82	0.060					9.72	**51.86**	
								TOTAL ACTA	**51.86**		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	023.011	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 2										
1	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	1.10	1.50	0.150					0.25	0.25	
		1.90	2.05	0.150					0.58	0.83	
		6.00	1.50	0.150					1.35	2.18	
	PUNTO 5										
2	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03	0.70	0.20					3.22	5.41	
	PUNTO 10										
3	Carrera 33 Calle 10D	12.30	3.75	0.20					9.23	14.63	
		3.27	4.11	0.20					2.69	17.32	
		7.18	3.07	0.20					4.41	21.73	
		13.43	3.65	0.20					9.80	31.53	
		6.15	3.75	0.15					3.46	34.99	
		1.64	4.11	0.15					1.01	36.00	
		3.59	3.07	0.15					1.65	37.65	
		6.72	3.65	0.15					3.68	41.33	
	PUNTO 11										
4	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	46.10	3.71	0.20					34.21	75.54	
		23.05	3.71	0.15					12.83	88.37	
	PUNTO 16										
5	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	16.30	3.69	0.15					9.02	97.39	
		8.20	3.63	0.15					4.46	101.85	
	PUNTO 18										
6	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	59.40	2.90	0.15					25.84	127.69	
		59.40	2.90	0.34					58.57	186.26	
	PUNTO 29										
7	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	21.15	2.70	0.40					22.84	209.10	
		9.00	2.90	0.40					10.44	219.54	
	PUNTO 30										
8	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.40					12.12	231.66	
	PUNTO 32										
9	Carrera 45 Calle 10	25.90	3.12	0.40					32.32	263.99	
	PUNTO 36										
10	Carrera 38A Calle 10A	5.73	8.02	0.20	-0.64				9.06	273.05	
	PUNTO 40										
11	Calle 9 Via Villa Kempis	11.00	3.65	0.15					6.02	279.07	

TOTAL ACTA 279.07

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.028	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 16										
2	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	16.30	3.69	0.18					10.83	**10.83**	
		8.20	3.63	0.18					5.36	**16.18**	
	PUNTO 18										
3	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	56.30	2.90	0.18					29.39	**40.22**	
		3.10	2.90	0.18	-0.06				1.56	**17.74**	
	PUNTO 29										
4	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	21.15	2.70	0.20					11.42	**29.16**	
		9.00	2.90	0.20					5.22	**34.38**	
	PUNTO 30										
5	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.20					6.06	**40.44**	
	PUNTO 32										
6	Carrera 45 Calle 10	25.90	3.12	0.20					16.16	**56.60**	
	PUNTO 36										
7	Carrera 38A Calle 10A	5.73	8.02	0.20	-0.64				9.06	**65.67**	
	PUNTO 40										
8	Calle 9 Via Villa Kempis	11.00	3.65	0.18					7.23	**72.89**	
		0.25	3.65	0.07					0.06	**72.96**	
								TOTAL ACTA	**102.35**		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	023.031	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	Unidad de Medida	M3-SUELTO

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 5										
1	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03	0.70	0.075				1.25	1.51	**1.51**	
	PUNTO 22										
2	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	78.58	7.42	0.075				1.25	54.66	**56.17**	
		10.30	8.08	0.075				1.25	7.80	**63.98**	
		10.65	2.25	0.075	2.00			1.25	1.12	**65.10**	
	PUNTO 2										
3	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	49.50	2.70	0.050				1.25	8.35	**73.45**	
		7.50	0.96	0.050				1.25	0.45	**73.90**	
		1.10	1.50	0.060				1.25	0.12	**74.03**	
		1.90	2.05	0.060				1.25	0.29	**74.32**	
		6.00	1.50	0.060				1.25	0.68	**74.99**	
		9.52	1.62	0.06				1.25	1.16	**76.15**	

TOTAL ACTA 76.15

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.032	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 27										
1	Calle 11C No. 45-50 - Bloque 3	403.35							403.35	403.35	
								TOTAL ACTA	403.35		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

C.C. 10.297.972

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.034	DESCRIPCIÓN ITEM	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	60.17							60.17	**60.17**	
	PUNTO 2										
2	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	66.52							66.52	**126.69**	
	PUNTO 5										
3	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.73							23.73	**150.42**	
	PUNTO 9										
4	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales	8.30							8.30	**158.72**	
	PUNTO 16										
5	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	14.00							14.00	**172.72**	
	PUNTO 22										
6	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	83.50							83.50	**256.22**	
	PUNTO 23										
7	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana	112.30							112.30	**368.52**	
	PUNTO 29										
8	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	10.40							10.40	**378.92**	
	PUNTO 29										
9	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	10.40							10.40	**389.32**	
	PUNTO 30										
10	Carrera 42B No. 10A-04	2.95							2.95	**392.27**	
	PUNTO 40										
11	Calle 9 Vía Villa Kempis	7.20							7.20	**399.47**	

TOTAL ACTA **399.47**

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	023.037	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	Unidad de Medida	KG

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 18										
1	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	56.30	2.90	0.18		383.70		0.030	338.29	**338.29**	
		3.10	2.90	0.18	-0.06	383.70		0.030	17.94	**356.23**	
	PUNTO 29										
2	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	21.15	2.70	0.20		383.70		0.030	131.47	**487.70**	
		9.00	2.90	0.20		383.70		0.030	60.09	**547.79**	
	PUNTO 30										
3	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.20		383.70		0.030	69.76	**617.54**	
	PUNTO 32										
4	Carrera 45 Calle 10	25.90	3.12	0.20		383.70		0.030	186.04	**803.58**	

TOTAL ACTA **803.58**

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.045	DESCRIPCIÓN ITEM	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 16										
1	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	3.60					4.00		14.40	**14.40**	
	PUNTO 18										
2	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	2.80					14.00		39.20	**53.60**	
	PUNTO 29										
3	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	2.60					6.00		15.60	**69.20**	
	PUNTO 30										
4	Carrera 42B No. 10A-04	2.90					1.00		2.90	**72.10**	
	PUNTO 32										
5	Carrera 45 Calle 10	3.00					4.00		12.00	**84.10**	
	PUNTO 36										
6	Carrera 38A Calle 10A	2.80					2.00		5.60	**89.70**	
	PUNTO 40										
7	Calle 9 Vía Villa Kempis	2.80					2.00		5.60	**95.30**	
								TOTAL ACTA	**95.30**		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.046	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS**	**Unidad de Medida**	**KG**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANT. PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 16										
1	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42		0.35			3.98	4.00	12.00	66.78	**66.78**	
	PUNTO 18										
2	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12		0.35			3.98	14.00	10.00	194.78	**261.56**	
	PUNTO 29										
3	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal		0.35			3.98	6.00	9.00	75.13	**336.68**	
	PUNTO 30										
4	Carrera 42B No. 10A-04		0.35			3.98	1.00	9.00	12.52	**349.20**	
	PUNTO 32										
5	Carrera 45 Calle 10		0.35			3.98	4.00	10.00	55.65	**404.85**	
	PUNTO 36										
6	Carrera 38A Calle 10A		0.35			3.98	2.00	10.00	27.83	**432.68**	
	PUNTO 40										
7	Calle 9 Via Villa Kempis		0.35			3.98	2.00	10.00	27.83	**460.50**	

TOTAL ACTA **460.50**

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.049	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)**	**Unidad de Medida**	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	258.00					3.00		774.00	**774.00**	
							TOTAL ACTA		**774.00**		

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°	2
CONTRATO N°	2606190875
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA	HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO RT

N° ITEM	023.067	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS**	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 2										
1	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	49.50	2.70						133.65	**133.65**	
		7.50	0.96						7.20	**140.85**	

TOTAL ACTA **140.85**

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	023.090	DESCRIPCIÓN ITEM	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	Unidad de Medida	PTO

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis						1.00		1.00	1.00	
	PUNTO 2										
2	Calle 19 entre Carrera 24 y 26						1.00		1.00	2.00	
	PUNTO 5										
3	Calle 17 entre Carrera 24 y 25						1.00		1.00	3.00	
	PUNTO 9										
4	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales						1.00		1.00	4.00	
	PUNTO 10										
5	Carrera-33 Calle 10D						1.00		1.00	5.00	
	PUNTO 11										
6	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A						1.00		1.00	6.00	
	PUNTO 22										
7	Calle 11A entre Carreras 44 y 45						1.00		1.00	7.00	
	PUNTO 27										
8	Calle 11C No. 45-50 - Bloque 3						1.00		1.00	8.00	
	PUNTO 36										
9	Carrera 38A Calle 10A						1.00		1.00	9.00	
	PUNTO 40										
10	Calle 9 Vía Villa Kempis						1.00		1.00	10.00	

TOTAL ACTA 10.00

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA: HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR: CONSORCIO RT

N° ITEM	29.007.000	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 4										
1	Carrera 25 Calle 17	12.53	1.69	0.20					4.24	4.24	
	PUNTO 5										
2	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	8.10	1.50	0.10					1.22	5.45	
		6.73	1.55	0.10					1.04	6.49	
	PUNTO 6										
3	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	8.70	0.97	0.10					0.84	7.34	

TOTAL ACTA 7.34

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	029.013	DESCRIPCIÓN ITEM	**DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO**	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 22										
1	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	7.42	78.58	0.075					43.73	**43.73**	
		8.08	10.30	0.075					6.24	**49.97**	
		10.65	2.25	0.075				2.00	0.90	**50.87**	
	PUNTO 2										
2	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	49.50	2.70	0.050					6.68	**57.55**	
		7.50	0.96	0.050					0.36	**57.91**	
		1.10	1.50	0.060					0.10	**58.01**	
		1.90	2.05	0.060					0.23	**58.25**	
		6.00	1.50	0.060					0.54	**58.79**	
		9.52	1.62	0.06					0.93	**59.71**	

TOTAL ACTA 59.71

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	029.014	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 29										
1	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	1.10	1.50	0.150					0.25	**0.25**	
		1.90	2.05	0.150					0.58	**0.83**	
	PUNTO 5										
2	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03	0.70	0.20					3.22	**4.06**	
	PUNTO 10										
3	Carrera 33 Calle 10D	38.50	3.65	0.20					28.11	**32.16**	
		9.00	3.50	0.20					6.30	**38.46**	
	PUNTO 11										
4	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	35.94	3.65	0.20					26.24	**64.70**	
	PUNTO 18										
5	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	59.40	2.90	0.120					20.67	**85.37**	
		60.00	3.00	0.120					-21.60	**63.77**	Cantidad Acta 001
	PUNTO 29										
6	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	9.00	2.90	0.15					3.92	**67.68**	
	PUNTO 30										
7	Carrera 42B No. 10A-04	10.10	3.00	0.15					4.55	**72.23**	
		10.20	3.00	0.15					-4.59	**67.64**	Cantidad Acta 001
	PUNTO 36										
8	Carrera 38A Calle 10A	5.73	8.02	0.20					9.19	**76.83**	

TOTAL ACTA 76.83

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	030.003	DESCRIPCIÓN ITEM	REGULADOR DE TRANSITO	Unidad de Medida	DIA

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	martes, 1 de septiembre de 2026							3.00	3.00	3.00	
2	miércoles, 2 de septiembre de 2026							3.00	3.00	6.00	
3	jueves, 3 de septiembre de 2026							3.00	3.00	9.00	
4	viernes, 4 de septiembre de 2026							2.00	2.00	11.00	
5	sábado, 5 de septiembre de 2026							2.00	2.00	13.00	
6	lunes, 7 de septiembre de 2026							2.00	2.00	15.00	
7	martes, 8 de septiembre de 2026							2.00	2.00	17.00	
8	miércoles, 9 de septiembre de 2026							2.00	2.00	19.00	
9	jueves, 10 de septiembre de 2026							3.00	3.00	22.00	
10	viernes, 11 de septiembre de 2026							3.00	3.00	25.00	
11	sábado, 12 de septiembre de 2026							3.00	3.00	28.00	
12	lunes, 14 de septiembre de 2026							2.00	2.00	30.00	
13	martes, 15 de septiembre de 2026							2.00	2.00	32.00	
14	miércoles, 16 de septiembre de 2026							4.00	4.00	36.00	
15	jueves, 17 de septiembre de 2026							4.00	4.00	40.00	
16	viernes, 18 de septiembre de 2026							4.00	4.00	44.00	
17	sábado, 19 de septiembre de 2026							4.00	4.00	48.00	
18	lunes, 21 de septiembre de 2026							4.00	4.00	52.00	
19	martes, 22 de septiembre de 2026							4.00	4.00	56.00	
20	miércoles, 23 de septiembre de 2026							3.00	3.00	59.00	
21	jueves, 24 de septiembre de 2026							4.00	4.00	63.00	
22	viernes, 25 de septiembre de 2026							4.00	4.00	67.00	
23	sábado, 26 de septiembre de 2026							4.00	4.00	71.00	
24	lunes, 28 de septiembre de 2026							3.00	3.00	74.00	
25	martes, 29 de septiembre de 2026							3.00	3.00	77.00	
26	miércoles, 30 de septiembre de 2026							3.00	3.00	80.00	
								TOTAL ACTA	80.00		

FIRMA

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTEREVENTORIA
C.C.

Ardizon Valencia

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	AB1	DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Unidad de Medida	KG

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 16										
1	Carrera 43 entre Calle 11 y 11A		0.25				32.00	0.557	4.46	4.46	
		11.03						0.557	6.14	10.60	
			0.25				24.00	0.557	3.34	13.94	
		8.10						0.557	4.51	18.45	
	PUNTO 18										
2	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	75.20						0.994	74.75	93.20	
	PUNTO 36										
3	Carrera 38A Calle 10A	710.88						0.994	706.61	799.82	
	PUNTO 40										
4	Carrera 43 entre Calle 11 y 11A		0.25				66.00	0.557	9.19	809.01	
		22.00						0.557	12.25	821.26	
								TOTAL ACTA	821.26		

FIRMA
NOMBRE:
RESIDENTE DE INTEREVENTORIA
C.C.

Ardizon Valencia
FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N° 2
CONTRATO N° 2606190875
OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO RT

N° ITEM	NP-1	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	10.06							10.06	10.06	
	PUNTO 2										
2	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	111.04							111.04	121.10	
	PUNTO 3										
3	Carrera 25 Calle 18	20.93							20.93	142.03	
	PUNTO 4										
4	Carrera 25 Calle 17	15.91							15.91	157.94	
	PUNTO 5										
5	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	24.43							24.43	182.37	
	PUNTO 6										
6	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	10.64							10.64	193.01	
	PUNTO 7										
7	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	28.23							28.23	221.24	
	PUNTO 9										
8	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales	8.30							8.30	229.54	
	PUNTO 10										
9	Carrera 33 Calle 10D	101.52							101.52	331.06	
	PUNTO 11										
10	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	99.62							99.62	430.68	
	PUNTO 16										
11	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	63.64							63.64	494.32	
	PUNTO 17										
12	Carrera 42 frente a No. 11-48 costado Colegio	14.69							14.69	509.01	
	PUNTO 18										
13	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	124.60							124.60	633.61	
	PUNTO 19										
14	Carrera 43 entre Calle 12 y 12A	58.00							58.00	691.61	
	PUNTO 22										
15	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	7.42							7.42	699.03	
	PUNTO 23										
16	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana	54.82							54.82	753.85	
	PUNTO 24										
17	Calle 11 carrera 44	58.00							58.00	811.85	
	PUNTO 25										
18	Carrera 43 entre Calle 11 y 11A	75.00							75.00	886.85	
	PUNTO 26										
19	Calle 11 entre Carrera 43 y 44	74.68							74.68	961.53	
	PUNTO 29										
20	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	35.75							35.75	997.28	
	PUNTO 30										
21	Carrera 42B No. 10A-04	26.40							26.40	1023.68	
	PUNTO 31										
22	Calle 10A entre Carrera 44 y 44A	26.70							26.70	1050.38	
	PUNTO 32										
23	Carrera 45 Calle 10	58.04							58.04	1108.42	
	PUNTO 33										
24	Carrera 43C Calle 10A	12.53							12.53	1120.95	
	PUNTO 36										
25	Carrera 38A Calle 10A	11.46							11.46	1132.41	
	PUNTO 40										
26	Calle 9 Vía Villa Kempis	7.30							7.30	1139.71	
	PUNTO 41										
27	Calle 23 Carrera 29B	28.80							28.80	1168.51	
									TOTAL ACTA	1168.51	

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO FIGUEROA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
C.C. 10.297.972

FIRMA
NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.110.533.483

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREACTA N°: 2
CONTRATO N°: 2608180875

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA: HCC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR: CONSORCIO RT

N° ITEM	NP-2	DESCRIPCIÓN ITEM	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
	PUNTO 1										
1	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	82.20							82.20	82.20	
		18.90							18.90	101.10	
		59.70							59.70	160.80	
	PUNTO 2										
2	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	75.52							75.52	236.32	
	PUNTO 3										
3	Carrera 25 Calle 18	14.83							14.83	251.15	
	PUNTO 4										
4	Carrera 25 Calle 17	12.53							12.53	263.68	
	PUNTO 5										
5	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	23.03							23.03	286.71	
	PUNTO 6										
6	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	8.70							8.70	295.41	
	PUNTO 7										
7	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	20.25							20.25	315.66	
	PUNTO 9										
8	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Via alterna Nogales	36.55							36.55	352.21	
	PUNTO 10										
9	Carrera 33 Calle 10D	36.18							36.18	388.39	
	PUNTO 11										
10	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	46.10							46.10	434.49	
	PUNTO 12										
11	Carrera 34A frente a No. 10C-51	31.10							31.10	465.59	
	PUNTO 16										
12	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	24.50							24.50	490.09	
	PUNTO 17										
13	Carrera 42 frente a No. 11-48 costado Colegio	12.15							12.15	502.24	
	PUNTO 18										
14	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	59.40							59.40	561.64	
	PUNTO 19										
15	Carrera 43 entre Calle 12 y 12A	24.30							24.30	585.94	
	PUNTO 22										
16	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	91.13							91.13	677.07	
	PUNTO 23										
17	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana.	55.20							55.20	732.27	
	PUNTO 24										
18	Calle 11 carrera 44	11.60							11.60	743.87	
	PUNTO 25										
19	Carrera 43 entre Calle 11 y 11A	22.50							22.50	766.37	
	PUNTO 26										
20	Calle 11 entre Carrera 43 y 44	27.30							27.30	793.67	
	PUNTO 29										
21	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	30.15							30.15	823.82	
	PUNTO 30										
22	Carrera 42B No. 10A-04	10.10							10.10	833.92	
	PUNTO 31										
23	Calle 10A entre Carrera 44 y 44A	24.00							24.00	857.92	
	PUNTO 32										
24	Carrera 45 Calle 10	25.90							25.90	883.82	
	PUNTO 33										
25	Carrera 43C Calle 10A	9.85							9.85	893.67	
	PUNTO 35										
26	Calle 10 carrera 39 (Primera entrada por la via principal)	27.65							27.65	921.32	
	PUNTO 36										
27	Carrera 38A Calle 10A	8.02							8.02	929.34	
	PUNTO 40										
28	Calle 9 Via Villa Kempis	11.00							11.00	940.34	
	PUNTO 41										
29	Calle 23 Carrera 29B .	27.00							27.00	967.34	
	PUNTO 46										
30	Calle 20B Frente al No. 31-03	12.50							12.50	979.84	
	PUNTO 47										
31	Calle 21 Carrera 31	4.20							4.20	984.04	

TOTAL ACTA 984.04

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

C.C. 10.297.972

FIRMA

NOMBRE: ARDIZON ALFONSO VALENCIA BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

C.C. 1.110.533.483

2

FACTURA

HCC INGENIERIA S.A.S

NIT 860038553-6
Nombre Comercial: HCC INGENIERIA SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4663
Dirección: TV 9 55 18
Teléfono: 2129629
Correo: facturacionhccingenieria@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

CUFE:23b105f8c96178052bd7a17808a3329fb4f51d403cd210b72ba91b715423efd88291c1f9cf4623375d13e85964d79d86

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. RYR6510
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764102806068 de 2025-12-09 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde RYR 6495 hasta RYR 10000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-11-05 10:00:56
Fecha Vencimiento: 2026-11-19
Fecha Dian: 2026-11-05 10:01:17
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE MANIZALES
NIT 890801053-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE MANIZALES
Dirección: CL 19 21 44
Teléfono: 6068928000
Correo: facturacionelectronica@manizales.gov.co
Ciudad: MANIZALES

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Crédito ACH

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	60015	Mmto rehabilitación infraestructura vial urb reparación y constrc de pav y peatonales Brs Estambul Granjas Estambul Nogales Nuevo Horizonte Panorama San Antonio Solidaridad, Villa Jardín y Kempis, de Manizales por monto agotable.	94	645,113,372.00	1.0	645,113,372.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
1. Discriminacion AIU:
* Administración 31.94% $151.573.643.53
* Imprevistos 0% 0,00
* Utilidad 4% $18.982.297,25

2. Amortizacion Anticipo
*Anticipo $137.236.375,2
* Valor total a Pagar $507.876.996,8

TOTAL BRUTO	645,113,372.00
SUBTOTAL	645,113,372.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL EN LETRAS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	645,113,372.00

3

REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA


CONTRATO N° 2660190875
CONTRATISTA : HCC INGENIERIA SAS

OBJETO "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDÍN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE".

Punto 1 (Barrio Panorama)
Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis

662 m2 de demolición carpeta asfáltica, nivelación con base sobre

ANTES

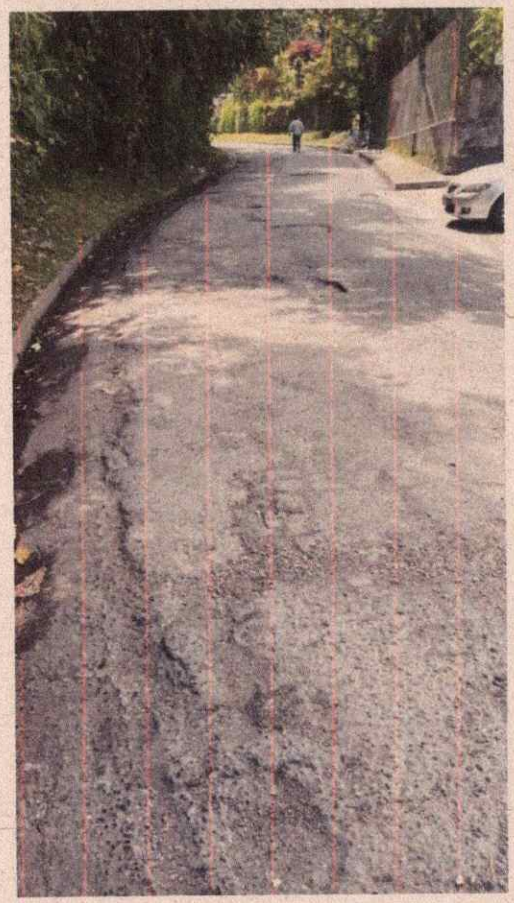

DESPUÉS



Punto 2 (Barrio San Antonio)
Calle 19 entre Carrera 24 y 26

Instalación de Pavimento Asfáltico

ANTES



DESPUÉS



Punto 3 (Barrio San Antonio)
Calle 19 entre Carrera 24 y 26

Reparación de anden en concreto

ANTES



DESPUÉS



Punto 4 (Barrio San Antonio)
Carrera 25 Calle 17

Reparación de anden en concreto

ANTES



DESPUÉS




Punto 5 (Barrio San Antonio)
Calle 17 entre Carrera 24 y 25

Reparación de anden de concreto

ANTES



DESPUÉS

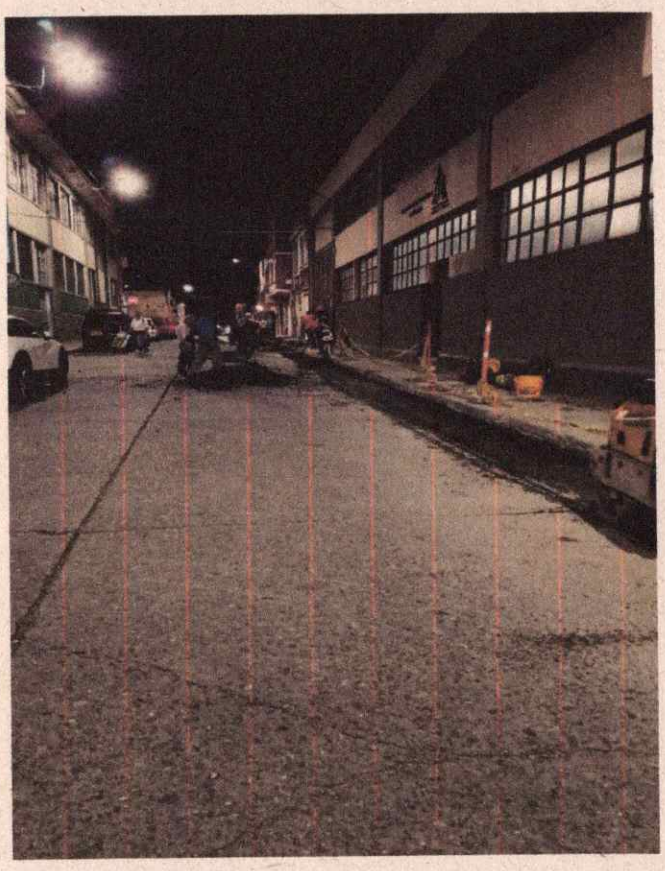

Punto 6 (Barrio San Antonio)
Calle 17 llegando hacia la Carrera 26


Instalación de Pavimento Asfáltico

ANTES






DESPUÉS

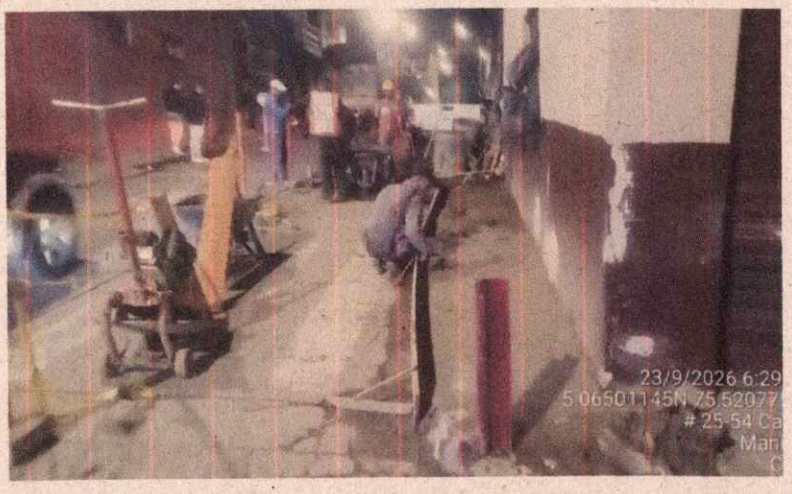

Punto 9 (Barrio Nogales)
Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales

Instalación de Pavimento Asfáltico

ANTES

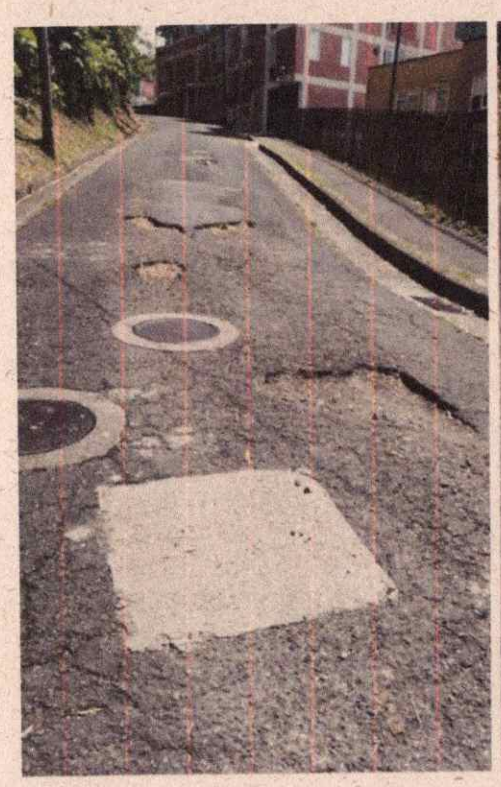



DESPUÉS



Punto 12 (Barrio Nogales)
Carrera 34A frente a No. 10C-51

Construcción de baranda en la parte superior del parque

ANTES



DESPUÉS




Punto 16 (Barrio Estambul)
Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42

Reparación de Pavimento MR-42

ANTES



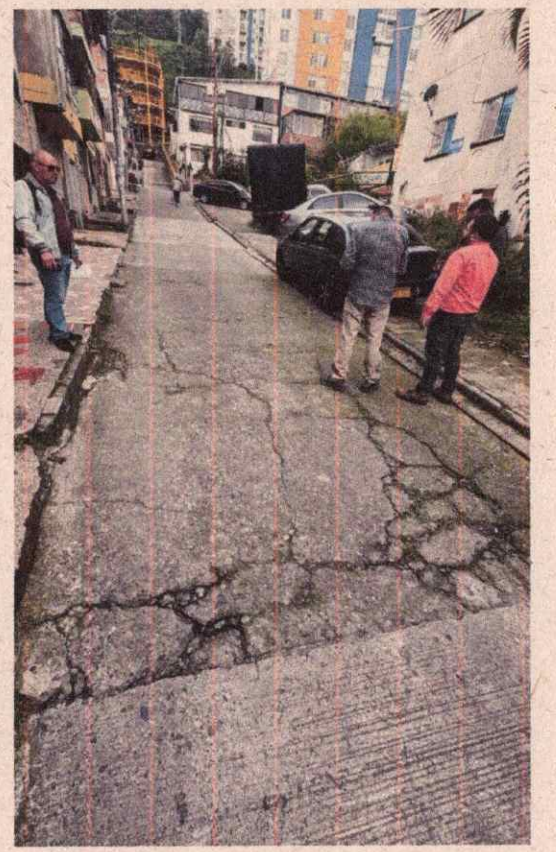


DESPUÉS



Punto 17 (Barrio Estambul)
Carrera 42 frente a No. 11-48 costado Colegio

Reconstrucción de andén

ANTES

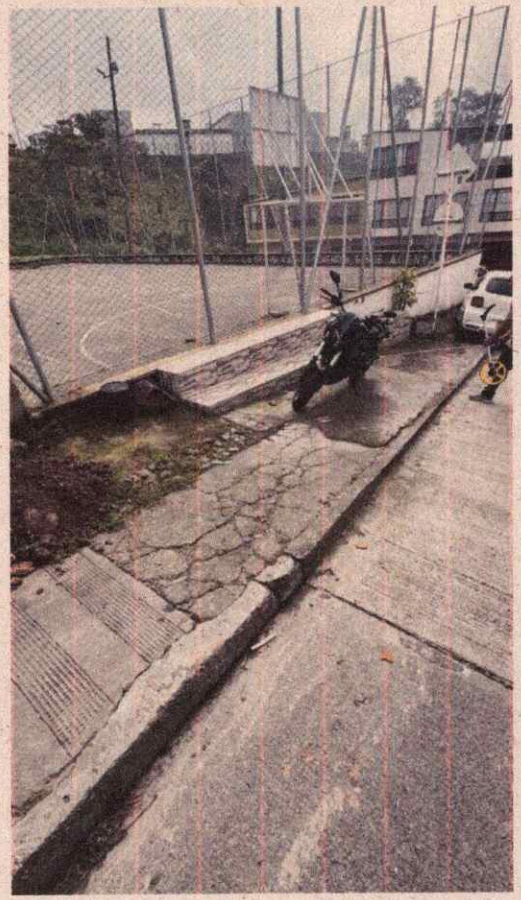


DESPUÉS




Punto 18 (Barrio Estambul)
Carrera 42 entre Carrera 11A y 12

Instalación Pavimento MR-42

ANTES

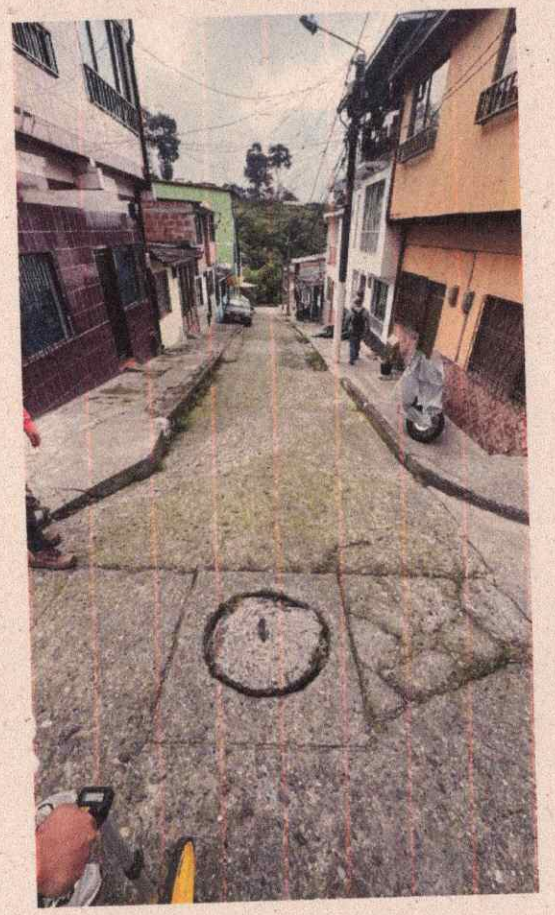

DESPUÉS

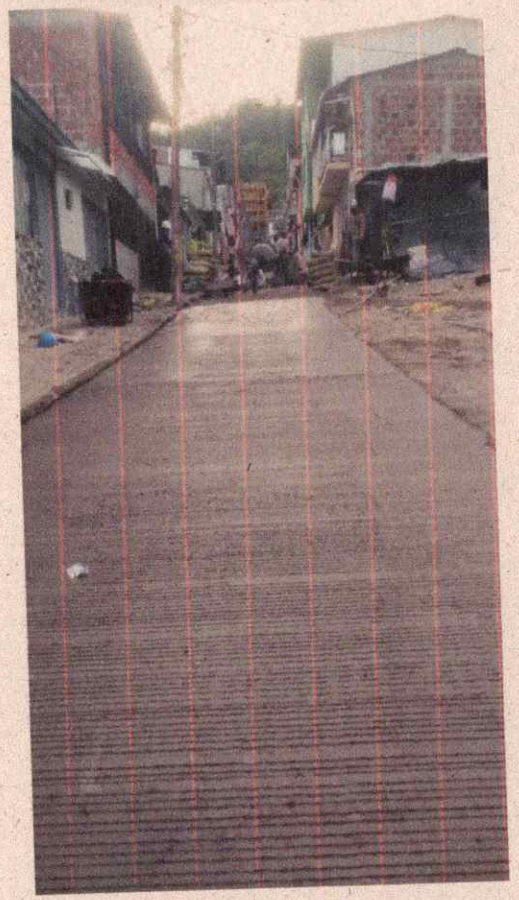

Punto 19 (Barrio Estambul)
Carrera 43 entre Calle 12 y 12A

Reposición de Pavimento MR 42

ANTES



DESPUÉS



Punto 20 (Barrio Estambul)
Calle 11A entre Carrera 44 y 45 - Bloques Estambul 2

Reparación de escaleras y construcción de barandas en ambos costados

ANTES



DESPUÉS



Punto 21 (Barrio Estambul)
Calle 11A entre Carrera 44 y 45 - Bloques 9,10,11 Estambul 2

Construcción de baranda en andén parte superior de la Cancha

ANTES




DESPUÉS




Punto 22 (Barrio Estambul)
Calle 11A entre Carreras 44 y 45

Instalación de Pavimento Asfáltico

ANTES

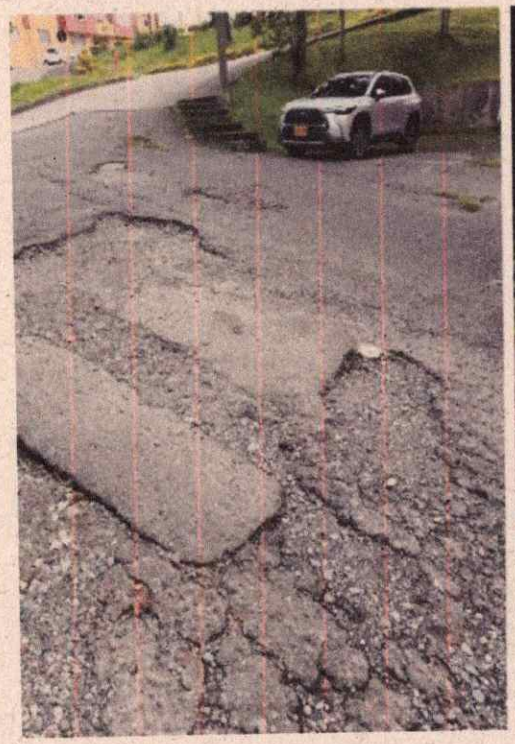

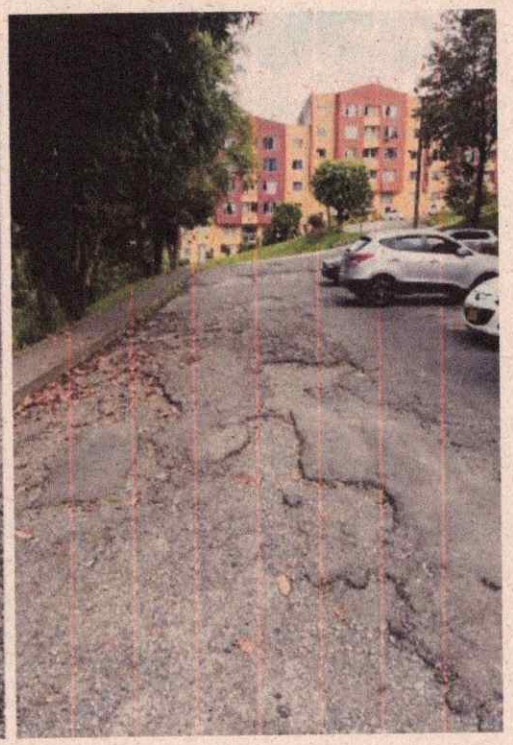


DESPUÉS




Punto 23 (Barrio Estambul)
Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana

Instalación de Pavimento Asfáltico

ANTES

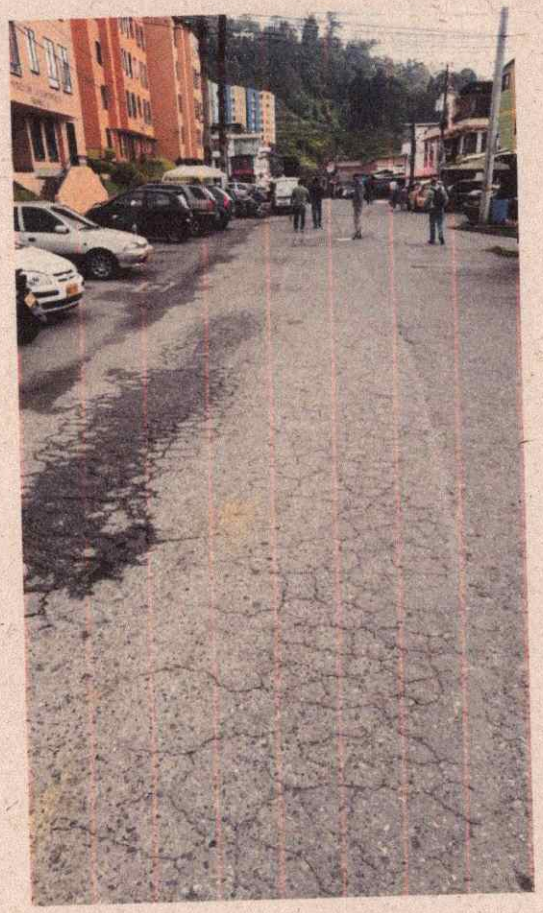

DESPUÉS

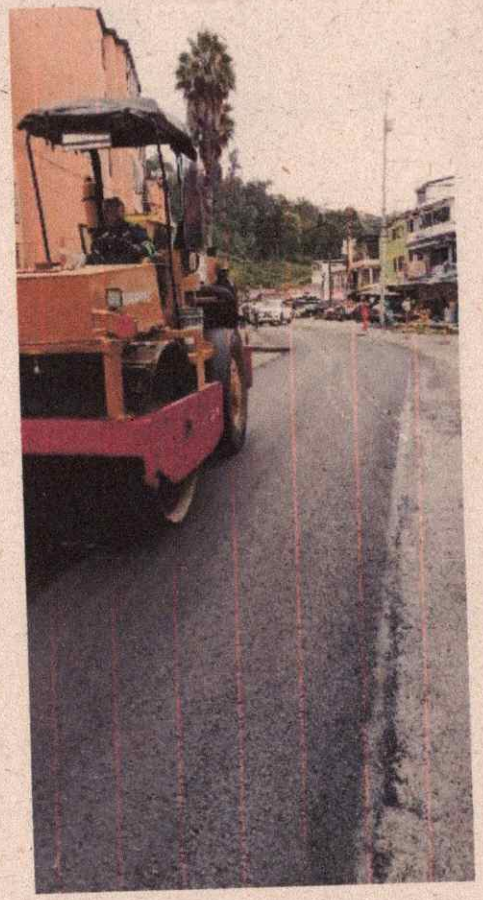

Punto 24 (Barrio Estambul)
Calle 11 carrera 44

Reparación de Pavimento MR 42

ANTES




DESPUÉS



Punto 25 (Barrio Estambul)
Carrera 43 entre Calle 11 y 11A

Reparación de Pavimento MR-42

ANTES

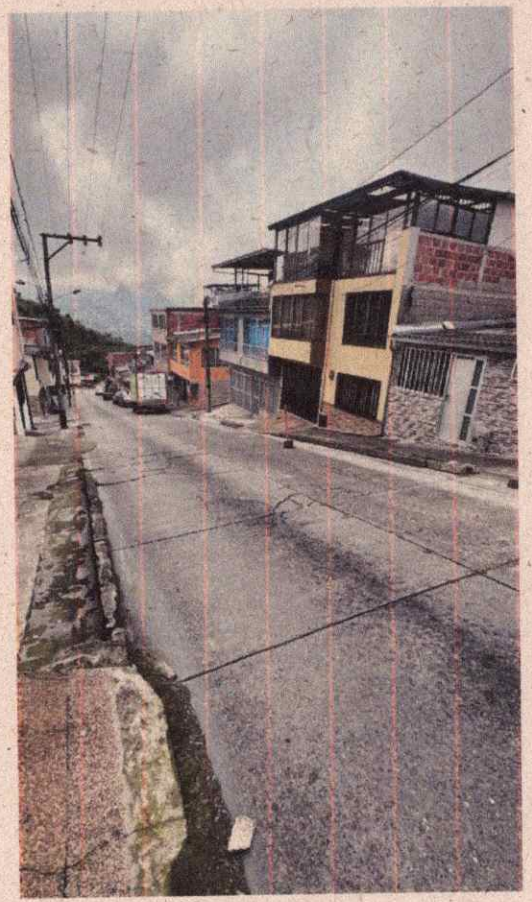


DESPUÉS



Punto 26 (Barrio Estambul)
Calle 11 entre Carrera 43 y 44

Reparación de Pavimento MR 42

ANTES

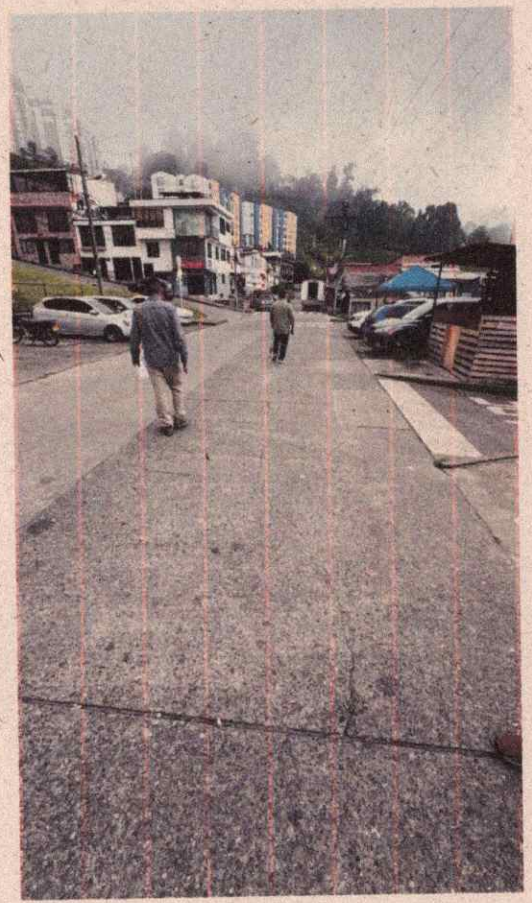


DESPUÉS



Punto 27 (Barrio Villa Jardin)
Calle 11C No. 45-50 - Bloque 3

Sello de Juntas

ANTES

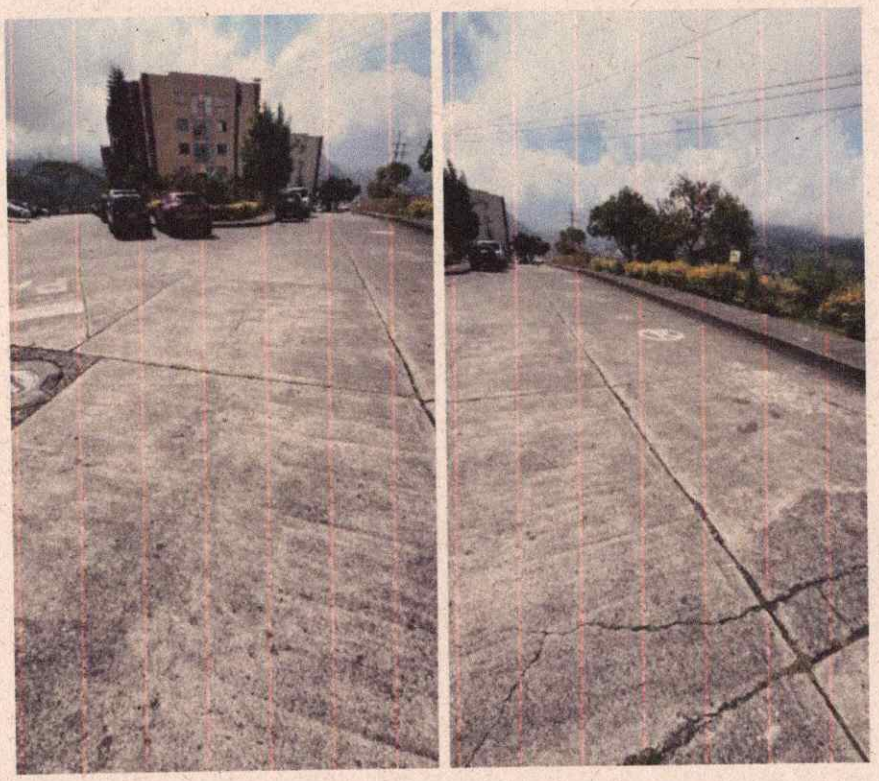


DESPUÉS




Punto 28 (Barrio Panorama)
Carrera 43 entre calles 10 A y Vía Panamericana

Reparación de escaleras, construcción de barandas y ampliación de huellas que comunican Panorama con la Panamericana

ANTES

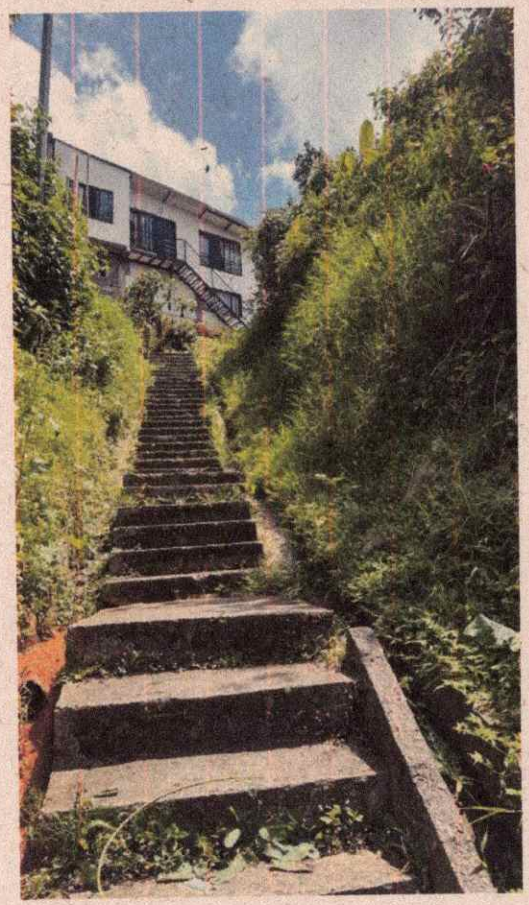


DESPUÉS

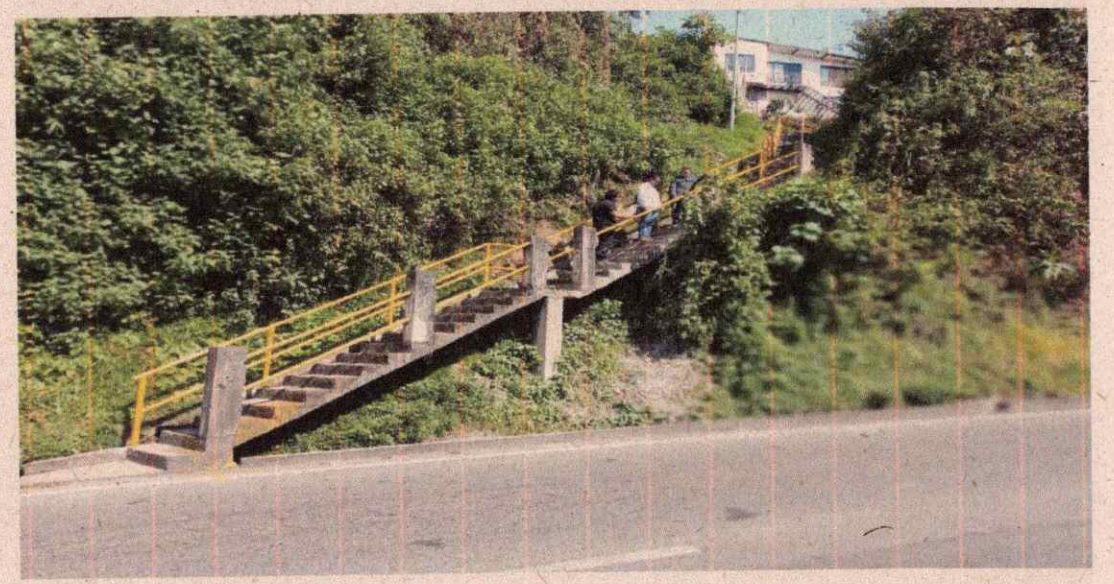


Punto 29 (Barrio Panorama)
Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal

Instalación de sub-base

ANTES

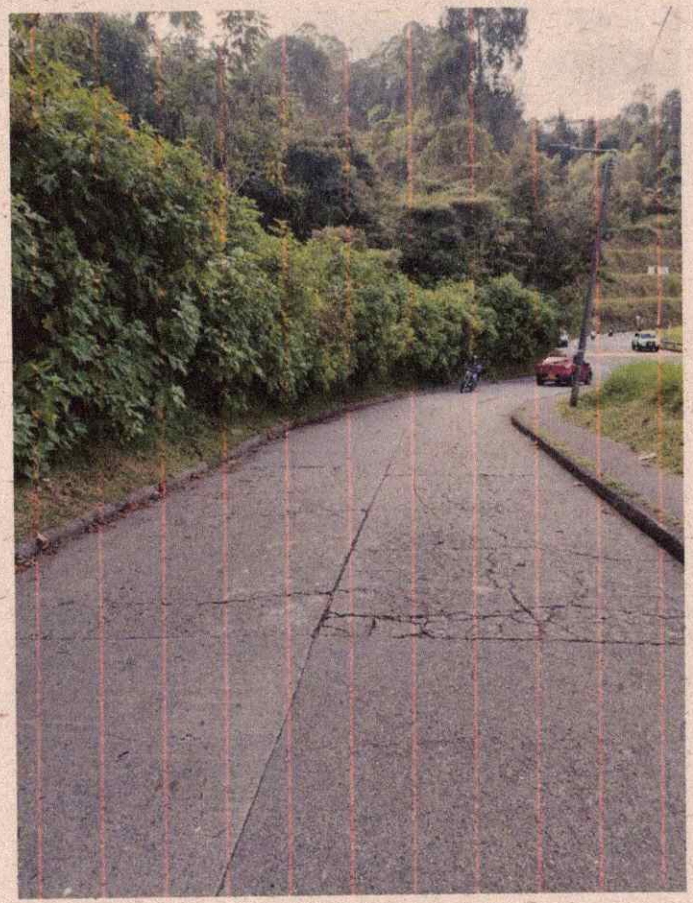


DESPUÉS

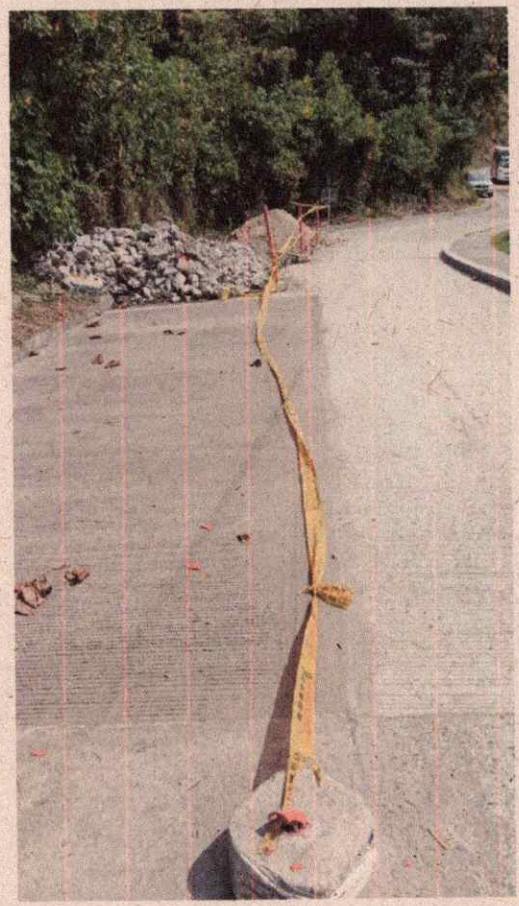


Punto 30 (Barrio Panorama)
Carrera 42B No. 10A-04

Instalación de Pavimento MR-42

ANTES

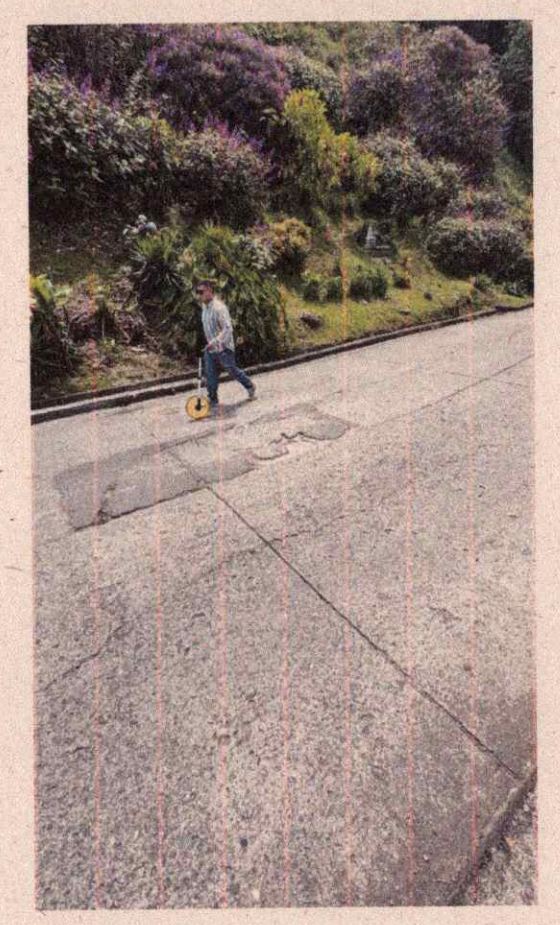

DESPUÉS

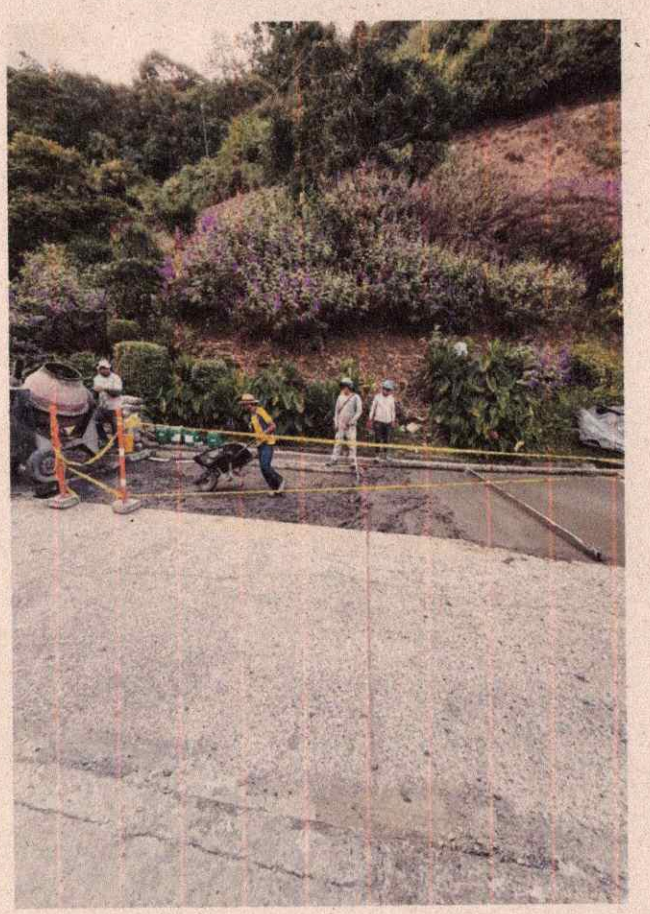


Punto 31 (Barrio Panorama)
Calle 10A entre Carrera 44 y 44A

Reparación de andén

ANTES



DESPUÉS

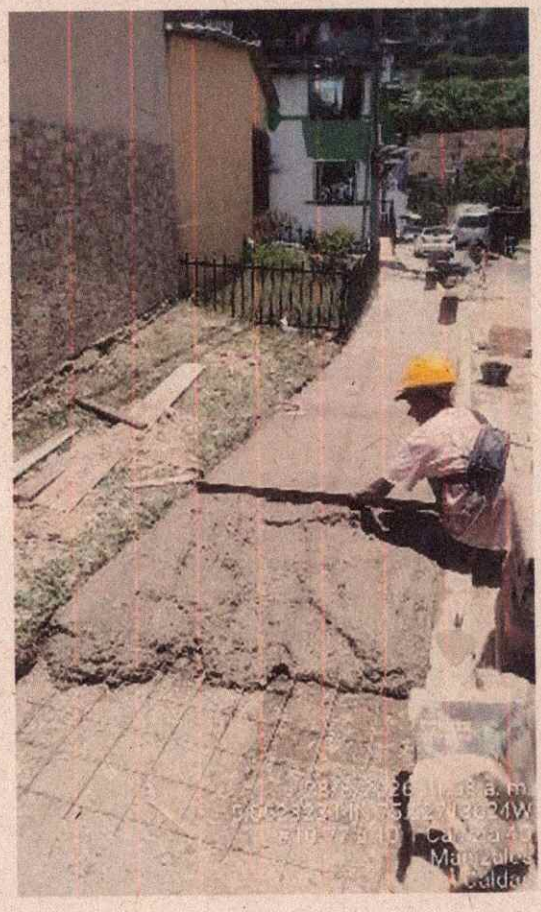

Punto 32 (Barrio Panorama)
Carrera 45 Calle 10

Reparación de Pavimento MR-42 vía principal

ANTES



DESPUÉS



Punto 33 (Barrio Panorama)
Carrera 43C Calle 10A

Reparación de andén y sardinel

ANTES




DESPUÉS



Punto 35 (Barrio Nuevo Horizonte)
Calle 10 carrera 39 (Primera entrada por la vía principal)

Construcción de escaleras y barandas en la primera entrada al barrio

ANTES

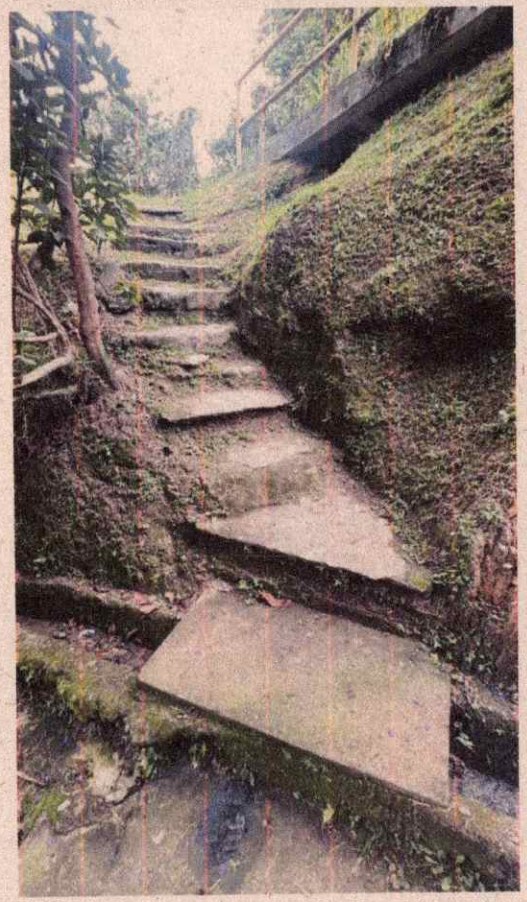


DESPUÉS



Punto 41 (Barrio Solidaridad)
Calle 23 Carrera 29B

Construcción del anden de acceso al barrio en una longitud de 50 m (Construcción de andén costado izquierdo en el acceso al barrio)

ANTES

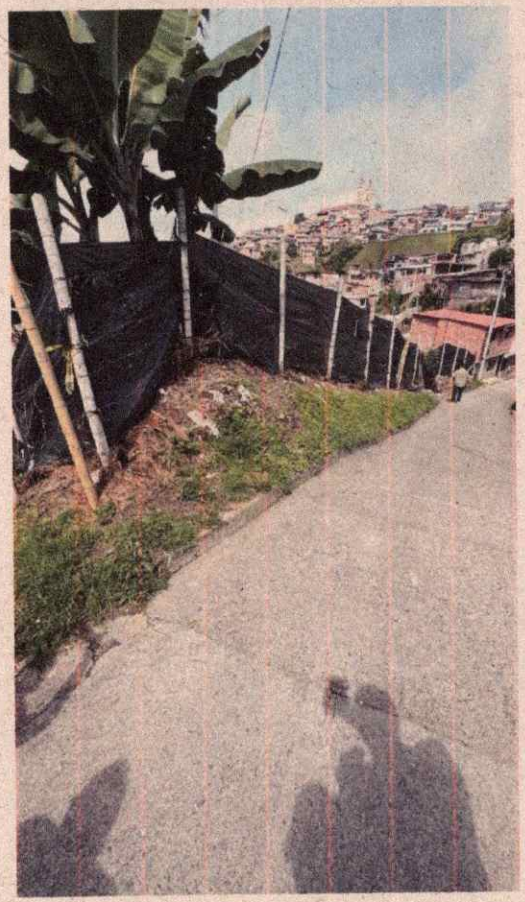


DESPUÉS



Punto 42 (Barrio Solidaridad)
Carrera 30 Sector No. 30-29

Construcción de barandas en andén vía principal

ANTES

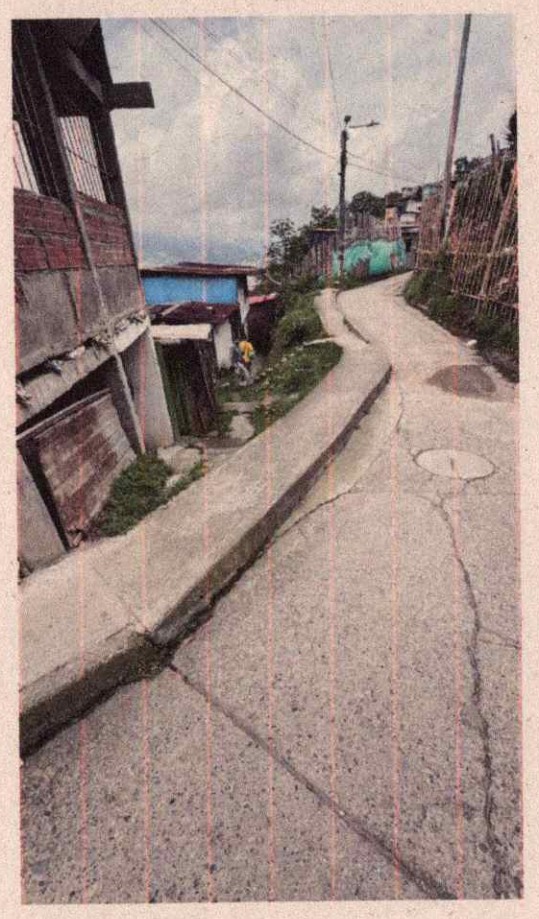


DESPUÉS



Punto 43 (Barrio Solidaridad)
Carrera 30 Sector No. 30-29

se proyecta la constuiccion de 50 ml de baranda en las escaleras (Construcción de barandas en escaleras en el sector de la vivienda No. 30-29 bajando)

ANTES

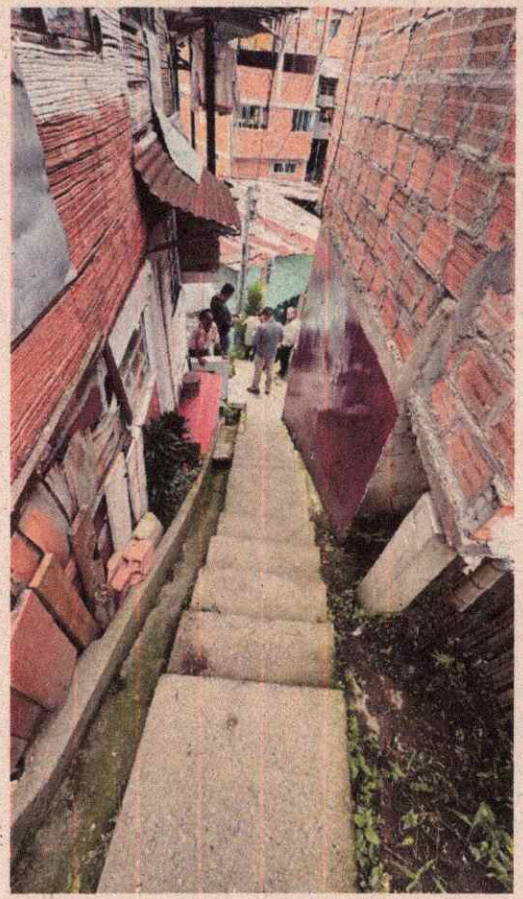


DESPUÉS



Punto 44 (Barrio Solidaridad)
Carrera 30 No. 21-71

Reparación de PAVIMENTO para manejo de aguas que se empozan

ANTES

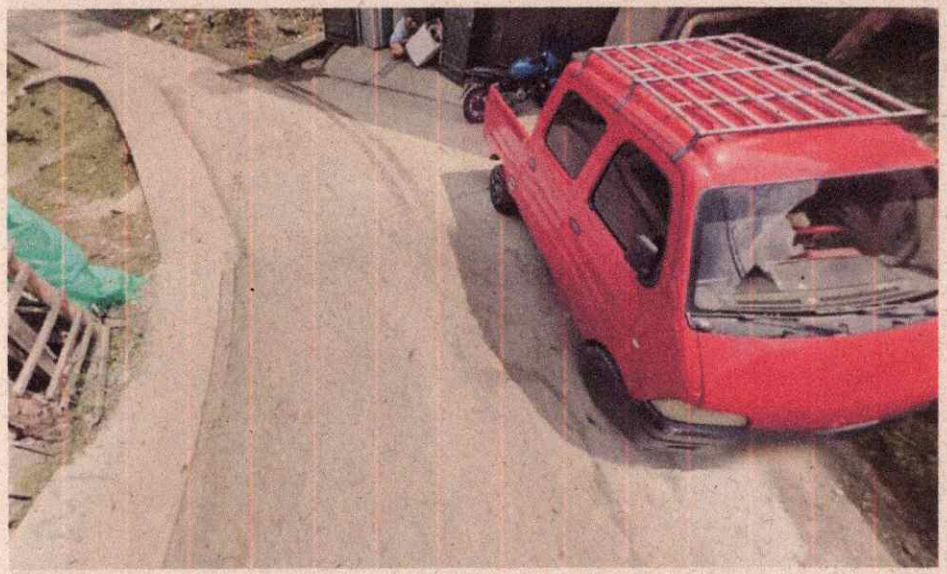

DESPUÉS





Punto 45 (Barrio Solidaridad)
Carrera 32 No. 20B-34

Construcción de barandas en escaleras por uno de los costados

ANTES



DESPUÉS




Punto 46 (Barrio Solidaridad)
Calle 20B Frente al No. 31-03

Construcción de escaleras en acceso al pasaje para dar continuidad a la circulación peatonal

ANTES



DESPUÉS

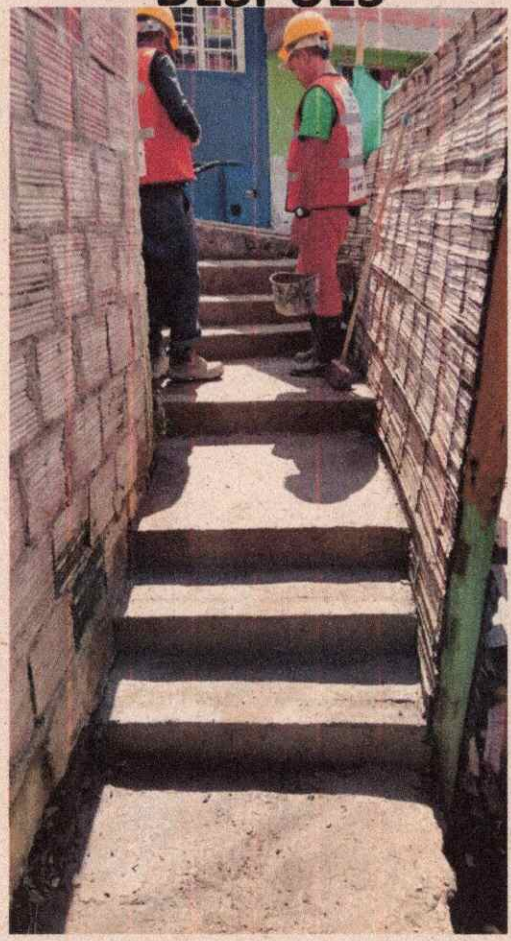

Punto 47 (Barrio Solidaridad)
Calle 21 Carrera 31

Adecuar peatonal sobre canaleta y construcción de baranda para dar continuidad al pas peatonal

ANTES



DESPUÉS





La Interventoría debe presentar un documento suscrito por su profesional SST, donde diga que "revisó, aprueba y avala la Seguridad Social del contratista de obra, presentada para el periodo xx a yy"

4

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038553-6	HCC INGENIERIA SAS		calle 16 No 112 38	3112307134	recursoshumanoshccingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO MANIZALES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95948104	13/10/2026	38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$50,791,358	$15,145,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	511.300	0		0		0	0	0	0	511.300	13
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.600	0		0		0	0	0	0	250.600	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	313.900	0		0		0	0	0	0	313.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	137.900	0		0		0	0	0	0	137.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	263.800	0		0		0	0	0	0	263.800	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	533.400	0		0		0	0	0	0	533.400	10

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2,977,400	0	0	0	0	0	0		2,977,400	12
230301	Porvenir	800224808-8	2,960,800	0	0	0	0	0	0		2,960,800	13
231001	Colfondos	800227940-6	1,278,100	0	0	0	0	0	0		1,278,100	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	579,200	0	0	0	0	0	0		579,200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.354.100				3.354.100	0	0	3.354.100			33.541	3.354.100	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.985.000	0	0	1.985.000	38

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2,010,900	2,010,900
Pensión	4	7,795,500	7,795,500
Riesgos Laborales	1	3,354,100	3,354,100
CCF	1	1,985,000	1,985,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	15,145,500	15,145,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038553-6	HCC INGENIERIA SAS		calle 16 No 112 38	3112307134	recursoshumanoshccingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO MANIZALES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95948104	13/10/2026	38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$50,791,358	$15,145,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero	Colom. exterior	Sucursal	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Ap M
1	CC 1002853065	CANO HOLGUIN FREDDY ALEJANDRO	1	0				X	X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF11	58.364	1	2.400	0	0	0	0	
2	CC 1002817903	CASTAÑO MARULANDA GUSTAVO ADOLFO	1	0																				230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
3	CC 1007736635	MARIN MOGOLLON DANIELA	1	0					X															230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS041	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	5	48.800	CCF11	700.362	12	28.100	0	0	0	0	
4	CC 1010155458	URARIYU JOSE RAMON	1	0					X															230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS041	875.453	15	35.100	14-23	875.453	15	5	61.000	CCF11	875.453	15	35.100	0	0	0	0	
5	CC 1020458965	MARTINEZ RENDON DAVID ALEXANDER	1	0																				230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS037	1.575.815	27	63.100	14-23	1.575.815	27	5	109.700	CCF11	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	
6	CC 1020456965	MARTINEZ RENDON DAVID ALEXANDER	1	0													X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	3	0	14-23	175.091	3	5	0	CCF11	175.091	3	0	0	0	0	0	
7	CC 1053788575	QUINTERO RODRIGUEZ LINA MARIA	1	0																				230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	126.300	CCF11	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	
8	CC 1053802957	HENAO CARDONA DAVID ESTEBAN	1	0											X									230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
9	CC 1053806757	OCAMPO GALLEGO DIANA PAOLA	1	0											X									230301	2.108.381	28	337.400	0	0	0	0	EPS041	2.108.381	28	84.400	14-23	2.108.381	28	5	146.800	CCF11	2.108.381	28	84.400	0	0	0	0	
10	CC 1053806757	OCAMPO GALLEGO DIANA PAOLA	1	0													X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS041	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	0	CCF11	116.727	2	0	0	0	0	0	
11	CC 1053816726	CARDONA RAMIREZ LUIS GONZALO	1	0					X															230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-23	408.545	7	5	28.500	CCF11	408.545	7	16.400	0	0	0	0	
12	CC 1053826775	QUINTERO VALENCIA XIMENA	1	0												X								230201	2.850.000	30	456.000	0	0	0	0	EPS010	2.850.000	30	114.000	14-23	2.850.000	30	5	198.400	CCF11	2.850.000	30	114.000	0	0	0	0	
13	CC 1053837745	OSORIO NARANJO JUAN DAVID	1	0																				230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS041	350.181	6	14.100	14-23	350.181	6	5	24.400	CCF11	350.181	6	14.100	0	0	0	0	
14	CC 1053837745	OSORIO NARANJO JUAN DAVID	1	0													X							230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS041	1.400.724	24	56.100	14-23	1.400.724	24	5	0	CCF11	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	
15	CC 1053843676	GOMEZ VILLADA CRISTIAN DAVID	1	0				X	X															231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF11	58.364	1	2.400	0	0	0	0	
16	CC 1053851562	RAMIREZ PEREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0					X						X									231001	1.576.815	22	252.300	0	0	0	0	EPS002	1.576.815	22	63.100	14-23	1.576.815	22	5	109.800	CCF11	1.576.815	22	63.100	0	0	0	0	
17	CC 1053851562	RAMIREZ PEREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0													X							231001	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-23	233.454	4	5	0	CCF11	233.454	4	0	0	0	0	0	
18	CC 1053851562	RAMIREZ PEREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0													X							231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-23	175.091	3	5	0	CCF11	175.091	3	0	0	0	0	0	
19	CC 1053856328	LOPEZ ROTAVISTA JORGE ANDRES	1	0				X							X									230201	1.114.743	15	178.400	0	0	0	0	EPS002	1.114.743	15	44.800	14-23	1.114.743	15	5	77.600	CCF11	1.114.743	15	44.800	0	0	0	0	
20	CC 1053857025	PATIÑO OROZCO JUAN CAMILO	1	0																				230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
21	CC 1053872491	MARTINEZ GAVIRIA ANDRES FELIPE	1	0				X	X															231001	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-23	233.454	4	5	16.300	CCF11	233.454	4	9.400	0	0	0	0	
22	CC 1053872491	MARTINEZ GAVIRIA ANDRES FELIPE	1	0													X							231001	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	0	CCF11	116.727	2	0	0	0	0	0	
23	CC 1054888309	CARDONA PATIÑO JERONIMO	1	0				X							X									231001	1.157.891	15	185.300	0	0	0	0	EPS010	1.157.891	15	46.400	14-23	1.157.891	15	5	80.600	CCF11	1.157.891	15	46.400	0	0	0	0	
24	CC 1090650752	GIRALDO DELGADO ALFONSO	1	0																				230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
25	CC 1062276272	SANCHEZ GARCIA JHON ALEXANDER	1	0				X																25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS002	525.272	9	21.100	14-23	525.272	9	5	38.600	CCF11	525.272	9	21.100	0	0	0	0	
26	CC 1062278157	TRUJILLO RAMIRES JEFERSON SMITH	1	0				X	X															25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS005	525.272	9	21.100	14-23	525.272	9	5	38.600	CCF11	525.272	9	21.100	0	0	0	0	
27	CC 1088328833	ARISTIZABAL GOMEZ JUAN CAMILO	1	0																				230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038553-6	HCC INGENIERIA SAS		calle 16 No 112 38	3112307134	recursoshumanoshccingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO MANIZALES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95948104	13/10/2026	38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$50,791,358	$15,145,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla/mis	Bolsillo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Ap M
28	CC 1105761436	BASABE PEREZ LUIS JAIDER	1	0			S																	230301	1.892.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.892.542	29	67.800	14-23	1.892.542	29	5	117.900	CCF11	1.892.542	29	67.800	0	0	0	0	
29	CC 1105761436	BASABE PEREZ LUIS JAIDER	1	0			S								X									230301	56.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	56.364	1	0	14-23	56.364	1	5	0	CCF11	56.364	1	0	0	0	0	0	
30	CC 1109829403	URIBE VINASCO JOHN JAIRO	1	0			S		X															25-14	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS041	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	5	48.800	CCF11	700.362	12	28.100	0	0	0	0	
31	CC 1110533483	VALENCIA BAUTISTA ARDIZON ALFONSO	1	0			S																	231001	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-23	3.500.000	30	5	243.800	CCF11	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	
32	CC 1115742589	CRUZ MENDEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
33	CC 1192885829	DELGADO TRUJILLO JOSE ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230201	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS037	525.272	9	21.100	14-23	525.272	9	5	35.600	CCF11	525.272	9	21.100	0	0	0	0	
34	CC 1234190988	MENA BECERRA ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.249.090	29	359.900	0	0	0	0	EPS002	2.249.090	29	90.000	14-23	2.249.090	29	5	156.600	CCF11	2.249.090	29	90.000	0	0	0	0	
35	CC 1234190988	MENA BECERRA ALEXANDER	1	0			S								X									230301	56.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	56.364	1	0	14-23	56.364	1	5	0	CCF11	56.364	1	0	0	0	0	0	
36	CC 15990058	SANTOS MORENO JOHNN FREDY	1	0			S	X	X															231001	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-23	350.181	6	5	24.400	CCF11	350.181	6	14.100	0	0	0	0	
37	CC 16161757	GUTIERREZ RIVERA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.892.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS041	1.892.542	29	67.800	14-23	1.892.542	29	5	117.900	CCF11	1.892.542	29	67.800	0	0	0	0	
38	CC 16161757	GUTIERREZ RIVERA LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230201	56.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS041	56.364	1	0	14-23	56.364	1	5	0	CCF11	56.364	1	0	0	0	0	0	
39	CC 16209900	RAMOS MARTINEZ JAIME	1	3			S		X																0	0	0	0	0	0	0	EPS010	2.083.334	25	83.400	14-23	2.083.334	25	5	145.100	CCF11	2.083.334	25	83.400	0	0	0	0	
40	CC 30316357	PEREZ VALENCIA MARIA NANCY	1	0			S							X										25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
41	CC 5916957	ARIAS PATIÑO NORVEY	1	0			S		X															231001	583.935	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.935	10	23.400	14-23	583.935	10	5	40.700	CCF11	583.935	10	23.400	0	0	0	0	
42	CC 75077471	GONZALEZ MARIN JHON ARLEY	1	0			S	X																230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	8.200	CCF11	116.727	2	4.700	0	0	0	0	
43	CC 75089818	MEDINA CARDONA JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS002	1.517.451	26	60.700	14-23	1.517.451	26	5	105.700	CCF11	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	
44	CC 75089818	MEDINA CARDONA JOSE ALEXANDER	1	0			S								X									230201	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	0	14-23	233.454	4	5	0	CCF11	233.454	4	0	0	0	0	0	
45	CC 9894695	LADINO UTIMA ORLANDO OLIVERIO	1	0			S		X															230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-23	875.453	15	5	61.000	CCF11	875.453	15	35.100	0	0	0	0	
46	PT 4656233	YNFANTE ZAVALA YOVANNI RAMON	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
47	PT 8173239	DABOIN CASTILLO EVELIN DEL CARMEN	1	0			S	X	X															25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS041	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	8.200	CCF11	116.727	2	4.700	0	0	0	0	
48	SC 8306398	CORDOVA GUARIQUE JHONDER JOSE	1	0			S		X						X									230301	2.235.530	30	357.700	0	0	0	0	EPS005	2.235.530	30	89.500	14-23	2.235.530	30	5	155.600	CCF11	2.235.530	30	89.500	0	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038553-6	HCC INGENIERIA SAS	calle 16 No 112 38	3112307134	recursoshumanoshccingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO MANIZALES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95149005	14/09/2026	42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$48,661,083	$14.730.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	628.100	0		0		0	3	1.500	0	629.600	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	214.600	0		0		0	3	500	0	215.100	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	251.800	0		0		0	3	600	0	252.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.100	0		0		0	3	400	0	145.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	326.300	0		0		0	3	800	0	327.100	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	390.700	0		0		0	3	900	0	391.600	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2,805,900	0	0	0	0	3	6,300	0	2,812,200	14
230301	Porvenir	800224808-8	3,148,100	0	0	0	0	3	7,100	0	3,155,200	21
231001	Colfondos	800227940-6	792,100	0	0	0	0	3	1,800	0	793,900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	673,600	0	0	0	0	3	1,600	0	675,200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.378.600				3.378.600	3	7.600	3.386.200			33.786	3.386.200	42

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.942.500	3	4.400	1.946.900	42

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.956.600	1.961.300
Pensión	4	7.419.700	7.436.500
Riesgos Laborales	1	3.378.600	3.386.200
CCF	1	1.942.500	1.946.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	14.697.400	14.730.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038553-6	HCC INGENIERIA SAS		calle 16 No 112 38	3112307134	recursoshumanoshccingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO MANIZALES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95149005	14/09/2026	42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$48,861,083	$14,730,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Exonerado	Colom. exterior	Suspensión	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Apo MI
1	CC 1002817503	CASTAÑO MARULANDA GUSTAVO ADOLFO	1	0			S	X																230201	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS037	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	5	85.400	CCF11	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	
2	CC 1007736835	MARIN MOGOLLON DANIELA	1	0			S	X							X									230301	664.302	7	106.300	0	0	0	0	EPS041	664.302	7	26.600	14-23	664.302	7	5	46.300	CCF11	664.302	7	26.600	0	0	0	0	
3	CC 1010156455	URARIYU VINICIO ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF11	58.364	1	2.400	0	0	0	0	
4	CC 1010156456	URARIYU JOSE RAMON	1	0			S	X																230301	1.634.176	28	261.500	0	0	0	0	EPS041	1.634.176	28	65.400	14-23	1.634.176	28	5	113.900	CCF11	1.634.176	28	65.400	0	0	0	0	
5	CC 1013555234	GOMEZ MARULANDA VALERIA	1	0			S	X	X						X									230201	559.665	7	89.600	0	0	0	0	EPS002	559.665	7	22.400	14-23	559.665	7	5	39.000	CCF11	559.665	7	22.400	0	0	0	0	
6	CC 1013555234	GOMEZ MARULANDA VALERIA	1	0			S									X								230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	0	CCF11	116.727	2	0	0	0	0	0	
7	CC 1020458965	MARTINEZ RENDON DAVID ALEXANDER	1	0			S	X																230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-23	350.181	6	5	24.400	CCF11	350.181	6	14.100	0	0	0	0	
8	CC 1023904054	BELTRAN RINCON MICHAEL ALEXIS	1	0			S	X	X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF11	58.364	1	2.400	0	0	0	0	
9	CC 1053798575	QUINTERO RODRIGUEZ LINA MARIA	1	0			S																	230201	1.800.000	30	289.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	126.300	CCF11	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	
10	CC 1053788302	CAMPIÑO ARIAS JUAN CAMILO	1	0			S	X	X															230201	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS002	583.635	10	23.400	14-23	583.635	10	5	40.700	CCF11	583.635	10	23.400	0	0	0	0	
11	CC 1053788302	CAMPIÑO ARIAS JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	0	CCF11	116.727	2	0	0	0	0	0	
12	CC 1053890873	LOPEZ HENAO SANTIAGO ALBERTO	1	0			S		X															230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS010	583.635	10	23.400	14-23	583.635	10	5	40.700	CCF11	583.635	10	23.400	0	0	0	0	
13	CC 1053802957	HENAO CARDONA DAVID ESTEBAN	1	0			S								X									230301	2.068.778	30	331.100	0	0	0	0	EPS037	2.068.778	30	82.800	14-23	2.068.778	30	5	144.000	CCF11	2.068.778	30	82.800	0	0	0	0	
14	CC 1053805757	OCAMPO GALLEGO DIANA PAOLA	1	0			S	X							X									230301	1.274.617	18	204.000	0	0	0	0	EPS041	1.274.617	18	51.000	14-23	1.274.617	18	5	88.800	CCF11	1.274.617	18	51.000	0	0	0	0	
15	CC 1053816726	CARDONA RAMIREZ LUIS GONZALO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
16	CC 1053827697	OROZCO CORTES YHONY ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	5	48.800	CCF11	700.362	12	28.100	0	0	0	0	
17	CC 1053828508	GALLEGO ESPINOSA JUAN MANUEL	1	0			S		X															230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS005	350.181	6	14.100	14-23	350.181	6	5	24.400	CCF11	350.181	6	14.100	0	0	0	0	
18	CC 1053828778	QUINTERO VALENCIA XIMENA	1	0			S																	230201	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS010	2.800.000	30	112.000	14-23	2.800.000	30	5	194.900	CCF11	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	
19	CC 1053837746	OSORIO NARANJO JUAN DAVID	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS041	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	5	85.400	CCF11	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	
20	CC 1053843102	AGUDELO VILLEGAS LUIS DAVID	1	0			S	X	X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF11	58.364	1	2.400	0	0	0	0	
21	CC 1053849567	JARAMILLO MEDINA CRISTIAN DAVID	1	0			S	X	X															230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	46.700	14-23	1.167.270	20	5	81.300	CCF11	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	
22	CC 1053851562	RAMIREZ PEREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X																231001	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-23	291.818	5	5	20.400	CCF11	291.818	5	11.700	0	0	0	0	
23	CC 1053857026	PATIÑO OROZCO JUAN CAMILO	1	0			S	X																230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS037	291.818	5	11.700	14-23	291.818	5	5	20.400	CCF11	291.818	5	11.700	0	0	0	0	
24	CC 1054887534	CASTAÑEDA CASTAÑO JUAN MANUEL	1	0			S		X															230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-23	291.818	5	5	20.400	CCF11	291.818	5	11.700	0	0	0	0	
25	CC 1060850752	GIRALDO DELGADO ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
26	CC 1088326833	ARISTIZABAL GOMEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
27	CC 1105781438	BASABE PEREZ LUIS JAIDER	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS017	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	5	85.400	CCF11	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038553-6	HCC INGENIERIA SAS		calle 16 No 112 38	3112307134	recursoshumanoshccingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADMINISTRATIVO MANIZALES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95149005	14/09/2026	42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$48,861,083	$14,730,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Ap. M
28	CC 1108829403	URIBE VINASCO JOHN JAIRO	1	0			S	X																25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS041	1.517.451	26	80.700	14-23	1.517.451	26	5	105.700	CCF11	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	
29	CC 1108829403	URIBE VINASCO JOHN JAIRO	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS041	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	5	0	CCF11	116.727	2	0	0	0	0	0	
30	CC 1110533463	VALENCIA BAUTISTA ARDIZON ALFONSO	1	0			S								X									231001	4.249.853	30	680.500	0	0	0	0	EPS005	4.249.853	30	170.000	14-23	4.249.853	30	5	296.500	CCF11	4.249.853	30	170.009	0	0	0	0	
31	CC 1115742598	CRUZ MENDEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS010	408.545	7	16.400	14-23	408.545	7	5	28.500	CCF11	408.545	7	16.400	0	0	0	0	
32	CC 1147943785	GONZALEZ EDUARDO	1	0			S	X	X															230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS037	700.362	12	28.100	14-23	700.362	12	5	48.800	CCF11	700.362	12	28.100	0	0	0	0	
33	CC 1221965012	AREVALO RESLEN NICOLAS ALFONSO	1	0			S	X	X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF11	58.364	1	2.400	0	0	0	0	
34	CC 1234190986	MENA BECERRA ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.415.619	30	386.500	0	0	0	0	EPS002	2.415.619	30	96.700	14-23	2.415.619	30	5	168.200	CCF11	2.415.619	30	96.700	0	0	0	0	
35	CC 19161757	GUTIERREZ RIVERA LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230201	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS041	1.575.815	27	63.100	14-23	1.575.815	27	5	109.700	CCF11	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	
36	CC 19209980	RAMOS MARTINEZ JAIME	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	30	100.000	14-23	2.500.000	30	5	174.000	CCF11	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	
37	SC 181731166	CORDOVA GUARIQUE JHONDER JOSE	1	0			S								X									230301	2.141.732	30	342.700	0	0	0	0	EPS002	2.141.732	30	85.700	14-23	2.141.732	30	5	149.100	CCF11	2.141.732	30	85.700	0	0	0	0	
38	CC 30316357	PEREZ VALENCIA MARIA NANCY	1	0			S								X									25-14	2.399.782	30	384.000	0	0	0	0	EPS017	2.399.782	30	96.000	14-23	2.399.782	30	5	167.100	CCF11	2.399.782	30	96.000	0	0	0	0	
39	CC 30399437	MUÑOZ ALARCON LUZ ANGELICA	1	0			S	X	X															230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-23	350.181	6	5	24.400	CCF11	350.181	6	14.100	0	0	0	0	
40	PT 4658233	YNFANTE ZAVALA YOVANNI RAMON	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	
41	CC 5916957	ARIAS PATIÑO NORVEY	1	0			S	X																231001	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS037	408.545	7	16.400	14-23	408.545	7	5	28.500	CCF11	408.545	7	16.400	0	0	0	0	
42	CC 75059618	MEDINA CARDONA JOSE ALEXANDER	1	0			S	X																230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-23	1.634.178	28	5	113.800	CCF11	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	
43	CC 79806135	URIBE SANCHEZ DIEGO MAURICIO	1	0			S		X															230301	73.334	1	11.800	0	0	0	0	EPS037	73.334	1	3.000	14-23	73.334	1	5	5.200	CCF11	73.334	1	3.000	0	0	0	0	
44	CC 98707989	LOPEZ ARBOLEDA JOSE DIRLEY	1	0			S	X	X															25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-23	175.091	3	5	12.200	CCF11	175.091	3	7.100	0	0	0	0	
45	CC 9894695	LADINO UTIMA ORLANDO OLIVERIO	1	0			S	X																230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-23	1.634.178	28	5	113.800	CCF11	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5

CERT PAZ SALVO PARAFISCALES

HCC INGENIERIA SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ identificado con **C.C 80.858.047** de Bogotá D.C en mi condición de representante legal de **HCC INGENIERÍA S.A.S** identificada con NIT **860.038.553-6**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. 80.858.047 DE BOGOTÁ D.C
REP. LEGAL
HCC INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 860.038.553-6

Dirección: Carrera 16 No. 112-38. Bogotá **Teléfono:** (+57) 311 2307134

Correo electrónico: gerenciahccingenieria@gmail.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**170259925**	**640723819**	**09/09/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **860038553**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.118.18.23**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,225,634.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,225,634.00	COP$ 1,225,634.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	170259925	640723819	09/09/2026

Número de Identificación
860038553

Primer Nombre ó Razón Social
HCC INGENIERIA S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 16 # 112-38 APT 602

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3138019851

Correo electrónico
recursoshumanoshccingenieria@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Caldas

Regional Centros SIIF
36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra
0

Número Contrato de Obra
2606190875

Nombre Obra
mantenimiento y rehabilitacion

Fecha Inicio Obra
09/07/2026

Fecha Terminación Obra
08/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
MANIZALES

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
1383000000.00

Costo Total Mano de Obra
30000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
28

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1225634.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1225634.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**170259925**	**640723819**	**09/09/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **860038553**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.118.18.23**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,225,634.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,225,634.00	COP$ 1,225,634.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	170259925	640723819	09/09/2026

Número de Identificación
860038553

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Departamento
BOGOTA

Dirección de Domicilio
CRA 16 # 112-38 APT 602

Localización
Nacional

Correo electrónico
recursoshumanoshccingenieria@gmail.com

Regional
Caldas

Número Licencia de Obra
0

Nombre Obra
mantenimiento y rehabilitacion

Fecha Terminación Obra
08/10/2026

Tipo FIC
Mensual

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total Mano de Obra
30000000.00

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA
0.00

Primer Nombre ó Razón Social
HCC INGENIERIA S.A.S.

Tipo de documento
01

Naturaleza Juridica
01

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Teléfono de Contacto
+57,3138019851

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF
36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra
2606190875

Fecha Inicio Obra
09/07/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
MANIZALES

Año Periodo a Pagar
2026

Costo Total de Obra a Todo Costo
1383000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
28

Aporte FIC
1225634.00

Valor del Pago
1225634.00

6

AUTORIZACION DESCUENTO

HCC INGENIERIA S.A.S

Bogotá, 30 de septiembre de 2026

Señor:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANIZALES

REF: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2606190875 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDÍN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE".**

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DESCUENTOS ACTA PARCIAL NO. 2**

Cordial Saludo,

Cordial Saludo, En mi calidad de representante legal de la empresa **HCC INGENIERIA SAS** identificada con NIT: **860.038.553-6**, me permito autorizar al Municipio de Manizales, para que del pago correspondiente al Acta de Pago Parcial N°2, del Contrato de Obra N° **2606190875**, se realicen los descuentos de retención en la fuente.

Atentamente,

CRISTHIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
Representante Legal
HCC INGENIERIA SAS

Elaboro: HJGC
Reviso: HJGC
Aprobó: CJRM

7

CUMPLIM IND NACIONAL

HCC INGENIERIA S.A.S

Bogotá, 30 de Septiembre de 2026

Señor:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANIZALES

REF: **CONTRATO No CTO 2606190875 2026. CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ESTAMBUL, GRANJAS DE ESTAMBUL, NOGALES, NUEVO HORIZONTE, PANORAMA, SAN ANTONIO, SOLIDARIDAD, VILLA JARDIN, VILLA KEMPIS, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.**

ASUNTO: **INDUSTRIA NACIONAL ACTA PARCIAL N°2**

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal de la empresa **HCC INGENIERIA SAS** identificada con **NIT: 860.038.553-6** Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en la ejecución del contrato de la referencia he destinado un 100% de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, o de personal requerido para el cumplimiento del contrato de la referencia.

Para el cumplimiento de esta obligación, a continuación, se anexan Tabla del Personal vinculado al contrato.

1	Valencia Bautista Ardizon Alfonso	1.110.533.483	Residente Civil
2	Ramirez Martinez Cristhian Javier	80.858.057	Director de Obra
3	Acuña Arias Cesar David	1016103945	Coord. De proye
4	Quintero Valencia Ximena	1.053.828.775	Residente SST
5	Quintero Rodriguez Lina Maria	1.053.768.575	Residente Social
6	Ceballos Ruiz Daniela	1.053.869.947	Ambiental
7	Aristizabal Gomez Juan Camilo	1.088.326.833	Oficial
8	Mena Becerra Alexander	1.234.190.986	Oficial
9	Perez Valencia Maria Nancy	30.316.357	Aux Tránsito
10	Ocampo Gallego Diana Paola	1.053.806.757	Aux Tránsito
11	Henao Cardona David Esteban	1.053.802.957	Ayudante
12	Cordova Guarique Jhonder Jose	181.731.166	Ayudante
13	Ynfante Zavala Yovanni Ramon	4.658.233	Ayudante

HCC INGENIERIA S.A.S

14	Gutierrez Rivera Luis Fernando	16.161.757	Ayudante
15	Osorio Naranjo Juan David	1.053.837.745	Ayudante
16	Castaño Marulanda Gustavo A	1.002.817.503	Ayudante
17	Basabe Perez Luis Jaider	1.105.781.438	Ayudante
18	Cruz Mendez Miguel Angel	1.115.742.599	Ayudante
19	Martinez Rendon David A	1.020.458.965	Ayudante
20	Ramirez Perez Johan Sebastian	1.053.851.562	Ayudante
21	Patiño Orozco Juan Camilo	1.053.857.025	Ayudante
22	Medina Jose Alexander	75.083.618	Ayudante
23	Giraldo Delgado Alfonso	1.060.650.752	Ayudante
24	Sanchez Garcia Jhon Alexander	1.062.276.272	Ayudante
25	Delgado Trujillo Jose Alejandro	1.192.895.929	Ayudante
26	Trujillo Ramirez Jeferson Smith	1.082.128.157	Ayudante
27	Cardona Patiño Jeronimo	1.054.866.309	Aux Tránsito
28	Lopez Rotavista Jorge Andres	1.053.856.326	Aux Tránsito

De esta manera estoy dando cumplimiento a lo presentando en el FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL. FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, presentado dentro de la propuesta de la Licitación

Atentamente,

HCC INGENIERIA SAS

CHRISTIAN JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
Representante Legal

Elaboro: HJGC
Reviso: HJGC
Aprobó: CJRM

Dirección: Bogotá, Carrera 16 # 112 – 38 **Teléfonos:** 3017694336
