NIT. 900441532-3

INFORME DEL CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA No 012 OBRA A TODO COSTO

Ciudad y fecha: PITALITO, OCTUBRE 27 DE 2026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL DOMINGO SAVIO
PITALITO HUILA

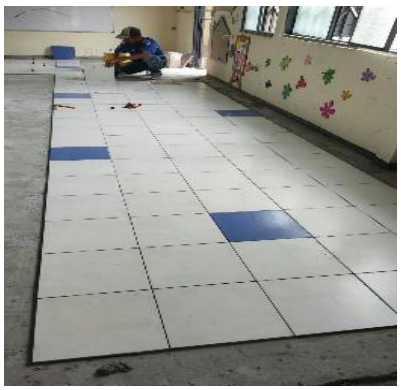
ASUNTO: INFORME

Mediante el presente informe doy a conocer que se realizó la entrega a satisfacción de los siguientes item contratados con la Institución Educativa Municipal Domingo Savio

Ítem	Código UNSPSC	Can	Unidad	Descripción detallada de los elementos
1	72121406	10	Unidad	Suministro e instalación a todo costo de 54 metros cuadrados de piso cerámico (baldosa para tráfico pesado mínimo PEI3) en el aula de Preescolar de la Sede Principal. Incluye: - Retiro de la alfombra existente. - Suministro del piso cerámico (diseño a convenir de acuerdo a la paleta suministrada) - Suministros de todos los materiales necesarios. - Mano de obra.
2	72121406	1	Unidad	Elaboración a todo costo de un muro en concreto y varilla de 12 mm en la parte exterior del parque infantil del aula de Preescolar para contención del material de relleno. Medidas: 10 metros de largo; 20 cm de ancho; altura mayor: 85 centímetros; altura menor: 25 centímetros. Incluye: - Retiro y reubicación del material de relleno existente.

				- Suministros de todos los materiales necesarios. - Mano de obra.
3	72152905	1	Unidad	Cambio a todo costo de la cubierta de las aulas de clases No. 11 y 12 de la Sede Principal, equivalente a 136 metros de teja arquitectónica, color azul, calibre 30 con su respectiva canalización. Incluye: - Suministro de todos los materiales - Mano de obra con personal certificado en trabajo en alturas. - Retiro del techo actual elaborado en Eternit - Suministro e instalación de las tejas y la los caballetes. - Suministro e instalación de 9,5 metros de canal en lámina galvanizada, con su respectiva canalización en tubería PVC 3".
4	24111810	2	unidad	Suministro e instalación de dos (2) tanques de almacenamiento de agua de 1,000 litros sobre los baños de los estudiantes de la Sede Principal. Incluye: - Retiro de los tanques existentes. - Suministros de todos los materiales necesarios. - Mano de obra.

ITEM 1


NIT. 900441532-3

ITEM 2






ITEM 3






ITEM 4




Carrera 1B # 4-06 Celular: 3134378341
centraldeingenieriaytecnologia@hotmail.com
Pitalito-Huila-Colombia

NIT. 900441532-3

CORDIALMENTE,

CENTRAL DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA SAS

NIT. 900441532-3



JAIME ANDRES VERU LISCANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.440.519
