Alcaldía de Neiva / Primero Neiva	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
	FOR-GCO-15	**Versión:** 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO: ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECON RIO MAGDALENA, MUNICPIO DE NEIVA.

ACTA DE RECIBO DE OBRA

CONTRATISTA:	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS	**CONTRATO No.**	1910 de 2020
INTERVENTOR:	N/A	**VR CONTRATO INICIAL:**	$ 44.460.697,60
SUPERVISOR	JOSE ALEXANDER DIAZ MENDEZ	**VR. ANTICIPO (40%)**	$ 0
FECHA DE INICIO	12/11/2020	**VR.MODIFICACION**	$ 12.091.577,60
PLAZO INICIAL	1 MES	**VR. VIGENTE:**	$ 56.552.275
PLAZO FINAL	2 MESES - 8 DIAS	**VR. EJECUTADO**	$ 56.552.275,20
FECHA TERMINACION	02/18/2021	**VR. PRESENTE ACTA**	$ 56.552.275,20

ACTA No. 1 — **Parcial** — **Final** X

Hoja 1 **de** 1

	Mes	Dia	Año
Fecha Acta	02/18/2021		

		CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES VIGENTES				EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**Vr.UNIT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**								
1.1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y REVOQUE, CON RETIRO	M2	22	$ 13.874,64	307.739,52	22	307.740	22,18	307.740
2	**ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y CIELO FALSO**								
2.1	Mantenimiento de canales, incluye reacomodación del canal, reacomodación de soportes y limpieza	ML	39	$ 19.500,00	766.350,00	39	766.350	39,30	766.350
2.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	127	$ 73.349,64	9.315.404,28	127	9.315.404	127,00	9.315.404
2.3	Sellado de goteras existentes	VG	1	$ 1.170.000,00	1.170.000,00	1	1.170.000	1,00	1.170.000
2.4	Suministro e Instalación bajante agua lluvia PVC 4" (incluye accesorios)	ML	3	$ 23.681,58	71.044,74	3	71.045	3,00	71.045
2.5	Pintura con esmalte estructura metálica	M2	166	$ 11.213,28	1.860.058,89	166	1.860.059	165,88	1.860.059

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Link SIG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

3	**CARPINTERIA METALICA**									
3.1	Suministro de puerta en lámina, incluye resane, anticorrosivo y pintura.	UN	4	$ 155.518,74	622.074,96	4	622.075	4,00	622.075
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA REJA. Con marco en 1"X1/8", verticales y horizontales en tubo cuadrado de 1". Incluye pintura en anticorrosivo y esmalte, pasador y varilla de soporte.	M2	20	$ 59.985,90	1.199.718,00	20	1.199.718	20,00	1.199.718
3.3	Suministro e instalación de malla electrosoldada con marco en ángulo de 1" x 1/8" para reja de seguridad en estructura de cubierta, incluye pintura en anticorrosivo.	M2	60	$ 24.045,06	1.442.703,60	60	1.442.704	60,00	1.442.704
4	**ESTUCO Y PINTURA**								
4.1	Pintura a tres mano con vinilo, incluye resane	M2	217	$ 13.494,00	2.928.198,00	217	2.928.198	217,00	2.928.198
4.2	PAÑETE MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	30	$ 13.607,10	408.213,00	30	408.213	30,00	408.213
5	**ENCHAPES Y MESONES**								
5.1	ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.125X0.25 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (203/8" refuerzo y E = 01/4" C 0,20 m)	ML	12	$ 26.660,40	319.924,80	12	319.925	12,00	319.925
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE PARED CERAMICA PARA MURO Y MESÓN	M2	15	$ 36.073,44	541.101,60	15	541.102	15,00	541.102
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA ÁREA BAÑOS	M2	20	$ 38.181,78	763.635,60	20	763.636	20,00	763.636
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO	M2	20	$ 41.239,38	824.787,60	20	824.788	20,00	824.788
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
6.1	REPARACIÓN SALIDA PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". Incluye accesorios necesarios para un buen funcionamiento.	UN	10	$ 24.786,84	247.868,40	10	247.868	10,00	247.868

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO 1/2". Incluye accesorios necesarios para un buen funcionamiento.	UN	4	$ 25.204,92	100.819,68	2	50.410	2,00	50.410
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO DESCARGA SENCILLA INCL. GRIFERIA Y ACOPLE SANITARIO	UN	3	$ 148.699,98	446.099,94	3	446.100	3,00	446.100
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO	UN	2	$ 113.664,72	227.329,44	2	227.329	2,00	227.329
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL BLANCO	UN	1	$ 207.511,98	207.511,98	1	207.512	1,00	207.512
6.6	REPARACIÓN PUNTO SANITARIO DE 2". incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento.	UN	4	$ 47.105,76	188.423,04	4	188.423	4,00	188.423
6.7	REPARACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4". incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento.	UN	4	$ 75.643,62	302.574,48	4	302.574	4,00	302.574
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS	UN	2	$ 143.109,72	286.219,44	2	286.219	2,00	286.219
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Medidor de 1/2" volumétrico	UN	2	$ 136.265,22	272.530,44	1	136.265	1,00	136.265
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
7.1	Tablero Trifásico 12 circuitos con totalizador, Barraje de 200A, Barrajes de Neutroy tierra, Puerta y chapa Incluye cuatro protección de1x20 A 10 KA. Empotrado.	UN	2	$ 337.225,20	674.450,40	2	674.450	2,00	674.450
7.2	Breaker Industrial ABB Formula A1B de Corriente Nominal In (A) : 40 - Poder de Corte Icu (kA) 440 Vac : 15 KA y 240 Vac : 25 KA	UN	2	$ 111.852,00	223.704,00	2	223.704	2,00	223.704
7.3	Suministro e Instalación Tubería de 1 1/4" Galvanizado	ML	12	$ 24.297,00	291.564,00	12	291.564	12,00	291.564
7.4	Suministro e Instalación de Tubería 3/4" EMT	ML	40	$ 8.580,00	343.200,00	40	343.200	40,00	343.200

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

7.5	Suministro e Instalación de Acometida en cable cobre aislado	ML	175	$ 41.340,00	7.234.500,00	235	9.714.900	235,00	9.714.900
7.6	Salida iluminación, no incluye luminaria, ni toma, ni ducto	UN	14	$ 56.550,00	791.700,00	9	508.950	9,00	508.950
7.7	Salida interruptor sencillo	UN	6	$ 92.798,94	556.793,64	0	0	0,00	0
7.8	Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, tubería conduit EMT 3/4" longitud promedio 6m	UN	6	$ 104.915,46	629.492,76	32	3.357.295	32,00	3.357.295
7.9	Salida toma doble tipo GFCI cable Cu # 12 THHN AWG, tubería conduit EMT 3/4" longitud promedio 6m	UN	4	$ 127.920,00	511.680,00	0	0	0,00	0
7.10	salida toma trifásica con tierra, 30A, cable de Cu 3#10+10T, No incluye aparatos ni ductos	UN	2	$ 79.967,16	159.934,32	0	0	0,00	0
7.11	Suminstro e Instalación de Luminaria Bala LED 1500 lm	UN	4	$ 66.300,00	265.200,00	0	0	0,00	0
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Luminaria led de 120x30cm, mínimo 3200 lm, incluye accesorios y soporte de instalación, a todo costo.	UN	10	$ 93.600,00	936.000,00	0	0	0,00	0
7.13	Suministro e Instalación de Interruptor sencillo	UN	6	$ 19.578,00	117.468,00	6	117.468	6,00	117.468
7.14	Suministro e Instalacion de Toma doble polo a tierra	UN	10	$ 24.258,00	242.580,00	10	242.580	10,00	242.580
7.15	Suministro e Instalacion de Toma doble polo a tierra aerea con clavija	UN	14	$ 89.709,36	1.255.931,04	0	0	0,00	0
7.16	Suministro e Instalacion de Toma trifásica con clavija	UN	2	$ 91.713,96	183.427,92	0	0	0,00	0
7.17	Suministro e Instalacion de Salida de iluminacion con lampara tortuga con Bombillo Led 8 Vatios con Rejilla (Incluye ducto metalico EMT 3/4" , Cableado, Luminaria Y Accesorios Varios.)	UN	6	$ 146.445,78	878.674,68	0	0	0,00	0
7.18	Inspeccion RETIE	UN	1	$ 781.108,97	781.108,97	1	781.109	1,00	781.109
8	**ASEO**								
8.1	ASEO GENERAL DE OBRA INCLUYE DESMANCHE DE PISOS	UN	1	$ 780.000,00	780.000,00	1	780.000	1,00	780.000

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ITEMS NO PREVISTOS								
4NP	Suministro e intalación de tapa (0.75x0.75x0.03) en concreto de 3000PSI E=caja de inspección. Incluye estructura en acero	UN	1	$ 175.397,00	175.397,00	1	175.397	1,00	175.397
5NP	Sondeo de tubería sanitaria existente	GLB	1	$ 500.082,00	500.082,00	1	500.082	1,00	500.082
6NP	Desmonte teja TERMOACUSTICA. Incluye retiro y disposición final.	M2	118	$ 12.700,00	1.498.600,00	118	1.498.600	118,00	1.498.600
7NP	Suministro e intalación de correa metálica tubular sección transversal 4x10cm E=1mm	ML	30	$ 27.000,00	810.000,00	30	810.000	30,00	810.000
8NP	Suministro e instalacion marco para puerta en lámina C.18.	UN	4	$ 145.000,00	580.000,00	4	580.000	4,00	580.000

COSTOS DIRECTOS	45.241.820,15		$ 45.232.955,45		45.232.955
ADMINISTRACION 15%	6.786.273,02		$ 6.784.943,32		6.784.943
IMPREVISTOS 5%	2.262.091,02		$ 2.261.647,78		2.261.648
UTILIDADES 5%	2.262.091,02		$ 2.261.647,78		2.261.648
VALOR TOTAL CONTRATADO	56.552.275,20	99,98%	$ 56.541.194,33	99,98%	56.541.194,33

MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:	0,0%	$ -
VALOR A GIRAR:	99,98%	$ 56.541.194,3

VALOR A GIRAR: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Contratista

JOSE ALEXANDER DIAZ MENDEZ
Supervisor - Municipio

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 1910 DE 2020 CELEBRADA ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

OBJETO:	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	**JAIME ANDRES AREVALO ROJAS** C.C. No. 7.710.008 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (**$56.552.275,20**)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
PLAZO ADICIONAL 1:	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL 2:	OCHO (8) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	Dos (02) meses y ocho (08) días, contados a partir de la suscripción de acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA ACTA DE REINICIO: N.A** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 1: 29 de diciembre de 2020.** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 2: 08 de febrero de 2021.**	

VALOR PRESENTE ACTA: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($56.541.194,33).**

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$44.460.697,60
2. Adición - Otro Sí No. 01	$12.091.577,60
3. Valor Final Contratado	$56.552.275,20
4. Valor Final Ejecutado	$56.541.194,33
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$11.080,87
6. Saldo a Favor del Contratista	$0

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

FECHA DE TERMINACION: 18 febrero del 2021

En Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2021, se reunieron el secretario de Competitividad **JOSÉ ALEXANDER DÍAZ MENDEZ**, en calidad de supervisor aceptación de oferta 1910 de 2020 y **JAIME ANDRES AREVALO ROJAS**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 18 del mes de febrero del 2021.

JOSÉ ALEXANDER DÍAZ MENDEZ
Supervisor

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Contratista

Edgar A. Quintero M
Abogado y/o Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Factura Electrónica De Venta #JAAR-7
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 90 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 23/03/2021 09:48 AM
Fecha de Generación: 23/03/2021 09:48 AM
Fecha de Vencimiento: 21/06/2021
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Razon Social: N/A
CC: 7710008-0
Teléfono: + (57) 0318675444
Correo Eléctronico: jaimearevalo2021@hotmail.com
Dirección: CL 8 81 02 CA B 28 CONJ BOSQUES DE CANTABRIA 1
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : MUNCIPIO DE NEIVA
Razon Social MUNICIPIO DE NEIVA
NIT: 891180009-1
Teléfono: +(57) 8 716080
Correo Eléctronico:
Dirección: CR 5 9 74
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	1	Unidad	45,232,955	45,232,955	0	**45,232,955**
2	2	ADMINISTRACION 15%	ADMINISTRACION 15%	1	Unidad	6,784,943	6,784,943	0	**6,784,943**
3	3	IMPREVISTOS 5%	IMPREVISTOS 5%	1	Unidad	2,261,648	2,261,648	0	**2,261,648**
4	4	UTILIDAD 5%	UTILIDAD 5%	1	Unidad	2,261,648	2,261,648	0	**2,261,648**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte.
ACTA FINAL DEL CONTRATO No. 1910 DE 2020. CUYO OBJETO ES; ADECUACION DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECOM RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.

CUFE :
e8d012773a79fc032a56ebb397c8b0f145626233e468b208cc30bc051f56cf4ef32de984f18371566399d67ed87113ce

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 56,541,194
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 56,541,194
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 56,541,194
Total a pagar :	COP 56,541,194

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764011652465 entre los rangos de Facturación del 7 al 100 usando el prefijo JAAR con vigencia entre las fechas 2021-03-18 al 2021-09-18.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

EL BANCO DE BOGOTA a solicitud del interesado informa que AREVALO ROJAS JAIME ANDRES identificado(a) con Cedula de Ciudadanía número 7710008 está vinculado con el BANCO DE BOGOTA a través de los siguientes productos financieros:

[X] Cuenta corriente No. 792102972 abierta desde el 27/02/12

[ ] Cuanta de ahorros *_*_*_*

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14690088875

(415)7707212489984(8020) 000001469008887 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 7 1 0 0 0 8	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 1 0 0 0 8	1 9 9 7 0 3 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Huila	4 1	Neiva	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AREVALO	ROJAS	JAIME	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Huila	4 1	Neiva	0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 81 02 CA B 28 CONJ BOSQUES DE CANTABRIA 1

42. Correo electrónico: jarevalorojas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 6 7 5 4 4 4	3 1 3 3 4 7 9 7 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 2 1 2 0 1	7 1 1 0	2 0 1 2 1 2 0 1	4 3 9 0	4 9 2 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 04 - 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AREVALO ROJAS JAIME ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-01-2021 11:06:22AM

ACEPTACION DE OFERTA N.1910
DE 2020
INFORME FINAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE NEIVA
NIT: 891180.009-1

CONTRATISTA:
JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.
C.C.: 7.710.008

SUPERVISOR:
JOSE ALEXANDER DIAZ MENDEZ
C.C.: 7.715.911

11-12/2020	Se imparte el acta de inicio de obra suscrito por NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA secretaria de competitividad del Municipio de NEIVA y JAIME ANDRES AREVALO ROJAS contratista.
14-12/2020	Se realiza la visita de obra en el local comercial del parque pentagrama del malecón, por parte del Contratista de obra Ing. Jaime Andres Arevalo Rojas, Juan Jose Llanos Estrada área técnica y de la administración municipal por parte de Juridico de competitividad Edgar Quintero, Juliana Beltrán, Kelly Yoreidy, Sonia Vanessa y Heidy Alejandra Ruiz de la dependencia de competitividad y el ingeniero Jorge ortiz (Delgado) delegado del Supervisor, con el fin de realizar la socialización de los trabajos a realizar. De acuerdo con la visita de obra, se evidencia que las cantidades presupuestadas no se ajustan a la realidad, las cuales presentan mayores cantidades a las contratadas inicialmente, y se programa una nueva visita para el dia 16 de Diciembre para realizar un balance general.
15-12/2020	Se inician las labores de intervención dentro de la edificación del local comercial, instalando un cerramiento perimetral de advertencia, por consiguiente se realiza la demolicion de enchape de acuerdo a la orientacion dada por la supervisión del contrato, tambien se hace el retiro de escombros existentes dentro del local comercial

minerva Editor Alfresco 4.x y actualizado según la Ley 1581 por [redacted]

16-12/2020	Continua labores con el personal de obra para la demolicion de enchape y retiro de escombros. La visita de obra se suspende debido a que el señor Juan Jose Llanos del area tecnica del contratista da positivo para SARS COVID-19. Por otro lado se emite con la reacomodacion del canal y soportes.
17-12/2020	Se inicia con el mantenimiento de canales reacomodados y limpieza, igualmente con el suministro e instalación bajante de agua lluvia. Por otro lado se continua con la demolición de escombros y enchape.
18-12/2020	Se continua con la demolicion de enchape y retiro de escombros. Tambien se hace el retiro de los marcos de puertas y ventanas existentes en mal estado, y se concluyen las actividades de demolición y retiro de escombros.
19-12/2020	Se inicia las reparaciones de los puntos sanitarios y el punto de salida hidraulico, y la adecuacion de mesones internos del local
20-12/2020	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.

minorva Base de datos generada y actualizada según la ley 1581 de 2012

[redacted]

21-12/2020	Se continua con la adecuacion de los mesones internos y la reparación de los puntos sanitarios, dando por terminadas estas actividades e inicio del desmonte de correa metalica tubular en mal estado, y el desmonte de la teja termoacustica existente en mal estado.
22-12/2020	Se inicia con el sellado de goteras en la cubierta existente, y con la alfajia en concreto. Por otro lado se inicia la instalacion de ceramica para el area de baños.
23-12/2020	Se continua con la alfajia en concreto y la instalacion de ceramica para el area de baños. Igualmente se inicia con el suministro e instalación de enchape para piso.
24-12/2020	Se continua con la alfajia en concreto. Se da inicio al pañete para muros donde incluye filos y dilataciones.
25-12/2020	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.

minerva

26-12/2020 Se da inicio al suministro e instalacion de tuberia de 1 1/4" galvanizado y el suministro e instalación de tuberia 3/4" EMT. Por otro lado se continua con el suministro e instalacion de enchape para pisos.

27-12/2020 Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.

28-12/2020 Se continua con el suministro e instalacion de tuberia de 1 1/4" galvanizado y el suministro e instalación de tuberia 3/4" EMT, dando por terminados estas actividades y continuando con el pañete para los muros donde se incluyen filos y dilataciones.

29-12/2020 Se da inicio al suministro e instalación del enchape de pared ceramica para muro y meson, igualmente la instalacion de marcos para puertas.

30-12/2020 Comienza el suministro de puertas en lamina, suministro e instalación de ventanas reja y se concluye la instalacion del enchape de pared ceramica para muro y meson.

[redacted]

31-12/2020	Se inicia con el suministro e instalacion de la malla electrosoldada para reja de seguridad en la estructura de cubierta
01-01/2021	Dia Festivo. No se realizan labores de obra.
02-01/2021	Dia de descanso. No se realizan labores de obra.
03-01/2021	Dia Festivo dominical. No se realizan labores de obra.
04-01/2021	Se inicia con la instalacion del area electrica donde se instala el tablero trifasico de 12 circuitos con totalizador, igualmente con el (Baker) Breaker industrial.
05-01/2021	Se realiza la instalación de la acometida en cable de cobre aislado, para asi continual con la salida para la iluminacion con su interruptor sencillo.

06-01/2021	Se inician las adecuaciones para realizar la salida de toma doble con polo a tierra con una longitud de 6metros, de igual manera se continua con el mismo procedimiento para así hacer la salida del toma de doble tipo con una longitud de 6metros. Se continua y culmina la acometida en cable de cobre aislado.
07-01/2021	Se realiza la salida del toma trifasica con tierra. Se continuan con las actividades correspondientes para la salida del toma de doble tipo con una longitud de 6 metros.
08-01-2021	Se continua con la salida de la toma trifasica. Por otro lado se da inicio al suministro e instalacion de la luminaria en bala, de la misma manera con las led.
09-01-2021	Se da inicio al suministro e instalacion de interruptor sencillo, Junto con los tomas dobles de polo a tierra, tambien los tomas dobles con polo a tierra aerea con clavija.
10-01/2021	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.

[redacted]

11-01/2021	Dia festivo. No se realizan labores de obra.
12-01/2021	Se hace la instalacion de la toma trifasica con su clavija, igualmente a la salida de iluminación con lampara tortuga. Por otro lado se culminan las instalaciones electricas y se procede con la inspeccion RETIE.
13-01/2021	Se da inicio a la instalacion de la cabreria entesa termoacustica. Por otro lado inician con la pintura con esmalte para toda la estructura metalica.
14-01/2021	Se inicia con el sondeo de la tuberia sanitaria existente. De igual manera inician las reparaciones de los puntos sanitarios de 2" y 4" para un buen funcionamiento. Se realiza visita de obra para el balance de mayores y menores cantidades por parte de la supervición del contrato.
15-01/2021	Continua con las reparaciones del punto sanitario de 4" para un buen funcionamiento. Por otro lado se da inicio a la instalacion del sanitario blanco de descarga sencilla y del orinal blanco.

16-01/2021	Se inicia la instalacion del registro de paso directo 1/2". igualmente se realiza la respectiva instalacion del lavamanos.
18-01/2021	Continua la instalacion del registro de paso directo 1/2". Por otro lado se inicia el suministro e instalacion del medidor de 1/2" volumetrico.
17-01/2021	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.
19-01/2021	Se continua con la instalacion del registro de paso directo 1/2" y el medidor de 1/2" volumetrico.
20-01/2021	Se da inicio a la instalacion de la tapa en concreto de 3000 PSI en caja de inspeccion y con su estructura de acero. Por otro lado se realiza la instalacion del lavaplatos en acero inoxidable.
21-01/2021	Se continua con la instalacion de la luminaria en bala y las luces led.

22-01/2021	Se continua con la instalacion del medidor de 1/2" volumetrico.
23-01/2021	se realiza la inspeccion RETIE
24-01/2021	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.
25-01/2021	Se inician actividades para el resane del local comercial.
(26-01/2021)	
26-01/2021	Continuan actividades para el resane del local comercial.
27-01/2021	Se continua realizando el resane sobre el local comercial.
28-01/2021	Se continuan realizando actividades culminando asi el resane del local comercial.

29-01/2021	Se inician actividades de pintura sobre el local comercial
30-01/2021	Continuan las actividades de pintura sobre el local comercial.
31-01/2021	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.
01-02/2021	Se inicia el aseo general de la obra
02-02/2021	Se continua con el aseo general de la obra desmanchando el piso.
03-02/2021	Continuan actividades para el suministro e instalación de la acometida en cable de cobre aislado. Por otro lado se realiza el suministro e instalación de la Correa metalica tubular

[redacted]

[redacted]

04-02/2021	Se continua con el suministro e instalación de la acometida en cable de cobre aislado, igualmente se hace el suministro e instalacion de la correa metalica tubular.
05-02/2021	Se continua con el suministro e instalación de la correa metalica tubular, de igual manera con el suministro e instalacion de la acometida en cable de cobre aislado.
06-02/2021	Continua el suministro e instalacion de la correa metalica tubular.
07-02/2021	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.
08-02/2021	Se continua con el suministro e instalacion de la acometida en cable de cobre aislado. Por otro lado se inicia el proceso de suministro e instalacion de la malla electro soldada.

09-02/2021	Se continua con el suministro e instalación de la malla electrosoldada.
10-02/2021	Se continua con el suministro e instalacion de la malla electrosoldada.
11-02/2021	Se continua con el suministro e instalacion de la acometida en cable de cobre aislado. Se realiza visita de obra y se hace un balance de mayores y menores teniendo en cuenta el alcance real del proyecto por parte del supervisor.
12-02/2021	Se continua con el suministro e instalación de la malla electro soldada, de igual manera el suministro e instalacion de la acometida en cable de cobre aislado.
13-02/2021	Se realiza la instalacion de la teja termoacustica.
14-02/2021	Dia festivo dominical. No se realizan labores de obra.

[redacted]

15-02/2021	Pintura con esmalte sobre toda la estructura metalica.
16-02/2021	Se continua con la actividad de pintura con esmalte sobre (toda) toda la estructura metalica.
17-02/2021	Se continua con la actividad de pintura con esmalte sobre toda la estructura metalica
18-02/2021	Se realiza el aseo general de la obra, incluyendo el desmanche del piso. Se hace entrega de la obra a satisfaccion del contrato.

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

ACEPTACION DE OFERTA No. 1910 DE 2020

INFORME FINAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.

CONTRATISTA:

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
CC: 7.710.008

PERIODO DEL INFORME:

11 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**1910 DE 2020**
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE(**$44.460.697,60**)
VALOR ADICIONAL:	DOCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOSCON SESENTA CENTAVOS MCTE (**$12.091.577,60**)
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (**$56.552.275,20**)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NEIVA NIT. 891.180.009-1
CONTRATISTA	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS C.C. No. 7.710.008 de Neiva
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 1 MES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
PLAZO ADICIONAL 1	30 DÍAS CALENDARIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO ADICIONAL 2	8 DIAS CALENDARIO DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE (**$56.541.194,33**)

JUSTIFICACION

La remodelación y rehabilitación del local que se encuentra ubicado en el parque PENTAGRAMA del MALECÓN del rio Magdalena se hace con el fin de aprovechar de forma económica el espacio público productivo para el servicio de gestión para el emprendimiento del municipio de Neiva. Este se encuentra entre la Cll 16 y Ave. La Toma.

Este espacio fue destinado para el aprovechamiento económico, pero por el abandono presentado desde el año 2014 este está en manos de la delincuencia, lo que ocasiona que sea usado y habitado por habitantes de calle, causando así un deterioro del municipio teniendo así gran inseguridad para los transeúntes de esta zona.
Dada esta situación, la administración cree pertinente y prioritario intervenir en esta ubicación, para así poder modificarla y generar alternativas de trabajo la población

vulnerable del municipio de Neiva donde al mismo tiempo se estarán cuidando los bienes que se encuentren a cargo de la administración municipal.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

El presente Informe correspondiente a la ejecución del **CONTRATO No 1910 del 2020**, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y JAIME ANDRES AREVALO ROJAS con la C.C. No 7.710.008 de Neiva, a partir del acta de inicio suscrita por las partes el 11 de diciembre del 2020, en donde se orientaron los trabajos para realizar la prestación de servicios de adecuación del local comercial ubicado en el parque pentagrama del malecón del Rio Magdalena del Municipio de Neiva descritos a continuación:

Las intervenciones de las edificaciones en cuanto a su adecuación se iniciaron el día 15 de diciembre del año 2020, después de realizada la visita a la zona de intervención del inmueble en compañía de la supervisión del contrato de obra de fecha 14 de diciembre de 2020.

Una vez identificadas la zona a intervenir, se identificaron mayores cantidades a ejecutar e ítems no previstos que hacen parte integral del proyecto debido al deterioro existente de la estructura existente, por tal razón se procedió a realizar un balance de obra mediante acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos No.1 y así obtener el alcance real del proyecto de adecuación del inmueble. No obstante, la administración municipal adiciona plazo de 30 días mediante Otrosí No.1 de fecha 29 de diciembre de 2020 conforme a la verificación de las cantidades realizadas en la visita técnica del día 28 de diciembre de 2020 por parte de la supervisión del contrato.

Además, la administración adiciona plazo y recurso económico mediante Otrosí No.2 con fecha del 8 de febrero del 2021, por un valor de **DOCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($12.091.577,60)**, a causa del deterioro constante por los invasores de la zona de intervención, donde es pertinente adicionar los ítems nuevos y cantidades adicionales cuantificadas por la supervisión del contrato el día 06 de enero de 2021 mediante visita técnica al sitio de obra, las mayores cantidades y las nuevas actividades y/o cantidades de obra a realizar con el fin que la adecuación del local comercial sea óptima.

Por otro lado, durante la ejecución de la obra, se evidenció un aumento y disminución de algunas cantidades contractuales, donde se ve la necesidad de ajustar las cantidades de obra mediante acta de mayores y menores cantidades No.2 cuantificadas de fecha 11 de febrero de 2021, cantidades socializadas, cuantificadas y aprobadas por la supervisión del contrato y la firma contratista y cuyas actividades realizadas hasta la fecha de entrega del presente informe han sido las siguientes:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad
1		**PRELIMINARES**		
1.1	72151500	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y REVOQUE, CON RETIRO	22,18	M2
2		**ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y CIELO FALSO**		
2.1	40183000	Mantenimiento de canales, incluye reacomodación del canal, reacomodación de soportes y limpieza	39,30	ML
2.2	30171500	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	127,00	M2
2.3	30171500	Sellado de goteras existentes	1,00	VG
2.4	40183000	Suministro e Instalación bajante agua lluvia PVC 4" (incluye accesorios)	3,00	ML
2.5	31211700	Pintura con esmalte estructura metálica	165,88	M2
3		**CARPINTERIA METALICA**		
3.1	30171500	Suministro de puerta en lámina, incluye resane, anticorrosivo y pintura.	4,00	UN
3.2	30171500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA REJA. Con marco en 1"X1/8", verticales y horizontales en tubo cuadrado de 1". Incluye pintura en anticorrosivo y esmalte, pasador y varilla de soporte.	20,00	M2
3.3	30171500	Suministro e instalación de malla electrosoldada con marco en ángulo de 1" x 1/8" para reja de seguridad en estructura de cubierta, incluye pintura en anticorrosivo.	60,00	M2
4		**ESTUCO Y PINTURA**		
4.1	31211700	Pintura a tres mano con vinilo, incluye resane	217,00	M2
4.2	31211700	PAÑETE MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	30,00	M2
5		**ENCHAPES Y MESONES**		
5.1	72151500	ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.125X0.25 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (203/8" refuerzo y E = 01/4" C 0,20 m)	12,00	ML

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

5.2	40183000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE PARED CERAMICA PARA MURO Y MESÓN	15,00	M2
5.3	40183000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA ÁREA BAÑOS	20,00	M2
5.4	40183000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO	20,00	M2
6		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
6.1	30181500	REPARACIÓN SALIDA PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". Incluye accesorios necesarios para un buen funcionamiento.	10,00	UN
6.2	30181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO 1/2". Incluye accesorios necesarios para un buen funcionamiento.	2,00	UN
6.3	30181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO DESCARGA SENCILLA INCL. GRIFERIA Y ACOPLE SANITARIO	3,00	UN
6.4	30181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO	2,00	UN
6.5	30181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL BLANCO	1,00	UN
6.6	30181500	REPARACIÓN PUNTO SANITARIO DE 2". incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento.	4,00	UN
6.7	30181500	REPARACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4". incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento.	4,00	UN
6.8	30181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS	2,00	UN
6.9	30181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Medidor de 1/2" volumétrico	1,00	UN
7		**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
7.1	72151500	Tablero Trifásico 12 circuitos con totalizador, Barraje de 200A, Barrajes de Neutroy tierra, Puerta y chapa Incluye cuatro protección de1x20 A 10 KA. Empotrado.	2,00	UN

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

7.2	72151500	Breaker Industrial ABB Formula A1B de Corriente Nominal In (A) : 40 - Poder de Corte Icu (kA) 440 Vac : 15 KA y 240 Vac : 25 KA	2,00	UN
7.3	72151500	Suministro e Instalación Tubería de 1 1/4" Galvanizado	12,00	ML
7.4	72151500	Suministro e Instalación de Tubería 3/4" EMT	40,00	ML
7.5	72151500	Suministro e Instalación de Acometida en cable cobre aislado	235,00	ML
7.6	72151500	Salida iluminación, no incluye luminaria, ni toma, ni ducto	9,00	UN
7.7	72151500	Salida interruptor sencillo	0,00	UN
7.8	72151500	Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, tubería conduit EMT 3/4" longitud promedio 6m	32,00	UN
7.9	72151500	Salida toma doble tipo GFCI cable Cu # 12 THHN AWG, tubería conduit EMT 3/4" longitud promedio 6m	0,00	UN
7.10	72151500	salida toma trifásica con tierra, 30A, cable de Cu 3#10+10T, No incluye aparatos ni ductos	0,00	UN
7.11	72151500	Suminstro e Instalación de Luminaria Bala LED 1500 lm	0,00	UN
7.12	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Luminaria led de 120x30cm, mínimo 3200 lm, incluye accesorios y soporte de instalación, a todo costo.	0,00	UN
7.13	72151500	Suministro e Instalación de Interruptor sencillo	6,00	UN
7.14	72151500	Suministro e Instalacion de Toma doble polo a tierra	10,00	UN
7.15	72151500	Suministro e Instalacion de Toma doble polo a tierra aerea con clavija	0,00	UN
7.16	72151500	Suministro e Instalacion de Toma trifásica con clavija	0,00	UN

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

7.17	72151500	Suministro e Instalacion de Salida de iluminacion con lampara tortuga con Bombillo Led 8 Vatios con Rejilla (Incluye ducto metalico EMT 3/4" , Cableado, Luminaria Y Accesorios Varios.)	0,00	UN
7.18	72151500	Inspeccion RETIE	1,00	UN
8		**ASEO**		
8.1	72102900	ASEO GENERAL DE OBRA INCLUYE DESMANCHE DE PISOS	1,00	UN
		ITEMS NO PREVISTOS		
4NP		Suministro e intalación de tapa (0.75x0.75x0.03) en concreto de 3000PSI E=caja de inspección. Incluye estructura en acero	1,00	UN
5NP		Sondeo de tubería sanitaria existente	1,00	GLB
6NP		Desmonte teja TERMOACUSTICA. Incluye retiro y disposición final.	118,00	M2
7NP		Suministro e intalación de correa metálica tubular sección transversal 4x10cm E=1mm	30,00	ML
8NP		Suministro e instalacion marco para puerta en lámina C.18.	4,00	UN

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
C.C. No. 7.710.008
CONTRATISTA

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND


REGISTRO FOTOGRÁFICO

INMUEBLE : **LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.**







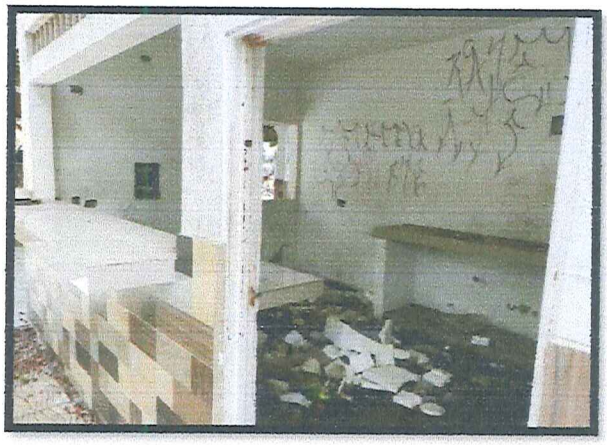





NICO: jareva
61-02 casa b2
CEL: 313 347 97
CIUDAD: NEIVA - HUILA












CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA



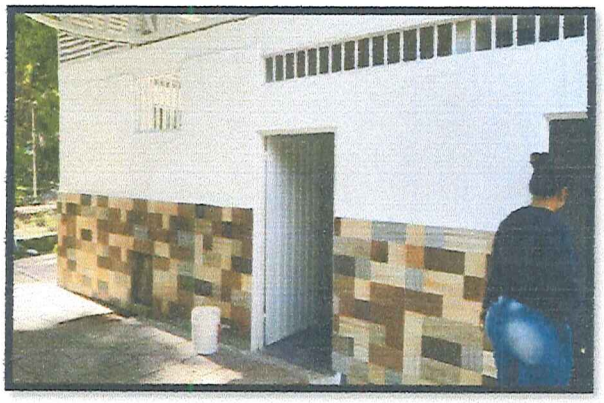










CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA




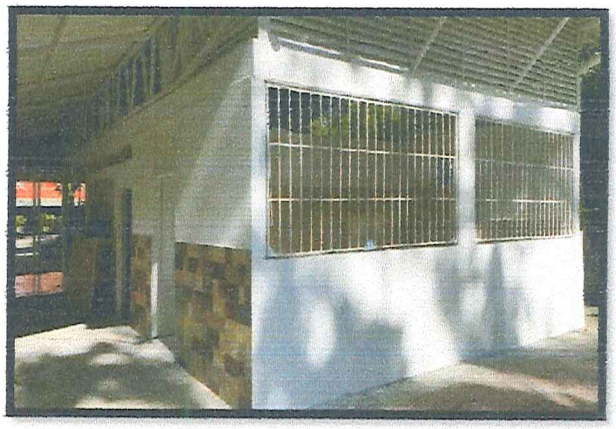








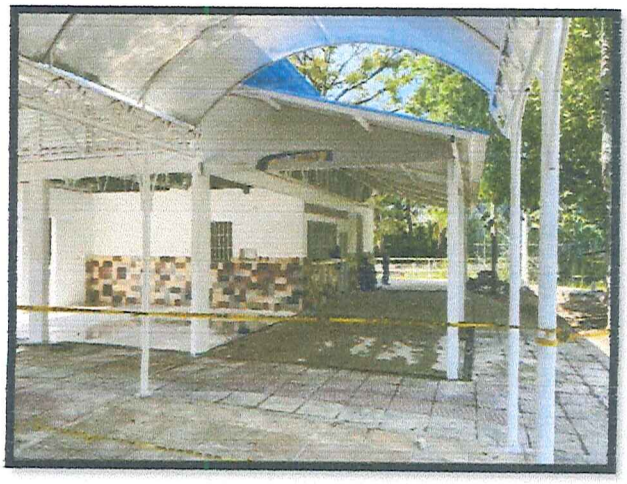


CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA



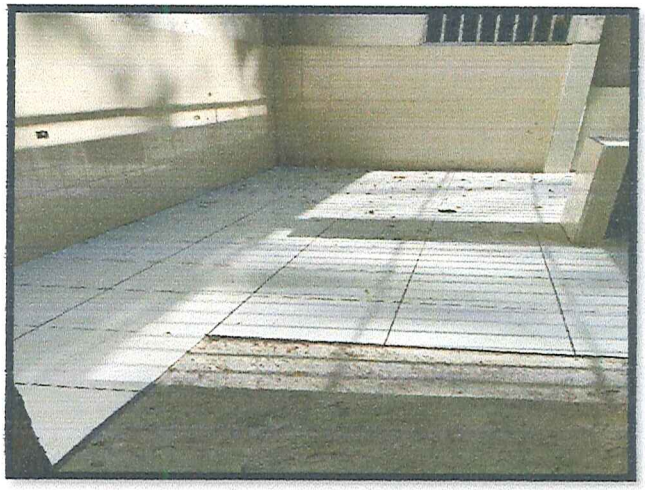

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA – HUILA



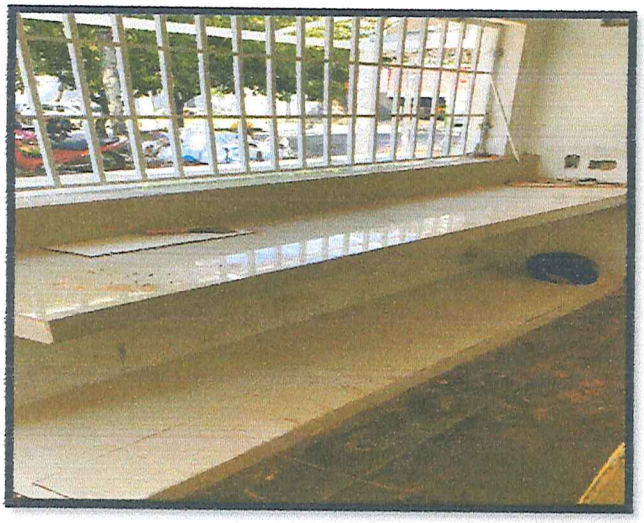





JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
C.C. No. 7.710.008
CONTRATISTA

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA – HUILA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Somos la Primera Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2020
Somos la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2019

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5606495637

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000143679 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2021	26	02	2021

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **JAIME ANDRES AREVALO ROJAS** IDENTIFICACIÓN: CC **7.710.008**

DIRECCIÓN: CL 8 81 81 CA B 28 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 8744732

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE NEIVA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.009-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE NEIVA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.009-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/12/2020	28/09/2021	11,310,455.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/12/2020	28/03/2024	11,310,455.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	11,310,455.20

BENEFICIARIOS
NIT 891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 18-02-2021, SE DA INICIO AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VIGENCIA DESDE 18-02-2021 HASTA 18-02-2026.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA NO 1910, DE FECHA 10-12-2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENRAGRAMA DEL MALECON RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****33,931,365.60	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(8020)000000000007000560649563

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207E0A0AFB795B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000143679** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **JAIME ANDRES AREVALO ROJAS** IDENTIFICACIÓN: CC **7.710.008**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE NEIVA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.009-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE NEIVA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.180.009-1**

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 1910 DE 2020 CELEBRADA ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

OBJETO:	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	**JAIME ANDRES AREVALO ROJAS** C.C. No. 7.710.008 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE **($56.552.275,20)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Dos (02) meses y ocho (08) días, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, y/o hasta agotar el valor del contrato sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 de Diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021

En Neiva, a los 19 días del mes de marzo de 2021, se reunieron el Secretario de Competividad JOSÉ ALEXANDER DÍA MENDEZ, en calidad de supervisor de la oferta No. 1910 de 2020 y JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	**$44.460.697,60**
2. Adición - Otro Sí No. 01	**$12.091.577,60**
3. Valor Final Contratado	**$56.552.275,20**
4. Valor Final Ejecutado	**$56.541.194,33**
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$11.080,87**
6. Saldo a Favor del Contratista	**$0**

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	11 Diciembre 2020
2. Acta de Justificación en Tiempo N° 1	29 Diciembre 2020
3. Acta de Justificación Adicional en tiempo y adición presupuestal No.2	08 Febrero 2021
4. Acta de Entrega y Recibo	18 Febrero 2021
5. Acta de Terminación	18 Febrero 2021

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de la Aseguradora Solidaria de Colombia, con los amparos de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales – Póliza de Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobadas por la Oficina de Contratación así:

Aseguradora Solidaria de Colombia						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA	560-47-994000143679	Cumplimiento	$8.892.139,60	10/12/2020	20/07/2021	11/10/2020
PÓLIZA ÚNICA	560-47-994000143679	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$8.892.139,60	10/12/2020	20/01/2024	11/10/2020
PÓLIZA ÚNICA	560-47-994000143679	Estabilidad de la Obra	$8.892.139,60	10/12/2020	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo y entrega final de Obra	11/10/2020

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de la Aseguradora Solidaria de Colombia, con los amparos de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales – Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobadas por la Oficina de Contratación así:

Aseguradora Solidaria de Colombia						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA	560-74-99400026778	Predios, labores y operaciones	$175.560.600	10/12/2020	20/07/2021	11/10/2020

AMPLIACIÓN PÓLIZA POR ADICIÓN EN DINERO

Aseguradora Solidaria de Colombia						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ADICIONAL	560-47-994000143679 -ANEXO 2	Cumplimiento	$11.310.455,20	10/12/2020	28/08/2021	12/02/2021
PÓLIZA ADICIONAL	560-47-994000143679 -ANEXO 2	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$11.310.455,20	10/12/2020	28/02/2024	12/02/2021
PÓLIZA ADICIONAL	560-47-994000143679 -ANEXO 2	Estabilidad de la Obra	$11.310.455,20	10/12/2020	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo y entrega final de Obra	12/02/2021

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de egreso N° Pendiente	PENDIENTE	$56.552.275,20	$56.541.194,33	$ 11.080,87
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$44.460.697,60	$12.091.577,60	$56.552.275,20	$56.541.194,33	$ 11.080,87

VALOR A PAGAR: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE **($56.541.194,33)** M/Legal.

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor de la aceptación de oferta certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha18 de febrero de 2021.

6.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios".*

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($56.541.194,33)**M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

JOSÉ ALEXANDER DÍAZ MENDEZ
Supervisor y/o Contratista

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ingeniero Civil Contratista
Contratista

Edgar A. Quintero M
Abogado y/o Contratista

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
CC.7.710.008

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Neiva, 10 de Marzo de 2021

YESSENIA MAZO LUGO en mi condición de Contador Público de JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.710.008 de Neiva (Huila), me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensaciones familiar, instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Neiva a los 10 días del mes de Marzo de 2021.

Firma: _____
Nombre: **YESSENIA MAZO LUGO**
C.C. 1.075.263.878 de Neiva (H)
En Calidad de Contador Público
TP. No. 202434 - T

El empleo es de todos | Mintrabajo

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	11EE2021744100100001222
Nombre y/o Razón Social	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Identificación	7.710.008

En el periodo comprendido entre el 9/03/2020 al 9/03/2021 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No registra.
- **RECLAMACIONES**. No Registra.
- **INVESTIGACIONES:** No registra.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en la Resolución 2143 del 2014, articulo 1 numeral 19.

Neiva, viernes, 12 de marzo de 2021

CLARA INÉS BORRERO TAMAYO
Directora Territorial Del Huila.

Transcriptor: Magda. M.
Reviso bases/Aprobó: L. Herminso.
Reviso bases/Aprobó: Rocío.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20082921
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-03-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7710008	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 81 02	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	jarevalorojas@hotmail.com	TELÉFONO	8675444
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 02	Año: 2021	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		20082921

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7710008	57	No	No	No	41	1	Salario	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7710008																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7710008	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7710008	SANITAS	30	$908.526	0.1250000	$113.600	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	7710008	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7710008	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$145.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$145.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$113.600	$0	0	$0	0	$0	$113.600	0	$0	$0	$113.600	$0	0	$0	$0	$113.600	$0	$0	$113.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$63.300	0	$0	$0	$63.300	0	$0	$63.300	0	$0	$633	$63.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$113.600
PENSIONES	1	$145.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$63.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$322.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19639646
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-02-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7710008	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 81 02	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	jarevalorojas@hotmail.com	TELÉFONO	8675444
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		19639646

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7710008	57	No	No	No	41	1	Salario	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7710008																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7710008	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7710008	SANITAS	30	$908.526	0.1250000	$113.600	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	7710008	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7710008	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$145.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$145.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$113.600	$0	0	$0	0	$0	$113.600	0	$0	$0	$113.600	$0	0	$0	$0	$113.600	$0	$0	$113.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$63.300	0	$0	$0	$63.300	0	$0	$63.300	0	$0	$633	$63.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$113.600
PENSIONES	1	$145.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$63.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$322.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19393948
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-01-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7710008	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 81 02	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	jarevalorojas@hotmail.com	TELÉFONO	8675444
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 12	Año: 2020	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		19393948

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7710008	57	No	No	No	41	1	Salario	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	$877.803

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7710008																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7710008	COLFONDOS	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7710008	SANITAS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	7710008	0.0696000	$61.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7710008	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$140.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$140.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$109.800	$0	0	$0	0	$0	$109.800	0	$0	$0	$109.800	$0	0	$0	$0	$109.800	$0	$0	$109.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$61.100	0	$0	$0	$61.100	0	$0	$61.100	0	$0	$611	$61.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$109.800
PENSIONES	1	$140.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$61.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$311.400

PROINCO
INGENIERIA S.A.S.

PAZ Y SALVO

Yo MARLON ANDRES SALGADO SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.075.262.997 de Neiva, actuando en representación legal de la empresa PROINCO INGENIERIA SAS con Nit. 900.375.623 - 2 Mediante el presente documento dejo constancia que el señor JAIME ANDRES AREVALO ROJAS con cedula de ciudadanía No. 7.710.008 de Neiva, me canceló el valor total del CONTRATO DE OBRA No.003 DE 2020, cuyo objeto es; "MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA", quedando a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a al señor JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 02 días del mes de Marzo de 2021.

MARLON ANDRES SALGADO SALGADO
C.C. 1.075.262.997 de Neiva – Huila
RPL/ PROINCO INGENIERIA SAS
NIT.900.375.623 - 2

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

CONTRATO MANO DE OBRA No. 003 DE 2020

Entre los suscritos a saber JAIME ANDRES AREVAL ROJAS con cedula de ciudadanía No. 7.710.008 de Neiva – Huila actuando a nombre propio, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE y el señor MARLON ANDRES SALGADO SALGADO con cedula de ciudadanía No. 1.075.262.997 de Neiva – Huila, Actuando en representación Legal de la empresa PROINCO INGENIERIA SAS con Nit.900.375.623 - 2, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de mano de obra, con destino al contrato de mínima cuantía No. MNSCOMCMCOP-053-2020, celebrado entre el Municipio de Neiva y el señor Jaime Andrés Arévalo Rojas, cuyo objeto es; ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA".Y que se regirá por las normas legales aplicables, a esta materia y en especial por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO – EL CONTRATISTA se obliga para EL CONTRATANTE a realizar "MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA". El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones suministradas por el CONTRATANTE; Las partes CONTRATANTES determinan voluntariamente que la relación que se genere del presente contrato se circunscribe dentro de la concepción de los contratos, sin que por ningún motivo se constituya vínculo laboral alguno. A su vez el CONTRATISTA se hará cargo del 100% de los salarios, seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales del personal que tenga a su cargo, los cuales serán cancelados por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA en los pagos parciales que se realicen, CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA para el ejercicio de sus labores empleara recursos propios, pero en el evento de que el CONTRATANTE apoye logísticamente al CONTRATISTA se entenderá de una manera liberada, sin que por tal concepto se configure una relación laboral que las partes acuerdan no es la voluntad de este contrato. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO – El valor del presente contrato es la suma de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS IVA INCLUIDO ($16.962.358) MONEDA CTE. El cual será cancelado por el CONTRATANTE así: un anticipo del 30% del valor del contrato equivalente a CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($5.088.707) MONEDA CTE y el faltante mediante pagos parciales según el avance de la obra los cuales serán revisados y aprobados por el CONTRATANTE, estos serán cobrados mediante cuenta de cobro, documento equivalente o factura de venta. CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto del presente contrato en 90 días calendarios contados a partir de la firma del presente contrato. PARAGARAFO; Este tiempo estará sujeto a la entrega por parte del CONTRATANTE y de los trabajadores a su cargo. CLAUSULA QUINTA. AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA deberá acreditar la afiliación al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, Riesgos Profesionales, y pago de aportes parafiscales lo cual será

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

demostrado periódicamente y/o a solicitud del CONTRATANTE.CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONMIENTO Y EJECUCION: El contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. PARÁGRAFO: Todos los gastos para la ejecución del presente contrato serán por cuenta del CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: LIQUIDACION. El contrato será liquidado por orden del contratista o por terminado el objeto del presente contrato. CLAUSULA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato el CONTRATISTA debe pagar al CONTRATANTE, a título de indemnización una suma equivalente del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato .El valor pactado de la presente clausula es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el CONTRATANTE le adeude al CONTRATISTA con la ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del código civil. CLAUSULA NOVENA .DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato el domicilio será la ciudad de Neiva (Huila) . Para constancia se firma en Neiva (Huila) a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2020.

CONTRATANTE

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
CC. 7.710.008 de Neiva (Huila)

CONTRATSITA

MARLON ANDRES SALGADO SALGADO
CC. 1.075.262.997 de Neiva (Huila)
RPL/ PROINCO INGENIERIAS SAS
NIT.900.375.623 - 2

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA – HUILA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20114293
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-03-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PROINCO INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900375623	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 N 6 98	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	PROINCOINGENIERIAS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8626060
FAX	0	SUCURSAL	003	NOMBRE SUCURSAL	roceria
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075262997	PRIMER APELLIDO	SALGADO	SEGUNDO APELLIDO	SALGADO
PRIMER NOMBRE	MARLON	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 02	Año: 2021	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$6.359.682		20114293

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7710008	01	No	No	No	41	1	Fijo	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	$908.526
CC-1075269874	01	No	No	No	41	1	Fijo	BARRIOS PALOMAR CARLOS ANDRES	$908.526
CC-1075315693	01	No	No	No	41	1	Fijo	MOSQUERA VARGAS CARLOS ENRIQUE	$908.526
CC-1020793132	01	No	No	No	41	1	Fijo	PERDOMO SOLANO JHON JAIRO	$908.526
CC-1075260012	01	No	No	No	41	1	Fijo	ROMERO JEFFERSON STIVEN	$908.526
CC-7691877	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS BAHAMON CARLOS FERNANDO	$908.526
CC-1075285886	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS BAHMON ANDRES MAURICIO	$908.526

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7710008																													0		
CC - 1075269874			X	2021-02-28																									0		
CC - 1075315693			X	2021-02-28																									0		
CC - 1020793132			X	2021-02-28																									0		
CC - 1075260012			X	2021-02-28																									0		
CC - 7691877																													0		
CC - 1075285886			X	2021-02-28																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7710008	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075269874	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075315693	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1020793132	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075260012	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 7691877	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075285886	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7710008	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075269874	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075315693	EPS-S COMF HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1020793132	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075260012	EPS-S COMF HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 7691877	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075285886	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7710008	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075269874	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075315693	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020793132	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075260012	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691877	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075285886	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$290.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$290.800
PROTECCION	2	$290.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$290.800
PORVENIR	3	$436.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$436.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$145.600	$0	0	$0	0	$0	$145.600	0	$0	$0	$145.600	$0	0	$0	$0	$145.600	$0	$0	$145.600
EPS-S COMF HUILA	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800
SANITAS	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	$443.100	0	$0	$0	$443.100	0	$0	$443.100	0	$0	$0	$443.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$254.800	0	$0	$254.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$254.800
PENSIONES	3	$1.017.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$443.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$254.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.970.500

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19828561
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-02-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PROINCO INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900375623	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 N 6 98	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	proincoingenierias@hotmail.com	TELÉFONO	8626060
FAX	0	SUCURSAL	003	NOMBRE SUCURSAL	ROCERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075262997	PRIMER APELLIDO	SALGADO	SEGUNDO APELLIDO	SALGADO
PRIMER NOMBRE	MARLON	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$6.389.967		19828561

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7710008	01	No	No	No	41	1	Fijo	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	$908.526
CC-1075269874	01	No	No	No	41	1	Fijo	BARRIOS PALOMAR CARLOS ANDRES	$908.526
CC-1082128476	01	No	No	No	41	1	Fijo	FLOREZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	$908.526
CC-1075315693	01	No	No	No	41	1	Fijo	MOSQUERA VARGAS CARLOS ENRIQUE	$908.526
CC-1020793132	01	No	No	No	41	1	Fijo	PERDOMO SOLANO JHON JAIRO	$908.526
CC-1075260012	01	No	No	No	41	1	Fijo	ROMERO JEFFERSON STIVEN	$908.526
CC-7691877	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS BAHAMON CARLOS FERNANDO	$908.526
CC-1075285886	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS BAHMON ANDRES MAURICIO	$908.526

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7710008																													0		
CC - 1075269874																													0		
CC - 1082128476			X	2021-01-01																									0		
CC - 1075315693																													0		
CC - 1020793132																													0		
CC - 1075260012																													0		
CC - 7691877																													0		
CC - 1075285886																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7710008	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075269874	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1082128476	PORVENIR	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 1075315693	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1020793132	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075260012	COLFONDOS	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 7691877	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1075285886	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7710008	SANITAS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075269874	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1082128476	EPS-S COMF HUILA	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	3	0.0696000	$2.200
CC - 1075315693	EPS-S COMF HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1020793132	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075260012	EPS-S COMF HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 7691877	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300
CC - 1075285886	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0696000	$63.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7710008	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075269874	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082128476	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075315693	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020793132	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075260012	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691877	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075285886	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$290.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$290.800
PORVENIR	4	$441.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$441.100
COLFONDOS	2	$290.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$290.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COMF HUILA	3	$74.100	$0	0	$0	0	$0	$74.100	0	$0	$0	$74.100	$0	0	$0	$0	$74.100	$0	$0	$74.100
SANITAS	1	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$145.600	$0	0	$0	0	$0	$145.600	0	$0	$0	$145.600	$0	0	$0	$0	$145.600	$0	$0	$145.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$445.300	0	$0	$0	$445.300	0	$0	$445.300	0	$0	$4.453	$445.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$256.100	0	$0	$256.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$256.100
PENSIONES	3	$1.022.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$445.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$256.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.980.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19632959
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-01-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PROINCO INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900375623	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 N 6 98	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	proincoingenierias@hotmail.com	TELÉFONO	8626060
FAX	0	SUCURSAL	003	NOMBRE SUCURSAL	ROCERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075262997	PRIMER APELLIDO	SALGADO	SEGUNDO APELLIDO	SALGADO
PRIMER NOMBRE	MARLON	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 12	Año: 2021	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$7.022.424		19632959

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7710008	01	4	No	No	41	1	Fijo	AREVALO ROJAS JAIME ANDRES	$877.803
CC-1075269874	01	No	No	No	41	1	Fijo	BARRIOS PALOMAR CARLOS ANDRES	$877.803
CC-1082128476	01	No	No	No	41	1	Fijo	FLOREZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE	$877.803
CC-1075315693	01	No	No	No	41	1	Fijo	MOSQUERA VARGAS CARLOS ENRIQUE	$877.803
CC-1020793132	01	No	No	No	41	1	Fijo	PERDOMO SOLANO JHON JAIRO	$877.803
CC-1075260012	01	No	No	No	41	1	Fijo	ROMERO JEFFERSON STIVEN	$877.803
CC-7691877	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS BAHAMON CARLOS FERNANDO	$877.803
CC-1075285886	01	No	No	No	41	1	Fijo	VARGAS BAHMON ANDRES MAURICIO	$877.803

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7710008																													0		
CC - 1075269874																													0		
CC - 1082128476																													0		
CC - 1075315693																													0		
CC - 1020793132																													0		
CC - 1075260012																													0		
CC - 7691877																													0		
CC - 1075285886																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7710008	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1075269874	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1082128476	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1075315693	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1020793132	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1075260012	COLFONDOS	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 7691877	PROTECCION	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1075285886	PROTECCION	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7710008	SANITAS	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 1075269874	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 1082128476	EPS-S COMF HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 1075315693	EPS-S COMF HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 1020793132	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 1075260012	EPS-S COMF HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 7691877	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100
CC - 1075285886	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	3	0.0696000	$61.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7710008	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075269874	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082128476	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075315693	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020793132	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075260012	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691877	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075285886	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$562.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$562.000
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	1	$140.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$140.500
PROTECCION	2	$281.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$281.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COMF HUILA	3	$105.600	$0	0	$0	0	$0	$105.600	0	$0	$0	$105.600	$0	0	$0	$0	$105.600	$0	$0	$105.600
SANITAS	1	$35.200	$0	0	$0	0	$0	$35.200	0	$0	$0	$35.200	$0	0	$0	$0	$35.200	$0	$0	$35.200
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$140.800	$0	0	$0	0	$0	$140.800	0	$0	$0	$140.800	$0	0	$0	$0	$140.800	$0	$0	$140.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$488.800	0	$0	$0	$488.800	0	$0	$488.800	0	$0	$0	$488.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$281.600	0	$0	$281.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$281.600
PENSIONES	3	$983.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$488.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$281.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.035.500

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

PAZ Y SALVO

Yo Carlos Andres Barrios Palomar, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1075269874, de Neiva mediante el presente documento dejo constancia que JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, me canceló el valor de los servicios prestados y prestaciones a que tengo derecho, quedando a **paz y salvo** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 01 de marzo de 2021.

Carlos Andres Barrios Palomar

Nombre: Carlos Andres Barrios Palomar

C.C. 1075269874.

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

PAZ Y SALVO

Yo Jhon Jairo Salamo P. identificado con cédula de ciudadanía Nº 1020793132 de Bogotá mediante el presente documento dejo constancia que JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, me canceló el valor de los servicios prestados y prestaciones a que tengo derecho, quedando a **paz y salvo** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 07 - Marzo 2024.

Jhon Jairo Salamo Pardomo

Nombre: Jhon Jairo Pardomo.

C.C. 1020793132.



CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

PAZ Y SALVO

Yo Carlos Enrique Mosquera V., identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.075.315.693, de Neiva mediante el presente documento dejo constancia que JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, me canceló el valor de los servicios prestados y prestaciones a que tengo derecho, quedando a **paz y salvo** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 01 Marzo - 2021.

Carlos Enrique Mosquera V

Nombre: Carlos Enrique Mosquera Vargas

C.C. 1.075.315.693

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA – HUILA

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

PAZ Y SALVO

Yo Andres Mauricio Vargas Bahamon, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1075285886, de Neiva mediante el presente documento dejo constancia que JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, me canceló el valor de los servicios prestados y prestaciones a que tengo derecho, quedando a **paz y salvo** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 01 de Marzo del 2021.

Andres Mauricio Vargas Bahamon

Nombre: Andres Mauricio Vargas Bahamon

C.C. 1075285886



CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA – HUILA

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

PAZ Y SALVO

Yo Jefferson Steven Romero, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.075.260.012, de Neiva mediante el presente documento dejo constancia que JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, me canceló el valor de los servicios prestados y prestaciones a que tengo derecho, quedando a **paz y salvo** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 01 de Marzo 2021.

Jefferson Steven Romero

Nombre: Jefferson Steven Romero

C.C. 1.075.260.012

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA – HUILA

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Ing. Civil Especialista Ambiental
M.P. 25202-098919 CND

PAZ Y SALVO

Yo Carlos Fernando Vargas.B identificado con cédula de ciudadanía Nº 7.691.877, de Neiva. mediante el presente documento dejo constancia que JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, me canceló el valor de los servicios prestados y prestaciones a que tengo derecho, quedando a **paz y salvo** por todo concepto, por lo cual posteriormente no se podrá interponer ninguna reclamación de carácter civil o penal, laboral o de cualquier otra índole, que pueda afectar a JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

Para constancia se firma a los 01 de Marzo de 2021.



Carlos Fernando Vargas.B.
Nombre: Carlos Fernando Vargas Bahamon.
C.C. 7.691.877 de Neiva.

CORREO ELECTRÓNICO: jarevalorojas@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 8 # 81-02 casa b28 bosques de Cantabria
CEL: 313 347 9711
CIUDAD: NEIVA - HUILA
