

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 de 5

ACTA No. 02

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: VALLE / VARIOS

FECHA: (dd/mm/aaaa) **01/03/2022**
30 AM

HORA: (hh.mm AM/PM) De **10: 00 AM** a **11:**

LUGAR: Reunión Virtual por Teams

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

OBJETIVO:

Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 6 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Personal Presentado, aprobado y contratado por la Gerencia Integral.	GI Proyecta
2	Revisión situación Iniciativa Andalucía - Valle.	GI Proyecta – PS
3	Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.	GI Proyecta
4	Cronogramas procesos de contratación.	GI Proyecta
5	Gestión Documental.	GI Proyecta – PS
6	Matriz de Maduración Proyectos presentados por los municipios.	GI Proyecta – PS
7	Derecho de Petición CVC Proyecto Guadalajara de Buga.	GI Proyecta – PS
8	Sostenibilidad de los proyectos	GI Proyecta – PS
9	Informes de Gerencia Integral.	GI Proyecta
10	Plan de Contingencia cronograma Plan Operativo	GI Proyecta

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

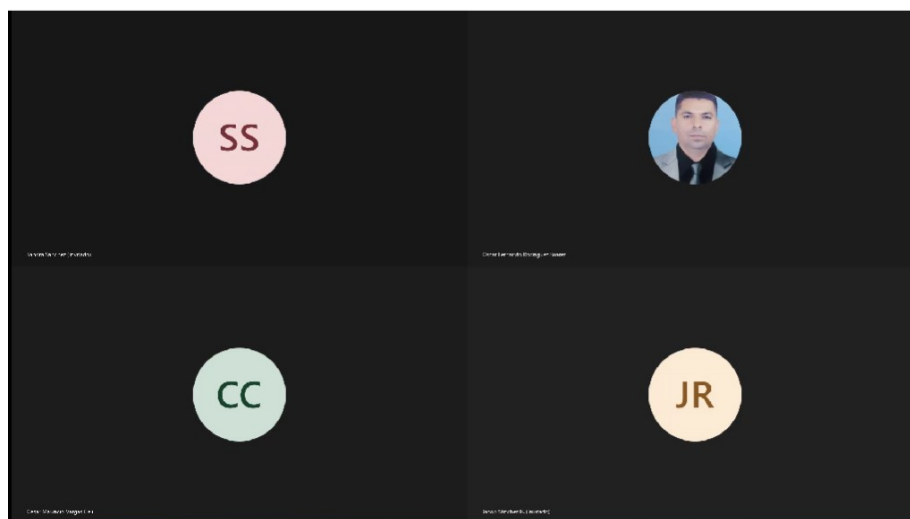
	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	NO APLICA	
2		
3		
4		
5		

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 2 de 5

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

[Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-20220301_100042-Grabación de la reunión.mp4](#)



Por medio de la presente se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en el departamento del Valle que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 3 de 5

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.

Cesar Mauricio Vargas Celi - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Mónica Liliana Pérez Rueda - Apoyo jurídico Supervisión del Contrato Interadministrativo.

Sandra Sanchez - Gerente del Proyecto - GI Proyecta. (Asistió con el mismo enlace de Jacob Sanchez)

Jacob Sanchez - GI Proyecta.

Se inicia con la presentación de los asistentes por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, toma la palabra la supervisión del contrato interadministrativo por parte de Prosperidad Social, haciendo una descripción de los compromisos adquiridos por la Gerencia Integral en el comité operativo No 3 del día 14 de febrero del 2022 alineado a los proyectos del departamento del Valle.

Se continua la reunión haciendo una revisión del estado de contratación de los proyectos en el departamento del Valle:

RADICADO	SECTOR	DEPTO	MUNICIPIO	Estado Contratación	NOMBRE	VALOR INICIAL	VALOR CONTRATACIÓN
E-2020-2203-155888	Vías y Transporte	Valle del Cauca	La Unión	02/03/2022. Adjudicación Obra. 02/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Construcción de vías urbanizaciones La Esperanza, Bosques de la Acurela, Villa del Sol, La Ermita, Mirador de las Brisas municipio La Unión - Valle del Cauca	\$ 2,023,855,338	\$ 2,023,855,338
E-2020-2203-232571	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Andalucía	La GI informó en comité No Viabilidad. Sin soportes.	Rehabilitación y construcción de pavimento rígido en vías urbanas, Andalucía	\$ 1,509,907,882	
E-2020-2203-253372	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Alcalá	18/02/2022. Adjudicación Obra. 02/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Construcción De Pavimento En Concreto Rígido En La Vía Alcalá, La Cuchilla Del Municipio De Alcalá - Valle Del Cauca	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000
E-2020-2203-261304	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	04/03/2022. Adjudicación Obra. 04/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Construcción De Plaza Huelga En La Vereda El Café Zona Rural Del Municipio De Ansermanuevo - Valle Del Cauca	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000
E-2020-1733-235598	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	10/03/2022. Adjudicación Obra. 10/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Optimización Del Estado De La Malla Vial Rural Del Municipio De Guadalajara De Buga - Valle Del Cauca (1.817.652.370.83)	\$ 1,779,622,647	\$ 1,779,622,6

Se puntualiza sobre los siguiente Temas:

1. Personal Presentado, aprobado y contratado por la Gerencia Integral.

Se pide a la GI hacer revisión sobre el personal presentado porque el personal contratado no corresponde en su totalidad, presentándose contratos de profesionales sin previa presentación por parte de la GI e inclusive con un Profesional que hace parte del contrato 501 2021. La Gerente del Proyecto se compromete hacer la revisión y hacer lo indicado para dar cumplimiento en el menor tiempo posibles.

2. Revisión situación Iniciativa Andalucía - Valle.

Se pide a la gerencia con base al oficio remitido sobre la no viabilidad de la iniciativa, presentar los debidos soportes de la visita y documentos del trabajo realizado en campo con

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 4 de 5

el municipio, acorde con lo manifestado de no existencia de redes de servicios públicos en los tramos a intervenir.

3. Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.
Se agradece a la interventoría la entrega de los respectivos enlaces, donde permiten un acceso de un pdf por proyecto para todos los departamentos. Con base a los mismos se constata que se adelantan los procesos de contratación, pero se indica a la gerencia que esos enlaces limitan el acceso la totalidad de información que se maneja en el proceso.

4. Cronogramas procesos de contratación.
En la tabla anterior, se evidencia la fecha de adjudicación de los procesos de contratación de obras e interventoría.

5. Gestión Documental.
La gerencia Integral informa estar al día con la gestión del archivo y contar con un profesional en esa área, que se encuentra al frente del mismo. La supervisión del contrato de Prosperidad Social propone una capacitación con el encargado de Gestión documental de la entidad y coordinará la misma e informará para su realización.

6. Matriz de Maduración Proyectos presentados por los municipios.
La gerencia Integral informa estar organizando una matriz de control de maduración de proyectos la cual compartirá cuanto esté completa.

7. Derecho de Petición CVC Proyecto Guadalajara de Buga.
Se solicita a la GI la respuesta al derecho de petición radicado por la CVC, a lo cual indica que ya tienen la proyección de este que relaciona consultas u respuestas adelantadas ante la corporación en el proceso de maduración dejando claro la no intervención del área delimitada de la reserva por parte del proyecto.

8. Sostenibilidad de los proyectos.
Se confirma la reunión que se adelantará el día 03/03/2022 con el Profesional Bernardo Romero a la 8:00 am.

9. Informes de Gerencia Integral.
Se solicita a la GI, entregar la subsanación del Informe mensual No 1, respondiendo y comprometiéndose a hacer la entrega la ingeniera Sandra el 03/03/2022, El Informe mensual No 2 la GI pide un mayor plazo, a lo que se informa que deben sujetarse al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Plan de Contingencia cronograma Plan Operativo.
Se pide de la misma manera dar respuesta a la Gerencia dar respuesta al oficio radicado por la Supervisión del contrato interadministrativo pidiendo el plan de contingencia al cronograma respectivo. La gerencia establece compromiso de entrega.


 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 5 de 5


COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Presentación Hojas de vida Profesionales que sustituyen a los ya aprobados por Prosperidad Social.	GI Proyecta	01/03/2022	02/03/2022
2	Soportes visita y No pertinencia.	GI Proyecta	01/03/2022	02/03/2022
3	Subsanación Informe mensual 1 Gerencia Integral	GI Proyecta	01/03/2022	02/03/2022
4	Solicitar y programar capacitación en gestión documental	GI Proyecta – Prosperidad Social	01/03/2022	
5	Respuesta Derecho de Petición CVC Guadalajara de Buga.	GI Proyecta	01/03/2022	02/03/2022
6	Entrega Plan de Contingencia Cronograma Plan Operativo.	GI Proyecta	01/03/2022	02/03/2022

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: MARZO 2022 <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐


OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ SUAREZ
 Supervisor Contrato – DPS


CESAR MAURICIO VARGAS CELI
 Apoyo técnico - DPS
