

|                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Municipio<br/>El Carmen de Viboral</p> | <p align="center"><b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b></p>                  |  <p>AL TIEMPO, MAS OPORTUNIDAD<br/>EL CARMEN DE VIBORAL</p> |
|                                                                                                                             | <p align="center">CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020</p> |                                                                                                                                                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| FECHA ELABORACIÓN | 31 de agosto de 2022 |
|-------------------|----------------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| TIPO DE CONTRATO | Urgencia manifiesta. |
|------------------|----------------------|

### 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

#### 1.1 GENERALIDADES

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No CONTRATO                        | 120-CPS 204-2022                                                                                                                          |
| OBJETO                             | URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA GENERADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL |
| CONTRATISTA                        | CONCIVELSA Y CIA S.A.S.                                                                                                                   |
| FECHA DEL CONTRATO                 | 06 de mayo de 2022, por Secop II                                                                                                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                 | TREINTA (30) DÍAS                                                                                                                         |
| VALOR INICIAL                      | \$ 249.970.015                                                                                                                            |
| FECHA INICIO                       | 6/05/2022                                                                                                                                 |
| FECHA TERMINACIÓN                  | 6/06/2022                                                                                                                                 |
| PRORROGA N°1                       | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO                                                                                                              |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION         | CINCO (05) DE AGOSTO 2022                                                                                                                 |
| ADICION N° 1                       | \$ 49.613.780,56                                                                                                                          |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION | \$ 299.583.795,56                                                                                                                         |
| PRORROGA N°2                       | \$ 49.613.780,56                                                                                                                          |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION         | VEINTI UNO (21) DE AGOSTO 2022                                                                                                            |

#### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN        | 105     |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO | 105     |
| AVANCE PORCENTUAL         | 100,00% |


#### 1.3 AVANCE FINANCIERO

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 299.583.796 |
|--------------------|----------------|

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR EJECUTADO      | \$ 100.950.207,00 | ACTA DE PAGO N° 1 |
| VALOR EJECUTADO      | \$ 80.039.103,00  | ACTA DE PAGO N° 2 |
| VALOR EJECUTADO      | \$ 38.198.987,00  | ACTA DE PAGO N° 3 |
| VALOR EJECUTADO      | \$ 80.375.134,00  | ACTA DE PAGO N° 4 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 99,99%            |                   |

## 2. INFORME DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

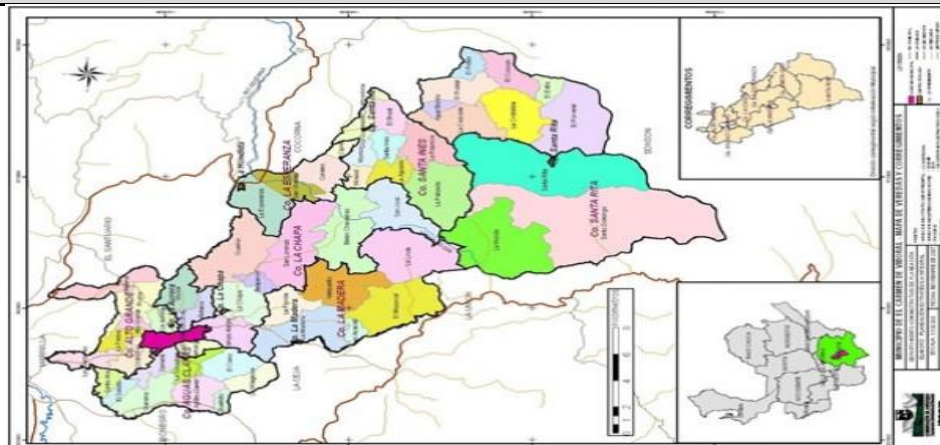

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Basado en lo estipulado en

### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

La supervisión se encuentra realizando constante seguimiento al contrato de urgencia manifiesta que cumplan con la documentación adecuada, pago de sus prestaciones sociales.

#### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

#### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas del Decreto no es obligatoria.

#### POLIZAS VIGENTES

| GARANTIA                                                                                                 | NOMBRE ASEGURADORA     | No PÓLIZA       | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| Cumplimiento del contrato (vigencia del contrato)                                                        | Seguros del Estado S.A | 65-44-101212104 | 6/05/2022     | 21/08/2022  | \$ 29.958.379,56  |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (vigencia del contrato y 3 años mas) | Seguros del Estado S.A | 65-44-101212104 | 6/05/2022     | 21/08/2025  | \$ 14.979.189,78  |
| Predios labores y operaciones (vigencia del contrato)                                                    | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022     | 21/08/2022  | \$ 200.000.000,00 |
| Contratista y subcontratista (vigencia del contrato 10%)                                                 | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022     | 21/08/2022  | \$ 60.000.000,00  |


|                                        |                        |                 |           |            |                  |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Vehículos propios y no propios         | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |
| Responsabilidad civil patronal         | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |
| Responsabilidad civil cruzada          | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |
| Gastos médicos                         | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |
| Daño emergente y lucro cesante         | Seguros del Estado S.A | 65-40-101065233 | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |
| Perjuicios                             | Seguros del Estado S.A | 65-40-          | 6/05/2022 | 21/08/2022 | \$ 60.000.000,00 |

#### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para la autorización del último pago, se verificó la entrega por parte del contratista de la seguridad social y el certificado de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexos a Continuación

  
 Jobanny José Copete Alvarez  
 Supervisor del contrato





