



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA
Secretaría de Salud

El Tolima
nos une

mojod

7

Ibagué, 07 de Diciembre de 2022.

Doctora
KATHERYNE LEÓN MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

7 DIC 2022

355 R
6150
non

ASUNTO: Remisión Solicitud de modificación No.002 al contrato interadministrativo No. 2265 de 2022.

Respetada Doctora.

De la manera más atenta me permito remitir Solicitud de Modificatoria No. 002 al contrato interadministrativo No. 2265 del 29 de Julio del 2022, suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Hospital Centro E.S.E del Municipio de Planadas- Tolima, cuyo objeto es: **"CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS- TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL SUBPROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA"** .

Anexo los siguientes documentos:

1. Solicitud modificatoria de la Secretaria de Salud. cinco (2) Folios.
2. Anexos. Ocho (8) folios.

Agradezco su atención y amabilidad.


VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Directora de Oferta de Servicios
Secretaría de Salud

Proyecto: Ana Maria Lozano-Abogada Contratista Dirección de Oferta 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005	
			Versión: 01	
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 5	
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 06/10/2011	

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:				
Fecha de elaboración de la solicitud:		07	de	Diciembre
			de	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
CONTRATO		X	CONVENIO	
Contrato y/o Convenio número:	2265	De	29 de Julio de 2022	
Objeto del Contrato: "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS- TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL SUBPROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA"				
Supervisor:	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR- Directora de Oferta de Servicios de la Secretaria de Salud			
Contratista y/o Cooperante:	HOSPITAL CENTRO E.S.E DE PLANADAS TOLIMA, NIT. 890.704.555-7			
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	El valor total del Contrato Interadministrativo es de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$695.000.000,00) MCTE			
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO , contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.			
Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:		16	de	Agosto
				de 2022
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:		13	de	Diciembre
				de 2022

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)	
Prórrogas	
Contrato y/o Convenio No.	Tiempo (días calendario)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 5
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:		de		de

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor (\$)
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	

Modificación No.001		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula N°	Descripción
2265	SEXTA- Forma Desembolso	<ul style="list-style-type: none"> • Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuando se acredite el 30% de avance en la ejecución de las obligaciones contractuales, entre ellas haber suscrito contrato de estudios y diseños para la construcción del nuevo Hospital Centro ESE de Planadas Tolima e interventoría respectiva y realización de esquemas básicos de diseños e ingeniera. • Un segundo pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando se acredite el sesenta por ciento (60%) de las actividades contractuales, entrega de anteproyecto recibido a satisfacción por parte de la interventoría y el Hospital Centro ESE de Planadas Tolima. • Un tercer pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando se acredite el 100% de las actividades contractuales correspondientes a estudios y diseños definitivos entregadas a satisfacción por parte de la interventoría y el Hospital Centro ESE de Planadas- Tolima. • Un desembolso final equivalente al diez (10%) del valor del aporte del departamento a la firma de la correspondiente acta de liquidación.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 5
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 06/10/2011

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD				
El presente documento tiene por objeto solicitar una		PRORRGA- CLAUSULA SEUNDA- PLAZO	AL CONTRATO 2265 DEL 29 DE JULIO DE 2022.	
Citado así:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.			
Prórrogas				
Cláusula No.		Tiempo (días calendario)		
2) PLAZO		60 DIAS CALENDARIO, para un plazo total de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO		
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio con la prórroga:		11	de	Febrero de 2023

Adiciones	
Cláusula No.	Valor (\$)
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	
Modificaciones	
Cláusula N°	Descripción
Justificación de la solicitud:	<p>Que mediante oficio No.00703, de fecha del 06 de diciembre de 2022, la E.S.E presenta solicitud de prórroga al contrato interadministrativo – 2265 de 2022, en donde argumenta lo siguiente:</p> <p>“</p> <p>1) “El día 06 de diciembre del año en curso se recibió solicitud de prórroga (fechada del 05 de diciembre) del Contrato de Consultoría No. 269, cuyo objeto es: REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS; suscrita por el Contratista, el Arquitecto HUGO ALBERTO PARRA HOYOS. Cuyo contenido es el siguiente:</p> <p>“(…) ”</p> <p>En el marco de la ejecución del contrato 269-2022 cuyo objeto es “REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO</p>

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 4 de 5
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 06/10/2011

HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS", se han venido realizando las actividades propias del objeto contractual desde la suscripción del acta de inicio hasta la fecha.

Como es de su conocimiento, las lluvias en el país se vieron intensificadas por el fenómeno de la Niña, de tal forma que los mayores acumulados de precipitaciones en el mes de agosto se registraron en zonas de la región andina Departamento del Tolima. Por otra parte, tal como fue predicho en el modelo del IDEAM (fuente: mapas de predicción del IDEAM) para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, el nivel de lluvias aumentó en aproximadamente un 30% respecto a los promedios históricos en la gran mayoría de los departamentos.

Las actividades objeto del contrato de la referencia incluyen dentro de sus actividades levantamiento topográfico, estudio de suelos y levantamiento arquitectónico los cuales han sido afectados ya que el incremento de las lluvias ha generado deslizamientos de tierra, derrumbes y taponamiento de la vía principal dificultando el desplazamiento hacia Planadas tanto del personal como de los equipos necesarios para el estudio de suelos.

Por otra parte, la capacidad instalada proyectada del Hospital, insumo para la elaboración del proyecto en todas sus etapas, fue aprobada por la Ministerio el pasado 25 de noviembre. Adicionalmente, las mesas técnicas realizadas tanto con la Secretaría de Salud Departamental como con el Ministerio de Salud han generado ajustes sobre las propuestas de diseño realizadas por esta consultoría.

Todo lo anteriormente mencionado son factores que han prolongado los tiempos inicialmente estimados para la ejecución del proyecto. Como quiera que todas las situaciones mencionadas son circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito no imputables al consultor, de manera respetuosa solicito una prórroga de sesenta (60) días, tiempo estimado de afectación del plazo de ejecución del contrato (*cursiva fuera de texto*)

(...)"


2) El mismo día 06 de diciembre de la presente anualidad el Ingeniero LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ, envió el concepto técnico considerando viable la solicitud de prórroga del Contrato 269 2022 y adicionalmente solicitó prórroga del Contrato de Consultoría No. 268, cuyo objeto es: INTERVENTORIA A LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 5 de 5
	SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 06/10/2011

	<p>3) <i>Teniendo en cuenta que los contratos mencionados en los numerales anteriores se derivan directamente del Contrato Interadministrativo No. 2265 de fecha 29 de julio de 2022, celebrado entre el Hospital Centro ESE de Planadas y la Gobernación del Tolima, es indispensable para acceder a lo solicitado por el Interventor y el Contratista que el contrato matriz sea prorrogado por sesenta (60) días."</i></p> <p>Por lo anterior, la nueva fecha de finalización del Contrato Interadministrativo No. 2265 del 29 de Julio de 2022, es el día 11 de febrero de 2023.</p>
--	--


MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
 Secretaria de Salud Departamental
 Ordenador Del Gasto


MARLIVI SALAZAR BARRERO
 Gerente
 HOSPITAL CENTRO E.S.E de Planadas
 Contratista


VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
 Directora de Oferta de Servicios
 Secretaria de Salud
 Supervisora

Proyecto: Ana Maria Lozano- Abogada Contratista SST
 Aprobó: Sandra Paola Sánchez Vargas - Asesora Juridica SST 

Planadas, 06 de diciembre de 2022

Señor
MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Secretaria de Salud del Tolima
E. S. D.

Asunto. Solicitud de prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2265 – 2022

MARLIVI SALAZAR BARRERO, actuando en nombre y representación legal del Hospital Centro ESE de Planadas – Tolima, en mi calidad de Gerente, conforme al Decreto de Nombramiento No. 056 de fecha 30 de abril de 2020 y acta de posesión No. 13 de fecha 30 de mayo de 2020; de forma respetuosa me permito solicitar su valiosa colaboración, en el sentido de estudiar la posibilidad de realizar prórroga al Contrato Interadministrativo No. 2265 de fecha 29 de julio de 2022, celebrado entre el Hospital Centro ESE de Planadas y la Gobernación del Tolima, cuyo objeto es: "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS – TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL SUBPROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA". Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:

- 1) El día 06 de diciembre del año en curso se recibió solicitud de prórroga (fechada del 05 de diciembre) del Contrato de Consultoría No. 269, cuyo objeto es: REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS; suscrita por el Contratista, el Arquitecto HUGO ALBERTO PARRA HOYOS. Cuyo contenido es el siguiente:

"(...)

En el marco de la ejecución del contrato 269-2022 cuyo objeto es "REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29

Dispuestos a servir con equidad e integridad





HOSPITAL CENTRO E.S.E.
DE PLANADAS
Nit. 890.704.555-7

DE JULIO DE 2022. CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS", se han venido realizando las actividades propias del objeto contractual desde la suscripción del acta de inicio hasta la fecha.

Como es de su conocimiento, las lluvias en el país se vieron intensificadas por el fenómeno de la Niña, de tal forma que los mayores acumulados de precipitaciones en el mes de agosto se registraron en zonas de la región andina Departamento del Tolima. Por otra parte, tal como fue predicho en el modelo del IDEAM (fuente: mapas de predicción del IDEAM) para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, el nivel de lluvias aumentó en aproximadamente un 30% respecto a los promedios históricos en la gran mayoría de los departamentos.

Las actividades objeto del contrato de la referencia incluyen dentro de sus actividades levantamiento topográfico, estudio de suelos y levantamiento arquitectónico los cuales han sido afectados ya que el incremento de las lluvias ha generado deslizamientos de tierra, derrumbes y taponamiento de la vía principal dificultando el desplazamiento hacia Planadas tanto del personal como de los equipos necesarios para el estudio de suelos.

Por otra parte, la capacidad instalada proyectada del Hospital, insumo para la elaboración del proyecto en todas sus etapas, fue aprobada por la Ministerio el pasado 25 de noviembre. Adicionalmente, las mesas técnicas realizadas tanto con la Secretaria de Salud Departamental como con el Ministerio de Salud han generado ajustes sobre las propuestas de diseño realizadas por esta consultoria.

Todo lo anteriormente mencionado son factores que han prolongado los tiempos inicialmente estimados para la ejecución del proyecto. Como quiera que todas las situaciones mencionadas son circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito no imputables al consultor, de manera respetuosa solicito una prórroga de sesenta (60) días, tiempo estimado de afectación del plazo de ejecución del contrato (*cursiva fuera de texto*)

(...)

- 2) El mismo día 06 de diciembre de la presente anualidad el Ingeniero LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ, envió el concepto técnico considerando viable la solicitud de prórroga del Contrato 269 2022 y adicionalmente solicitó prórroga del Contrato de Consultoría No. 268, cuyo objeto es: INTERVENTORIA A LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022. CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS.

Tratando a todos con equidad e integridad





HOSPITAL CENTRO E.S.E
PLANADAS - TOLIMA
NIT. 890.704.555-7

- 3) Teniendo en cuenta que los contratos mencionados en los numerales anteriores se derivan directamente del Contrato Interadministrativo No. 2265 de fecha 29 de julio de 2022, celebrado entre el Hospital Centro ESE de Planadas y la Gobernación del Tolima, es indispensable para acceder a lo solicitado por el Interventor y el Contratista que el contrato matriz sea prorrogado por sesenta (60) días.

Agradeciendo una pronta respuesta,

Atentamente,

MARLIVI SALAZAR BARRERO
Gerente

- Anexos:
1. Solicitud de prorroga presentada por el Contratista.
 2. Concepto técnico y solicitud de prorroga presentada por el Interventor

PARTICIPACIÓN:	NOMBRE COMPLETO	CARGO O ACTIVIDAD	FECHA	FIRMA
Proyecto:	Oscar Alberto Quintero Horta	Asesor Jurídico	06/12/2022	
Revisó:	Oscar Alberto Quintero Horta	Asesor Jurídico	06/12/2022	
Aprobó:	Sandra Patricia Sánchez Villegas	Subgerente	06/12/2022	
Los arriba firmantes, manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

Dispuestos a servir con equidad e integridad





Bogotá, 5 de diciembre de 2022

Ingeniero
LUIS FERNANDO TRIANA LÓPEZ
Interventor
Contrato 269/2022
HOSPITAL CENTRAL PLANADAS
E.S.M.

Referencia: Solicitud de prórroga Contrato 269-2022

Respetado doctor,

En el marco de la ejecución del contrato 269-2022 cuyo objeto es “REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS”, se han venido realizando las actividades propias del objeto contractual desde la suscripción del acta de inicio hasta la fecha.

Como es de su conocimiento, las lluvias en el país se vieron intensificadas por el fenómeno de la Niña, de tal forma que los mayores acumulados de precipitaciones en el mes de agosto se registraron en zonas de la región andina Departamento del Tolima. Por otra parte, tal como fue predicho en el modelo del IDEAM (fuente: mapas de predicción del IDEAM) para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, el nivel de lluvias aumentó en aproximadamente un 30% respecto a los promedios históricos en la gran mayoría de los departamentos.

Las actividades objeto del contrato de la referencia incluyen dentro de sus actividades levantamiento topográfico, estudio de suelos y levantamiento arquitectónico los cuales han sido afectados ya que el incremento de las lluvias ha generado deslizamientos de tierra, derrumbes y taponamiento de la vía principal dificultando el desplazamiento hacia Planadas tanto del personal como de los equipos necesarios para el estudio de suelos.

Por otra parte, la capacidad instalada proyectada del Hospital, insumo para la elaboración del proyecto en todas sus etapas, fue aprobada por la Ministerio el pasado 25 de noviembre. Adicionalmente, las mesas técnicas realizadas tanto con la Secretaría de Salud Departamental como con el Ministerio de Salud han generado ajustes sobre las propuestas de diseño realizadas por esta consultoría.



Todo lo anteriormente mencionado son factores que han prolongado los tiempos inicialmente estimados para la ejecución del proyecto.

Como quiera que todas las situaciones mencionadas son circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito no imputables al consultor, de manera respetuosa solicito una prórroga de sesenta (60) días, tiempo estimado de afectación del plazo de ejecución del contrato

Cordialmente,

HUGO ALBERTO PARRA HOYOS

Arquitecto

MP. 25700-05946

C.C: Dra. MARLIV SALAZAR BARRERO – Gerente Hospital Centro de Planadas
Dr. OSCAR QUINTERO – Asesor Jurídico Hospital Centro de Planadas

Fwd: Solicitud de prórroga contrato 269/2022 Hospital Central Planadas

2 mensajes

juridico juridico <juridico@hospitalcentroplanadas.gov.co>

6 de diciembre de 2022, 17:44

Para: ventanillaunica ventanillaunica <ventanillaunica@hospitalcentroplanadas.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **juridico juridico** <juridico@hospitalcentroplanadas.gov.co>

Date: mar, 6 dic 2022 a la(s) 16:15

Subject: Re: Solicitud de prórroga contrato 269/2022 Hospital Central Planadas

To: Hugo Alberto Parra Hoyos <hugoparra2009@gmail.com>

Cordial saludo,

De forma respetuosa nos permitimos solicitar el visto bueno de su solicitud por parte del Interventor.

Atentamente,

Hospital Centro ESE de Planadas Tolima

El mar., 6 de diciembre de 2022 4:04 p. m., Hugo Alberto Parra Hoyos <hugoparra2009@gmail.com> escribió:

Atento saludo,

Remitimos para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

----- Forwarded message -----

De: **Hugo Alberto Parra Hoyos** <hugoparra2009@gmail.com>

Date: mar, 6 dic 2022 a las 16:02

Subject: Solicitud de prórroga contrato 269/2022 Hospital Central Planadas

To: <luifer-planinter@outlook.com>

Atento saludo ingeniero,

Anexo remito para su consideración y demás fines pertinentes la solicitud de prórroga del contrato 269/2022 cuyo objeto es la "REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022. CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS".

Cordialmente,

--

HUGO ALBERTO PARRA HOYOS

Arquitecto

www.parraarquitectos.com

--

HUGO ALBERTO PARRA HOYOS

Arquitecto

www.parraarquitectos.com



juridico juridico <juridico@hospitalcentroplanadas.gov.co>

6 de diciembre de 2022, 17:58

Para: ventanillaunica ventanillaunica <ventanillaunica@hospitalcentroplanadas.gov.co>

[Texto citado oculto]



SolicitudProrroga269_2022Fda.pdf

199K



ING. CIVIL - MAGISTER EN INGENIERIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 25202-40971 CND

Ibagué, 06 Diciembre 2022.

Doctora:
Marlivi Salazar barrero
Gerente – Hospital Cetro E.S.E Planadas
Ciudad.

Ref. solicitud prórroga del contrato de consultoría N° 269 del 2022.

De acuerdo al oficio presentado por el contratista de diseños **HUGO ALBERTO PARRA HOYOS** el día 05 de diciembre del 2022 (anexo copia) en donde solicita la prórroga del contrato N° 269 del 02 septiembre 2022 por un tiempo de sesenta (60) días, una vez analizada la propuesta esta interventoría ve viable la ampliación del tiempo de ejecución.

Adicionalmente se debe prorrogar por los mismos sesenta (60) días el contrato N° 268 del 02 de Septiembre de 2022 (interventoría) para que la consultoría de los diseños no se quede sin su respectiva supervisión y revisión por parte de la interventoría externa.

Solicito a usted respetuosamente se realicen todos los tramites respectivos para realizar dichas prorrogas

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente,


LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ.
Interventor

ANEXO: Dos (2) folios

C.C. Archivo



Bogotá, 5 de diciembre de 2022

Ingeniero
LUIS FERNANDO TRIANA LÓPEZ
Interventor
Contrato 269/2022
HOSPITAL CENTRAL PLANADAS
E.S.M.

Referencia: Solicitud de prórroga Contrato 269-2022

Respetado doctor,

En el marco de la ejecución del contrato 269-2022 cuyo objeto es "REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS", se han venido realizando las actividades propias del objeto contractual desde la suscripción del acta de inicio hasta la fecha.

Como es de su conocimiento, las lluvias en el país se vieron intensificadas por el fenómeno de la Niña, de tal forma que los mayores acumulados de precipitaciones en el mes de agosto se registraron en zonas de la región andina Departamento del Tolima. Por otra parte, tal como fue predicho en el modelo del IDEAM (fuente: mapas de predicción del IDEAM) para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, el nivel de lluvias aumentó en aproximadamente un 30% respecto a los promedios históricos en la gran mayoría de los departamentos.

Las actividades objeto del contrato de la referencia incluyen dentro de sus actividades levantamiento topográfico, estudio de suelos y levantamiento arquitectónico los cuales han sido afectados ya que el incremento de las lluvias ha generado deslizamientos de tierra, derrumbes y taponamiento de la vía principal dificultando el desplazamiento hacia Planadas tanto del personal como de los equipos necesarios para el estudio de suelos.

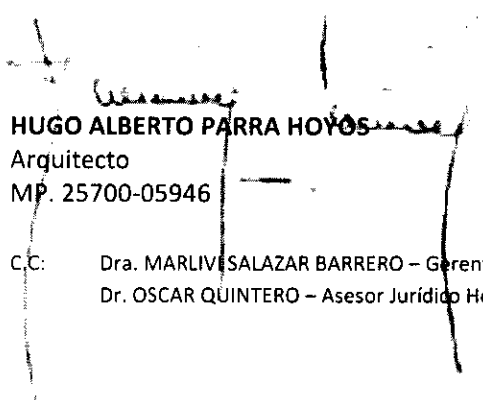
Por otra parte, la capacidad instalada proyectada del Hospital, insumo para la elaboración del proyecto en todas sus etapas, fue aprobada por la Ministerio el pasado 25 de noviembre. Adicionalmente, las mesas técnicas realizadas tanto con la Secretaría de Salud Departamental como con el Ministerio de Salud han generado ajustes sobre las propuestas de diseño realizadas por esta consultoría.



Todo lo anteriormente mencionado son factores que han prolongado los tiempos inicialmente estimados para la ejecución del proyecto.

Como quiera que todas las situaciones mencionadas son circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito no imputables al consultor, de manera respetuosa solicito una prórroga de sesenta (60) días, tiempo estimado de afectación del plazo de ejecución del contrato

Cordialmente,


HUGO ALBERTO PARRA HOYOS

Arquitecto

MP. 25700-05946

C.C: Dra. MARLIV SALAZAR BARRERO – Gerente Hospital Centro de Planadas
Dr. OSCAR QUINTERO – Asesor Jurídico Hospital Centro de Planadas



ventanillaunica ventanillaunica <ventanillaunica@hospitalcentroplanadas.gov.co>

Fwd: SOLICITUD PRORROGA CONTRATOS N° 268-269 DEL 2022

1 mensaje

juridico juridico <juridico@hospitalcentroplanadas.gov.co>

6 de diciembre de 2022, 17:44

Para: ventanillaunica ventanillaunica <ventanillaunica@hospitalcentroplanadas.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Luis Fernando Triana López** <luisfernandotrianalopez@hotmail.com>

Date: mar, 6 dic 2022 a la(s) 17:23

Subject: SOLICITUD PRORROGA CONTRATOS N° 268-269 DEL 2022

To: juridico@hospitalcentroplanadas.gov.co <juridico@hospitalcentroplanadas.gov.co>

BUENAS TARDES

ADJUNTO CARTA DANDO APROBACION SOLICITUD PRORROGA DEL CONTRATO N° 269 DEL 2022



CARTA SOLICITUD PRORROGA PLANADAS.pdf

417K

