

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	oct '18						
								09	16	23	30	07	14	
1														
2			Revisión de diseños arquitectónicos	8 días	jue 20/09/18	lun 01/10/18	depende de la fecha de entrega de los diseños definitivos						depende	
3			Revisión estructural	4 días	lun 01/10/18	jue 04/10/18	se depende de la entrga de insumos por parte de CMH						se dep	
4			Visita técnica y de acercamiento al proyecto	2 días	lun 01/10/18	mar 02/10/18	se realizará visita técnica para reconocimiento de zona y acercamiento con colectivo						se realiz	
5			Entrega de informe técnico	11 días	jue 20/09/18	jue 04/10/18	todo materia que no haya sido enviado no puede ser						todo r	
6			Reunión de aclaraciones técnicas, componetes, arquitectónicos, estruturales, no estruturales, electricos y museograficos.	1 día	vie 05/10/18	vie 05/10/18	se requiere reunión de aclaraciones sobre las especificaciones técnicas arquitectónicas.						se rec	
7			Trámites de permisos retie y retilap	20 días	vie 05/10/18	jue 01/11/18	se realizará la averiguación y ti							
8			Cotización estructura en madera y decisión de compra	5 días	lun 08/10/18	vie 12/10/18	se puede realizar la cotización de la estructura en madera una vez se tengan definidos todos los elementos						s	
9			Fabricación de la estructura	40 días	vie 12/10/18	jue 06/12/18	el fabricante se toma 40 días hábiles							

Proyecto: CRONOGRAMA INICI

Fecha: jue 04/10/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	3					oct '18	
								09	16	23	30	07		
10			Reunión de seguimiento	1 día	vie 12/10/18	vie 12/10/18	reunión de seguimiento semanal del contrato							
11			Proceso de Adquisición de planta	45 días	vie 05/10/18	jue 06/12/18	este item depende de la importación							
12			Adquisición de elementos no estructurales	30 días	jue 11/10/18	mié 21/11/18	se puede realizar la compra una vez se tengan todos los elementos no estructurales							
13			Reunión de seguimiento	1 día	vie 19/10/18	vie 19/10/18	reunión de seguimiento semanal del contrato							
14			Ajustes a proceso de montaje, revisión técnicas	5 días	vie 19/10/18	jue 25/10/18	ajustes a proceso							
15			Reunión de seguimiento	1 día	vie 26/10/18	vie 26/10/18	reunión de seguimiento semanal del contrato							
16			Seguimiento a proceso de fabricación, adquisiciones y montaje.	6 días	sáb 27/10/18	vie 02/11/18	ajustes a proceso							
17			Reunión de seguimiento	1 día	vie 02/11/18	vie 02/11/18	reunión de seguimiento semanal del contrato							
18			Seguimiento a proceso de fabricación, adquisiciones y montaje.	6 días	sáb 03/11/18	vie 09/11/18	ajustes a proceso							
19			Reunión de seguimiento	1 día	vie 09/11/18	vie 09/11/18	reunión de seguimiento semanal del contrato							
20			Seguimiento a proceso de fabricación, adquisiciones y montaje.	6 días	sáb 10/11/18	vie 16/11/18	ajustes a proceso							

Proyecto: CRONOGRAMA INICI
Fecha: jue 04/10/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	oct '18				
								09	16	23	30	07
21			Reunión de seguimiento	1 día	vie 16/11/18	vie 16/11/18	reunión de seguimiento semanal del contrato					
22			Seguimiento a proceso de fabricación, adquisiciones y montaje.	6 días	sáb 17/11/18	vie 23/11/18	ajustes a proceso					
23			Reunión de seguimiento	1 día	vie 23/11/18	vie 23/11/18	reunión de seguimiento semanal del contrato					
24			Seguimiento a proceso de fabricación, adquisiciones y montaje.	6 días	sáb 24/11/18	vie 30/11/18	ajustes a proceso					
25			Reunión de seguimiento	1 día	vie 30/11/18	vie 30/11/18	reunión de seguimiento semanal del contrato					
26			Verificación permisos ante la Alcaldía Municipal de Carmen de Bolivar	2 días	vie 30/11/18	lun 03/12/18	se debe tener la seguridad de los permisos por parte de la					
27			Contratación de personal	5 días	lun 26/11/18	vie 30/11/18	se realizará la contratación del personal para llevar a la					
28			Instalación de personal en campo	2 días	mié 05/12/18	jue 06/12/18	se llevará personal propio desde Bogotá					
29			Adquisición de materiales herramienta menor	3 días	vie 30/11/18	mar 04/12/18						
30			Embalaje y transporte de la estructura	3 días	mié 05/12/18	vie 07/12/18	la estructura y demás elementos se transportarán en tractomula desde bogotá.					
31			Reunión de seguimiento en campo	1 día	vie 07/12/18	vie 07/12/18	se solicita la presencia en campo por parte del coordinador del CMMH para					

Proyecto: CRONOGRAMA INICI
Fecha: jue 04/10/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	8					oct '18	
								09	16	23	30	07	14	
32			Recibo en situ, del material museográfico para su instalación.	3 días	lun 17/12/18	mié 19/12/18	se recibirá todo el material en el pabellón en el Carmen de							
33			Instalación en campo - MONTAJE PABELLÓN, MOTAJE MUSEOGRAFÍA, INSTALACIÓN DE PLANTA.	10 días	vie 07/12/18	jue 20/12/18	el cronograma a hoy ya se encuentra con un atraso de 13 días calendario debido a							
34			Elaboración de manual de montaje	50 días	vie 12/10/18	jue 20/12/18	este manual se irá alimentado							
35			Elaboración de registro audiovisual	50 días	vie 12/10/18	jue 20/12/18	este registro audiovisual se irá							
36			Entrega de manual de montaje y registro audiovisual	1 día	vie 21/12/18	vie 21/12/18	se entregará en la inauguración del proyecto							
37			Entrega de CMMH IGNAUGURACIÓN	1 día	jue 20/12/18	jue 20/12/18	si es posible se hará entrega el 16 de diciembre,pero a la							

Proyecto: CRONOGRAMA INICI

Fecha: jue 04/10/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











nde de la fecha de entrega de los diseños definitivos

depende de la entrga de insumos por parte de CMH

realizará visita técnica para reconocimiento de zona y acercamiento con colectivo

lo materia que no haya sido enviado no puede ser evaluado para su recomendación,este informe se entregará con base en el material sumunistrado y en la visita rea


requiere reunión de aclaraciones sobre las especificaciones técnicas arquitectónicas.

se realizará la averiguación y tramites de permisos de retie y retilap de requerirse.


se puede realizar la cotización de la estructura en madera una vez se tengan definidos todos los elementos estruturales y no estructurales. y el tipo de madera a uti

el fabricante se toma 40 días hábiles

Proyecto: CRONOGRAMA INICI Fecha: jue 04/10/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

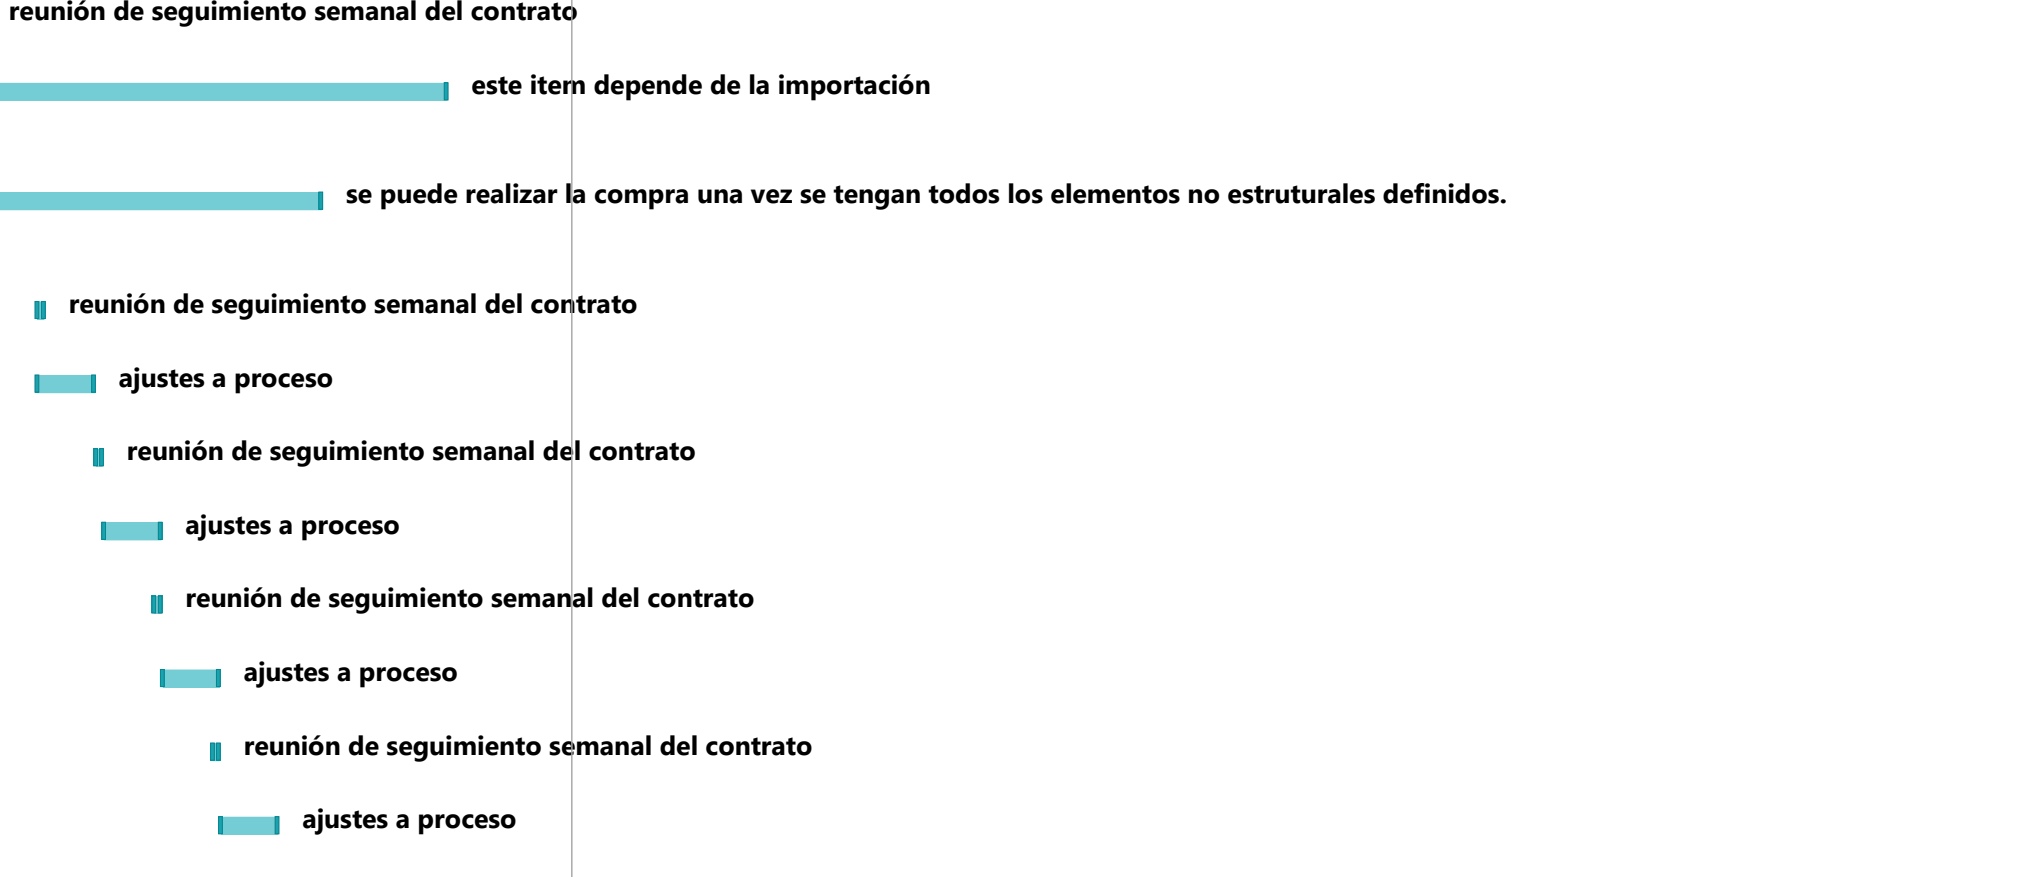

Proyecto: CRONOGRAMA INICI Fecha: jue 04/10/18	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		

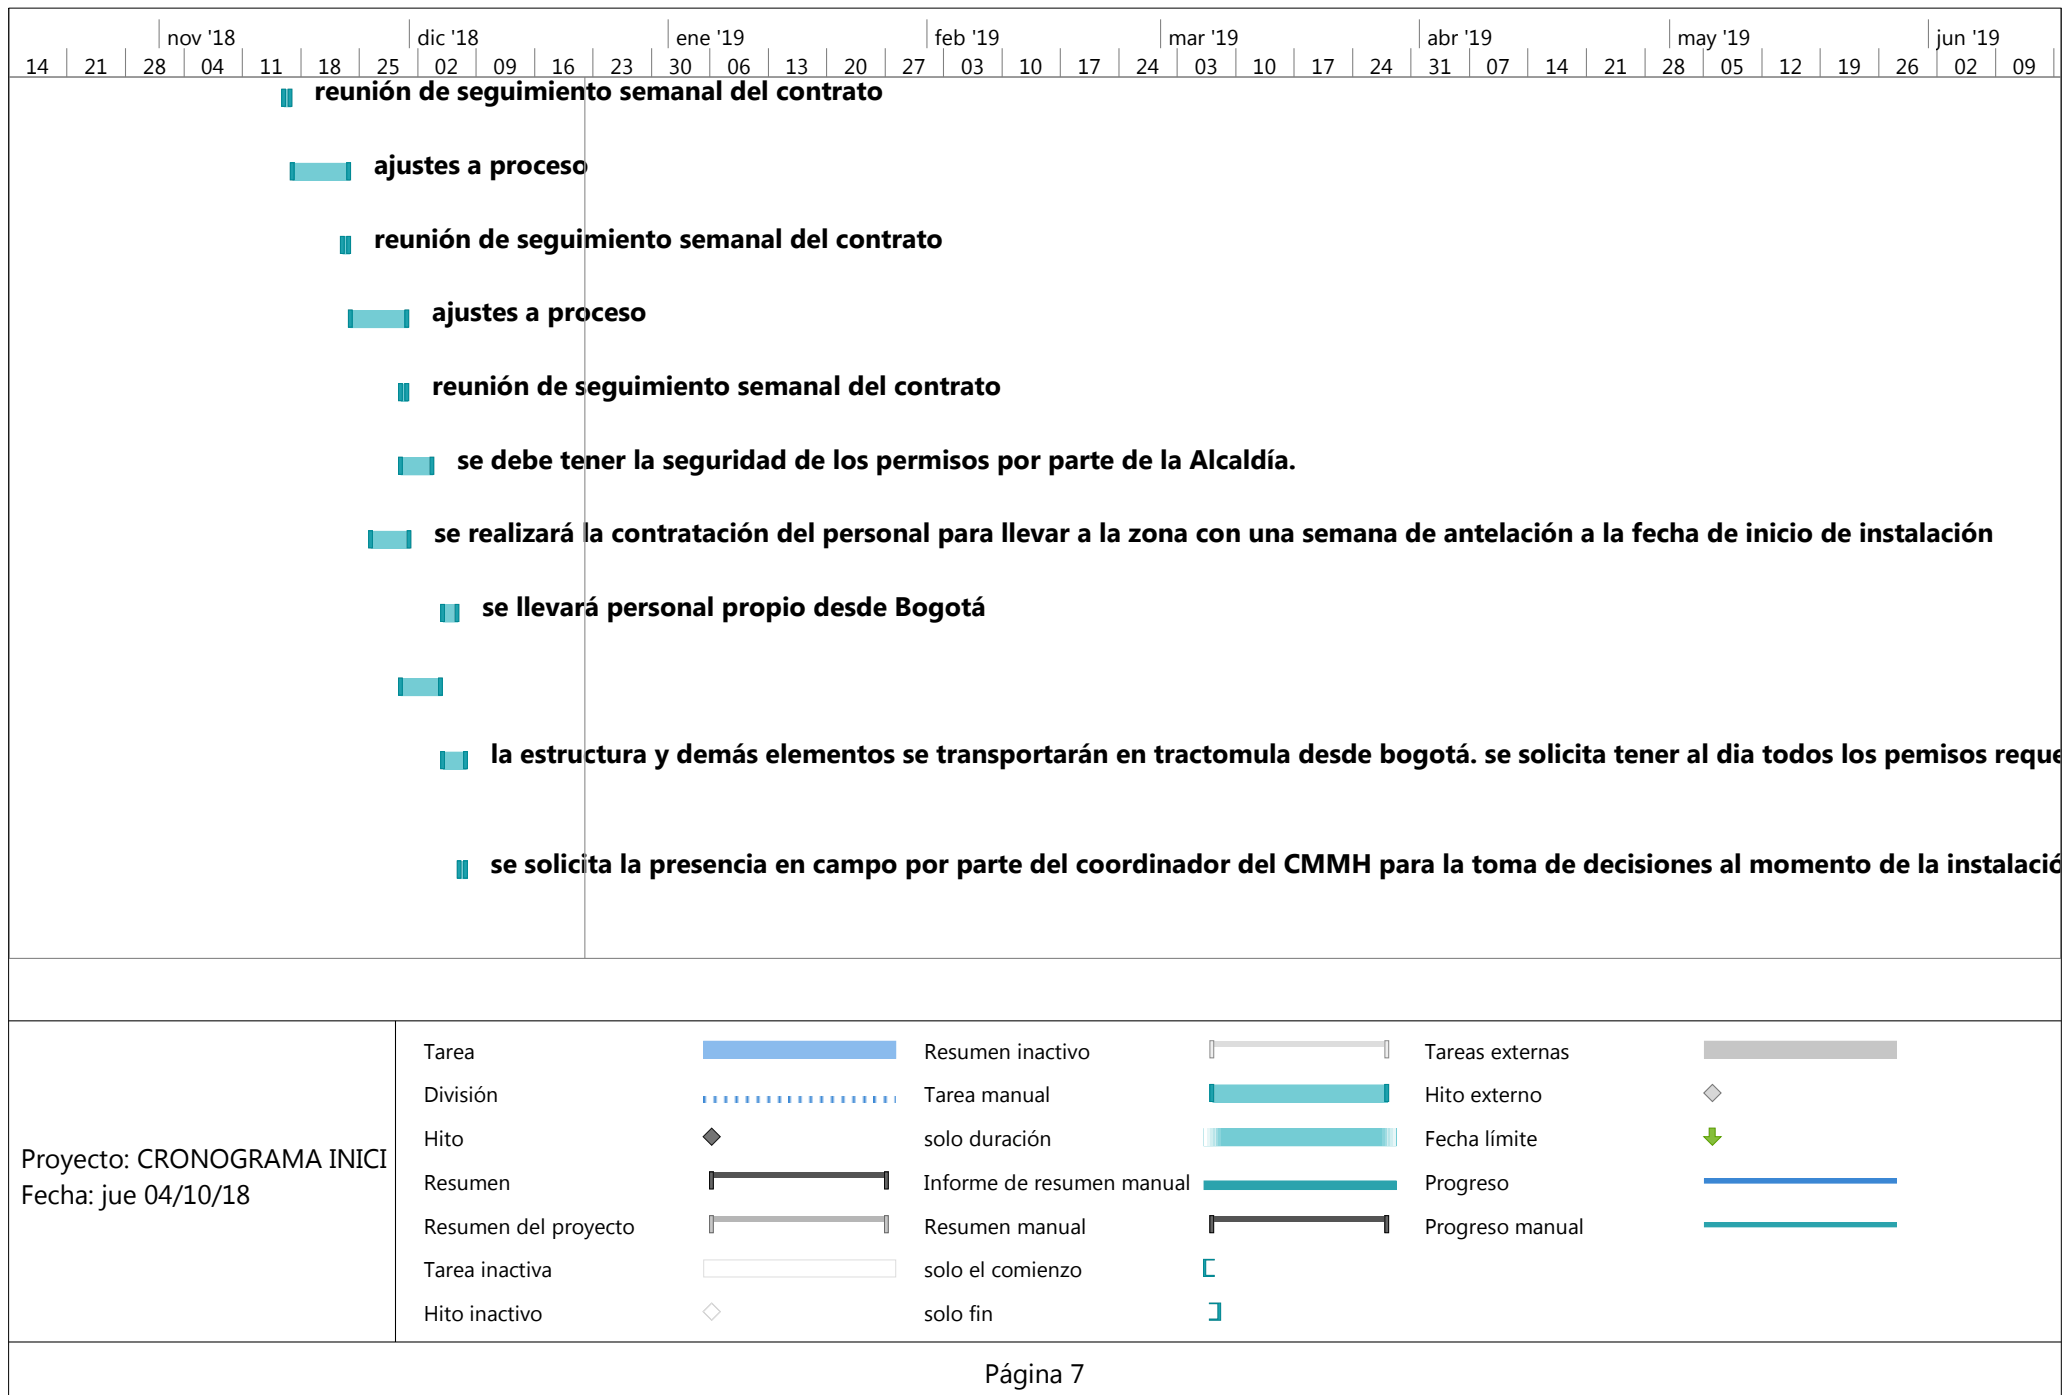

<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA INICI</div> <div>Fecha: jue 04/10/18</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		

Proyecto: CRONOGRAMA INICI
Fecha: jue 04/10/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10

ueridos para tal fin.

ión


Proyecto: CRONOGRAMA INICI
Fecha: jue 04/10/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

contamos con las especificaciones técnicas completas - podemos pagando doble jornal tratar de entregar el 16 de diciembre. (novenas)

nitivas


Proyecto: CRONOGRAMA INICI Fecha: jue 04/10/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

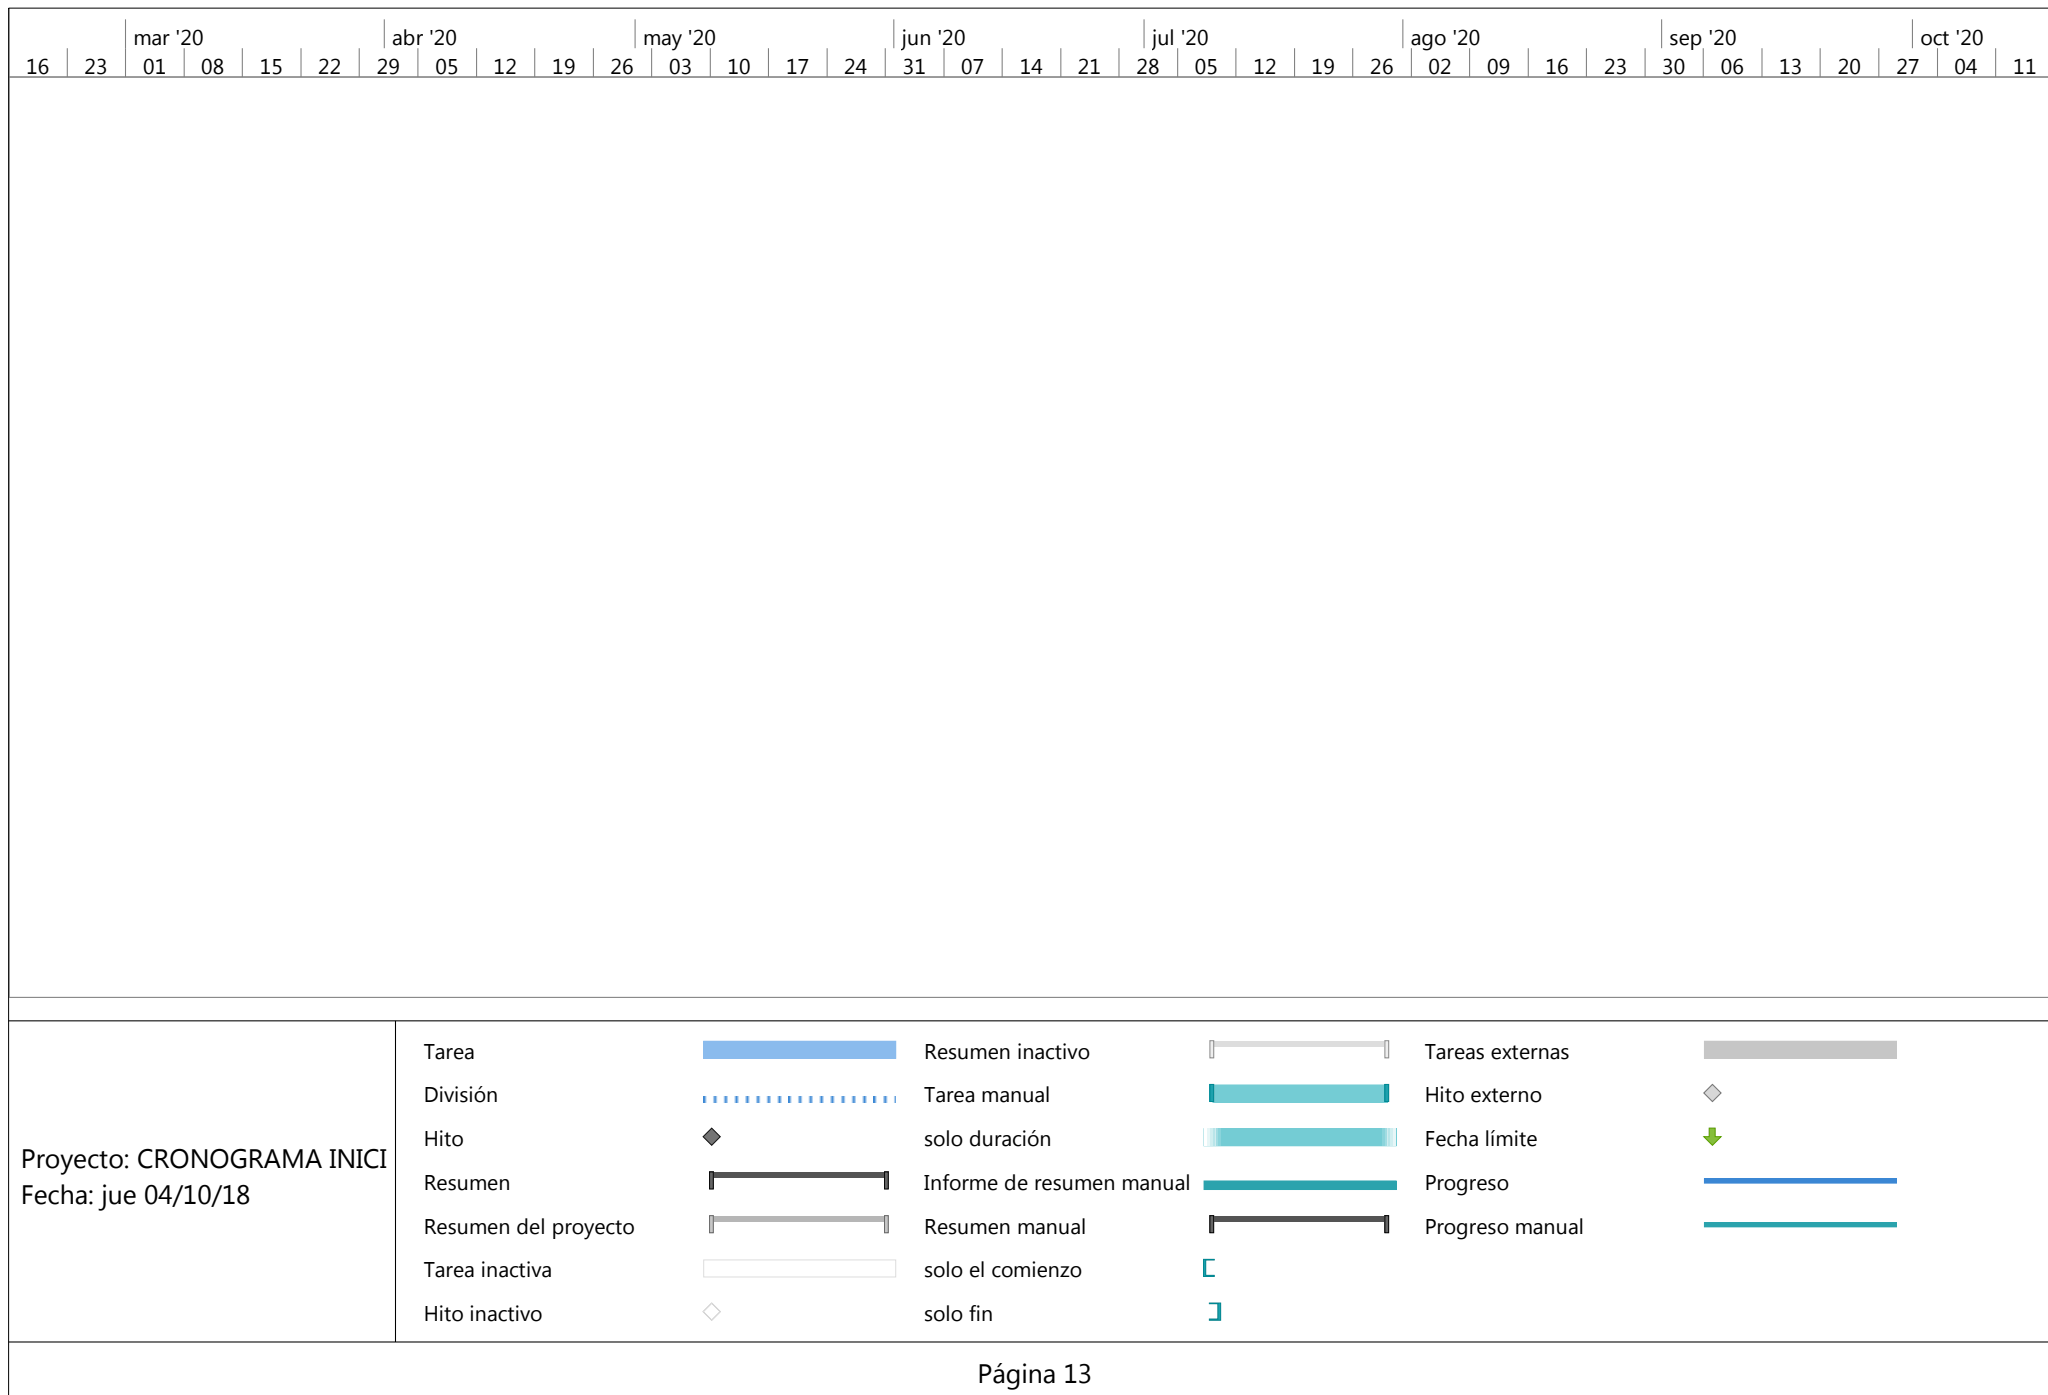

16 | 23 | mar '20 | 01 | 08 | 15 | 22 | abr '20 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | may '20 | 03 | 10 | 17 | 24 | jun '20 | 31 | 07 | 14 | 21 | jul '20 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | ago '20 | 02 | 09 | 16 | 23 | sep '20 | 30 | 06 | 13 | 20 | oct '20 | 27 | 04 | 11 |

Proyecto: CRONOGRAMA INICI
Fecha: jue 04/10/18

Tarea



División



Hito



Resumen



Resumen del proyecto



Tarea inactiva



Hito inactivo



Resumen inactivo



Tarea manual



solo duración



Informe de resumen manual



Resumen manual



solo el comienzo



solo fin



Tareas externas



Hito externo



Fecha límite



Progreso



Progreso manual





<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA INICI</div> <div>Fecha: jue 04/10/18</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		

Proyecto: CRONOGRAMA INICI

Fecha: jue 04/10/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA INICI</div> <div>Fecha: jue 04/10/18</div> </div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: CRONOGRAMA INICI

Fecha: jue 04/10/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA INICI</div> <div>Fecha: jue 04/10/18</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		



<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA INICI</div> <div>Fecha: jue 04/10/18</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		
