

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 4: Maquinaria y equipos.

MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO


[illegible]

Nota: Se debe anexar los certificados de mantenimiento.


Contratista ambiental

CIELO E LOPEZ

Interventoría ambiental



PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO EN OBRA

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Fecha: 23 6 23

[illegible]

Gasoline Engine | Motor Gasolina | Motor Gasolina

TE40ZX-XP

152

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Part Number Código Código	004-039
Model Modelo Modelo	TE40ZX-XP
Product Producto Produto	Gasoline Engine Motor Gasolina Motor Gasolina
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerador Per Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinder Monocilíndrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	4.0 HP
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	3.5 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	149 cc
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	No Tank Sin Tanque Sem Tanque
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	0.45 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	10W30
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	3400 RPM
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Recoil Start Arranque Manual Manual Retrátil
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Oil Sensor Alerta De Aceite Alerta De Óleo	No No Não
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	For Tamping Rammer Para Compactador de Solo Para Compactador de Solo

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8407.90.00
Net Weight Peso Neto Peso Líquido	15 kg
Gross Weight Peso Bruto Peso Bruto	17 kg
Box Dimension Tamanho de la Caja Dimensão da Caixa	355 x 340 x 390 mm
EAN	7898438034352
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	6

ANEXO 5

158

RGB Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Controlista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-057
		Versión: 001
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Fecha: 30/11/2017
		Página 1 de 1

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS	
MAQUINA/EQUIPO	CODIGO
COMPRESOR SPEEDAIR	C37930
TAREA	PERIODICIDAD
LIMPIEZA EQUIPO EN GENERAL	DESPUES DE CADA USO
CAMBIO DE ACEITE	CADA 1500 HORAS TRABAJADAS
MANTENIMIENTO ELECTRICO	2 VECEZ AL AÑO
CAMBIO DE FILTROS	CADA 500 HORAS TRABAJADAS
CONTROL GENERAL DE LOS DISTINTOS COMPONENTES POR PARTE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO	CADA 3000 HORAS TRABAJADAS
SUSTITUCION DEL ELEMENTO SEPARADOR DE AIRE	CADA 2000 HORAS TRABAJADAS
APROBACIÓN DEL LISTADO	
FECHA: 7/12/2019	FIRMA: 
APROBADO POR: RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
VºBº GERENCIA: RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
OBSERVACIONES:	

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001 Fecha: 30/11/2017 Página 1 de 1


FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			
CODIGO: C37930		FABRICANTE: SPEEDAIR	
FECHA ENTRADA: 13/03/2023		FECHA FABRICACIÓN : 2015	
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: compresores portátiles con caudal de 2 m³/min a 44 m³/min a presiones de 7 a 35 bar.			
CONTACTOS			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	TELEFONO
JOSE IGLESIAS	TECNICO EN REPARACION	ALKICON	3127925927




159

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001
			Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
HISTORIAL DE REVISIONES/REPARACIONES			
MAQUINA/EQUIPO		CODIGO	
COMPRESOR SPEEDAIR		C37930	
TAREA (DESCRIPCIÓN, HORAS, PERSONAL, REPUESTOS, IMPORTE, ETC)		HORA/Fecha	
Cambio de aceite y limpieza de motor ENCARGADO: ALKICON		INICIO: 2:00 pm 22-03-2023	
		FINALIZACIÓN: 4:00 pm 22-03-2023	
ENCARGADO:		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
			Versión: 001
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			
CODIGO: CP-2		FABRICANTE: HUSQVARNA	
FECHA ENTRADA: 06/03/2023		FECHA FABRICACIÓN : 2023	
DESCRIPCION DEL EQUIPO: CORTADORA DE PISO A GASOLINA			
CONTACTOS			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	TELEFONO
JOSE IGLESIAS	TECNICO EN REPARACION	ALKYCON	3127925927
			

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001
			Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS			
MAQUINA/EQUIPO		CODIGO	
CORTADORA DE PISO		CP-2	
TAREA		PERIODICIDAD	
CAMBIO DE ACEITE		CADA 2 MESES	
LIMPIEZA DEL EQUIPO		CADA QUE SE UTILICE	
MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS		2 VECES AL AÑO	
APROBACIÓN DEL LISTADO			
FECHA: 7/12/2019		FIRMA: 	
APROBADO POR: RICARDO GUERRA BARRIENTOS			
VºBº GERENCIA: RICARDO GUERRA BARRIENTOS			
OBSERVACIONES:			

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001
			Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
HISTORIAL DE REVISIONES/REPARACIONES			
MAQUINA/EQUIPO		CODIGO	
CORTADORA DE PISO		CP-2	
TAREA (DESCRIPCIÓN, HORAS, PERSONAL, REPUESTOS, IMPORTE, ETC)		HORA/Fecha	
		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:			
		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:			
		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:			
		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:			



LEIS MAQUINARIAS

CORTADORA DE PAVIMENTOS

Una cortadora de hormigón tardío ergonómica, útil para servicios y trabajos de reparación pequeños tales como aceras, entradas y calles de la ciudad. Corta zanjas para la colocación de tubería así como canales para colocación de cables. Hace juntas de expansión en los pisos de concreto.

Las cortadoras Husqvarna poseen manillas ajustables para permitir bajas vibraciones y una posición de trabajo ergonómica. También su excelente distribución de peso permite una excelente estabilidad al cortar.



Manillar Antivibración



Manubrio Ajustable



Indicador de Profundidad

Características:

- Cortadora de suelos de excelente diseño.
- Fácil de transportar y cargar.
- Tanque de agua integrado.
- Óptimo poder de transmisión hacia la cadena gracias al sistema Poly-V™.
- Manubrio ajustable y de poca vibración aumenta el confort del operador.

Cortadora de pavimentos tardíos

Marca	Husqvarna
Modelo	FS400LV
Origen	USA
Dimensiones	1067 x 508 x 991 mm
Peso	99 Kg

Motor

Motor	Honda GX390 (gasolina)
Hp	11
RPM	3600
Capacidad combustible	6.1 L

Equipo

Máxima Capacidad de disco	450 mm
Profundidad de corte	168 mm
Control de profundidad	Manual
Velocidad del eje del disco	2800 RPM
Enfriamiento	Aire forzado

Martillos Picadores y Rompedores



Diseñados para durar

mac³

Competencia MAC3

Gracias a décadas de experiencia en la tecnología de aire comprimido, MAC3 controla cada paso del proceso de la fabricación de martillos neumáticos, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eficientes y ergonómicos.


INGENIERÍA

Diseño y modelado 3D de martillos neumáticos



MECANIZADO

Centros de mecanizado CNC
Perforación de cilindros enteros

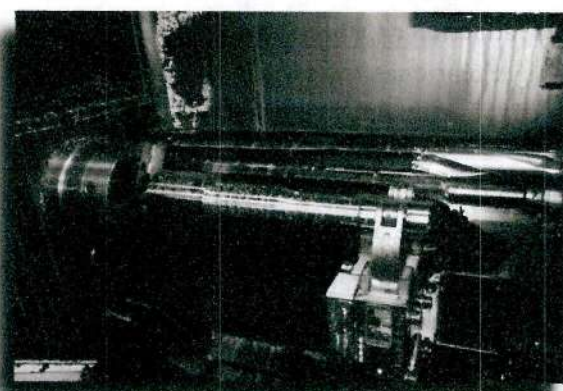

FABRICACIÓN

Montaje hecho por operadores calificados



PRUEBAS

Validación del
rendimiento de
cada martillo

Desde el diseño hasta la entrega al usuario, MAC3 hace todo lo posible para proporcionar soluciones garantizando una calidad inigualable y duradera de sus martillos.

Nuevas perspectivas para la eficiencia

MAC3 presenta nuevas oportunidades desde el punto de vista de la **ergonomía** y de la **eficiencia**, gracias a la mejora continua de sus martillos neumáticos.

★ EMPUÑADURAS ANTIVIBRATORIAS

70% de reducción de vibraciones.

► Menos vibraciones que limitan el impacto negativo sobre el operador.

★ SILENCIADO

50% menos de emisión de ruido.

► Esto reduce significativamente los riesgos de daño en la audición del usuario.

★ ENSAMBLAJE OPTIMIZADO

40% menos de piezas móviles.

► Confiere una vida útil más larga mientras reduce las operaciones de mantenimiento.

★ EFICIENCIA ENERGÉTICA

40% más de productividad.

► Martillos más ligeros y más potentes que consumen menos energía: un operador puede realizar el mismo trabajo con menor impacto físico.

Nuestros productos están diseñados y fabricados por equipos calificados para ofrecer herramientas confiables y eficientes garantizando una ergonomía inigualable y un trabajo más seguro.

1 Cilindros mecanizados en una sola pieza


- Piezas de desgaste limitadas
- Durabilidad de la herramienta

2 Tratamiento térmico del cilindro

- Óptimas propiedades mecánicas
- Ninguna necesidad de lubricación

3 Tratamiento de superficie niquelado

- Mejor protección contra la corrosión

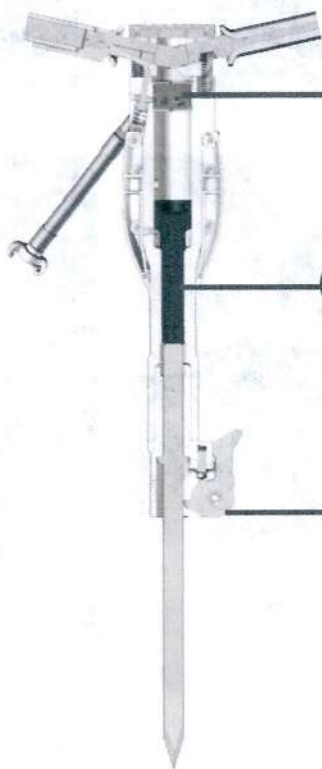

4 Acceso cómodo a la válvula de distribución

- Fácil mantenimiento

5 Impacto directo del pistón en el colchón de aire

- Rendimiento más alto
- Fiabilidad y durabilidad
- Facilidad de uso

6 Retenedor de pestillo o de tornillo de doble rosca

- Cambio de herramientas rápido y seguro



7 Empuñaduras ergonómicas disponibles

- Óptima seguridad para los operadores



Martillos Rompedores

POTENCIA y FIABILIDAD para todos los trabajos de media y pesada demolición en el sector de la construcción.



BB32



BB40
silenciado

Vibraciones amortiguadas

Reducir el impacto de las vibraciones sobre el operador se ha convertido en la mayor preocupación en ciertas áreas geográficas.

Los rompedores MAC3 con empuñaduras con sistema de antivibración tienen una fuerza de impacto equivalente a un rompedor estándar, y reducen en el mismo tiempo las vibraciones para el operador.



BB25
anti-vibración

Rompedores estándar

Los rompedores estándares están disponibles en versión básica o en versión silenciada, la que con su diseño delgado de silenciador ofrece la vista completa del trabajo mientras reduce significativamente el ruido. El silenciador puede suministrarse también en el kit que se adicionará después a un rompedor estándar.

Rompedores con diseño ergonómico mejorado

MAC3 ha creado soluciones para una óptima comodidad de uso junto con la seguridad mejorada de funcionamiento. El objetivo es de evitar los riesgos de heridas al usuario y limitar su exposición a los accidentes de trabajo.



★ **Protección de manos:** para mayor seguridad en el trabajo, en particular en las zanjas, hemos agregado las protecciones de manos para evitar daños a los dedos del operador manteniendo manejo fácil de rompedor.

★ **Gatillo de seguridad:** para impedir el accionamiento accidental de rompedor poniendo en peligro el operador, MAC3 ha diseñado un doble comando de seguridad. Para utilizar el martillo, el operador deberá accionar simultáneamente los dos gatillos opuestos.

Modelo	Silenciador (1)	Anti- vibración	Protección de manos	Seguridad (1)	Peso		Longitud		Cadencia de impacto golpes/min.	Consumo de aire		Enmangadura		
					kg	lb	mm	pulg.		l/s	pcm	Tipo	mm	pulg.
BB15	•	na	o	o	17.5	38	570	22.4	1 400	20	42.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
BB15	•	na	o	o	19	41	596	23.5	1 400	20	42.4	Hex	25 x 108	1" x 4 1/4"
BB20	•	•	na	o	20.9	46	660	26.0	1 300	18.3	38.8	Hex	25 x 108	1" x 4 1/4"
BB25	•	•	na	o	24.2	53	718	28.3	1 300	20	42.4	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB25	•	•	na	o	24.2	53	718	28.3	1 300	20	42.4	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"
BB27	•	na	o	o	26	57.3	704	27.7	1 200	20	42.4	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB27	•	na	o	o	26	57.3	704	27.7	1 200	20	42.4	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"
BB32	o	na	o	o	32	71	704	27.7	1 150	20	42.4	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB32	o	na	o	o	32	71	704	27.7	1 150	20	42.4	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"
BB40	o	na	o	o	38	84	720	28.3	1 100	26.7	56.5	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB40	o	na	o	o	38	84	720	28.3	1 100	26.7	56.5	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"

• = estándar ; o = opción ; na = non aplicable ; (1) = obligatorio en las zonas que requieren marcado CE

Martillos Picadores y Cinceladores

PRECISIÓN y EFICIENCIA para todos los trabajos de demolición pequeña y mediana en la construcción, la minería y las canteras.



Martillos cinceladores

Estas herramientas son la solución fiable para aplicaciones que requieren mayor precisión, junto con una buena potencia de impacto.

Equipado con una empuñadura en "D", están disponibles en versión estándar o en versión con seguridad reforzada que impide el funcionamiento accidental del gatillo.

Cinceladores MAC3 integran un sistema de fijación de herramientas rápido y segurizado.



Martillos picadores

Diseñados para aplicaciones en trabajos de demolición que requieren mayor potencia del impacto, picadores MAC3 se adaptan para las posiciones horizontales así como verticales.

Su diseño delgado permite fácil manejo, incluso en espacios restringidos.

Picadores MAC3 integran un sistema de fijación de herramientas rápido y segurizado, con retenedor de tornillo o de pestillo.

Modelo	Seguridad (1)	Tipo de retenedor	Peso		Longitud		Cadencia de impacto golpes/min.	Consumo de aire		Enmangadura		
			kg	lb	mm	pulg.		l/s	pcm	Tipo	mm	pulg.
P5	o	tornillo	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P5	o	tornillo	5.1	11.3	364	14.3	2 800	8.3	17.6	Con	23/16 x 70	5/8" x 2 3/4"
P5	o	muelle	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Rd	17,3	.680"
P5	o	muelle	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Hex	14,7	.580"
P5	o	tornillo	5.1	11.3	364	14.3	2 800	8.3	17.6	Rd	17 x 60	43/64" x 2 23/64"
P5	o	tornillo	6.2	13.7	392	15.4	2 800	8.3	17.6	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	7	15.5	437	17.2	2 200	15	31.8	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	6.8	15	422	16.6	2 200	15	31.8	Rd	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	6.8	15	422	16.6	2 200	15	31.8	RdHex	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	7	15.5	420	16.5	2 200	15	31.8	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P9	o	tornillo	8.6	19	460	18.1	1 800	16.7	35.4	Rd	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P9	o	tornillo	8.6	19	460	18.1	1 800	16.7	35.4	RdHex	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P9	o	muelle	9	19.9	406	16	1 600	20	42.4	Rd	17,3	.680"
P9	o	muelle	9	19.9	406	16	1 600	20	42.4	Hex	14,7	.580"
P9	o	tornillo	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P9	o	tornillo	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	25 x 75	1" x 3"
P9	o	tornillo	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	26 x 70	1 1/32" x 2 3/4"
P9	o	tornillo	8.6	19	458	18	1 800	16.7	35.4	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P9	o	pestillo	9.8	21.6	495	19.5	1 800	16.7	35.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
P13	o	tornillo	12.9	28.4	529	20.8	1 500	20	42.4	Rd	26 x 70	1 1/32" x 2 3/4"
P13	o	pestillo	14	30.9	584	23	1 500	20	42.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
P13	o	tornillo	13	28.7	540	21.3	1 500	20	42.4	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P13	o	tornillo	13	28.7	540	21.3	1 500	20	42.4	Rd	25 x 75	1" x 3"

• = estándar ; o = opción ; (1) = obligatorio en las zonas que requieren marcado CE

Accesorios

Martillo	Tipo					
		Pico	Cinzel	Pala estrecha	Pala ancha	Manguera
P5	Hex	✓	✓	✓		✓
P5	Con	✓	✓	✓*		✓
P5	Rd	✓	✓			✓
P7	Rd	✓	✓			✓
P9	Hex	✓	✓	✓	✓	✓
P9	Rd	✓	✓			✓
P13	Hex	✓	✓	✓	✓	✓
P13	Rd	✓	✓	✓*	✓*	✓
BB	Hex	✓	✓	✓	✓	incluida

* = necesita montaje de un collarín de fijación específico



Maletín P5

Picador P5 + 1 pico
+ 1 cinzel + 1 manguera



Anticongelante

Aceite anticongelante en latas de 2L
para condiciones invernales



Soluciones de Aire Comprimido



MAC3 le propone una amplia oferta de equipos de aire comprimido para:

- ▶ aplicaciones en la construcción: **compresores móviles** desde 2,0 hasta 5,0 m³/min – 70 hasta 180 PCM
- ▶ chorreo y enlucido: **arenadora** de 70 L y **equipo de enlucido**
- ▶ aplicaciones industriales: **compresores estacionarios** desde 2 hasta 315 kW – 3 hasta 430 HP



www.mac3europe.com



Equipo conforme a la
normativa europea
en vigor.

10, Allée du Canal
F-42160 Saint Cyprien
Francia
tél: +33 (0)4 77 02 13 08
fax: +33 (0)4 77 02 20 28
email: contact@mac3europe.com

Distribuido por:

MARTILLOS ROMPEDORES



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de una pieza mecanizado en la masa
 - Número limitado de piezas
 - Mejor resistencia con el tiempo
 - Optimización del rendimiento
- Acero tratado
 - Optimización de las características mecánicas
 - Autolubricación para el funcionamiento
- Tratamiento de la superficie en el zincado
 - Una mayor protección contra la corrosión
- Golpe directo en el colchón de aire
 - Fiabilidad y longevidad
 - Comodidad de uso
- Distribución de fácil acceso
 - Un fácil mantenimiento
- Retenedor de pestillo
 - Cambios rápidos de herramientas
 - Seguridad del usuario

Ficha Técnica

Sierra Circular Bosch GKS 150

Gran rendimiento y resistencia para cortes brutos


- Asequible pero fiable: calidad Bosch a un precio asequible, la mejor opción para los profesionales que miran el precio.
- Facilidad de uso: - La visión clara del corte en la placa base aumenta la precisión del mismo - Robusta asa auxiliar para mayor estabilidad de corte
- Manejabilidad y fantástica ergonomía: - Diseño compacto, robustez, más potencia y menos peso - El diseño ergonómico y el material resistente aumentan la durabilidad



El paquete incluye:

- Llave macho hexagonal
- Caja de cartón
- 1 hoja de sierra circular, Eco for Wood, 184 x 2,2 / 1,4 x 20 mm,
- Tope paralelo (número de pieza de recambio: 1 600 A01 4HJ)

Potencia absorbida*	1.500 W
Diámetro del disco de sierra*	184 mm
Profundidad de corte (90°)*	64 mm



MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXCAVADORA

Vi030-6B

(S/N BF284 y superior)

Vi035-6B

(S/N BF938 y superior)

YANMAR

Puntos de inspección y servicio	Página
---------------------------------	--------

■ Inspección antes del arranque

Inspección y vuelta a llenar del agua de enfriamiento	139
Inspección y vuelta a llenar del aceite de motor	141
Inspección del nivel de combustible en el tanque de combustible y reabastecimiento de combustible	142
Inspección y vuelta a llenar del tanque de aceite hidráulico	144
Inspección de la tensión de la correa del ventilador	145
Inspección y vuelta a llenar de electrolito la batería	146
Engrasado	147
Inspección del equipo eléctrico	148

■ Cada 50 horas

Engrase del engranaje del giro y el cojinete de giro	279
Drenado del agua y depósitos en el tanque de combustible	279

■ Cada 100 horas

Limpieza del elemento del separador de agua	280
---	-----

■ Cada 250 horas

Inspección y ajuste de la tensión de la correa del ventilador	281
Inspección y limpieza del depurador de aire	283
Inspección y vuelta a llenar del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes	285

■ Cada 500 horas

Reemplazo del filtro de combustible	289
Cambio del aceite de motor y del elemento del filtro de aceite de motor	291
Inspección y limpieza de la aleta del radiador y enfriador de aceite	293
Reemplazo del elemento del depurador de aire	294
Reemplazo del elemento del filtro de retorno de aceite hidráulico	295

■ Cada 1000 horas

Cambio del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes de marcha	296
Cambio del aceite hidráulico y limpieza del elemento del filtro de aspiración	300
Inspección y ajuste de las holguras de las válvulas de admisión/escape	Consulte a su distribuidor

■ Cada 1500 horas

Inspección y ajuste de la bomba de inyección de combustible.	Consulte a su distribuidor
Inspección, limpieza y comprobación de la válvula de inyección de combustible.	Consulte a su distribuidor
Inspección del sistema de ventilación del cigüeñal	Consulte a su distribuidor

■ Cada 2000 horas

Limpieza del interior del sistema de enfriamiento	303
Inspección del acumulador	307

Listado de inspecciones y servicios periódicos

◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa

Artículos para la inspección y servicio		Diana- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Información general	Verifique el desprendimiento y rotura de piezas	◇							
	Inspeccione los pernos y tuercas sueltos, reapretar	◇							
	Inspeccione el estado del motor	◇							
	Limpie	□							
Aceite de com- bustible	Compruebe y suministre aceite al tan- que	◇(○)							
	Purgue el tanque de combustible		□						
	Separador de agua	Compruebe, drene	◇						
		Limpie		□					
	Cambie el elemento del filtro de com- bustible					●			
Aceite de lubri- cación	Aceite de motor	Compruebe, vuelva a suministrar	◇						
		Sustituya				●			
	Cambie el elemento del filtro de aceite del motor					●			
	Aceite de engr- naje reductor de la marcha	Compruebe, vuelva a suministrar			○				
		Sustituya		● 1.ª vez			●		
Agua de enfri- amiento	Verifique y llene el agua de enfri- amiento	◇							
	Compruebe la existencia de fugas de agua de enfriamiento	◇							
	Verifique y limpie las aletas del radia- dor					□			
	Inspeccione y ajuste la tensión de la correa del ventilador	◇			□				
	Sustituya el agua de enfriamiento								● dentro de dos años
	Limpie e inspeccione el sistema del agua de enfriamiento								● dentro de dos años
Manguera de caucho	Inspeccione y cambie la tubería del aceite del combustible, tubería del agua de enfriamiento	◇				□			
Depurador de aire	Limpie el depurador de aire					●			
	Sustituya el elemento del depurador de aire								

Artículos para la inspección y servicio			Verifique	Suministre	Remplace	Ajuste (limpieza)	Aceite y grasa			
			Diaria-mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Sistema hidráulico	Aceite hidráulico	Compruebe, vuelva a suministrar	◇							
		Sustituya						●		
	Limpie el filtro de aspiración					□ 1.ª vez		□		
	Cambie el filtro de retorno					● 1.ª vez	●			
	Compruebe la existencia de anomalías en la bomba hidráulica		◇							
	Compruebe el funcionamiento del acumulador									◇
Grasa	Inspeccione las posiciones de engrase, engrase		■							
	Engrasado de los engranajes de giro y de los cojinetes de giro			■						
Tren	Inspeccione, ajuste la tensión de la oruga		◇							
Equipo de control	Compruebe el rendimiento, juego de las palancas de desplazamiento (pedales)		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego de las palancas de control		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego de la palanca de la pala		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego del pedal de giro de la pluma		◇							
	Compruebe el rendimiento del dial de control del motor		◇							
Equipo eléctrico	Inspeccione las luces de trabajo, bocina		◇							
	Inspeccione la función del contador horario		◇							
	Inspeccione el funcionamiento del monitor LCD		◇							
	Inspeccione los indicadores LED		◇							
	Inspeccione si hay cables rotos, cortocircuitos, reapriete los terminales sueltos		◇							
	Inspeccione, suministre líquido de batería		◇							
	Compruebe la gravedad específica del electrolito							□ Según sea necesario		

Artículos para la inspección y servicio		◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa							
		Diaria- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Motor	Inspeccione y ajuste la holgura de la válvula de escape y admisión								
	Inspeccione y ajuste la bomba de inyección de combustible						□		
	Inspeccione, limpie y compruebe la válvula de inyección de combustible							◇/Según sea necesario	
	Inspeccione el sistema de ventilación del cigüeñal							◇	

Nota :

- Cuando la máquina se use en lugares de trabajo con polvo, limpie y reemplace el elemento del filtro dos veces o más frecuentemente que lo que se especifica en la tabla.
- Es indispensable realizar las inspecciones y servicios periódicos para cumplir con los reglamentos de control de emisiones de la EPA (agencia de protección del medio ambiente). Mantenga un registro de los resultados.

PARTE EQUIPOS

GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA

REPORTE TÉCNICO

CÓDIGO:

FO_STP_15

FECHA DE VIGENCIA:

15/09/2014

FECHA Y HORA DE INICIO:

21/09/2013

CLIENTE:

EQUIPO:

SERIE:

LUGAR:

San Antonio Pinar

TÉLEFONO:

MODELO:

HOROMETRO:

2512

ORDEN DE TRABAJO:

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO:

TEMPERATURA AMBIENTE:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNOSTICO ☐

MANTENIMIENTO ☒

REPARACIÓN ☐

GARANTÍA ☐

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo 250 hrs

CAUSA DE LA FALLA:

Tiempo Comptido

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Revisión y ajuste de combustible
Aceite Motor
Filtro de combustible
Temperatura General

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

EQUIPO DISPONIBLE:

SI ☐

NO ☐

POR QUE?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

Clave Reporte Pudo Completar Pasa de 250 a 2512
Un tiempo de trabajo (6 hrs)

TÉCNICOS:

RECIBI A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

DETALLES TIEMPOS EMPLEADOS

FECHA	MOTIVO	HORAS	COMENTARIOS
	DIAGNÓSTICO		
	REPARACIÓN O INTERVENCIÓN		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO IDA		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO REGRESO		
	OTROS		

PARTE EQUIPOS

GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA

REPORTE TÉCNICO

CÓDIGO:

FO_STP_15

FECHA DE VIGENCIA:

15/09/2014

FECHA Y HORA DE INICIO: 15-09-2014 11:00

LUGAR: San Carlos P.

2542

CLIENTE: [Handwritten]

TÉLEFONO: [Handwritten]

EQUIPO: [Handwritten]

MODELO: [Handwritten]

SERIE: [Handwritten]

HOROMETRO: [Handwritten]

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO: [Handwritten]

TEMPERATURA AMBIENTE:

ORDEN DE TRABAJO:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNOSTICO ☐

MANTENIMIENTO ☒

REPARACIÓN ☐

GARANTÍA ☐

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo reductores de transmisión
Cambio Aceite primeros 50 horas

CAUSA DE LA FALLA:

Aquecimiento de componentes

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Se limpiaron tapones de drenaje
- Se colocaron en posición de drenaje
- Se drenó aceite reductores
- Se agregó Aceite SAE 80W-90
- Se programó próximos mantenimiento

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

- Mantener periódico, inspección visual y operacional
- Cuidar el inicio de labor

EQUIPO DISPONIBLE: SI ☒ NO ☐ POR QUÉ?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT
Aceite SAE 80W-90	500ml		

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

La máquina está en buenas condiciones, trabajar normalmente.
Se programó la máquina para próximos mantenimiento 250h

TÉCNICOS:

Santiago Lombardo

RECIBI A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Santiago Lombardo

[Handwritten Signature]

DETALLES TIEMPOS EMPLEADOS

FECHA	MOTIVO	HORAS	COMENTARIOS
	DIAGNÓSTICO		
	REPARACIÓN O INTERVENCIÓN		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO IDA		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO REGRESO		
	OTROS		

Anexo 3.2 5: Registro capacitaciones.



Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 23 MM 6 AA 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 23/06/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CHARLA INFORMATIVA

☐

COMITÉ CIUDADANO

☐

CAPACITACIÓN

☒


ENTRENAMIENTO

☐

OTRO


☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPañÍA	FIRMA
Rigoberto Valencia	15536261	Oficial	Carlos Ramos	
Maria del Carmen Lopez	43993098	Auxiliar Vial	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Sebastian R	1152714135	Ayudante	Carlos Ramos	
Jasbleidy Echavarria	1000643733	Auxiliar Vial	Guinco	
Angel David	1037482285	Oficial	Guinco	
Manuel	1126105000	Ayudante	Carlos Ramos	
Carlos Rovira	7019588	Ayudante	Guinco	
Davinson Torres	1002278537	Operador Maquina	PITA 7	
Josany Pulgarin	71175366	Ayudante	Guinco	
Camilo Soto	1037464366	Ayudante	Guinco	
Areison Zapata	1038117365	Operador Maquina	PITA 7	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Rafael Santo	1063716627	Ayudante	Carlos Ramos	
Eduardo Parra	6122321	Ayudante	Carlos Ramos	



(Nombre)

Contratista



(Nombre)

Interventoría



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA EN EL FRENTE DE OBRA

Fecha: 25 6 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Mes Reportado	Consumo de Agua m³	Consumo de Energía Kwh	Observaciones al comportamiento
N/A	N/A	N/A	No se tiene corte de factura de servicios públicos al momento del informe, ya que estos consumos se ven reflejados mes vencido.
N/A	N/A	N/A	Hasta la fecha no se cuenta con una cuenta de servicio publicos de la oficina, ya que el pago del arriendo incluye los servicio pagos.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.

(Nombre) JULIAN VILLA

Contratista

(Nombre) CIELO LOPEZ

Interventoría

1/2

Cód. FO-TICS-141	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 5	FO-TICS Acta de reunión general	

DATOS GENERALES							
Número de acta							
Secretaría o Departamento Administrativo:							
Subsecretaría o Subdirección:							
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:				CONSORCIO PITA 7			
Lugar:	VEREDA LA FLORIDA	Fecha:	23/06/2023	Hora Inicio:	10:00 am	Hora Finalización:	10:30 am
Actividad o tema:	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA			Anexa listado de asistencia			
				SI	X	NO	
Elaborado por:	JULIAN VILLA	Convocada por:	JULIAN VILLA				
Objetivo de la reunión:	CONOCER EL MANEJO Y ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Manejo de los residuos sólidos en obra.

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Se realiza capacitación al personal sobre el manejo de los residuos sólidos en obra, donde se indica la disposición de estos de acuerdo al color de la bolsa ubicada en los puntos ecológicos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bolsa Blanca: Residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Bolsa Verde: Residuos orgánicos como los restos de comida o desechos agrícolas. Bolsa Negra: Residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida o papeles metalizados. <p>Con esta capacitación y actividad, queda claro para el personal cual es la manera correcta de realizar una disposición de residuos en los puntos ecológicos.</p>



Alcaldía de Medellín		REGISTRO DE CAPACITACIONES			
Fecha:	DD 23	MM 6	AA 2023		
PROYECTO:					
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO					
LUGAR Y FECHA:	ALCANTARILLADO PITA 7 23/06/2023				
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	JULIÁN VILLA				
EMPRESA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO PITA 7				
TEMA:	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA				
HORA DE INICIO:			HORA DE TERMINACIÓN:		
TIPO					
INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN		☒	
CHARLA INFORMATIVA	☐	ENTRENAMIENTO		☐	
COMITÉ CIUDADANO	☐	OTRO		☐	
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA	
Juan David A.C.	1034401285	Oficial	Quilaco	[Firma]	
Daniela Torres	1002743513	Operador	Pita 7	[Firma]	
CARLOS KOVICH	20192588	Operador	Quilaco	[Firma]	
Saúl Villalobos	70353267	Oficial	Quilaco	[Firma]	
Sebastián Villalobos	21175366	Operador	Quilaco	[Firma]	
Camilo Acosta Lora	1037464366	Operador	Quilaco	[Firma]	
Andrés Topolo	1038113365	Operador	Pita 7	[Firma]	
Andrés Obispo	71866485	Oficial	Pita 7	[Firma]	
RAFAEL SANTI	1063716627	Operador	Quilaco	[Firma]	
Eduardo Varro	612232	Operador	Quilaco	[Firma]	
Sebastián R.	1151121135	Operador	Quilaco	[Firma]	
JASIEL ENRIQUE	1000643733	Auxiliar	Quilaco	[Firma]	
Sebastián R.	1126211000	Operador	Quilaco	[Firma]	
Sebastián R.	43093093	Auxiliar	Quilaco	[Firma]	
Sebastián R.	1553680	Operador	Quilaco	[Firma]	
<p>[Firma]</p> <p>Contratista</p>					<p>[Firma]</p> <p>Interventoría</p>

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha:

DD 23

MM

6

AA 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA. SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA:

ALCANTARILLADO PITA7 23/08/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL

JULIAN VILLA

EMPRESA:

CONSORCIO ALCANTARILLADO PITA 7

TEMA:

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

COMITÉ CIUDADANO

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

OTRO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
WILLIAM A.C.	1034481285	Oficial	6 claco	[Firma]
Dawson Tares	1002743514	Operador	Pita 1	[Firma]
CARLOS Kovich	2019588	Oficial	6 claco	[Firma]
Saivel villeras	71353267	Oficial	Sinco	Saivel
JOSEPH RUBEN	21175366	By	guirco	JOSEPH
Camilo A. Soto Lopez	1037464366	ayudante	guirco	Camilo
AMILTON ZOPALO	1038113365	Operador	Pita 2	AMILTON ZOPALO
Alex A. Chaverta	71866985	Oficial	Pita 7	[Firma]
RAFEL SINTO	1053716627	Hydromante	carlos	RAFAEL S
Eduardo Parra	6123321	Hydromante	carlos	Eduardo
Sebastián R.	1151121135	Regulador	carlos R.	[Firma]
JASIERO FERNANDEZ	1000643333	Aux vial	SINCO	JASIERO F
[Firma]	11261100	Hydromante	carlos R.	[Firma]
[Firma]	43093099	Aux vial	glyco	[Firma]
[Firma]	1553680	Oficial	callo R.	[Firma]

(Form)

Contratista

(Members)

Interventoría

ANEXO 1

Anexo 3.2 6: Planilla de escombros y remisiones.

Interventoría ambiental

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

28200

FECHA: ____/____/____

DIA: ____ NOCHE: ____

FESTIVO: ____

OBRA: ____

PLACA: ____

KM: ____

HORA INGRESO: ____

HORA SALIDA: 1050

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

Jaivel Villacas

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

28454

FECHA: 26/5/23

DIA: 4 NOCHE: ____

FESTIVO: ____

OBRA: pito (1)

PLACA: 196374

KM: 104245

HORA INGRESO: 1225

HORA SALIDA: ____

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	X 9475	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

Jaivel Villacas

ANEXO 2



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
Nº 28408

FECHA: 30/05/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: C/500m PTA 2

PLACA: 34552 KM: HORA INGRESO: 8:30 HORA SALIDA: 21

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
Nº 27878

FECHA: 31/05/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PIM 7 SAN A-10000 DE 10400

PLACA: 507655 KM: 202720 HORA INGRESO: HORA SALIDA: 10:40

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10m	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.**

S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28411

FECHA: 3/1/11

DIA: _____

NOCHE: _____

FESTIVO: _____

OBRA: CarreteraPLACA: 11-111

KM: _____

HORA INGRESO: 11:11

HORA SALIDA: _____

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL			<u>Piedra</u>		
OBSERVACIONES					
CONDUCTOR: <u>YER</u>			RECIBE: _____		

**M.A.T.**

S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 27880

FECHA: 07/06/2011

DIA: ☒

NOCHE: _____

FESTIVO: _____

OBRA: Pista 7. San Antonio PradoPLACA: SV2065KM: 282348HORA INGRESO: 6:40

HORA SALIDA: _____

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	<u>70.115</u>	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					
CONDUCTOR: <u>Fabio Valencia</u>			RECIBE: <u>Jaiver Villalobos</u>		



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28414

FECHA: 07/06/2023

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Consorcio PITA 7 San Antonio Prado

PLACA: SNQ52 KM: HORA INGRESO: 12:00 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

Edgardo Guzmán
CONDUCTORJaime Villalba
RECIBE

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 27882

FECHA: 07/06/2023

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Pita 7. San Antonio Prado

PLACA: SNZ065 KM: 387.498 HORA INGRESO: 7:50 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	70mts	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

Fabián Valencia
CONDUCTORYEISON
RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comREMISION
Nº 27883

FECHA: 01/06/23

DIA: 1 NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: 81265

PLACA: 81265

KM: 2654

HORA INGRESO: 7:35

HORA SALIDA

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	7.44	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comREMISION
Nº 28331

FECHA: 01/06/23

DIA: 1 NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: 81107 PRADO

PLACA: 81353

KM: 531

HORA INGRESO: 4:40

HORA SALIDA

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	9.5	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 27885

FECHA: 27/11/11

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PAVIMENTO DE CEMENTO

PLACA: 27885 KM: 2.2876 HORA INGRESO: HORA SALIDA: 12:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA) ✓	70m	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: [Signature]

RECIBE: [Signature]



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28420

FECHA: 05/05/11

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: CONSTRUCCION PISTA 7 - SAN ANTONIO DE PISA

PLACA: 28420 KM: HORA INGRESO: 9:40 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: [Signature]

RECIBE: [Signature]



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28507

FECHA: 05/06/23/

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: CONSUMO M3

PLACA: TUGU15

KM:

HORA INGRESO: 10.30

HORA SALIDA: 11.35

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	4m ³	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES	con basura				

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 27887

FECHA: 06/06/23/

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PISO 7. SIN TRABAJO DE PISO

PLACA: SUT05

KM:

282492

HORA INGRESO: 6.15

HORA SALIDA: 9.15

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	40m ³	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comREMISION
Nº 28509

FECHA: 07 / 06 / 23 /

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: CONCRETO LIBREPLACA: 11-11-15 KM: HORA INGRESO: 13.45 HORA SALIDA: 10.20

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	11	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comREMISION
Nº 28428

FECHA: 07 / 06 / 23 /

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: CONCRETO LIBREPLACA: 11-11-15 KM: HORA INGRESO: 13.45 HORA SALIDA: 10.20

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	11	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.**
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28430

FECHA: / /

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA:

KM:

HORA INGRESO:

HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.**
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28512

FECHA: 08/06/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Consorcio Rita 7

PLACA: TNC 15

KM:

HORA INGRESO: 7.25

HORA SALIDA: 10.45

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	74	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28348

FECHA: 21/01/21

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA:

KM:

HORA INGRESO:

HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	95	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					
CONDUCTOR			RECIBE		



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28432

FECHA: 27/01/21

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA:

KM:

HORA INGRESO:

HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					
CONDUCTOR			RECIBE		



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
28515

FECHA: 01/06/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: construcion Ruta 7

PLACA: 126610 KM: HORA INGRESO: 9.05 HORA SALIDA: 11.25

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	9.4	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

Diego Marino Henao
CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
28436

FECHA: 13/06/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: consorcio Ruta 7 San Antonio de Pácora

PLACA: 510520 KM: HORA INGRESO: 8.50 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

Edo Sandoval
CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28486

FECHA: 13/01/23

DIA: X NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: 217A 7 ACOPADO

PLACA: 15394 KM: 105470 HORA INGRESO: 1010 HORA SALIDA 1050

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA) X	840	115
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28488

FECHA: 14/01/23

DIA: X NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: 217A CA. LOMADA

PLACA: 15374 KM: 105504 HORA INGRESO: 850 HORA SALIDA 1020

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA) X	840	115
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28557

FECHA: 14/06/11

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: 5-10-1

PLACA: 55255 KM: 55255 HORA INGRESO: 5:00 HORA SALIDA: 11:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	05	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES	110				

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28445

FECHA: 15/06/11

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: 5-10-1 LOTA 7 SUR INTERIOR 1-1

PLACA: 55255 KM: 55255 HORA INGRESO: 12:00 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	1	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28560

FECHA: 15 / 00 / 23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA:

KM:

HORA INGRESO:

HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	45	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES	8 JOHANA				

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28526

FECHA: 15 / 00 / 23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: consorcio Pila 7

PLACA: HVE 615

KM:

HORA INGRESO:

HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	45	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28448

FECHA: 16 / 11 / 2016

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Reparación de la vía pública

PLACA: 155 KM: 1.5 HORA INGRESO: 7:00 HORA SALIDA: 12:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28701

FECHA: 20 / 06 / 23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Reparación de la vía pública

PLACA: 155 KM: 1.5 HORA INGRESO: 9:15 HORA SALIDA: 12:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28496
FECHA: 20/01/25DIA: ☒ NOCHE: ☐FESTIVO: ☐

OBRA: 071.7 C/INORAL

PLACA: 12374 KM: 105881 HORA INGRESO: 1105 HORA SALIDA

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA) X 8.744		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28705
FECHA: 21/05/23DIA: ☐ NOCHE: ☐FESTIVO: ☐

OBRA: Consorcio VITA 7 SIN INTERVENIR

PLACA: 12374 KM: HORA INGRESO: 1200 HORA SALIDA

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
Nº 28707

FECHA: ____/____/____

DIA: ____ NOCHE: ____

FESTIVO: ____

OBRA: _____

PLACA: _____

KM: _____

HORA INGRESO: 7/1

HORA SALIDA _____

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	1	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR _____

RECIBE _____



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28618

FECHA: 22/06/23

DIA: ____ NOCHE: ____

FESTIVO: ____

OBRA: 1117 SR 7-1000 DE PADO

PLACA: 537068

KM: 285745

HORA INGRESO: 13:00

HORA SALIDA _____

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA) ✓	10.43	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR _____

RECIBE _____

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28619

FECHA: 23 / 11 / 13

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LA ZONA RURAL DE LA COMUNA DE SAN CARLOS

PLACA: 11353 KM: 537.526 HORA INGRESO: 9:50 HORA SALIDA: 11:30

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10.00	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.** S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28584

FECHA: 23 / 11 / 13

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LA ZONA RURAL DE LA COMUNA DE SAN CARLOS

PLACA: 11353 KM: 537.526 HORA INGRESO: 9:50 HORA SALIDA: 11:30

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	0.5	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

Cód. FO-TICS-141	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 5	FO-TICS Acta de reunión general	

DATOS GENERALES					
Número de acta					
Secretaría o Departamento Administrativo:					
Subsecretaría o Subdirección:					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Consejo PIRA 7			
Lugar:	Uda la Florida	Fecha:	09/06/23	Hora Inicio:	Hora Finalización:
Actividad o tema:	Entrega de residuos	Anexo listado de asistencia			
		SI	X	NO	
Elaborado por:	Jhon Lilla	Convocada por:	Jhon Lilla		
Objetivo de la reunión:	Realizar entrega de residuos generados en obra				

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Entrega de residuos reciclables

DESARROLLO TEMÁTICO
Se realiza entrega de residuos sólidos reciclables generados en obra, se entrega a la señora María Consuelo Ruiz, residente del sector y que realiza recolección de este tipo de residuos, se realiza la entrega de 2 kg de plástico y vidrio.

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

[illegible]

Anexo 3.2 7: Planilla de residuos sólidos.

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 8: Control de sustancias químicas.

Interventoría ambiental



191

Anexo 3.2 9: Evaluación Socio Ambiental.

261



Alcaldía de Medellín
Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA JUNIO

Proyecto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO

Interventoría: ECOVIAS S.A.S

Contratista: CONSORCIO PITA 7

Requerimiento Socio-Ambiental	Item	Parámetro a Evaluar	Aplica	No Aplica	100%	50%	0%	Periodicidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	MENSUAL	Observaciones
	G1	El documento del PASAO se encuentra debidamente actualizado y cuenta con las aprobaciones correspondientes.	X			Cumple parcialm ente		Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	El PASAO se encuentra en aprobación falta la firma del director de obra del contratista.
	G2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos de seguimiento y monitoreo que son responsabilidad del contratista y se entregan a la Interventoría en la fecha acordada.	X			Cumple parcialm ente		Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	

GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL
CONTRACTUAL

G3	El residente ambiental labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
G4	El residente social labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
1.0	La brigada cuenta con el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas).	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
1.1	El contratista limpia las vías de acceso de los vehículos de carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o cuando la Interventoría lo requiera para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAMA
MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

1.2	Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina la jornada diaria o cuando es exigido por la interventoría y/o el contratante.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3	Se utilizan canecas para la recolección de residuos sólidos según los sitios concertados con la Interventoría y con el código de colores establecido.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
1.4	La brigada cuenta con el personal exigido en los pliegos de condiciones		X				Diaria						
1.5	La Brigada cumple las funciones establecidas en el Guía socioambiental y/o PASAO.		X				Diaria						

1.6	Se lleva adecuadamente un registro de generación de Residuos.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
1.7	Se cuenta con el servicio de recolección de residuos ordinarios prestado por una E.S.P.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
1.8	Se entregan los residuos Peligrosos a una empresa autorizada con licencia ambiental para tal fin. Se cuenta con los certificados de disposición final.						Mensual						
1.9	El Acopio de Residuos cumple con los lineamientos de la Guía socioambiental	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	

194

1.10	Los escombros son retirados del frente de obra y su área de influencia directa y dispuesta en sitios autorizados, dentro de las 24 horas siguientes a su generación .	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.11	Existen acopios temporales para escombros con volúmenes superiores a 5 m ³ por 250 metros de Intervención.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.12	Las zonas verdes y ronda hidráulica de cuerpos de agua se encuentran libres de disposición temporal de escombros.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.13	Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposición temporal de escombros	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

MANEJO DE
RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION

1.14	Se separan las demoliciones en concreto, las rocas o fragmentos de roca, el material de excavaciones, el pavimento flexible y base granular; para su posterior reutilización o reciclaje	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.15	La disposición final de escombros se hace en los sitios aprobados en el PASAO, los cuales cumplen con la legislación ambiental vigente	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.16	Se diligencia diaria y adecuadamente el formato de disposición de escombros.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%

861

1.17	Se entrega mensualmente a la interventoría el certificado en el que consta el volumen de escombros dispuesto en la escombrera aprobada	X		Cumple			Mensual	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
2.0	Se humedece la superficie de la vía y se efectúa barrido previo, cuando se usan compresores para su limpieza	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.1	En vecindad de núcleos institucionales, se trabaja bajo ciclos de 2 horas continuas de ruido, seguidas de 2 horas continuas de descanso, o los intervalos que se logren concertar con la interventoría.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2	Los vehículos utilizados en obra cuentan con certificación de emisiones atmosféricas vigente o la correspondiente Revisión Técnico Mecánica	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra es el requerido según las hojas de vida de cada una de las máquinas.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

196

**PROGRAMA PARA
EL CONTROL DE
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS**

2.4	Para la operación de equipos y herramientas de construcción en las noches y fines de semana se cuenta con el permiso de ruido nocturno exigido por el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, y que otorgan las Inspecciones de policía del sector		X						Semanal								
2.5	Se han realizado quemas con madera, carbón, o aceites usados		X						Diaria								
2.6	Cuando se utiliza el corte de adobe, ladrillos, prefabricados o cualquier tipo de bloque en seco, se realiza siguiendo las exigencias de la Guía socioambiental (control de emisiones)	X		Cumple					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.7	Se realiza humedecimiento de las vías desprovistas de acabados, dos veces por día o cuando es exigido por la interventoría y/o el contratante	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	La mezcla asfáltica se calienta en fogones portátiles a gas						Diaria					
2.9	Existe cubrimiento con malla protectora para emisiones fugitivas en edificaciones mayores a 3 pisos						Diaria					
2.10	Los materiales pétreos almacenados temporalmente en obra permanecen perfectamente cubiertos	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

3.0	Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de almacenamiento de materiales según las necesidades de la obra.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.1	Los materiales de construcción ubicados temporalmente en el frente de obra se almacenan de acuerdo a las exigencias de la Guía socioambiental.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 3 días previa justificación y V.B. de la Interventoría. (Excluyendo los centros de acopio aprobados por la interventoría).	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAMA DE USO
Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

3.3	Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
3.4	Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
3.5	La protección de los materiales de construcción y / o reutilizables, se hace con plásticos, lonas o mallas.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Los agregados y materiales son suministrados de sitios aprobados en el PASAO y que cumplen con la legislación ambiental vigente.	X		Cumple				Mensual	100%	100%	100%	100%	100%

861

3.7	Se cuenta con las certificaciones mensuales de cada uno de los proveedores empleados.	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.8	Se clasifica y separa el material que se puede reutilizar, según el programa de residuos sólidos	X		Cumple			Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
4.0	La excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad están entibadas y/o cumplen con las especificaciones coordinadas con la interventoría	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.1	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica, plástico o madera de tal forma que no se contamina el suelo.	X			Cumple parcialm ente		Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	50%	

**PROGRAMA PARA
LA PROTECCION
DEL SUELO**

4.2	Las excavaciones se encuentran señalizadas según la Guía.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
4.3	Se clasifica y separa el suelo orgánico y el material vegetal resultante de las actividades de excavación	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
4.4	Se hace protección de canales de escorrentía (canalización). Se evitan procesos de erosión.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
4.5	No se evidencia derrame de hidrocarburos (aceites o combustibles) en el suelo	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
4.6	Los escombros almacenados temporalmente en obra se ubican a 1 metro o más de distancia de las excavaciones.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	

661

**PROGRAMA PARA
EL MANEJO DE LAS
SQ PELIGROSAS**

5.0	Cuenta con un listado completo de todas las sustancias químicas utilizadas en la Obra	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.1	Cuenta con las hojas de seguridad de todas las Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en la Obra	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.2	El acopio de SQ cuenta con la señalización informativa y preventiva pertinente	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.3	Las SQ y el acopio poseen el etiquetado de riesgos de la ONU	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.4	No se presenta incompatibilidad entre las SQ en el almacenamiento o manipulación	X		Cumple			Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5.5	Se aplica el procedimiento para el suministro de combustible a maquinaria y equipo aprobado en el PASAO	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Se tienen contemplados dentro del Plan de Contingencia los riesgos por accidentes con SQ y es socializado con el personal de la obra.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.0	Las máquinas que laboran para la obra se encuentran en perfecto estado de operación y se les ha realizado el mantenimiento exigido en sus hojas de vida	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.1	Las volquetas y vehículos cuentan con la revisión técnico mecánica y con toda la documentación exigida por las normas vigentes	X	Cumple	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.2	La movilización de maquinaria y equipos se realiza cumpliendo con las exigencias de la Guía de manejo socioambiental y los compromisos pactados en el PASAO	X	Cumple	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.3	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015 (Estado del platón y cubrimiento de la carga)	X	Cumple	Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**PROGRAMA
MANEJO DE
MAQUINARIA,
EQUIPOS Y
VEHICULOS**

6.4	El Formato de listado de Vehículos en obra permanece debidamente diligenciado y actualizado	X		Cumple		Diario	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Los vehículos cuentan con extintores adecuados con carga vigente	X		Cumple		Semanal	100%	100%	100%	100%	100%
6.6	La maquinaria de obra es movilizad mediante camabaja para los casos que así lo ameriten por sus características físicas.	X		Cumple		Diario	100%	100%	100%	100%	100%
6.7	Se lleva a cabo el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria y equipo de la obra.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

7.0	Se tienen debidamente protegidos los sumideros del frente de obra y los que la interventoría defina	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.2	Se tienen debidamente plafonadas y demarcadas las cajas de inspección ubicadas en el frente de obra		X				Diaria							
7.3	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.5	Las cajas presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DE
CUERPOS DE AGUA
Y REDES

7.6	No se realizan vertimientos de aceites y otras sustancias o residuos a la calle, los sumideros, pozos y redes.	X		Cumple							Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
7.7	Si se realizan cortes a ladrillos, tablas o adoquines, utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se tienen debidamente adecuados sistemas de tratamiento para el vertimiento resultante.	X		Cumple							Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
7.8	Cuando se realizan derrames accidentales de combustibles o aceites se atienden de manera inmediata como lo señala el Plan de Contingencia		X								Diaria					

7.9	Cuando se realiza mantenimiento de maquinaria pesada en obra, se lleva a cabo en los puntos autorizados y se coloca polietileno que cubra y aisle la totalidad del área donde se realiza ésta actividad.	X			Cumple parcialmente		Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	
7.10	Se certifica el tratamiento de las aguas resultantes de los baños móviles	X					Mensual						
7.11	El lecho de la quebrada y sus cercanías no presenta escombros o contaminación generada por la obra.	X					Diaria						
7.11	El material resultante de desarenadores es dispuesto adecuadamente como Residuo Especial.	X					Semanal						

8.0	Los tratamientos silviculturales ejecutados cuentan con permiso de la Autoridad Ambiental	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
8.1	Se cumple con todas las exigencias de la Resolución de la Autoridad Ambiental que aprobó los tratamientos silviculturales	X		Cumple		Semanal	100%	100%	100%	100%	100%
8.2	Las especies vegetales sembradas cuentan con el mantenimiento requerido y exigido por la Resolución de aprovechamiento Forestal o las especificaciones técnicas de la SIF		X			Semanal					
8.3	Las labores silviculturales son debidamente aisladas del espacio circundante		X			Diaria					

GESTION DE LA
FAUNA Y FLORA

8.4	Los árboles son trasladados siguiendo las exigencias establecidas en el manual de silvicultura y en el permiso de la autoridad ambiental		X																
8.5	Los árboles son sembrados cumpliendo con el procedimiento recomendado en la Resolución de aprovechamiento Forestal o las especificaciones técnicas de la SIF		X							Diaria									
8.6	Los árboles sembrados cuentan con un tutor y el mismo cumple la función de mantener el árbol es estado perpendicular		X							Semanal									
8.7	La siembra de grama o coberturas es realizada según las especificaciones técnicas de la SIF		X							Semanal									

8.8	Los residuos vegetales propios de la realización de los diferentes tratamientos silviculturales son retirados del frente de obra una vez termina la jornada diaria	X					Cumple parcialmente		Diana	50%	50%	50%	50%	50%	50%
8.9	El acopio de material vegetal no supera los 1.5 m de altura, y permanece protegido de la circulación vehicular como también de la intemperie.	X				Cumple			Diana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.10	Se tiene identificadas la fauna y flora que será afectada en el proyecto para su manejo.	X				Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.11	No se evidencia la extracción, caza, comercialización de las especies de fauna y flora de la zona.	X				Cumple			Diana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

204

AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA	8.12	Se prohíbe el cuidado de animales callejeros por personal de la obra.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	8.13	Se hizo el ingreso en el Sistema del Arbol Urbano (SAU), de los individuos entregados en el proyecto.		X					1 vez							
	9.0	El contratista emplea instrumentos para regular el suministro de agua en los procesos.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	9.1	Se cuenta con iluminación de bajo consumo (ahorradoras) en campamentos e instalaciones temporales.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	9.2	Se aprovecha el agua lluvia en actividades de limpieza	X		Cumple				Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	9.3	Se realiza un seguimiento al consumo de agua y energía en los frentes de obra	X		Cumple				Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10.0	El perímetro del frente de obra se encuentra debidamente demarcado según las exigencias de la Guía socio ambiental y el cerramiento aprobado en el PASAO	X	Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.1	Se tienen habilitados senderos peatonales sobre todo el frente de obra de acuerdo a lo definido en el PASAO, la Guía socioambiental y el PMT	X	Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.2	La obra cuenta con los suficientes avisos preventivos e informativos, según las exigencias de la Guía socioambiental y los compromisos del PASAO	X	Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	

10.3	La señalización se encuentra limpia y en buen estado.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.4	Los senderos peatonales se encuentran completamente aislados del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.5	Los senderos peatonales son protegidos por barreras cuando limitan con el flujo vehicular.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.6	A los predios afectados por la construcción de las obras se les garantiza un acceso cómodo y libre de obstáculos	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.7	Las superficies de los senderos peatonales son firmes, antideslizantes y sin obstáculos	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES**

10.8	Los senderos peatonales poseen conectividad, guían de un origen a un destino.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
10.9	La obra posee todos los senderos peatonales necesarios según el PASAO y el PMT	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
10.10	Las instalaciones temporales permanecen debidamente señalizadas	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
10.11	Las señales informáticas, preventivas y reglamentarias cumplen con las exigencias del Manual de Señalización Vial	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
10.12	Se garantiza el acceso vehicular a los garages o se le da alguna solución alternativa conforme al usuario del garage	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

10.13	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas y las facturas son pagadas oportunamente	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.14	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.15	El campamento cumple con las condiciones mínimas de Higiene y aseo.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.16	El campamento cumple con las condiciones mínimas de seguridad.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10.17	Se tienen los permisos para ocupación del espacio público por fuera de la obra.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%
S 1.1	Cuenta con las actas de vecindad iniciales elaboradas	X		Cumple			1 vez	100%	N/A	N/A	100%	
S 1.2	Cuenta con las actas de entorno iniciales elaboradas	X		Cumple			1 vez	100%	N/A	N/A	100%	
S 1.3	Realizó de manera adecuada y oportuna la reunión de inicio de obra	X		Cumple			1 vez	100%	N/A	N/A	100%	
S 1.4	Tiene conformado y operando el Comité Ciudadano de Obra	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	
S 1.5	Cuenta con la oficina de Atención a la comunidad	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	

202

Participación Ciudadana

S 1.6	Implementa de manera adecuada la recepción de hojas de vida de mano de obra local .	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.7	Hace control y propicia la contratación de mano de obra local	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.8	Realiza seguimiento de PQRS	X		Cumple			Quincenal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se han presentado PQRS
S 1.9	Atiende las PQRS	X		Cumple			Quincenal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se han presentado PQRS
S 1.10	Realizó de manera adecuada y oportuna la reunión de seguimiento de obra	X		Cumple			Requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.11	Capacita a la comunidad en temas propios del proyecto	X		Cumple			Requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se han realizado, se tiene proyectado hacerse en el mes de agosto, sin embargo si hay dudas e inquietudes el contratista está dispuesto a realizar las acciones correspondientes

S 1.12	Capacita a los trabajadores en temas necesarios para el buen desarrollo de la obra	X		Cumple				Requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.1	Instaló la valla informativa de manera oportuna y siguiendo los lineamientos de la entidad contratante	X		Cumple				1 vez	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.2	Entregó de manera adecuada y oportuna la información de actividades de elaboración de actas de vecindad	X		Cumple				1 vez	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.3	Entregó de manera adecuada y oportuna la información de reunión de inicio de obra	X		Cumple				1 vez	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.4	Implementa las estrategias del programa de comunicación y divulgación aprobado	X		Cumple				Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	

Información y divulgación

	S 2.5	Informa a la comunidad sobre cierres, desvíos, cortes o cambios significativos en la cotidianidad de los habitantes	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	S 2.6	Promueve a través de actividades la sostenibilidad del proyecto	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizará en agosto
				Promedio Evaluación Ambiental				97%						
				Promedio Evaluación Social				100%						
				Calificación Mensual Gestión				98%						
				TECNOLOGO AMBIENTAL CONTRATISTA		TECNOLOGO AMBIENTAL INTERVENTORIA		TECNOLOGO SOCIAL CONTRATISTA		TECNOLOGO SOCIAL INTERVENTORIA				

209

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 10: Lista de verificación de campamentos.

 <p>Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>		VERIFICACIÓN EN CAMPAMENTOS				
ELEMENTO	FECHA (19/06/2023)					OBSERVACIONES
Cerramiento adecuado y completo.	SI					
Escombros debidamente almacenados	SI					
Senderos peatonales	SI					
Vestier.	NO					El vestier no se encuentra en optimas condiciones y que se encuentra junto con los materiales de construcción (Tubería)
Bodega/zona de herramientas.	SI					
Mesa - comedor.	N.A					
Zona residuos peligrosos	SI					
Recipiente para lavar herramienta.	N.A					
Zona para preparar mezclas.	SI					
Elementos de aseo.	SI					
Escalera adecuada.	SI					
Zona de hidratación	N.A					
Baño movil en buen estado.	NO					No hay baño movil, pero hay unidades sanitarias fijas en los campamentos.
Recipientes de residuos sólidos	SI					
Cartelera informativa.	SI					
Señal ruta evacuación.	SI					
Señalización zona de residuos.	SI					
Señalización zona Sustancias químicas peligrosas	SI					
Señal punto de hidratación-agua.	NO					
Señal prohibido fumar.	SI					
Señal sólo personal autorizado.	SI					
Fichas de seguridad completas.	SI					
Política de reciclaje publicada.	NO					
Zonas de trabajo señalizada.	SI					
Bitácora.	SI					
Elementos que se tienen	18					
Elementos Totales a cumplir	4					
Valoración del cumplimiento	81,82%					

Se indicará SI o NO tiene el elemento solicitado y NA no aplica cuando el elemento no se debe tener en ese sitio
SI = 1; NO = 0

(Firma)

CIELO E. LÓPEZ

(Nombre) CIELO ESTHER LÓPEZ VEGA

Residente Ambiental Interventoría

211

Cód. FO-ADQU-273

Versión. 5

Formato

**FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de
Obra Pública**



Alcaldía de Medellín

Anexo 3.2 11: Orden y limpieza de obra Interventoría.

212

 Alcaldía de Medellín <small>Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>	PERCEPCIÓN DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA			
Fecha: 24 06 2023				
PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO				
CONTRATISTA: CONSORCIO PITA 7				
FECHA	OL-BUENO (100)	OL-REGULAR (50)	OL-DEFICIENTE (0)	OBSERVACIONES
1 al 8 de Junio	100	-		
9 al 15 de Junio	100	-		
16 al 22 de Junio	100	-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
	100	-		

Se debe colocar el valor de OL, de acuerdo a los siguientes criterios:

OL-1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

OL-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables y otros mal almacenados.

OL-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

Se debe cumplir con un promedio mensual > al 80%

(Firma) CIELO E. LÓPEZ

Interventor: CIELO ESTHER LÓPEZ VEGA

2/27

Cód. FO-ADQU-273

Versión. 5

Formato
**FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de
Obra Pública**



Alcaldía de Medellín

Anexo 3.2 12: Suministro de material de construcción.



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

FECHA	Nº REMISIÓN	PLACA DEL VEHÍCULO	VOLUMEN RECIBIDO (m ³)	PROVEEDOR	MATERIAL
15/05/2023	1432	TGA343	18,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
17/05/2023	1483	MLB039	9,46	SANTA RITA	ARENA DE CONCRETO
18/05/2023	1485	MLB039	9,46	SANTA RITA	TRITURADO
19/05/2023	1434	TGA343	18,00	SANTA RITA	ARENILLA
23/05/2023	1518	LXE202	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
23/05/2023	1519	LXE202	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
23/05/2023	28199	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
24/05/2023	1520	LXE202	9,50	SANTA RITA	TRITURADO
24/05/2023	1489	MLB039	9,46	SANTA RITA	ARENILLA
24/05/2023	28269	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
24/05/2023	17776	JYY115	8,478	SANTA RITA	TRITURADO
24/05/2023	1438	TGA343	18	SANTA RITA	ARENILLA
25/05/2023	1439	TGA343	18,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
26/05/2023	1442	TGA343	18,00	SANTA RITA	ARENILLA
26/05/2023	28453	TTG374	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
29/05/2023	1528	LXE202	9,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
30/05/2023	28459	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
31/05/2023	28410	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
31/05/2023	27877	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
01/06/2023	28413	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
01/06/2023	27881	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
02/06/2023	28329	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
02/06/2023	27884	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
02/06/2023	28330	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
03/05/2023	28468	TTG374	8,70	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/06/2023	28419	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/06/2023	1559	MLB039	9,46	SANTA RITA	ARENILLA
05/06/2023	1539	LXE202	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
06/06/2023	1560	TGA343	18,00	SANTA RITA	TRITURADO
06/06/2023	1651	TGA343	18,00	SANTA RITA	ARENILLA
06/06/2023	27888	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
06/06/2023	28424	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
07/06/2023	28427	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/06/2023	28429	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/06/2023	28479	TTG374	8,70	SANTA RITA	ARENILLA
08/06/2023	1652	TGA343	18,00	SANTA RITA	TRITURADO
08/06/2023	17786	JYY115	6,045	SANTA RITA	ARENILLA
09/06/2023	28347	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
09/06/2023	28431	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
13/06/2023	28435	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
13/06/2023	28485	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
14/06/2023	28556	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
15/06/2023	28444	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
15/06/2023	28525	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
16/06/2023	28447	SNQ520	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
20/06/2023	28450	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
20/06/2023	28495	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
21/06/2023	17788	JYY115	8,79	SANTA RITA	ARENILLA

21/06/2023	20704	SNQ520	9	SANTA RITA	ARENA DE CONCRETO
22/06/2023	28706	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
Volumen total			541,05		

Nota: Se debe anexar mensualmente el certificado de entrega por parte del proveedor.



Contratista ambiental _____



Interventoría ambiental _____

GLACCO S.A.S.

CONTROL DE

VOLQUETAS

R.O

17786

GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S

CONTRATANTE: Glacco S.A.S.

OBRA: Pista de Bordo

ORIGEN: _____ DESTINO: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PLACA	
6.045	☒ M ²	☐ Arena Concreto	1447205	
	☐ Ton	☐ Arena Pega		
	☐ Viaje	☐ Arena Revoque		
	☐ Horas	☐ Tinturado		
	OBSERVACIONES			
		☐ Base Granular	08-25-2022	
		☐ Mezcla Asiática		
		☐ Arena		
		☐ Piedra	SALIDA	
		☐ Escombros		
		☐ Otros:	HORA	KM
ENTREGÓ <u>Wto</u>		RECIBIÓ <u>[Signature]</u>	LLEGADA	
			HORA	KM

Carrera 76 No. 3 - 36 Medellín - Antioquia - PBX: (4) 444 40 17

ANEXO 4



CONTROL DE RECIBO

VOLQUETAS

17788

CONTRATANTE: Guinco S.A.S.

OBRA: Pista de vuelo

ORIGEN: _____ DESTINO: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PLACA
879	☒ M ² ☐ Ton ☐ Viaje ☐ Horas	☐ Arena Concreto ☐ Arena Pega ☐ Arena Revoque ☐ Tinturado ☐ Base Granular ☐ Mezcla Asiática ☒ Arenilla ☐ Piedra ☐ Escombros ☐ Otros: _____	<div>14775</div> <div>FECHA</div> <div>27-06-23</div> <div>SALIDA</div> <div>HORA</div> <div>KM</div> <div>LLEGADA</div> <div>HORA</div> <div>KM</div>
OBSERVACIONES			
ENTREGÓ		RECIBÍ	

REMISIÓN N° RDC1100034083

Viaje

VDC1100034732

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR GENERICO

PLACAS GEN-SENC

CONDUCTOR CONDUCTOR GENERICO

CÉDULA 000000

TELÉFONO

PROPIETARIO

CEDULA PROP.

ARGOS

CLIENTE

SOTARCO S A S - ALCANTARI FLORIDA SN ANTONIO PRADO

NIT 800129071

SOTARCO S A S - ALCANTARI FLORIDA SN ANTONIO PRADO

CL 56 SUR 70 A 127

BARRIO BARICHARA PQ SOLO BUS

MEDELLIN-Antioquia

TEL.

TIPO NEGOCIO Industrial

CENTRO

DC11-CV PT AGR SAN JAVIER MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA SALIDA 21/05/2023

HORA SALIDA 07 03 13

FECHA PROMETIDA 30/04/2023

FECHA REMISION 21/05/2023

Impreso por Ortiz P. Os Cristian Alejandro

Impreso el 6/21/2023 7 03 15 AM

No. PEDIDO	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	No. Lote	CANTIDAD	UM	TONELADAS	M3	ORDEN COMPRA	TIPO DESCARGUE
ZAPS-253078B-20	4525353	ARENILLA PEÑA SAN JAVIER.		13.10	T	13 10	8 79		Descargue Manual

Total

13 10

8 79

OBSERVACIONES

JYY115 7050

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE O QUIEN RECIBE

LLEGADA:

ENTREGA:

NOMBRE CLARO Y SELLO

Firma y Cedula del Transportador

El cargamento viaja por cuenta y riesgo del transportador. Declaro que he recibido el cargamento arriba descrito en perfecto estado y en las cantidades registradas para ser entregado al destinatario de acuerdo con las instrucciones anotadas anteriormente con la misma cantidad y estado que me fue entregado.

No. SELLOS

Tipo Entrega

RET

DC11-CV PT AGR SAN JAVIER, MEDELLIN, Antioquia.

4/2



CONTROL DE
VOLQUETAS
RECIBO
1.77776

CONTRATANTE: Guinco S.A.S.

OBRA: Pista de acceso

ORIGEN: _____ DESTINO: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PLACA
8478	☒ M ² ☐ Ton ☐ Vialje ☐ Horas	☐ Arena Concreto ☐ Arena Pega ☐ Arena Revoque ☒ Tinturado ☐ Base Granular ☐ Mezcla Asiática ☐ Arenilla ☐ Piedra ☐ Escombros ☐ Otros: _____	144775
OBSERVACIONES			FECHA
			24.05.2023
			SALIDA
			HORA
			KM
			LLEGADA
			HORA
			KM
ENTREGÓ <u>[Signature]</u>		RECIBIÓ <u>Bibiana R.</u>	

REMISIÓN No. R4A2500028759

Via, V4A2500029333

SAS - ACUEDUCTO SAN JOSE Y
CEMENTARIA

C. 800129071

SOTARCO SAS - ACUEDUCTO SAN JOSE Y
COMPLEMENTARIA

CL 65 SUR 76 314 SAN ANTONIO DE PRADO

BARRIO: SAN ANTONIO DE PRA VDA SAN JOSE

MEDELLIN-Antioquia

TEL:

TIPO NEGOCIO: Industrial

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR GENERICO

PLACAS GEN-SENC

CONDUCTOR CONDUCTOR GENERICO

CÉDULA 000000

TELÉFONO

PROPIETARIO

CEDULA PROP.

CENTRO

4A25-PLANTA AGRG
GIRARDOTA, GIRARDOTA, ANTIOQUIA

FECHA SALIDA 24/05/2023

HORA SALIDA 10 19 30

FECHA PROMETIDA 31/05/2023

FECHA REMISION 24/05/2023

Impreso por Perez, Rua Wilson Leon

Impreso el 5/24/2023 10 19 39 AM

OPERADOR



No. PEDIDO	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	No. Lote	CANTIDAD	UM	TONELADAS	M3	ORDEN COMPRA	TIPO DESCARGUE
ZCPS-2557721-10	4625263	AGR GRU R7M 1IN GIRARDOTA		13.50	T	13.50	8.478		Descarga Manual

CONCRETOS ARGOS S.A.S

N.T. 369.250.697-4

Total :

13.50 8.478

OBSERVACIONES
JYY115 GR2015465

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE O QUIEN RECIBE

LLEGADA:

ENTREGA:

NOMBRE
CLARO Y
SELLO

Firma y Cedula del Transportador

El cargamento viaja por cuenta y riesgo del transportador. Declaro que he recibido el
cargamento arriba descrito en perfecto estado y en las cantidades registradas para
ser entregado al destinatario descargado con las instrucciones emitidas
anteriormente con la misma cantidad y estado que me fue entregado.

No. SELLOS

Tipo Entrega

RET

#Error

4A25-PLANTA AGRG

GIRARDOTA, GIRARDOTA, Antioquia.

FIRMA Y SELLO DE SALIDA DE BODEGA

812

CONDUCTOR Agustino Llano

RECIBO YES

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE MATERIAL					
TRITURADO					
ARENA DE CONCRETO					
ARENILLA					
ARENA DE REVOQUE					
AFIRMADO					
BASE GRANULAR					
SUB BASE					
MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
			PIEDRA REVENTADA		
			PIEDRA CANTO RODADO		
			ESCOMBRO(PALEROS)		
			ESCOMBRO(MAQUINA)		
			ARENA DE PEGA		
			ACARREO INTERNO		
			ASFALTO		

PLACA: 406615 KM: 10.55 HORA INGRESO: 10:55 HORA SALIDA: 11:03

OBRA: Consorcio Pte 7

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

FECHA: 24/05/23
DIA: NOCHE
FESTIVO: NO

REMISION No 28269

CONDUCTOR El

RECIBO NO

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE MATERIAL					
TRITURADO					
ARENA DE CONCRETO					
ARENILLA					
ARENA DE REVOQUE					
AFIRMADO					
BASE GRANULAR					
SUB BASE					
MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
			PIEDRA REVENTADA		
			PIEDRA CANTO RODADO		
			ESCOMBRO(PALEROS)		
			ESCOMBRO(MAQUINA)		
			ARENA DE PEGA		
			ACARREO INTERNO		
			ASFALTO		

PLACA: 406615 KM: 10.55 HORA INGRESO: 10:55 HORA SALIDA: 11:03

OBRA: Consorcio Pte 7

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

FECHA: 24/05/23
DIA: NOCHE
FESTIVO: NO

REMISION No 28199

CONDUCTOR

RECIBE

OBSERVACIONES

SUB BASE		MATERIAL		M3		COSTALES	
TRANSPORTE DE MATERIAL							
TRITURADO							
ARENA DE CONCRETO							
ARENILLA							
ARENA DE REVOQUE							
AFIRMADO							
BASE GRANULAR							
PIEDRA CANTO RODADO							
PIEDRA REVENTADA							
MATERIAL		M3		COSTALES		M3	COSTALES

OBRA: C-15-1010 K. 11.7 SAN MATEO

PLACA: 15-1010 KM: 11.7

HORA INGRESO: 7:00 HORA SALIDA: 11:00

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

FECHA: 28/04/2010 DIA: 28 NOCHE: 04

FESTIVO: NO

REMISION N° 28704

CONDUCTOR

RECIBE

CONDUCTOR

RECIBE

OBSERVACIONES

SUB BASE		MATERIAL		M3		COSTALES	
TRANSPORTE DE MATERIAL							
TRITURADO							
ARENA DE CONCRETO							
ARENILLA							
ARENA DE REVOQUE							
AFIRMADO							
BASE GRANULAR							
PIEDRA CANTO RODADO							
PIEDRA REVENTADA							
MATERIAL		M3		COSTALES		M3	COSTALES

OBRA: C-15-1010 K. 11.7 SAN MATEO

PLACA: 15-1010 KM: 11.7

HORA INGRESO: 7:00 HORA SALIDA: 11:00

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

FECHA: 28/04/2010 DIA: 28 NOCHE: 04

FESTIVO: NO

REMISION N° 28495

CONDUCTOR

RECIBE



M.A.T. S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matsas1@hotmail.com - contabilidadmatv@gmail.com

REMISION 284593

NO 26

FECHA: 26/5/23

DIA: X

FESTIVO:

NOCHE:

OBRA: Pto 3

PLACA: Pto 3

KM: 104242

HORA INGRESO: 11:45

HORA SALIDA: 12:10

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES	OBSERVACIONES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA			
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO			
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)			
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)			
ARENILLA			ARENA DE PEGA			
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO			
TRITURADO			ASFALTO			
TRANSPORTE DE MATERIAL						

CONDUCTOR: *[Signature]*

RECIBE: *[Signature]*

284593

NO 26

FECHA: 26/5/23

DIA: X

FESTIVO:

NOCHE:

REMISION
 N° 28706



FECHA: 22/05/2023
 DIA: _____
 NOCHE: _____
 FESTIVO: _____

NIT: 900.449.464-7
 Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
 matas11@hotmail.com • contabilidadmat0@gmail.com

OBRA: _____
 PLACA: _____
 KM: _____
 HORA INGRESO: _____
 HORA SALIDA: _____

SUB BASE	BASE GRANULAR	AFIRMADO	ARENA DE REVOQUE	ARENILLA	ARENA DE CONCRETO	TRITURADO	TRANSPORTE DE MATERIAL
PIEDRA REVENTADA	PIEDRA CANTO RODADO	ESCOMBRO(PALEROS)	ESCOMBRO(MAQUINA)	ARENA DE PEGA	ACARREO INTERNO	ASFALTO	
MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES		

OBSERVACIONES

CONDUCTOR: _____
 RECIBE: _____

[illegible]



S.A.S. M.A.T.

REMISIÓN N° 27877

FECHA: 31/05/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matsas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

OBRA: 7

PLACA: 542065

KM: 282.779

HORA INGRESO: 9:15

HORA SALIDA:

MATERIAL		M3	COSTALES	MATERIAL		M3	COSTALES
SUB BASE				PIEDRA REVENTADA			
BASE GRANULAR				PIEDRA CANTO RODADO			
AFIRMADO				ESCOMBRO(PALEROS)			
ARENA DE REVOQUE				ESCOMBRO(MAQUINA)			
ARENILLA		10m		ARENA DE PEGA			
ARENA DE CONCRETO				ACARREO INTERNO			
TRITURADO				ASFALTO			
TRANSPORTE DE MATERIAL							

OBSERVACIONES

1000 Costo

CONDUCTOR

Walter K. Williams

RECIBE

[illegible]

122



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

REMISION
Nº 27801
FECHA: 21/01/2021
DIA: 21 NOCHE: 21
FESTIVO: 21

OBRA:

PLACA: 542045 KM: 282445 HORA INGRESO: 7:30 HORA SALIDA: 1:45

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES	Todo costo				

CONDUCTOR: Edgar Villanueva S

RECIBE: VE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

REMISION
Nº 28329
FECHA: 21/01/21
DIA: 21 NOCHE: 21
FESTIVO: 21

OBRA:

PLACA: 542045 KM: 282445 HORA INGRESO: 12:55 HORA SALIDA: 1:15

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: Edgar Villanueva S

RECIBE: Edgar Villanueva S

CONDUCTOR _____

RECIBE _____

OBSERVACIONES _____

SUB BASE		MATERIAL		M3		COSTALES	
TRANSPORTE DE MATERIAL							
TRITURADO							
ARENA DE CONCRETO							
ARENILLA							
ARENA DE REVOQUE							
AFIRMADO							
BASE GRANULAR							
PIEDRA CANTO RODADO							
PIEDRA REVENTADA							
MATERIAL							
M3							
COSTALES							

PLACA: _____ **KM:** _____

OBRA: _____

FECHA: _____ **DIA:** _____ **NOCHE:** _____

FESTIVO: _____

REMISION No. 28330

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidaddmat0@gmail.com

M.A.T. S.A.S.

CONDUCTOR _____

RECIBE _____

OBSERVACIONES _____

SUB BASE		MATERIAL		M3		COSTALES	
TRANSPORTE DE MATERIAL							
TRITURADO							
ARENA DE CONCRETO							
ARENILLA							
ARENA DE REVOQUE							
AFIRMADO							
BASE GRANULAR							
PIEDRA CANTO RODADO							
PIEDRA REVENTADA							
MATERIAL							
M3							
COSTALES							

PLACA: _____ **KM:** _____

OBRA: _____

FECHA: _____ **DIA:** _____ **NOCHE:** _____

FESTIVO: _____

REMISION No. 27884

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidaddmat0@gmail.com

M.A.T. S.A.S.

222



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

REMISION
Nº 28468

FECHA: 31/07/2011
DIA: X NOCHE: _____
FESTIVO: _____

OBRA:

Plaza

PLACA: T83341 KM: 107.790

HORA INGRESO: 7:40

HORA SALIDA: 3:25

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	X	5.70 M3	PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE

Walter Villaseca



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matas11@hotmail.com - contabilidadmat10@gmail.com

REMISION
Nº 28419

FECHA: 07/07/2011
DIA: _____ NOCHE: _____
FESTIVO: _____

OBRA:

Plaza

PLACA: T83341 KM: 107.790

HORA INGRESO: 7:40

HORA SALIDA: 3:30

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	X	5.70 M3	PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



M.A.T.

S.A.S.

REMISION

Nº 2627

FECHA: 04/05/21

DIA: _____ NOCHE: _____

FESTIVO: _____

OBRA: CONCRETO

PLACA: 1111

KM: 1111

HORA INGRESO: 3:11

HORA SALIDA: _____

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: _____

San Mateo



M.A.T.
S.A.S.

REVISION N° 28429

FECHA: 08/06/23

DIA: 1 NOCHE:

FESTIVO:

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

mtas11@hotmail.com - contabilidadmat@gmail.com

OBRA: *CONCRETO VITA 2*

PLACA: *119336* RM

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	10		PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBRA: *CONCRETO VITA 2*

PLACA: *119336* RM

HORA INGRESO: *10:30*

HORA SALIDA: *10:50*

CONDUCTOR: *Elvira*

RECIBI: *[Signature]*



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28479

FECHA: 21/01/2023

DIA: X NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PTA 3 C/11111

PLACA: 448378 KM: 105.282 HORA INGRESO: 130 HORA SALIDA: 1

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28347

FECHA: 21/01/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: C/11111

PLACA: 448378 KM: 59.116 HORA INGRESO: 3:01 HORA SALIDA: 12:11

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

RECIBE



M.A.T.
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat@gmail.com

REMISION
Nº **28431**

FECHA: 21/06/23

DIA: 21 NOCHE: 23

FESTIVO: 23

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA

PLACA: 3198525 KM: 7 HORA INGRESO: 8:30 HORA SALIDA: 11:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	10		PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: Edy S. S. S. S. S. RECIBE: Edy S. S. S. S. S.



M.A.T.
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat@gmail.com

REMISION
Nº **28435**

FECHA: 13/06/23

DIA: 13 NOCHE: 23

FESTIVO: 23

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA

PLACA: 3198525 KM: 7 HORA INGRESO: 8:30 HORA SALIDA: 11:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	10		PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: Edy S. S. S. S. S. RECIBE: Edy S. S. S. S. S.



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION N° **28485**

FECHA: 11/01/21 NOCHE:

DIA: FESTIVO:

OBRA:

PLACA: KM: 10.46 HORA INGRESO: 7:30 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: RECIBE:



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION N° **28556**

FECHA: 11/01/21 NOCHE:

DIA: FESTIVO:

OBRA:

PLACA: KM: 10.46 HORA INGRESO: 7:30 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: RECIBE:



M.A.T.
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No 28444

FECHA: 15/06/23
DÍA: NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: RECONSTRUCCION DE LA CARRERA

PLACA: 15-17A KM: 1.1 HORA INGRESO: 11:00 HORA SALIDA: 11:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR Pedro Henao RECIBE



M.A.T.
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No 28525

FECHA: 15/06/23
DÍA: NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: CONSTRUCCION PISO

PLACA: 15-615 KM: 12.45 HORA INGRESO: 12:45 HORA SALIDA: 11:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR Pedro Henao RECIBE



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION N° **28447**

FECHA: 13/05/11 DÍA: 13 NOCHE: 11

FESTIVO: 11

OBRA: Carretera Vía 7 Sur y Local 214

PLACA: 28447 KM: 1.1 HORA INGRESO: 08:00 HORA SALIDA: 09:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: Elvira RECIBE: Elvira



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION N° **28450**

FECHA: 13/05/11 DÍA: 13 NOCHE: 11

FESTIVO: 11

OBRA: Carretera Vía 7 Sur y Local 214

PLACA: 28450 KM: 1.1 HORA INGRESO: 08:00 HORA SALIDA: 09:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR: Elvira RECIBE: Elvira

222

ENTREGA.

OBSERVACIONES.

☐ M3
☐ DIA
☐ VIAJES.
☐ INTERNO

1873

CANT.

UNIDAD.

DESCRIPCION.

PLACA.

FECHA.


LLEGADA.

- ☐ ARENA DE PEGA
- ☐ ARENA DE CONCRETO
- ☐ ARENA DE REVOQUE
- ☐ AFIRMADO
- ☐ BASE
- ☒ PIEDRA
- ☐ RECUNA
- ☐ TRITURADO
- ☐ TIERRA BOTADERO
- ☐ TIERRAS INTERNAS
- ☐ GRAVILLA
- ☐ ARENILLA

RECIBIO.

Suministros y transporte de materiales de playa y cantera

CORREA SAS



Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
312 216 64 35.

Contratante:

Obra:

Origen:

CONTROL DE
VOLANTES Y MAQUINARIA

Nº

1432



CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
TEL: 312 216 64 35

CONTROL DE
VOLVETAS Y MAQUINARIA

Nº 1483

Contratante: Consorcio Fido 7

Obra: Alcantarillado Fido 7

Origen:

CANT.	UNIDAD.	DESCRIPCION.	RECIBIO.
		☐ ARENA DE PEGA	
		☐ ARENA DE CONCRETO	
		☐ ARENA DE REVOQUE	
		☐ AFIRMADO	
		☐ BASE	
		☐ PIEDRA	
		☐ RECUNA	
		☐ TRITURADO	
		☐ TIERRA BOTADERO	
		☐ TIERRAS INTERNAS	
		☐ GRAVILLA	
		☐ ARENILLA	

OBSERVACIONES.	ENTREGO.
☐ M3 ☐ DIA ☒ VIAJES. ☐ INTERNO	

PLACA.	FECHA.	LLEGADA.
MLA 034	D 17 05 2023 M A	

LEONARDO ROMAN O. NIT 7155600-1

422



CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO

NIT: 901185478-9

REGIMEN COMUN

TEL: 604 473 23 21



312 216 64 35.

Contratante: Concorro, Olaya 7

Obra: Alcantarillado la Florida

Origen:

**CONTROL DE
VOLANTES Y MAQUINARIA**

Nº

1485

CANT.		UNIDAD.	DESCRIPCION.	PLACA.	FECHA.	LLEGADA.
			☐ ARENA DE PEGA ☐ ARENA DE CONCRETO ☐ ARENA DE REVOQUE ☐ AFIRMADO ☐ BASE ☐ PIEDRA ☐ RECUNA ☐ TRITURADO ☐ TIERRA BOTADERO ☐ TIERRAS INTERNAS ☐ GRAVILLA ☐ ARENILLA	mla 039	D 18 05 1023 M A	

ENTREGO.

RECIBIO.

OBSERVACIONES.	
☐ M3	7
☐ DIA	
☒ VIAJES.	
☐ INTERNO	



CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
TEL: 312 216 64 35.

CONTROL DE
VOLVETAS Y MAQUINARIA
Nº 1434

Contratante:

Obra:

Origen:

CANT.

UNIDAD.

DESCRIPCION.

PLACA.

FECHA.

LLEGADA.

☒ M3
☐ DIA
☐ VIAJES.
☐ INTERNO

OBSERVACIONES.

- ☐ ARENA DE PEGA
- ☐ ARENA DE CONCRETO
- ☐ ARENA DE REVOQUE
- ☐ AFIRMADO
- ☐ BASE
- ☐ PIEDRA
- ☐ RECUBRIMIENTO
- ☐ TRITURADO
- ☐ TIERRA BOTADERO
- ☐ TIERRAS INTERNAS
- ☐ GRAVILLA
- ☐ ARENILLA

ENTREGO.

RECIBIO.

LEONARDO ROMAN O. NIT 7152560-1

Vereda Montañita SAN ANTONIO DE PRADO NIT: 901185478-9 REGIMEN COMUN TEL: 604 473 23 21 TEL: 312 216 64 35.		CONTROL DE VOLANTES Y MAQUINARIA Nº 1518	
Contratante: <i>CONCRETO PRADO</i>		Obra: <i>h + b + l +</i>	
Origen: <i>BOM 1.14</i>			
CANT.	UNIDAD.	DESCRIPCION.	PLACA. <i>LX 202</i>
☐ M3	☐ DIA	☐ ARENA DE CONCRETO	FECHA. D <i>23</i> M <i>05</i> A <i>2022</i>
☐ VIAJES.	☐ AFIRMADO	☐ ARENA DE REVOQUE	LLEGADA.
☐ INTERNO	☐ BASE	☐ PIEDRA	
OBSERVACIONES.		☐ RECUNA	
		☐ TRITURADO	
		☐ TIERRA BOTADERO	
		☐ TIERRAS INTERNAS	
		☐ GRAVILLA	
		☒ ARENILLA	
ENTREGO.		RECIBIO.	


LEONARDO ROMAN G. NIT 7153960-1

TICA


CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita SAN ANTONIO DE PRADO NIT: 901185478-9 REGIMEN COMUN TEL: 604 473 23 21 ☎ 312 216 64 35		CONTROL DE VOLVETAS Y MAQUINARIA N° 1519	
Contratante: Obra: Origen:		CANT. UNIDAD. DESCRIPCION.	
PLACA. FECHA. D M A LLEGADA.		OBSERVACIONES. ☐ M3 ☐ DIA ☐ VIAJES. ☐ INTERNO ☐ ARENA DE PEGA ☐ ARENA DE CONCRETO ☐ ARENA DE REVOQUE ☐ AFIRMADO ☐ BASE ☐ PIEDRA ☐ RECUNA ☐ TRITURADO ☐ TIERRA BOTADERO ☐ TIERRAS INTERNAS ☐ GRAVILLA ☒ ARENILLA	
RECIBIO.		ENTREGO.	



CORREA SAS
 Suministros y transporte
 de materiales de playa y cantera

		CORREA SAS Suministros y transporte de materiales de playa y cantera		
<p style="text-align: right;">/ereda Montañita</p> <p style="text-align: right;">SAN ANTONIO DE PRADO</p> <p style="text-align: right;">NIT: 901185478-9</p> <p style="text-align: right;">REGIMEN COMUN</p> <p style="text-align: right;">TEL: 604 473 23 21 ☎ 312 216 64 35.</p> <p style="text-align: right;">Contratante:</p>		<p style="text-align: center;">Obra:</p> <p style="text-align: center;">Origen:</p>		
<p>Nº 1520</p>				
<p>CONTROL DE VOLVETAS Y MAQUINARIA</p>				
CANT.	UNIDAD.	DESCRIPCION.	PLACA.	
		ARENA DE PEGA	LXC 202	
		ARENA DE CONCRETO		
		ARENA DE REVOQUE		
		Afirmado		
		Base		
		Piedra		
		Recuña		
		Triturado		
		Tierra Botadero		
		Tierras Internas		
		Gravilla	RECIBO.	
		Arenilla		
OBSERVACIONES.				
☐ M3 ☐ DIA ☐ VIAJES. ☐ INTERNO				
FECCHA.		LLEGADA.		
D M A		24 05 2023		

230

Vereda Montañita SAN ANTONIO DE PRADO NIT: 901185478-9 REGIMEN COMUN TEL: 604 473 23 21 TEL: 312 216 64 35		CONTROL DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA Nº 1438	
Contratante:		Obra:	
Origen:		Placa:	
DESCRIPCION.		FECHA.	
☐ ARENA DE PEGA ☐ ARENA DE CONCRETO ☐ ARENA DE REVOQUE ☐ AFIRMADO ☐ BASE ☐ PIEDRA ☐ RECUBA ☐ TRITURADO ☐ TIERRA BOTADERO ☐ TIERRAS INTERNAS ☐ GRAVILLA ☒ ARENILLA		LLEGADA.	
UNIDAD.		RECIBIO.	
CANT.		ENTREGO.	
OBSERVACIONES.		RECEPCION.	
☐ M3 ☐ DIA ☐ VIAJES. ☐ INTERNO		PLACA.	
CORREA SAS Suministros y transporte de materiales de playa y cantera		RECIBIO.	
		RECIBIO.	



CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
312 216 64 35

**CONTROL DE
VOLANTES Y MAQUINARIA**
Nº 1439

Contratante: Consorcio Papo 7

Obra: P.B. 7

Origen: Heliconia-

CANT.

UNIDAD.

DESCRIPCION.

PLACA.

FECHA.

D M A

LEGADA.

☒ M3
☐ DIA
☐ VIAJES.
☐ INTERNO

OBSERVACIONES.

☐ ARENA DE PEGA
☐ ARENA DE CONCRETO
☐ ARENA DE REVOQUE
☐ AFIRMADO
☐ BASE
☒ PIEDRA
☐ RECUNA
☐ TRITURADO
☐ TIERRA BOTADERO
☐ TIERRAS INTERNAS
☐ GRAVILLA
☐ ARENILLA

ENTREGÓ.

RECIBIO.



Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
TEL: 312 216 64 35.

CONTROL DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIA
Nº 1442

Contratante:

Obra:

Origen:

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

CANT.		UNIDAD.	DESCRIPCION.	PLACA.	FECHA.	LLEGADA.
1000		M3	ARENA DE PEGA	7417343	26/07/03	
☐		M3	ARENA DE CONCRETO			
☐		ARENA DE REVOQUE				
☐		AFIRMADO				
☐		BASE				
☐		PIEDRA				
☐		RECUNA				
☐		TRITURADO				
☐		TIERRA BOTADERO				
☐		TIERRAS INTERNAS				
☐		GRAVILLA				
☐		ARENILLA				

RECIBIO.
Javier y Virgas

OBSERVACIONES.	
☐ VIAJES.	Romero
☐ DIA	
☐ INTERNO	



CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
TEL: 312 216 64 35

Contratante:

Obra:

Origen:

CONTROL DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIA

Nº 1528

CANT.

UNIDAD.

DESCRIPCION.

PLACA.

FECHA.

LLEGADA

☐ M3
☐ DIA
☐ VIAJES.
☐ INTERNO


OBSERVACIONES.

☐ ARENA DE PEGA
☐ ARENA DE CONCRETO
☐ ARENA DE REVOQUE
☐ AFIRMADO
☐ BASE
☐ PIEDRA
☐ RECUNA
☐ TRITURADO
☐ TIERRA BOTADERO
☐ TIERRAS INTERNAS
☐ GRAVILLA
☐ ARENILLA

ENTREGA.

RECIBO.

VEREDA MONTAÑITA SAN ANTONIO DE PRADO REGIMEN COMUN NIT: 901185478-9 TEL: 604 473 23 21 312 216 64 35.		CONTROL DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA N° 1559		Contratante: Obra: Origen:		Suministros y transporte de materiales de playa y cantera CORREA SAS	
PLACA. NIT 18 C34		FECHA. D M A 05 06 2013		LLEGADA.		ENTREGO.	
DESCRIPCION.		UNIDAD.		CANT.		OBSERVACIONES.	
ARENA DE PEGA ARENA DE CONCRETO ARENA DE REVOQUE AFIRMADO BASE PIEDRA RECUNA TRITURADO TIERRA BOTADERO TIERRAS INTERNAS GRAVILLA ARENILLA		M3 DIA VIAJES. INTERNO		7		7	
RECIBIO.		RECIBIO.		RECIBIO.		RECIBIO.	



CORREA SAS
Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
REGIMEN COMUN
Nit: 901185478-9
TEL: 604 473 23 21
TEL: 312 216 64 35

Contratante:

Obra:

Origen:

CONTROL DE
VOLVETAS Y MAQUINARIA

Nº 1539


CANT.		UNIDAD.	DESCRIPCION.	PLACA.	FECHA.	LLEGADA.
☐ M3	☐ DIA	☐ VIAJES.	☐ ARENA DE PEGA		☐ D	☐ A
☐ INTERNO	☐	☐	☐ ARENA DE CONCRETO		☐ M	
			☐ AFIRMADO		☐	
			☐ BASE		☐	
			☐ PIEDRA		☐	
			☐ RECUNA		☐	
			☐ TRITURADO		☐	
			☐ TIERRA BOTADERO		☐	
			☐ TIERRAS INTERNAS		☐	
			☐ GRAVILLA		☐	
			☐ ARENILLA		☐	


RECIBIO.

ENTREGA.

OBSERVACIONES.

Vereda Montañita SAN ANTONIO DE PRADO NIT: 901185478-9 REGIMEN COMUN TEL: 604 473 23 21 312 216 64 35.		CONTROL DE VOLVETAS Y MAQUINARIA Nº 1560	
Contratante: Obra: Origen: Vereda Montañita		Correa SAS Suministros y transporte de materiales de playa y cantera	
DESCRIPCION. PLACA. FECHA. LLEGADA. RECIBIO.		CANT. UNIDAD. ENTREGO. OBSERVACIONES.	
ARENA DE PEGA ☐ ARENA DE CONCRETO ☐ ARENA DE REVOQUE ☐ AFIRMADO ☐ BASE ☐ PIEDRA ☐ RECUBA ☐ TRITURADO ☐ TIERRA BOTADERO ☐ TIERRAS INTERNAS ☐ GRAVILLA ☐ ARENILLA ☐		M3 ☐ DIA ☐ VIAJES. ☐ INTERNO ☐	





CORREA SAS

Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

Vereda Montañita
SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 901185478-9
REGIMEN COMUN
TEL: 604 473 23 21
TEL: 312 216 64 35.

CONTROL DE
VOLQUETAS Y MAQUINARIA
Nº 1651

Contratante:

Obra:

Origen:

CANT.

UNIDAD.

DESCRIPCION.

PLACA.

FECHA.

LEGADA.

M3 ☒
DIA ☐
VIJES. ☐
INTERNO ☐

OBSERVACIONES.


ARENA DE PEGA ☐
ARENA DE CONCRETO ☐
ARENA DE REVOQUE ☐
AFIRMADO ☐
BASE ☐
PIEDRA ☐
RECUNA ☐
TRITURADO ☐
TIERRA BOTADERO ☐
TIERRAS INTERNAS ☐
GRAVILLA ☐
ARENILLA ☐

ENTREGO.

RECIBIO.

LEONARDO ROMAN S. NIT 7132006-1

Vereda Montañita SAN ANTONIO DE PRADO NIT: 901185478-9 REGIMEN COMUN TEL: 604 473 23 21 312 216 64 35.		CONTROL DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA Nº 1652	
Contratante: Obra: Origen:		RECEBIO.	
UNIDAD.		DESCRIPCION.	
CANT.		PLACA.	
ENTREGO.		FECHA.	
OBSERVACIONES.		LEGADA.	
☐ M3 ☐ DIA ☐ VIAJES. ☐ INTERNO		☐ ARENA DE PEGA ☐ ARENA DE CONCRETO ☐ ARENA DE REVOQUE ☐ AFIRMADO ☐ BASE ☐ PIEDRA ☐ RECUNA ☒ TRITURADO ☐ TIERRA BOTADERO ☐ TIERRAS INTERNAS ☐ GRAVILLA ☐ ARENILLA	



Suministros y transporte
de materiales de playa y cantera

235

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 13: Correos enviados y recibidos.



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL Y SST CONTRACTUAL

2 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

15 de junio de 2023, 15:49

Buenas tardes, a continuación adjunto presupuesto socioambiental y SST en excel, cada componente ubicar en la casilla del frente la cantidad que realmente se necesita de los ítems que están dentro de este presupuesto y anexar aparte, lo que se requiere y no está relacionado en este presupuesto, de acuerdo a lo conversado, esta información se requiere a más tardar el día sábado 17 de Junio antes de medio día.

Cordialmente

Cielo Esther López Vega
Residente Ambiental de Interventoría ECOVÍAS.

 Presupuesto Socio-Ambiental contractual.xlsx
2373K

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

20 de junio de 2023, 8:23

Cordial saludo.

Adjunto envío el presupuesto ajustado de acuerdo a los requerimientos de la obra.

[El texto citado está oculto]

 Presupuesto Socio-Ambiental contractual.xlsx
2375K



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OBSERVACIONES PASAO V2

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

28 de mayo de 2023, 7:11

Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen día ingeniero Julián Villa, cordial saludo.

A continuación adjunto las observaciones realizadas por la supervisión e Interventoría, las cuales deben ser corregidas en los próximos 5 días hábiles, después de recibir este correo, para así proceder con la aprobación del mismo.

¡Feliz día!

Cordialmente

Cielo Esther López Vega
Residente Ambiental Interventoría ECOVIAS.

2 adjuntos**PASAO ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN V2.docx**
21523K**198-1-0060.pdf**
341K

25A



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

INFORME SEMANAL AMBIENTAL

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

22 de junio de 2023, 9:42

Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Cordial saludo.

Adjunto envío el informe semanal para su revisión y aprobación.

Quedo atento.

 **13. Informe semanal de actividades ambientales.zip**

JULIAN VILLA
Residente Ambiental
Consortio PITA 7

239



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

INFORME SEMANAL AMBIENTAL N°15

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

15 de junio de 2023, 14:31

Para: Alexandra Maria Restrepo Londono <alexandram.restrepo@medellin.gov.co>, manuela.castano@medellin.gov.co, velasquez0823@hotmail.com

Buenas tardes ingenieras cordial saludo, adjunto informe semanal ambiental N° 15, cualquier inquietud quedo atenta.

Cordialmente

Cielo Esther López Vega

Residente Ambiental de Interventoría ECOVIAS

 Informe semanal No 15 Amb.xlsm
8450K

2/0



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

INFORME SEMANAL AMBIENTAL N° 16

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

21 de junio de 2023, 19:44

Para: Alexandra Maria Restrepo Londono <alexandram.restrepo@medellin.gov.co>, manuela.castano@medellin.gov.co, velasquez0823@hotmail.com

Buenos días, adjunto informe semanal correspondiente al N° 16 del proyecto Construcción de redes de alcantarillado vereda la Florida, San Antonio de Prado.

Quedo atenta.

Atentamente:

Cielo Esther López Vega

Residente Ambiental Interventoría ECOVIAS



Informe semanal No 16 Amb.xlsm

4242K

241



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL MAYO

3 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

30 de mayo de 2023, 21:14

Buenos días profesionales Julián Villa Y Evering Piedrahita componentes Social, Ambiental, a continuación les comparto la calificación mensual de los componentes en mención, por favor revisar, firmar y devolver por este mismo medio.

Cordialmente

Cielo Esther López Vega
Residente Ambiental Interventoría ECOVIAS

 **Anexo 3.2.10 Evaluación Socio Ambiental..xlsx**
432K

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

31 de mayo de 2023, 9:21

Cordial saludo.

Adjunto el archivo con las respectivas firmas.
[El texto citado está oculto]

 **Anexo 3.2.10 Evaluación Socio Ambiental..xlsx**
789K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

30 de mayo de 2023, 21:41

Muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

6/7/23, 13:34

Gmail - Escombros y material sobrante

242



IMG_20230607_093501.jpg
1978K



IMG_20230607_115327.jpg
2378K



IMG_20230607_115413.jpg
3894K



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Escombros y material sobrante

2 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
7 de junio de 2023, 9:13

Buenos días señores Consorcio Pita7, cordial saludo.

La interventoría a solicitado en varias ocasiones el retiro de todo los residuos de construcción y demolición ubicados a lo largo de la vía donde se llevan a cabo las actividades constructivas, de acuerdo a la norma manejo de RCD se les recuerda que estos residuos tienen un tiempo máximo de acopio en los frentes de obra de 3 días, es por ello que la interventoría solicita el retiro inmediato de estos residuos ya que estos llevan más de una semana en sitio y se les recuerda que estas falencias no se pueden volver a presentar.

Cordialmente

Cielo Esther López Vega
Residente Ambiental Interventoría ECOVIAS

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
7 de junio de 2023, 15:06

Cordial saludo.

El día de hoy 07 de junio se realizó la respectiva limpieza del material sobrante ubicado a los costados de la vía del Tramo 2, con el fin de dar cumplimiento a las observaciones generadas por la interventoría, adjunto se envía registro fotográfico de las acciones realizadas.

Quedo atento.

JULIAN VILLA
Residente Ambiental
Consorcio PITA 7
[El texto citado está oculto]

4 adjuntos



IMG_20230607_093458.jpg
1954K

2/3



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

DOCUMENTOS CANTERA

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

29 de mayo de 2023, 13:18

Cordial saludo.

Adjunto envío los documentos de la Cantera Santa Rita, para su revisión y aprobación.

Quedo atento.

JULIAN VILLA
Residente Ambiental.
CONSORCIO PITA 7

 **Santa Rita.rar**
2655K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

29 de mayo de 2023, 13:22

Muchas gracias, recibido.

[El texto citado está oculto]

249



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL Y SST, PRESUPUESTO SOCIOAMBIENTAL

2 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

26 de junio de 2023, 10:22

Para: manuela.castano@medellin.gov.co, Alexandra Maria Restrepo Londono <alexandram.restrepo@medellin.gov.co>, velasquez0823@hotmail.com

Buenos días ingenieras, cordial saludo:

A continuación envío acta de comité socioambiental N° 08, también adjunto la nueva propuesta al presupuesto socio ambiental, el cual será el definitivo para realizarle seguimiento, este se encuentra revisado y aprobado por la Interventoría.

Quedo atenta!

Cordialmente

*Cielo Esther López Vega**Residente Ambiental de Interventoría ECOVIAS***2 adjuntos** **Presupuesto Socio-Ambiental contractual.xlsx**
2376K **Acta 08 Socioambiental-SST 14-06-2023.pdf**
3227K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

26 de junio de 2023, 10:30

Para: manuela.castano@medellin.gov.co, Alexandra Maria Restrepo Londono <alexandram.restrepo@medellin.gov.co>, velasquez0823@hotmail.com

Buen día, hago corrección el anterior es el presupuesto socio ambiental contractual y este es el conciliado el cual será el definitivo, revisado y aprobado por la Interventoría.

Cordialmente

*Cielo Esther López Vega**Residente Ambiental de Interventoría ECOVIAS*

[El texto citado está oculto]

 **Presupuesto Socio-Ambiental conciliado - 20-6-23.xlsx**
2374K

245



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Revisión PASAO

1 mensaje

Manuela Castano Velasquez <manuela.castano@medellin.gov.co>
Para: "laflorida.ecovias@gmail.com" <laflorida.ecovias@gmail.com>

29 de mayo de 2023, 8:25

Buenos días Cielo,

Te comparto la revisión del PASAO, discúlpame la demora

En los dos archivos se encuentran las observaciones uno es del documento en general y el otro hace referencia a las observaciones.

Quedo atenta a la versión final.



Manuela Castaño Velásquez
Contratista
Equipo de Agua Potable
Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial
Edificio Plaza de La Libertad, piso 8ª
Teléfono: 604 385 55 55 extensión 8447
manuela.castano@medellin.gov.co



Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo El Municipio de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

2 adjuntos

PASAO ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN V2.docx
21523K

27.05.2023_OBSERVACIONES PASAO LA FLORIDA.docx
1486K

246



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

MODIFICACION PMT

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

31 de mayo de 2023, 12:39

Cordial saludo.

Adjunto envío la modificación que tuvo el PMT aprobado para la ejecución del proyecto.

Quedo atento.

JULIAN VILLA
Residente Ambiental
Consortio PITA 7



Respuesta Modificación No. 1 rad 202330195168.pdf
222K

247



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

INFORME SEMANAL AMBIENTAL

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

7 de junio de 2023, 16:25

Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Cordial saludo.

Adjunto envío el correspondiente informe semanal para su revisión y aprobación.

Quedo atento.

JULIAN VILLA
Residente Ambiental
Consortio PITA 7

 11. Informe semanal de actividades ambientales.xls



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

INFORME SEMANAL AMBIENTAL

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

14 de junio de 2023, 16:24

Cordial saludo.

Adjunto envío el correspondiente informe semanal.

Quedo atento.

 **12. Informe semanal de actividades ambientales.xls**

JULIAN VILLA
Residente Ambiental
Consortio PITA 7

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

15 de junio de 2023, 14:18

Buenas tardes!

Recibido, recibido y aprobado

[El texto citado está oculto]

6/7/23, 13:33

Gmail - alcantarilladopita7@gmail.com sent you INFORME SEMANAL AMBIENTAL via WeTransfer

249



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

alcantarilladopita7@gmail.com sent you INFORME SEMANAL AMBIENTAL via WeTransfer

2 mensajes

WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Responder a: alcantarilladopita7@gmail.com
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

1 de junio de 2023, 13:00



**alcantarilladopita7@gmail.com
sent you INFORME SEMANAL
AMBIENTAL**

1 item, 57.9 MB in total · Expires on 8 June, 2023

Get your files

Download link

<https://wetransfer.com/downloads/e57a4498f76bde2c163d996ae7c1b4b920230601175727/a9f4b01f8f9af0c08adfcac8e3eedbf120230601175742/e4c4be>

1 item

10. Informe semanal de actividades ambientales.xls

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts.

[About WeTransfer](#) · [Help](#) · [Legal](#) · [Report this transfer as spam](#)

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Para: leidygaleano1801@gmail.com
[El texto citado está oculto]

20 de junio de 2023, 14:31

6/7/23, 13:33

Gmail - alcantarilladopita7@gmail.com sent you PASAO_V3.rar via WeTransfer



ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

alcantarilladopita7@gmail.com sent you PASAO_V3.rar via WeTransfer

1 mensaje

WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Responder a: alcantarilladopita7@gmail.com
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

31 de mayo de 2023, 17:01



alcantarilladopita7@gmail.com
sent you PASAO_V3.rar

1 item, 184 MB in total · Expires on 7 June, 2023

PASAO_V3.rar
CORRECCIONES PASAO V3

Get your files

Download link

<https://wetransfer.com/downloads/e0bcf71b17e4497da48dac529a6a0d6f20230531215352/53a730e1db0f689a671678cf5e5eb87c20230531215410/36b3a4>

1 item

PASAO_V3.rar
184 MB

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts.

[About WeTransfer](#) · [Help](#) · [Legal](#) · [Report this transfer as spam](#)



Anexo 3.2 14: Manejo de sumideros frente de obra.

252

 Alcaldía de Medellín <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>	SUMIDEROS PRESENTES EN EL FRENTE DE OBRA					
Fecha: 25 / 6 / 2023						
PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO						
CONTRATISTA CONSORCIO PITA7						
SEMANAL (Fecha)	Frente de Obra	No. De sumideros presentes en el frente de obra	Limpios	Regulares	Deficientes	OBSERVACIONES
1 al 8 de Junio	Tramo 2	2	SI			N.A
9 al 15 de Junio	Tramo 2	2	SI			N.A
16 al 24 de Junio	Tramo 2 y Tramo 1	3	SI			En tramo 1 se encuentra un sumidero el cual se encuentra colmatado con concreto, se hicieron las respectivas averiguaciones y efectivamente no ha sido ocasionado por la obra y para hacer la limpieza y mantenimiento de este se necesita un equipo especial, sin embargo la Interventoría le comunicó a EPM verbalmente en un recorrido de obra que se realizó esa semana, para que ellos tomaran las acciones pertinentes.

Cielo E Lopez

(Firma)

(Nombre) CIELO ESTHER LÓPEZ VEGA

Residente Ambiental Interventoría

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 15: Actualización PMT.

254



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Medellín, 25/05/2023

SeñorA:
Carmen Garcés Hernández
Directora de Obra
CONSORCIO PITA 7
Cel.: 3146060518
Correo: alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Asunto: Plan de manejo de tránsito (pmt), secretaría de movilidad.
construcción de redes de alcantarillado en la vereda la
florida, san antonio de Prado

Cordial saludo.

La Secretaría de Movilidad aprueba la modificación No. 1 del Plan de Manejo de Tránsito presentado para la ejecución del Contrato 4600095815 DE 2022 – “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO” -, de la siguiente manera:

Tipo cierre	Dirección	Fecha inicio	Fecha final	Horario
Total	Calle 56Sur entre carreras 85 y 87	16/09/2023	28/11/2023	09:00 a 16:00
Parcial	Calle 56Sur entre carreras 67A y 75	05/06/2023	15/09/2023	09:00 a 16:00

En la calle 56 Sur entre carreteras 67A y 75 (TRAMO 1) circulan las rutas Circular ruta 1, Circular ruta 2, Metro Estrella, Metro Limonar, Solobus ruta 4, Solobus ruta 5, Solobus ruta 2, Prado Minorista, Ruta 10 Veredal-San José. En horarios de 4:00 a.m. a 11:30 p.m. Con intervalos de 30 a 45 minutos aproximadamente. El tramo 1 contempla cierre parcial por lo que las rutas mencionadas no se verán afectadas en distancia de recorrido, pero si en tiempo.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

En la calle 56Sur entre carreras 75 y 85 (TRAMO 3) Transita el Circular ruta 5 Florida con horarios de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. intervalos de 45 minutos. El servicio es prestado por la empresa Cootrasana con vehículos tipo Bus. Con la cual se acordó que se hará los cierres de vía en horario entre 7:00 a 17:00. No se contemplan desvíos para esta ruta, toda vez, es la única vía de acceso. Por lo tanto, se debe contemplar contacto permanente con el encargado de la coordinación del transporte, igualmente se acuerda informar si hay cambios de horario por las siguientes situaciones: por afectación del clima, por necesidad de la comunidad en condición de discapacidad, por necesidad de las empresas o por avances en cronograma. La ruta de bus podrá hacer su recorrido con normalidad hasta el punto de cierre total donde contará con las condiciones para realizar maniobra de reversa.

La superficie de rodadura en el horario donde no se otorga permiso debe quedar libre de maquinaria y señalización y completamente segura para la circulación del flujo vehicular y peatonal.

En caso de ocupación de celdas de zona ZER, se debe de establecer el pago anticipado de la Tasa de Uso de las celdas de estacionamiento regulado con Terminales de Transporte de Medellín S.A, según Decreto 240 de 2017, Artículos 5° y 7°; este debe de realizarse previo a su ocupación, so pena de incurrir en sanción. Teléfono: 4448020 Ext 190 – 154.

El PMT presentado no hace referencia a los vehículos particulares (carros y motos) del personal de obra, por lo tanto, no está permitido el estacionamiento de dichos vehículos en ningún tramo de la vía. Y

Se deben considerar y realizar las reprogramaciones necesarias en los semáforos que estén en las áreas de los cierres o en las rutas de desvío, dichas reprogramaciones deben ser enviadas a ésta Secretaría, antes de la implementación de los cierres.

De presentarse una contingencia, donde se requiera personal de apoyo, se podrán solicitar a la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta que los costos de las unidades de Tránsito serán asumidos por la obra.

Las intervenciones en las intersecciones, se deben de realizar en cierres parciales nocturnos únicamente.



Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Commutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

www.medicalln.gov.co





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

En horario diurno se debe de garantizar como mínimo dos carriles de circulación debidamente canalizados en el tramo de intervención.

La señalización temporal de las obras se implementará de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones dadas en la Secretaría de Movilidad y al Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, emitido por el Ministerio de Transporte, y adoptado por la Resolución 1885 del 17 de junio de 2015, de la misma entidad, en su capítulo IV.

La demarcación horizontal o marcas viales que se vea afectada por las obras, de manera parcial o total, deberá ser restituida en su totalidad según las especificaciones del Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, vigente a la fecha de restitución y las condiciones particulares establecidas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, así: 1°. Afectación parcial o total de líneas longitudinales y transversales, estacionamiento, paraderos, cebras, símbolos y leyendas (flechas, símbolos, triángulos y leyendas tales como: PARE, DESPACIO, SOLO BUS, entre otras), se deben reconstruir en su totalidad. 2°. Cuando la restitución de la demarcación se realice para poner en funcionamiento la vía puede hacerse de manera provisional con pintura acrílica antideslizante y las marcas definitivas con pintura plástico en frío.

Si esta obra interfiere con algún cierre de obras aledañas, se deben poner de acuerdo con los demás contratistas para no interferir con la movilidad del sector.

Las obras a llevar a cabo se deben socializar con la comunidad y con las empresas de transporte público, a las cuales se les debe garantizar su operación, e implementar en todo momento senderos peatonales.

En los lugares donde se requieran hacer cierres totales de vía, o en vías de alto flujo vehicular y peatonal, se deberá presentar un plan de manejo de tránsito puntual para ese sitio.

La ocupación de más espacio del autorizado y la deficiente señalización, es causal de suspensión de permiso.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Se deben ubicar auxiliares de tránsito, los cuales deben de estar debidamente capacitados y certificados, de manera que se disminuya las congestiones debido al ingreso y salida de vehículos pesados a la obra, evitando contratiempos y accidentes.

Los incidentes causados por la deficiente señalización durante la ejecución de estos trabajos, serán únicamente responsabilidad del contratista.

La supervisión del cumplimiento del PMT y el seguimiento a la movilidad por la afectación del proyecto, será responsabilidad de la interventoría del contrato, en cabeza del director de interventoría, Diego Alberto Betancur, perteneciente al Secretario de gestión y control territorial - Dependencia servicios públicos de la ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, quien a su vez el supervisor del contrato por lo que deberá hacerle supervisión al seguimiento del cumplimiento del PMT aprobado por parte de la Secretaría de Movilidad, el cual se debe hacer a través del equipo de supervisión; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito

Siendo respetuosos con los peatones y habitantes de la zona de influencia de la intervención, se deberán habilitar senderos peatonales según el avance y la necesidad de la obra para garantizar la protección y seguridad en los desplazamientos.

Es importante contar con un buen manejo de la maquinaria y los camiones que transportan material y escombros de forma que no interfieran en la circulación del flujo vehicular existente, utilizando zonas demarcadas para procesos de cargue y descargue dentro de la obra.

No se permitirá el almacenamiento de material después de cada jornada diurna o nocturna de trabajo, así se garantiza la circulación en condiciones de seguridad y movilidad para los usuarios de la vía, en el momento de su apertura.

Este permiso perderá su validez cuando por disposiciones especiales se reglamenten nuevas medidas en materia de transporte y tránsito, igualmente cuando no posea el original en el lugar de la obra.



Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Commutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

www.medellin.gov.co



256



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Durante la ejecución de las obras, la Secretaría de Movilidad realizará controles previniendo la buena señalización y el personal necesario como auxiliares de tránsito garantizando la circulación de peatones y vehículos.

Las autoridades de tránsito podrán suspender esta autorización temporalmente, si encuentra condiciones de alta congestión.

En caso que se genere afectación en la dinámica y condiciones de movilidad no previstas en el plan de manejo de tránsito inicial, el responsable de la intervención deberá realizar de manera inmediata las modificaciones necesarias para que el impacto en la movilidad sea el menor posible e informar a la Secretaría de Movilidad.

De no cumplirse lo anterior las autoridades de tránsito procederán a imponer los comparendos correspondientes.

Respuesta radicado No. 202310161716 del 22 de mayo de 2023

Cordialmente,

JUAN CARLOS USUGA MONTOYA
LIDER DE PROGRAMA

Proyectó: Sandra Patricia Uribe
Profesional Universitario
Unidad de circulación

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 16: Presupuesto socio ambiental ajustado.

GUIA SOCIO-AMBIENTAL								
Construcción de redes de alcantarillado en la Vereda La Florida, San Antonio de Prado.					Modificaciones		Necesidad real	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR NUEVO
GESTIÓN SOCIAL Y								
Reuniones con la comunidad (inicio, avance y finalización), incluyen alquiler video beam, logística reuniones comunidad	un	18	\$ 207.600	\$ 3.736.800	-8	\$ (1.660.800)	10	\$ 2.076.000
Logística reuniones comunidad	un	18	\$ 103.800	\$ 1.868.400	-9	\$ (934.200)	9	\$ 934.200
Información y divulgación variantes según manual de identidad (14x21 cm, bond 90 gr, A4)	un	1500	\$ 519	\$ 778.500	0	\$ -	1500	\$ 778.500
Identidad (50x35 cm, bond 90 gr, A4)	un	50	\$ 2.180	\$ 109.000	0	\$ -	50	\$ 109.000
Valla 3x6 m según del manual de identidad (50x35 cm, bond 90 gr, A4)	un	10	\$ 385.162	\$ 3.851.620	-6	\$ (2.310.972)	4	\$ 1.540.648
Valla 3x6 m según del manual de identidad (50x35 cm, bond 90 gr, A4)	un	1	\$ 12.975.000	\$ 12.975.000	0	\$ -	1	\$ 12.975.000
GESTIÓN AMBIENTAL								
Manejo de Residuos Sólidos Canecas de 3 galones (para ubicar en campamentos y distribuidos en frentes de obra). Los colores de las canecas y el	un	10	\$ 5.398	\$ 53.980	-4	\$ (21.592)	6	\$ 32.388
Canecas de 3 galones (para ubicar en campamentos y distribuidos en frentes de obra). Los colores de las canecas y el	un	10	\$ 37.783	\$ 377.830	-7	\$ (264.481)	3	\$ 113.349
Acopio temporal de residuos	un	1	\$ 653.940	\$ 653.940	1	\$ 653.940	2	\$ 1.307.880

borlas plásticas para frentes de obra color negra (residuos)	un	500	\$ 204	\$	102.000	600	\$	122.400	1100	\$ 224.400
borlas plásticas para frentes de obra color blanca (residuos)	un	500	\$ 202	\$	101.000	0	\$	-	500	\$ 101.000
borlas plásticas para frentes de obra color rojo (residuos)	un	80	\$ 157	\$	12.560	0	\$	-	80	\$ 12.560
Herramientas y equipos para el aseo y limpieza en obra	global	10	\$ 103.800	\$	1.038.000	3	\$	311.400	13	\$ 1.349.400
Disposición adecuada de residuos	mes	9	\$ 400.000	\$	3.600.000	-2	\$	(800.000)	7	\$ 2.800.000
Almacenamiento adecuado de materiales de construcción				\$	1.565.300					\$ 8.096.500,00
Teleras 1,20 x 0,70 m	un	50	\$ 21.590	\$	1.079.500	100	\$	2.159.000	150	\$ 3.238.500,00
Plástico Negro, calibre 4 y ancho	kg	100	\$ 4.858	\$	485.800	900	\$	4.372.200	1000	\$ 4.858.000,00
Manejo del Recurso Hídrico				\$	599.350					\$ 480.650
Material tipo pomadora color azul para proteger sumideros (Rollo	m	200	\$ 1.187	\$	237.400	-100	\$	(118.700)	100	\$ 118.700
Estación de madera común para soporte de cerramiento	un	50	\$ 3.239	\$	161.950	0	\$	-	50	\$ 161.950
Kit anti-derrames	un	1	\$ 200.000	\$	200.000	0	\$	-	1	\$ 200.000
Abanderados				\$	110.200					\$ 110.200
Barreta de palo y soga tenebridad grado diamante (45 x 45 cm, con	un	4	\$ 27.550	\$	110.200	0	\$	-	4	\$ 110.200
Señalización vial y desvíos				\$	17.021.480					\$ 18.869.792
Señales preventivas según manual de señalización vial, 0,60	un	10	\$ 75.135	\$	751.350	0	\$	-	10	\$ 751.350
Señales preventivas según manual de señalización vial, 75 x	un	10	\$ 77.013	\$	770.130	24	\$	1.848.312	34	\$ 2.618.442
Auxilio para alquiler de maletines para el manejo de tránsito - PMU	un	100	\$ 5.000	\$	500.000	0	\$	-	100	\$ 500.000
(incluye todo lo necesario para la formulación, el trámite de	un	1	\$ 15.000.000	\$	15.000.000	0	\$	-	1	\$ 15.000.000
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y				\$	36.474.303					\$ 33.117.796
Ubicación y dotación de				\$	14.261.663					\$ 14.512.601

Camilla emergencia polietileno	un	1	\$ 52.177	\$ 52.177	2	\$ 104.354	3	\$ 156.531
Extintor ABC 10 LB	un	2	\$ 41.878	\$ 83.756	2	\$ 83.756	4	\$ 167.512
Arquero de 4 unidades de mano	mes	9	\$ 1.536.240	\$ 13.826.160	0	-	9	\$ 13.826.160
Estandar con 2 limpieza por	un	15	\$ 13.926	\$ 208.890	-2	\$ (27.852)	13	\$ 181.038
Casco ajuste para proteccion	un	2	\$ 45.340	\$ 90.680	2	\$ 90.680	4	\$ 181.360
Botiquin cruz roja de primeros	un			\$ 3.308.960				\$ 1.915.300
Demarcación del área de	un	100	\$ 15.653	\$ 1.565.300	0	-	100	\$ 1.565.300
Baliza o delineador tubular*	m	1500	\$ 140	\$ 210.000	1000	\$ 140.000	2500	\$ 350.000
Cinta Señalización Naranja	m	500	\$ 1.765	\$ 882.500	-500	\$ (882.500)	0	\$ 0
franja tipo pomsomora color	un	20	\$ 32.558	\$ 651.160	-20	\$ (651.160)	0	\$ 0
naranja (Rollo por 100 m, ancho				\$ 244.188				\$ 569.772
de 100 m de ancho y dos				\$ 244.188				\$ 569.772
franjas reflectivas tipo IV				\$ 225.402				\$ 225.402
Transporte de personal,	un	3	\$ 81.396	\$ 244.188	4	\$ 325.584	7	\$ 569.772
una para vehiculo (volqueta o				\$ 225.402				\$ 225.402
camión) de 1,00 x 1,50 m,				\$ 225.402				\$ 225.402
Imagen Institucional	Un	6	\$ 37.567	\$ 225.402	0	-	6	\$ 225.402
Chalecos para director,				\$ 18.434.090				\$ 15.894.721
ingenieros, residentes, auxiliares				\$ 18.434.090				\$ 15.894.721
Protocolo de bioseguridad	Un	1	\$ 18.434.090	\$ 18.434.090	-0,13775397	\$ (2.539.369)	0,862246034	\$ 15.894.721
Aplicación del PAPSO								
Total Aplicación Guía				\$ 85.029.263				\$ 85.029.263
Socioambiental								

Protocolo de bioseguridad				
Aplicación del PAPSO	Un	-0,13775397	\$ 18.434.090	\$ (2.539.369)
VALOR TOTAL CANTIDADES QUE NO SE EJECUTAN				\$ (10.211.626)

CANTIDADES ADICIONALES				
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GESTIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Residuos Sólidos				
Acopio temporal de residuos sólidos ordinarios	un	1,00	\$ 653.940	\$ 653.940
Bolsas plásticas para frentes de obra color negra (residuos ordinarios)	un	600,00	\$ 204	\$ 122.400
Herramientas y equipos para el aseo y limpieza en obra	global	3,00	\$ 103.800	\$ 311.400
Almacenamiento adecuado de materiales de construcción				
Teleras 1,20 x 0,70 m	un	100,00	\$ 21.590	\$ 2.159.000
Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	900,00	\$ 4.858	\$ 4.372.200
Señalización vial y desvíos				
Señales preventivas según manual de señalización vial, 75 x 75, móvil usada en vías secundarias*	un	24,00	\$ 77.013	\$ 1.848.312
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL				
Ubicación y dotación de campamentos				
Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm*	un	2,00	\$ 52.177	\$ 104.354
Extintor ABC 10 LB	un	2,00	\$ 41.878	\$ 83.756
Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref 115 en lona	un	2,00	\$ 45.340	\$ 90.680
Demarcación del área de trabajos				
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	m	1000,00	\$ 140	\$ 140.000
Transporte de personal, Materiales y Equipos				
Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,00 x 1,50 m, impresión injekt resistente a la intemperie	un	4,00	\$ 81.396	\$ 325.584
VALOR TOTAL CANTIDADES ADICIONALES				\$ 10.211.626

262

CANTIDADES QUE NO SE EJECUTAN				
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONAL				
Reuniones con la comunidad				
Logística reuniones comunidad (inicio, avance y finalización), incluyen alquiler video beam, refrigerios para 30 personas).	un	-8,00	\$ 207.600	\$ (1.660.800)
Logística reuniones comité ciudadano de obra (incluye refrigerios para 15 personas).	un	-9,00	\$ 103.800	\$ (934.200)
Información y divulgación				
Valla tipo tijera 1 x 1 m en lamina galvanizada calibre 24 impresa en screen pintura	un	-6,00	\$ 385.162	\$ (2.310.972)
GESTIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Residuos Sólidos				
Canecas de 5 galones (para ubicar en campamentos y distribuidos en frentes de obra). Los colores de las canecas y el acopio temporal para el manejo de residuos sólidos, debe ser acorde con la norma	un	-4,00	\$ 5.398	\$ (21.592)
Canecas de 55 galones (para ubicar en campamentos y distribuidos en frentes de obra). Los colores de las canecas y el acopio temporal para el manejo de residuos sólidos, debe ser acorde con la norma	un	-7,00	\$ 37.783	\$ (264.481)
Disposición adecuada de residuos peligrosos	mes	-2,00	\$ 400.000	\$ (800.000)
Manejo del Recurso Hídrico				
Malla tipo polisombra color azul para proteger sumideros (Rollo por 200 m x 1,50 m ancho)	m	-100	\$ 1.187	\$ (118.700)
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL				
Ubicación y dotación de campamentos				
Casco ajuste para protección personal	un	-2	\$ 13.926	\$ (27.852)
Demarcación del área de trabajos				
Malla tipo polisombra color naranja (Rollo por 100 m, ancho de 1,50 m)	m	-500	\$ 1.765	\$ (882.500)
Conos (0,90 de altura y dos franjas reflectivas tipo IV diamante)	un	-20	\$ 32.558	\$ (651.160)



263

Anexo 3.2 17: Indicadores ambientales.

INDICADORES GESTION AMBIENTAL 2023

INDICADORES GESTION AMBIENTAL 2023																																			
		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre															
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%														
Programa de Residuos Sólidos	Gestión de residuos orgánicos (Kg)	1	100%	4	100.00%	5	100.00%	4,7	100.00%													Auditor													
	$\frac{\text{Residuos orgánicos generados (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de residuos orgánicos (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión de residuos reciclables (Kg)		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%																										
	$\frac{\text{Residuos reciclables generados (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de residuos reciclables (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión de residuos peligrosos (Kg)		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Residuos peligrosos generados (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de residuos peligrosos (Kg)}} \times 100$																																		
Material vegetal		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Material vegetal generado (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de material vegetal (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión suelo orgánico		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Gestión suelo orgánico generado (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de gestión suelo orgánico (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión excedentes de extracción		116.3	0.00%	502.4	100.00%	402.88	100.00%	396.6	100.00%																										
	$\frac{\text{Excedentes de extracción generados (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de excedentes de extracción (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión de carcacas de concreto		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Carcacas de concreto generadas (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de carcacas de concreto (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión de asfalto		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Asfalto generado (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de asfalto (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión de metales		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Metales generados (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de metales (Kg)}} \times 100$																																		
Gestión de maderas		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Maderas generadas (Kg)}}{\text{Capacidad máxima de maderas (Kg)}} \times 100$																																		
Programa Emisiones Atmosféricas	Indicador																					Diciembre	%	Auditor											
Medidas implementadas para el control de la emisión de material particulado																																			
	$\frac{\text{Medidas implementadas para el control de la emisión de material particulado}}{\text{Capacidad máxima de medidas implementadas para el control de la emisión de material particulado}} \times 100$	11	100.00%	50	100.00%	42	100.00%	37	100.00%																										
Programa Uso y almacenamiento de materiales	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Uso y almacenamiento de materiales}}{\text{Capacidad máxima de uso y almacenamiento de materiales}} \times 100$	6	100.00%	6	100.00%	10	100.00%	10	100.00%																										
Programa para la protección del suelo	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Protección del suelo}}{\text{Capacidad máxima de protección del suelo}} \times 100$	216.321	100.00%	303.819	100.00%	220.5	100.00%	34.125	100.00%																										
Materiales plásticos de carteras autorizadas	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Materiales plásticos de carteras autorizadas}}{\text{Capacidad máxima de materiales plásticos de carteras autorizadas}} \times 100$	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
Mantenimiento de las extracciones		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Mantenimiento de las extracciones}}{\text{Capacidad máxima de mantenimiento de las extracciones}} \times 100$	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
Reparabilización del suelo		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Reparabilización del suelo}}{\text{Capacidad máxima de reparabilización del suelo}} \times 100$	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
Protección del suelo																																			
	$\frac{\text{Protección del suelo}}{\text{Capacidad máxima de protección del suelo}} \times 100$																																		
Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Manejo de sustancias químicas peligrosas}}{\text{Capacidad máxima de manejo de sustancias químicas peligrosas}} \times 100$																																		
Control de alarmas		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%																										
	$\frac{\text{Control de alarmas}}{\text{Capacidad máxima de control de alarmas}} \times 100$																																		
Programa para mantener y reducir	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Mantenimiento y reducción}}{\text{Capacidad máxima de mantenimiento y reducción}} \times 100$																																		
Control de vehículos en obra		6	100.00%	6	100.00%	10	100.00%	10	100.00%																										
	$\frac{\text{Control de vehículos en obra}}{\text{Capacidad máxima de control de vehículos en obra}} \times 100$																																		
Programa prevención contaminación del recurso hídrico y SPTD	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Prevención de contaminación}}{\text{Capacidad máxima de prevención de contaminación}} \times 100$																																		
Protección de inundaciones		2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%																										
	$\frac{\text{Protección de inundaciones}}{\text{Capacidad máxima de protección de inundaciones}} \times 100$																																		
Protección de cuerpos de agua		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Protección de cuerpos de agua}}{\text{Capacidad máxima de protección de cuerpos de agua}} \times 100$																																		
Programa Fiestas y Fitos	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Fiestas y Fitos}}{\text{Capacidad máxima de fiestas y fitos}} \times 100$																																		
Gestión en la sala de fritos		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Gestión en la sala de fritos}}{\text{Capacidad máxima de gestión en la sala de fritos}} \times 100$																																		
Protección del material vegetal		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Protección del material vegetal}}{\text{Capacidad máxima de protección del material vegetal}} \times 100$																																		
Gestión trasplante de árboles		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Gestión trasplante de árboles}}{\text{Capacidad máxima de gestión trasplante de árboles}} \times 100$																																		
Gestión en la sala de fritos		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%																										
	$\frac{\text{Gestión en la sala de fritos}}{\text{Capacidad máxima de gestión en la sala de fritos}} \times 100$																																		
Programa Uso eficiente y ahorro del agua y la energía	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Uso eficiente y ahorro del agua y la energía}}{\text{Capacidad máxima de uso eficiente y ahorro del agua y la energía}} \times 100$																																		
Sistemas alternativos de agua		0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	1	100.00%																										
	$\frac{\text{Sistemas alternativos de agua}}{\text{Capacidad máxima de sistemas alternativos de agua}} \times 100$																																		
Programa Campesinatos y instalaciones temporales	Significado del indicador																																		
	$\frac{\text{Campesinatos y instalaciones temporales}}{\text{Capacidad máxima de campesinatos y instalaciones temporales}} \times 100$																																		
Servicios sanitarios en obra		2	100.00%	3	100.00%	3	100.00%	4	100.00%																										
	$\frac{\text{Servicios sanitarios en obra}}{\text{Capacidad máxima de servicios sanitarios en obra}} \times 100$																																		

265

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexos SST Contratista

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.3-1: Informe mensual contratista.

INFORME SGSST CONTRATISTA PITA 7

INFORME SG-SST MENSUAL DE CONSTRATISTA



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS GENERALES

Contratista: CONSORCIO PITA 7

Contrato de Obra: No 4600095815

Interventoría: ECOVIAS S.A.S

Contrato de Interventoría:

Periodo reportado: Mes: JUNIO Año: 2023


Objeto del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Actividades de SG-SST Obra del Periodo: las siguientes actividades de realizaron durante el periodo con el fin de implementar el SGSST y las actividades contempladas en el plan de trabajo dispuesto para la obra.

- Se realizaron 5 ingresos el cual se realizaron las respectivas inducciones al personal nuevo en obra socializando información general de la empresa, la política y objetivos del SGSST, se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor, se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar
- Se realizaron 26 entregas de dotación al personal y 30 de elementos de protección individual.
- Se realizaron 1 capacitación (Seguridad al manipular equipos eléctricos y manuales).
- Se realizaron 11 permisos de alturas con sus respectivos ATS, 10 de espacios confinados con sus respectivos APA y 2 permisos de trabajo en caliente con su respectiva lista de verificación.
- Se realizaron 34 preoperacionales (4 preoperacionales de retroexcavadora, 6 preoperacionales de canguro, 3 preoperacionales de martillo demoledor, 3 preoperacionales de pulidora, 2 preoperacional de compresor, 7 preoperacional de cortadora de pavimento, 3 preoperacional de radial, 3 preoperacionales de concretadora, 2 preoperacional de Bobcat.)
- Se realizaron 5 socializaciones de estándares de operación segura de maquinaria y equipos. (Estándar de operación segura de martillo demoledor, sierra circular, compresor, cortadora de pavimento)
- Se realizaron 6 charlas al personal (socialización ATS y APA, roles y responsabilidades, izaje de carga, Orden y aseo- manejo integral de residuos, investigación de accidente de trabajo)
- Se actualizó el perfil sociodemográfico incluyendo 5 trabajadores nuevos.
- Se envió a la interventoría 2 fichas técnica de la (mini retroexcavadora SANY y retroexcavadora Oruga y su respectivo manual de mantenimiento)
- Se realización 11 inspecciones de seguridad (Excavación, extensiones eléctricas, herramientas, inspecciones de seguridad, inspección de botiquín, inspección de extintores, inspección de camilla, , inspección de EPI, inspección de oficina, Inspección de sustancias químicas)
- Se realizó la conformación del grupo de apoyo de brigadistas de PITA 7

- Se envía la seguridad social (CARLOS RAMOS, CONSORCIO PITA7, GUINCO, JORGE ARROYAVE, LOBATO, RENTALMAQ, SOTARCO y MAT)
- Ausentismo actualizado-

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra

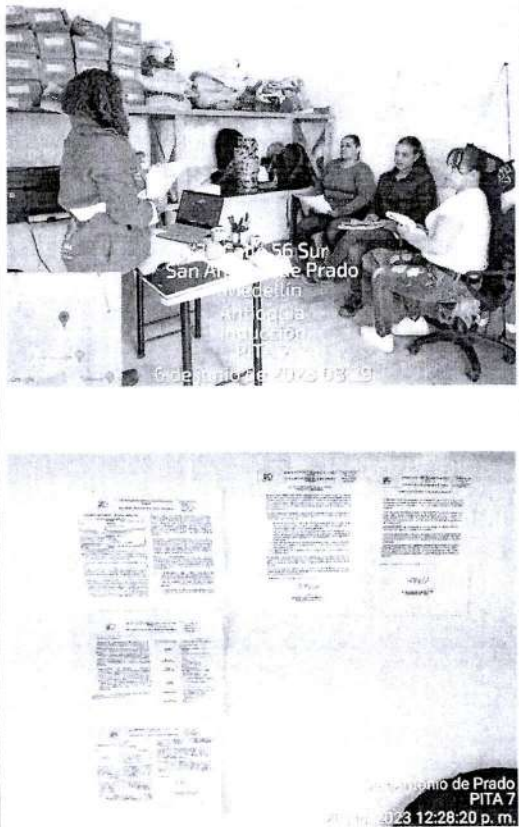Programa	Medidas de manejo	Registro Fotográfico	Anexo o Formatos
Reglamento de higiene y seguridad industrial	<p>Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones</p> <p>En el mes de junio 2023 se realizó la actualización de cartelera de SST y en las inducciones de ingreso se divulgó el reglamento de higiene y seguridad industrial junto con las políticas SST y de no consumo de alcohol.</p>		<p>Anexo 5.</p> <p>Registro fotográfico</p>

Medicina preventiva y del trabajo

En las actividades relacionadas de Vigilancia epidemiológica se realizó durante el mes junio 2023, la revisión documental del personal que ingreso nuevo al proyecto, donde se verificaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso que si sean aptos para el cargo y sin ninguna restricción para la ejecución de las actividades.


Se instalo la señalización preventiva e informativa en todos los tramos del proyecto Y así advertir a los colaboradores, vecinos y vehículos de la vía la existencia de una condición peligrosa.

. Se realizaron calistenias antes de iniciar actividades para la prevención de lesiones osteomusculares



Anexo
9
Evidencia
fotográfica

Entrega de dotación y elementos de protección personal	<p>Los EPP están contemplados en el artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 y tienen el propósito de proteger distintas partes del cuerpo del empleado e impedir que tenga contacto directo con elementos o factores de riesgo que puedan ocasionar una lesión, enfermedad o inclusive la muerte.</p> <p>Dando cumplimiento a lo anterior se realizó la entrega de dotación y EPPs al personal nuevo y se hizo la reposición de los mismo según su desgaste y las necesidades de las actividades que se están ejecutando.</p>	 <p>San Antonio de Prado PITA 7 21 Jun. 2023 9:00:53 a.m.</p> <p>53 Calle 56 Sur San Antonio de Prado Medellín Antioquia Entrega de dotación PITA 7 1 de junio de 2023 08:24</p> <p>#34-98 Calle 56 Sur San Antonio de Prado Medellín Antioquia Entrega EPI PITA 7 1 de junio de 2023 13:27</p>	Anexo 2.
Investigación de incidentes y accidentes de origen laboral	En el mes de junio de 2023 no se presentaron accidentes de laborales	NA	NA
Afiliación al sistema de seguridad social	<p>Se realiza revisión de cada trabajador al Sistema de seguridad social (A que entidades se encuentran afiliados EPS, ARL, Caja de Compensación, Pensión).</p> <p>Esta documentación se revisa antes que el personal ingrese a obra y sea avalada por interventoría.</p> <p>Se Verificó las planillas de seguridad social mensual de PITA 7, consorciados y subcontratistas.</p>	NA	Anexo 1 y 9
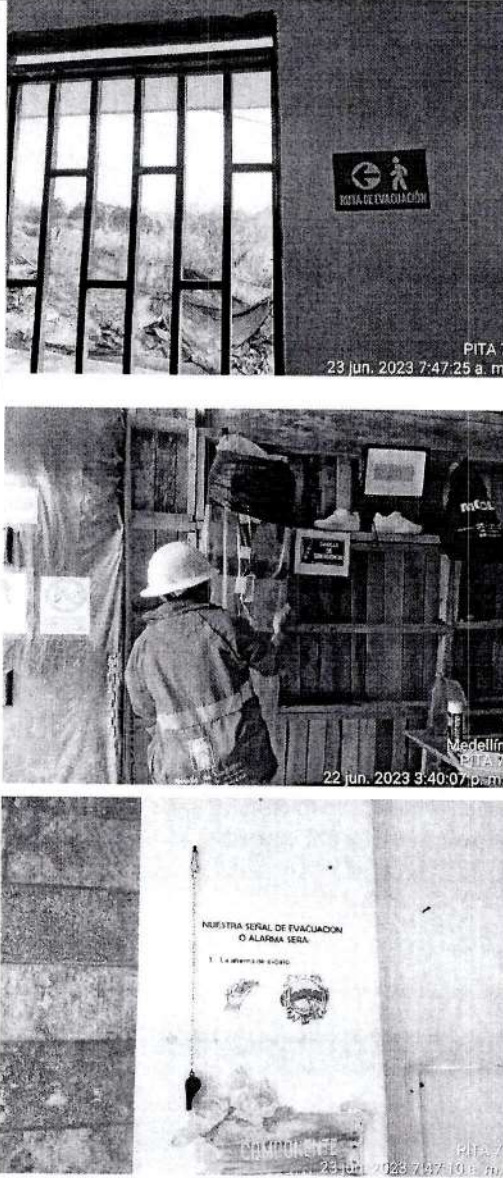
<p>Plan de emergencia</p>	<p>Fijar los parámetros básicos para la atención de Emergencias en la oficina y obras, para prevenir y controlar las diferentes situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas, los bienes de la empresa y su entorno ambiental.</p> <p>En el mes de junio 2023 se realizaron las inspecciones de los 3 puntos de emergencia que contamos en el proyecto</p> <p>Se realizó la conformación del grupo de apoyo de la brigada</p>	 <p>PITA 7 23 jun. 2023 7:47:25 a. m.</p> <p>Medellín PITA 7 22 jun. 2023 3:40:07 p. m.</p> <p>PITA 7 23 jun. 2023 7:07:10 p. m.</p>	<p>Anexo 12</p>
<p>Actividades especiales</p>	<p>En el mes de junio 2023 se ejecutaron actividades en alturas y espacios confinados en brechas, cañuelas y MHS con una profundidad máxima de 3,50 mts, el cual se tomaron las medidas preventivas para la ejecución de las actividades, se realizaron los permisos con sus ATS y APA correspondientes</p>	 <p>Calle 5ª Sur Unión de Prad Medellín Antioquia PITA 7 junio de mayo de 2023 10:16</p>	<p>Anexo 6</p>

Programa de Inspecciones y preoperacionales

Para las actividades a desarrollar, se necesita mucho apoyo de maquinaria, equipos y herramientas eléctricas, que se someten a preoperacionales e inspecciones diarias y semanales por parte del residente SST presente en el área y del operador, quien determina si la maquinaria, herramienta y el equipo está en condiciones de uso adecuado. Se anexa la inspección y preoperacional de los equipos en el presente informe.

- Botiquín.
- Camillas.
- Epp.
- Extintores.
- Oficina.
- Herramientas manuales.
- Extensiones eléctricas.
- frentes de trabajo.
- de seguridad.
- extensión eléctrica.
- Trabajo de excavación.

preoperacionales:

- Compresor
- Concretadora
- Canguros
- Cortadora de pavimento
- Martillo demoledor
- Pulidora
- Retroexcavadora
- Bobcat
- Sierra circular




Anexos
7 y 11

Plan de Inducciones y capacitaciones

Se realizaron inducciones al personal que ingreso nuevo al proyecto

Para este periodo de junio de 2023 se realizó capacitación sobre la seguridad al manipular las herramientas manuales y eléctricas, charlas y socializaciones e inducción en Seguridad y salud en el trabajo a personal.

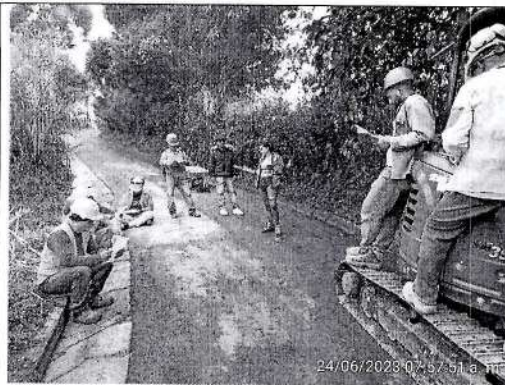

Anexo 1.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.

Diana Higuera

Firma SST del Contratista

Nini Johana R

Firma SST de la Interventoría

222

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.3-2: Anexo 2 EPP y Dotación.

ANEXO 2.

EPP Y DOTACIÓN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-095
		Versión: 001
	ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página: 1 DE 1

[illegible]

 <p>GUINCO SAS</p> <p>GUERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. R.C. 3000 270 5007</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-095
		Versión: 002
	ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página: 1 DE 1

[illegible]

ENTREGA DE DOTACIÓN

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

NOMBRE: <u>Georgina J. Kediakhita Z</u>	CEDULA: <u>43252447</u>
---	-------------------------

CARGO: Residente Social	OBRA: Pita 7.
-------------------------	---------------

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Catalina Gomez	CEDULA No.	Mat 334220
--------	----------------	------------	------------

CARGO	2000 kg	FIRMA	...
-------	---------	-------	-----

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

ENTREGA DE DOTACIÓN

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

1) DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

NOMBRE: James P. Ford

CEDULA: 6172321

CARGO: *Hydrate*

OBRA:	21.10.7
-------	---------

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE 2

CEDULA No. 4143378222

CARGO	Bridge SS
-------	-----------

FIRMA 

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

CEDULA:	77206985
---------	----------

OBRA:	Dita 7
-------	--------

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

CEDULA No. 1 9433 Hecan

FIRMA 

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.


El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.


FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

~~Arischo~~

CEDULA No:

71906485

Página 1 de 1



Pagina: 1 DE 1

OBRA: 8,179 7

Camilo.

FIRMA	
-------	--

112845a BS

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Leo et al Antonio Lopez

CEDULA: ID 60660100

CARGO: *officer*

OBRA: P. 70. 7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE 1000

CEDULA No. 1943378 ul

[illegible]

FIRMA *Dei...*

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

hardly ever

CEDULA No:

10 68660 100

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Edgar A. Durán
CARGO:	Revisor Sr

CEDULA:	6122321
OBRA:	D. 74.7

CARGO:	Leilan el SSR
--------	---------------

OBRA:	D. tu 7
-------	---------

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	de la Cabaña
CARGO	Pericleta 585

CEDULA No. 1143371209
FIRMA

CARGO	Residente 585
-------	---------------

FIRMA	<i>[Signature]</i>
-------	--------------------

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

05.

[Handwritten signature]

6122321

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Jennydy Lopez
CARGO:	Oficial

CEDULA:	1069660100
OBRA:	PISO 7.

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	JOHN W. [Signature]
CARGO	Director of [Signature]

CEDULA No.	113078207
FIRMA	[Signature]

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Geo-morphic Cor-

CEDULA No:

106866.01-0.



FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Subcap. Párrafo 6.7.20.2	CEDULA: 7117536
----------------------------------	-----------------

CARGO: <i>Py</i>	OBRA: <i>Pita 7</i>
------------------	---------------------

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	CEDULA No.
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten ID Number]</i>

CARGO	DESIGNER'S	FIRMA
-------	------------	-------

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:


295

Cód. FO-ADQU-273	Formato FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5		

Anexo 3.3-3: Anexo 1 Inducciones

ANEXO 1.

INDCACIONES



Fecha:
PROYECTO

DD 06 MM 06 AA 2023

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA

TEMA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN



CHARLA INFORMATIVA

11

COMITÉ CIUDADANO

11

CAPACITACIÓN

11

ENTRENAMIENTO

11

OTRO

[illegible]

Jack L. [unclear]

Contratista

Nini phona R

Interventoria

298

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-026
		Versión: 001
	EVALUACION INDUCCION -REINDUCCION	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: Proyecto Pita 7 Fecha: 6-6-2023
Nombre y Apellido del Empleado: Yael Carmen Lopez Cano
Cargo: Auxiliar Número de Documento: 43993098
Nombre del capacitador: Chirle Esteban Inducción X Re inducción

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

12/12

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal:

(a) Guantes, Pinzas, Gorra

(b) Arnés, baldes, gafas de sol

✓(c) Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo

2. Los Elementos de Protección Personal son de uso obligatorio durante la jornada laboral. SI X NO

3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. SI X NO

4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. SI NO X

5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. SI NO X

6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias psicoactivas mientras laboran. SI NO X

7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. SI NO X

8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. SI X NO

9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:

(a) Solicitar permisos cuando sea requerido

(b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo

✓(c) Todas las anteriores

10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:

(a) Utilizar los elementos de protección personal

(b) Cumplir con las normas de seguridad

✓(c) Todas las anteriores

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-026
		Versión: 001
	EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 2 de 2

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador


DEBER	DERECHO
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo	Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	Llegar tarde todos los días
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	✓
	PROTECTOR AUDITIVO	✓
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	✓
	PANTALONETA DE BAÑO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	✓
	CARETA PARA SOLDAR	✓

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción


Firma trabajador


Firma capacitador

299

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-028
		Versión: 001
	INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR		
Nombre y Apellidos del Trabajador:	Cédula:	Cargo:
<i>Yo del trabajo PTA 7</i>	43993098	<i>Acti Vial.</i>
Fecha:	Inducción:	Reinducción:
6-6-2023	X	

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X			
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X			
Se le indico a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X			
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X			
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X			
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X			
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	X			
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X			
Se dio a conocer la política de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y porte de armas.	X			
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X			
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X			
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X			
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X			
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	X			
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	X			



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: F-SST-028

Versión: 001

Fecha: 03/03/2023

Página 2 de 2

INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	X			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	X			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	X			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	X			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	X			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	X			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	X			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	X			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	X			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	X			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	X			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	X			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	X			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	X			

Yo Yohel Ruby Ruiz con cedula de ciudadanía C.C. 143993098 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción:

Realiza la inducción:

CONTROL DE ASISTENCIA

Ciudad:

Medellin

Fecha:

June 10

Duración:

2 hours

INDUCCIÓN

☒

CAPACITACION / CURSO / TALLER

7

REINDUCCIÓN

DIVULGACION

ENTRENAMIENTO

OTRO:


TEMA: POLITICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: ORIENTAR, ENTRENAR, SOCIALIZAR

EXPOSITOR: YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ

LISTADO DE ASISTENTES

[illegible]



Fecha:
PROYECTO

DD 06 MM 06 AA 2023

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA

TEMA:

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

11

COMITÉ CIUDADANO

11

CAPACITACIÓN

7

ENTRENAMIENTO

OTRO

[illegible]

Empty

(Nonstop)

Contratista

(Fama)

1. Normative

Interventoria



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: F-SST-027

Version: 001

EVALUACIÓN DE EFICACIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha: 03/03/2023

Página 1 de 1

Proyecto: Proyecto Pita 7 Lugar: sector la bodega Fecha: 6-6-2023

Tema de tratado: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del participante: José del Realizante

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	EVALUACION
1	La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la empresa en la identificación y gestión de los riesgos laborales:	F _____ V ☒	1,25
2	La empresa esta comprometida con el bienestar de:	A. La familia ☒ B. Los trabajadores C. Los clientes D. Ninguno de los anteriores	1,25
3	Todos los empleados, contratistas y proveedores, están obligados a cumplir con las normas y procedimientos de seguridad dentro de la empresa:	F _____ V ☒	1,25
4	La política debe ser revisada por la gerencia cada:	A. 3 años B. 5 años C. Anualmente ☒	1,25
5	En la política se establece el compromiso de cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales:	F _____ V ☒	1,25

Firma del participante: José del Realizante CC: 43993098

ESPACIO PARA EL EVALUADOR

* Cada pregunta corresponde el valor de (1,25) unidad.

* Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción.

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE
1-2	3-4	5

OBSERVACIONES: _____

Nombre y firma del evaluador: José del Realizante

[illegible]



REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha:

DD

DL

MM

06

AA

2023

PROYECTO.

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA

TEMA:

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

COMITÉ CIUDADANO

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

OTRO

[illegible]

(Frank)

(November)

Contratista

(Furness)

November

Interventoria

 <p>GUINCO SAS SOLUCIONES INTEGRADAS CONTRACTUALES S.A.S. NIT 700 204 640 7</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-025
	EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Versión: 002
		Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: pipa 7 Fecha: 06-06-23
Nombre y Apellido del Empleado: JOSÉ LUIS ECHAVARRIA (OPREA)
Cargo: Aux via Número de Documento: 100643733
Nombre del capacitador: [Firma] Inducción X Re inducción

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal: 12/12
(a) Guantes, Pinzas, Gorra
(b) Arnés, baldes, gafas de sol
☒ Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo
2. Los Elementos de Protección Personal son de uso obligatorio durante la jornada laboral. SÍ X NO
3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. SÍ X NO
4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. SÍ NO X
5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. SÍ NO X
6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias psicoactivas mientras laboran. SI NO X
7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. SI NO X
8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. SI X NO
9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:
(a) Solicitar permisos cuando sea requerido
(b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
☒ Todas las anteriores
10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:
(a) Utilizar los elementos de protección personal
(b) Cumplir con las normas de seguridad
☒ Todas las anteriores

203

 <small>GUINCO SAS</small> <small>QUEBRERA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S</small> <small>NEC 000 200 980 7</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-025
			Versión: 002
	EVALUACION INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN		Fecha: 03/03/2023
			Página 2 de 2

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER		DERECHO	
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	✓	Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL	✓
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo		Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades	✓
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	✓	Llegar tarde todos los días	
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud		Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera	✓

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	X
	PROTECTOR AUDITIVO	X
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	X
	PANTALONETA DE BAÑO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	X
	CARETA PARA SOLDAR	X

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

JASBEMY TCHAUARRIN

Firma trabajador

[Signature]

Firma capacitador

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-026
		Versión: 002
	INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR									
Nombre y Apellidos del Trabajador:	Cédula:	Cargo:							
JASBETON TCHAVARRIA C.	1000643333	Aux. vital							
Fecha:	Inducción:	Reinducción:							
06/06/23	X								
<p>Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMA</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> </table>					TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES					
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA									
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X								
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X								
Se le indicó a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X								
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X								
SEGURIDAD SOCIAL									
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X								
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X								
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X								
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X								
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	X								
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X								
Se dio a conocer la política de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y porte de armas.	X								
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X								
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X								
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X								
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X								
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X								
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	X								
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	X								
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	X								
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	X								

304

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-026
			Versión: 002
	INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN		Fecha: 03/03/2023
			Página 2 de 2

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	☒	☐	☐	☐
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	☒	☐	☐	☐
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	☒	☐	☐	☐
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	☒	☐	☐	☐
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	☒	☐	☐	☐
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	☒	☐	☐	☐
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	☒	☐	☐	☐
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	☒	☐	☐	☐
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	☒	☐	☐	☐
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	☒	☐	☐	☐
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	☒	☐	☐	☐
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	☒	☐	☐	☐
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	☒	☐	☐	☐
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	☒	☐	☐	☐
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	☒	☐	☐	☐
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	☒	☐	☐	☐

Yo JASOLEIDY ECHAZARRA con cedula de ciudadanía C.C. 1000643433 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: JASOLEIDY ECHAZARRA
 Realiza la inducción: [Firma]

 GUINCO SAS GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S NIT. 900.314.000	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-025
	EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Versión: 002
		Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: Proyecto Pto 7 Fecha: 03/03/23
 Nombre y Apellido del Empleado: Alba Vales Gencina Lopez
 Cargo: Auxiliar Número de Documento: 43 418157
 Nombre del capacitador: Jorge Est Inducción X Re inducción

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal:

- (a) Guantes, Pinzas, Gorra
 (b) Arnés, baldes, gafas de sol
 (x) Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo

2. Los Elementos de Protección Personal son de uso obligatorio durante la jornada laboral. SÍ X NO

3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. SÍ X NO

4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. SÍ NO X

5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. SÍ NO X

6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias psicoactivas mientras laboran. SÍ NO X

7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. SÍ NO X

8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. SÍ X NO

9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:

- (a) Solicitar permisos cuando sea requerido
 (b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
 (x) Todas las anteriores

10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:

- (a) Utilizar los elementos de protección personal
 (b) Cumplir con las normas de seguridad
 (x) Todas las anteriores



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

Código: F-SST-025
 Versión: 002
 Fecha: 03/03/2023
 Página 2 de 2

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER	DERECHO
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	☒ Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL ☒
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo	Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades ☒
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	☒ Llegar tarde todos los días
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	☒ Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera ☒

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	☒
	PROTECTOR AUDITIVO	☒
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	☐
	BOTAS DE SEGURIDAD	☒
	PANTALONETA DE BAÑO	☐
	GUANTES DE SEGURIDAD	☒
	CARETA PARA SOLDAR	☒

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

+ NUBIA _____
 Firma trabajador



 Firma capacitador

INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre y Apellidos del Trabajador:	Cédula:	Cargo:
Roberto J. Jarama	43718157	Aux. Vial
Fecha:	Inducción:	Reinducción:
06-06-2023	X	

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X			
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X			
Se le indicó a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X			
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X			
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X			
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X			
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	X			
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X			
Se dio a conocer la política de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y porte de armas.	X			
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X			
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X			
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X			
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X			
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	X			
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	X			

300

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-026	
			Versión: 002	
	INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN		Fecha: 03/03/2023	
			Página 2 de 2	

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	X			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	Y			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor	+			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	+			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	+			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	+			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	+			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	+			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	+			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	+			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	+			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	+			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	+			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	+			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	+			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	+			

Yo Dubio Dorne Flores con cedula de ciudadanía C.C. 43918157 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: [Signature]
 Realiza la inducción: [Signature]

 <small>GUINCO SAS CALLE 100 N° 100-100, CANTON GUAYAS, ECUADOR TEL: 043 230 0440</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-027
	EVALUACIÓN DE EFICACIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Version: 001 Fecha: 03/03/2023 Página 1 de 1

Proyecto: PIA 7 Lugar: SECTOR LOS RIOS Fecha: 06/06/23

Tema de tratado: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del participante: JASSTIN ECHAVARRIA

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO			
Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS	EVALUACION
1	La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la empresa en la identificación y gestión de los riesgos laborales:	F _____ V <u>X</u>	1,25
2	La empresa esta comprometida con el bienestar de:	A. La familia ☒ B. Los trabajadores C. Los clientes D. Ninguno de los anteriores	1,25
3	Todos los empleados, contratistas y proveedores, estan obligados a cumplir con las normas y procedimientos de seguridad dentro de la empresa:	F _____ V <u>X</u>	1,25
4	La política debe ser revisada por la gerencia cada:	A. 3 años B. 5 años ☒ C. Anualmente	1,25
5	En la política se establece el compromiso de cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales:	F _____ V <u>X</u>	1,25

Firma del participante: JASSTIN ECHAVARRIA CC: 1000643733

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE
1-2	3-4	5

OBSERVACIONES: _____

Nombre y firma del evaluador: [Firma]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-027
	EVALUACIÓN DE EFICACIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Version: 001
		Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

Proyecto: PIR 7 Lugar: SECTOR LOS VAREAS Fecha: 06/06/23

Tema de tratado: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del participante: Nubia Serna

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	EVALUACION
1	La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la empresa en la identificación y gestión de los riesgos laborales:	F _____ V <u>X</u>	7,25
2	La empresa esta comprometida con el bienestar de:	A. La familia ☒ B. Los trabajadores C. Los clientes D. Ninguno de los anteriores	1,25
3	Todos los empleados, contratistas y proveedores, estan obligados a cumplir con las normas y procedimientos de seguridad dentro de la empresa:	F _____ V <u>X</u>	7,25
4	La política debe ser revisada por la gerencia cada:	A. 3 años B. 5 años ☒ C. Anualmente	1,25
5	En la política se establece el compromiso de cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales:	F _____ V <u>X</u>	7,25

Firma del participante: X NUBIA CC: X NUBIA

ESPACIO PARA EL EVALUADOR


* Cada pregunta corresponde el valor de (1,25) unidad.

* Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción.

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE
1-2	3-4	5

OBSERVACIONES: _____

Nombre y firma del evaluador: [Firma]



Fecha:

DD

16

MM

06

AA

2025

PROYECTO:

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA

TEMA:

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

COMITÉ CIUDADANO

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

OTRO

[illegible]

(Firmas)

(Nombre)

Sorany Owens

Seamus Owens,

Contratista

(Ferns)

(Nome)

Zini labana k

Interventoria

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-026
		Versión: 001
	EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: ALCAZARILLAS LA FLORIDA Fecha: _____
 Nombre y Apellido del Empleado: SEBASTIAN RODRIGUEZ
 Cargo: AYUDANTE Número de Documento: 152714135
 Nombre del capacitador: Sorany Guerra Inducción X Re inducción _____

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

- Cuáles de estos elementos son de protección personal:
 (a) Guantes, Pinzas, Gorra
 (b) Arnés, baldes, gafas de sol
 (c) Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo
- Los Elementos de Protección Personal son de uso obligatorio durante la jornada laboral. SÍ X NO
- Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. SÍ X NO
- Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. SÍ NO X
- Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. SÍ NO X
- En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias psicoactivas mientras laboran. SÍ NO X
- Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. SÍ NO X
- Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. SÍ X NO
- Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:
 (a) Solicitar permisos cuando sea requerido
 (b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
 (c) Todas las anteriores
- Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:
 (a) Utilizar los elementos de protección personal
 (b) Cumplir con las normas de seguridad
 (c) Todas las anteriores



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

Código: F-SST-026

Versión: 001

Fecha: 03/03/2023

Página 2 de 2

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER	DERECHO	
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	✓ Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL	✓
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo	Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades	✓
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	✓ Llegar tarde todos los días	
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	✓ Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera	✓

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	✓
	PROTECTOR AUDITIVO	✓
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	✓
	PANTALONETA DE BAÑO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	✓
	CARETA PARA SOLDAR	✓

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

Firma trabajador

Firma capacitador



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: F-SST-028

Versión: 001

Fecha: 03/03/2023

Página 1 de 2

INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre y Apellidos del Trabajador: SEBASTIAN RODRIGUEZ	Cédula: 152714135	Cargo: AQUOSITE
Fecha:	Inducción: X	Reinducción:

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
------	----	----	----	---------------

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	☒	☐	☐	
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	☒	☐	☐	
Se le indicó a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	☒	☐	☐	
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	☒	☐	☐	

SEGURIDAD SOCIAL

Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	☒	☐	☐	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer la política de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y porte de armas.	☒	☐	☐	
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	☒	☐	☐	
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	☒	☐	☐	
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	☒	☐	☐	



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: F-SST-028

Versión: 001

Fecha: 03/03/2023

INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

Página 2 de 2

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	✓			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	✓			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	✓			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	✓			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	✓			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	✓			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	✓			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	✓			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	✓			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	✓			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	✓			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	✓			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	✓			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	✓			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	✓			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	✓			

Yo Sebastián Rodríguez González con cedula de ciudadanía C.C. 1102214138 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: Sebastián Rodríguez González

Realiza la inducción: Sorany Quera

312

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-027
			Version: 001
	EVALUACIÓN DE EFICACIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Fecha: 03/03/2023
			Página 1 de 1

Proyecto: Proyecto PITA 7 Lugar: Sector 105 Fecha: 16-06-2023

Tema de tratado: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del participante: Sebastian Rodriguez

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	EVALUACION
1	La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la empresa en la identificación y gestión de los riesgos laborales:	F ____ V <u>✓</u>	1.25
2	La empresa esta comprometida con el bienestar de:	A. La familia ☒ B. Los trabajadores C. Los clientes D. Ninguno de los anteriores	1.25
3	Todos los empleados, contratistas y proveedores, están obligados a cumplir con las normas y procedimientos de seguridad dentro de la empresa:	F ____ V <u>✓</u>	1.25
4	La política debe ser revisada por la gerencia cada:	A. 3 años B. 5 años ☒ C. Anualmente	1.25
5	En la política se establece el compromiso de cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales:	F ____ V <u>✓</u>	1.25

Firma del participante: [Firma] CC: 1152714135

ESPACIO PARA EL EVALUADOR									
<p>* Cada pregunta corresponde el valor de (1,25) unidad.</p> <p>* Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">CRITERIO DE EVALUACIÓN</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">DEFICIENTE</th> <th style="width: 33%;">ACEPTABLE</th> <th style="width: 33%;">EXCELENTE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1-2</td> <td style="text-align: center;">3-4</td> <td style="text-align: center;"><u>5</u></td> </tr> </table> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>Nombre y firma del evaluador: <u>Sorany Guerra</u></p>	CRITERIO DE EVALUACIÓN			DEFICIENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE	1-2	3-4	<u>5</u>
CRITERIO DE EVALUACIÓN									
DEFICIENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE							
1-2	3-4	<u>5</u>							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-094
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Versión: 002
		Fecha: 03/03/2023
		Página: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: <u>SEBASTIAN RODRIGUEZ</u>	CEDULA: <u>1152714135</u>
CARGO: <u>AYUDANTE</u>	OBRA: <u>ALCAJALADO LA FLORIDA</u>

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
BOTAS DE PIEL	X			1	16-06-23	[Firma]
GUANTES DE VAQUETA	X			1 PAR	16-06-23	[Firma]
GAFAS OSCURAS	X			1	16-06-23	[Firma]
TAPA OJOS DE INSERCIÓN	X			1	16-06-23	[Firma]
CASCO CON BARBUQUEJO	X			1	16-06-23	[Firma]
GUANTES DE PRECISION	X			1	16-06-23	[Firma]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE <u>Sorany Guerra</u>	CEDULA No. <u>1152698565</u>
CARGO <u>Recdista</u>	FIRMA <u>Sorany Guerra</u>

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Sebastian Rodriguez G.

CEDULA No: 1152714135

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-024
		Versión: 001
	EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: PITA 7 Fecha: 20-06-2023
 Nombre y Apellido del Empleado: Diana Cristina Figueroa
 Cargo: Portero 551 Número de Documento: 1020392931
 Nombre del capacitador: Sandy Cera Inducción X Re inducción

Responda con una x falso o verdadero según corresponda

CONCEPTO	DEFINICIÓN	F	V
1. COPASST	Un organismo de vigilancia y control del cumplimiento de las normas seguridad y salud en el trabajo.		☒
2. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Documento en el cual se establecen normas, reglamentaciones y responsabilidades de la empresa y trabajadores. También se evalúan y establecen los factores de riesgo que se encuentran en el contexto laboral. En este se define el compromiso por brindar actividades para evitar ATEL, dar inducción a todo el personal, promover y garantizar la constitución y funcionamiento del COPASST, destinar recursos necesarios para desarrollar actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ser publicado en dos lugares y conocido por todo el personal.		☒
3. ENFERMEDAD LABORAL	Enfermedad laboral es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión que realice una persona o como consecuencia de un accidente laboral, produciendo desde una incapacidad hasta la muerte.		☒
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Son de uso obligatorio durante la jornada laboral		☒

De las tres opciones que aparecen marque la respuesta correcta:

CONCEPTO	DEFINICIÓN
5. ACCIDENTE DE TRABAJO	<p>☒ A. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.</p> <p>☐ B. Condición contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.</p> <p>☐ C. Todo aquello que potencialmente puede causar un daño el trabajador en el desarrollo de sus funciones.</p>
6. COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	<p>☐ A. Un grupo de trabajadores que evalúan riesgos.</p> <p>☐ B. Un comité organizado por el empleador para juzgar trabajadores.</p> <p>☒ C. Un organismo de vigilancia y control para la prevención del acoso laboral y riesgos psicosociales</p>
7. REPORTE DE ACIDENTE DE TRABAJO	<p>☐ A. Debe hacerse dentro de las 72 horas siguientes al suceso y debe comunicarse a un compañero.</p> <p>☒ B. Debe hacerse de manera inmediata y debe comunicarse al jefe inmediato y al área de seguridad salud en el trabajo.</p> <p>☐ C. No debo reportarlo ya que me pasó a mí.</p>

314

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-024
			Versión: 001
	EVALUACION INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN		Fecha: 03/03/2023
			Página 2 de 2

✓ 8. CONDICIÓN INSEGURA	A. Aquellos factores físicos o circunstancias del medio de trabajo que pueden facilitar la ocurrencia de accidentes o incidentes. B. Evento ocurrido en el trayecto de la casa al trabajo y que produce una lesión en el trabajador. C. Adelantar un vehículo en línea continua.
✓ 9. PLAN DE EMERGENCIA	A. Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo B. Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes C. Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales
✓ 10. EN LA CONTRATACIÓN LABORAL USTED QUEDA AFILIADO A?	A. Seguro de responsabilidad civil, EPS y Seguro todo riesgo B. Sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACIÓN) C. Sistema de vigilancia privada, SOAT y ARL

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador.

DEBER	DERECHO
✓ Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	X Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL X
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo	Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades X
✓ Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	X Llegar tarde todos los días
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	X Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera X

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-10	EXCELENTE 11

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

Diana Hidalgo
Firma trabajador

Sorany Arend
Firma capacitador

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código: F-SST-027

Version: 001

EVALUACIÓN DE EFICACIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha: 03/03/2023

Pagina 1 de 1

Proyecto: pila 7 Lugar: Ofina pila 7 Fecha: 10-06-2023

Tema de tratado: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del participante: Diana Higuera**EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO**

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS	EVALUACION
1	La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la empresa en la identificación y gestión de los riesgos laborales:	F ____ V <u>✓</u>	1.25
2	La empresa esta comprometida con el bienestar de:	A. La familia B. Los trabajadores C. Los clientes D. Ninguno de los anteriores	1.25
3	Todos los empleados, contratistas y proveedores, estan obligados a cumplir con las normas y procedimientos de seguridad dentro de la empresa:	F ____ V <u>✓</u>	1.25
4	La politica debe ser revisada por la gerencia cada:	A. 3 años B. 5 años C. Anualmente	1.25
5	En la politica se establece el compromiso de cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales:	F ____ V <u>✓</u>	1.25

Firma del participante: Diana HCC: 102039747**ESPACIO PARA EL EVALUADOR**

* Cada pregunta corresponde el valor de (1,25) unidad.

* Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción.

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE
1-2	3-4	5 <u>✓</u>

OBSERVACIONES: _____

Nombre y firma del evaluador: Sorany Guevara

3/5

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-028
		Versión: 001
	INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR		
Nombre y Apellidos del Trabajador: <i>Diana Higuera</i>	Cédula: <i>1020397431</i>	Cargo: <i>Docente SST</i>
Fecha: <i>20-06-2023</i>	Inducción: <i>X</i>	Reinducción:

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	☒	☐	☐	/
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	☒	☐	☐	
Se le indicó a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	☒	☐	☐	
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	☒	☐	☐	
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	☒	☐	☐	/
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	☒	☐	☐	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	/
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer la política de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y porte de armas.	☒	☐	☐	
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	☒	☐	☐	
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	☒	☐	☐	
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	☒	☐	☐	
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	☒	☐	☐	

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código: F-SST-028

Versión: 001

Fecha: 03/03/2023

Página 2 de 2

INDUCCIÓN -REINDUCCIÓN

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	☒	☐	☐	☐
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	☒	☐	☐	☐
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	☒	☐	☐	☐
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	☒	☐	☐	☐
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	☒	☐	☐	☐
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	☒	☐	☐	☐
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	☒	☐	☐	☐
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	☒	☐	☐	☐
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	☒	☐	☐	☐
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	☒	☐	☐	☐
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	☒	☐	☐	☐
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	☒	☐	☐	☐
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	☒	☐	☐	☐
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	☒	☐	☐	☐
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	☒	☐	☐	☐
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	☒	☐	☐	☐

Yo Diana Cristina Aguila con cedula de ciudadanía C.C. 10709993 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción:

Diana Aguila

Realiza la inducción:

Sorany Guero

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-044
			Versión: 001
	ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO		Fecha: 03/03/2023
			Página: 1 de 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

Nombre	Diana Carolina Aguado		
Cedula	1010397431	Cargo	Residente / SST
Dirección	CL 104B N 74A	Teléfono	3006631994
Area de trabajo	Administrativa ☒ Operativa ☐	Fecha	20-06-2023

1. EDAD a. 18 - 27 años b. 28 - 37 años ☒ c. 38 - 47 años c. 48 años o mas	2. ESTADO CIVIL ☒ a. Soltero (a) b. Casado (a) c. Unión libre d. Separado (a) /Divorciado e. Viudo (a)
3. GÉNERO a. Masculino ☒ b. Femenino	4. COMPOSICIÓN FAMILIAR a. Ninguno a. Conyugue b. Conyugue- hijos c. Conyugue - hijos - padres d. Padres e. Padres - hermanos ☒ f. Hijos ☒ g. Otros
5. NUMERO DE PERSONAS A CARGO a. Ninguna ☒ c. 1 a 3 Personas c. 4 a 6 Personas d. Mas de 6 personas Numero de hijos _____	6. TENENCIA DE VIVIENDA a. Propia ☒ b. Arrendada c. Familiar d. Compartida con otra(s) familia(s)
5. NIVEL DE ESCOLARIDAD a. Primaria completa c. Secundaria completa c. Técnico ☒ d. Tecnólogo d. Universitario e. Especialista / Maestro	8. ESTRATO - BARRIO (Escribir nombre del barrio) 1. 2. ☒ 3. 4. 5.
9. USO DEL TIEMPO LIBRE a. Otro trabajo b. Labores domésticas ☒ c. Recreación y deporte d. Estudio e. Otro	10. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.) a. Mínimo Legal (S.M.L.) ☒ b. Entre 1 a 3 S.M.L. c. Entre 4 a 5 S.M.L. d. Entre 5 y 6 S.M.L. e. Mas de 7 S.M.L.
11. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA ☒ a. Menos de 1 año b. De 1 a 5 años c. De 5 a 10 años d. Mas de 10 años	12. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL a. Menos de 1 año b. De 1 a 5 años c. De 5 a 10 años ☒ d. Mas de 10 años

13. TIPO DE CONTRATACIÓN	14. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
☒ a. Obra o Labor ☐ b. Termino Fijo ☐ c. Indefinido ☐ d. Aprendiz ☐ e. Prestación de servicios	☐ a. Vacunación ☒ b. Exámenes de Ingreso ☐ c. Exámenes periódicos ☐ d. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo ☐ e. Ninguna
15. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD	16. FUMA
☒ a. Si ☐ b. No CUAL: _____	☒ a. Nunca ☐ b. Diario ☐ c. Semanal ☐ d. Quincenal ☐ e. Mensual ☐ f. Ocasional
17. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	18. CON QUE FRECUENCIA REALIZA EJERCICIO
☐ a. Nunca ☐ b. Diario ☐ c. Semanal ☐ d. Quincenal ☐ e. Mensual ☒ f. Ocasional	☐ a. Nunca ☐ b. Diario ☐ c. Semanal ☐ d. Quincenal ☐ e. Mensual ☒ f. Ocasional
19. TIPO DE SANGRE	20. FECHA DE NACIMIENTO
☒ O Positivo ☐ O Negativo ☐ A Positivo ☐ A Negativo ☐ B Positivo ☐ B Negativo ☐ AB Positivo ☐ AB Negativo	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>Día</div> <div>Mes</div> <div>Año</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;"> 31 5 1996 </div>
21. RAZA	22. AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
☐ a. Blanco ☐ b. Afrodescendiente ☒ c. Mestizo ☐ d. Indigena ☐ e. Mulato	EPS <u>Sora</u> AFP <u>POVENIV</u> ARL <u>Sora</u> Caja de compensación <u>Comfama</u>
23. CUENTA CON CERTIFICADO DE ALTURAS	
Fecha en que realizo el curso o reentrenamiento: <u>27-10-2023</u>	
Centro de entrenamiento: <u>Sena</u>	
Nivel: avanzado ☐ Basico ☐ Coordinador ☒	
24. TURNO DE TRABAJO	25. CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
☒ a. Diurno ☐ b. Nocturno ☐ c. Mixto	Nombre: <u>Jeronica Higuita</u> Telefono: <u>3006631994</u>
