

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 4 de diciembre de 2023 Al: 10 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 112 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	12.00%		84.00%	Obra Física Ejecutada (%)	17.50%		80.00%
Valor básico de la Obra	\$ 39.335.006,93	\$	275.345.048,50	Valor básico de la Obra	57.363.551,77		262.233.379,53
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				Interventor: GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S			
Contrato No. 1675 de 2023				Contrato No. 1708 DE 2023			
Valor Inicial: \$ 1.974.357.452,93				Valor Inicial: \$ 352.258.326,00			
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial: 4 MESES 6 DIAS				Plazo Inicial: 4 MESES Y 21 DIAS			
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación: 31 DE JULIO DE 2023				Fecha de Iniciación: 31 DE JULIO DE 2023			
Fecha de Vencimiento: 5 DE DICIEMBRE DE 2023				Fecha de Vencimiento: 20 DE DICIEMBRE DE 2023			

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


fundida de placas con mortero para renovación
desmonte de cielo raso en área de atención al usuario
instalación de manto asfáltico en placas de entresuelo
aseo en ventanería
instalación de láminas en fibra mineral para cielo raso



aplicación de pintura bituminosa



instalación de manto asfáltico

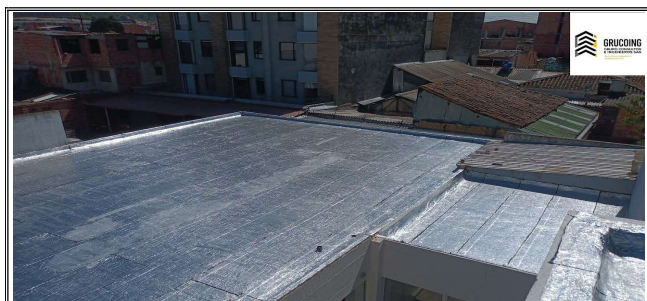



manto asfaltico en placz sobre archivo general



manto asfaltico sobre oficina 1er piso



Renivelacion placa de terraza con mortero



Renivelacion placa de terraza con mortero



aplicacion de manto asfaltico



instalacion de cielo raso en area deatencion al publico

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
aseo en ventaneria	 Firma Nombre : J. Andres Melo G. Matricula No.: A201020555
instalacion de manto asfaltico	
desmonte de cielo rasos	
nivelacion de placas de entrepiso para instalacion de mantos	
