



Secretaría de Infraestructura

SI-POI-2345

Armenia, 09 de septiembre de 2024

Doctora
BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRIGUEZ
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico
Municipio de Armenia

Asunto: Solicitud para prorrogar la suspensión del contrato de obra No. 2024-006.

Cordial Saludo

Mediante la presente y de conformidad con el asunto de referencia y dando cumplimiento de las funciones adoptadas por la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisores del contrato de obra pública No. 2024-006 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÓN VIAL, GLORIETA MALIBU Y EL BARRIO PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA", nos permitimos solicitar prorrogar la suspensión del contrato estatal por solicitud del contratista en base a la siguiente Justificación allegada a la Secretaría de Infraestructura, el día 05 de septiembre de 2024:

"Debido al paro de transporte que actualmente se presenta en el país, la empresa DIMEL INGENIERÍA, proveedora de los postes metálicos para la ejecución de la actividad de alumbrado público contractual, definida por el ítem, 4.1 Alumbrado Público, ha remitido una nueva comunicación de fecha 04 de septiembre, donde manifiesta la imposibilidad de transporte de dichos postes, los cuales ya están contruidos, pero debido a los inconvenientes ocasionados por el paro nacional de transporte, es imposible su suministro por ahora en la obra".

Teniendo en cuenta lo anterior y que el día 26 de agosto de 2024 siendo las 5:52PM se suspendió el contrato de obra No. 2024-006 en la plataforma SECOP – Sistema Electrónico para la Contratación Pública, manifestándose que sería reiniciado el día 10 de septiembre de 2024; se solicita en base a los hechos anteriores, prorrogar la suspensión del contrato de obra hasta tanto se realice la entrega de los postes por el proveedor DIMEL INGENIERÍA, es decir, hasta que se superen los hechos que dieron origen a la suspensión y de esta manera poder continuar con la ejecución del ítem de alumbrado público.

Se anexa la solicitud del contratista de obra, Jhon Jairo Sandoval Galindo (2 folios)

Lo anterior para la aprobación por parte del Departamento Administrativo Jurídico, atentamente.


CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
Secretaría de Infraestructura Municipal

Proyecto y elaboró: Isabel Cristina Ortiz Cortes – Profesional especializada – Secretaría de Infraestructura
Supervisora del contrato
Revisó: Monikandrea Rodríguez Gallego - Subsecretaría Municipal – Secretaría de Infraestructura



Cara 16 No. 15-28, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Contacto: Tel-(6) 7417100 - Correo Electrónico: infraestructura@armenia.gov.co

R-AM-SGI-001 V9 14/02/2024

Alcaldía Municipal de Armenia
Subdirección Depto Administrativo Jurídico


Recibi Hoy: 09 SEP 2024

No. Radicado: 730

Pasa A: 2:46pm

Firma Recibido: Ana Stefania

Ing Isabel



Armenia Quindío, 05 de Septiembre de 2024

Ingeniera:

ISABEL CRISTINA OTIZ CORTES

Supervisora

Contrato de Obra Número 006 de 2024

Objeto: Construcción de Obras Complementarias en la Conexión Vial, Glorieta Malibu y el Barrio El Portal de Pinares de la ciudad de Armenia.

Secretaria de Infraestructura.

Asunto: **Solicitud Ampliación Suspensión del contrato de Obra.**


Cordial saludo,

Debido al paro de transporte que actualmente se presenta en el país, la empresa DIMEL INGENIERIA, proveedora de los postes metálicos para la ejecución de la actividad de alumbrado público contractual, definida por el ítem, 4.1 **"Alumbrado público"**, ha remitido una nueva comunicación de fecha 04 de septiembre, donde manifiesta la imposibilidad del transporte de dichos postes, los cuales ya están contruidos, pero debido a los inconvenientes ocasionados por el paro nacional de transporte, es imposible su suministro por ahora a la obra.

Por lo tanto, para su conocimiento y aprobación, le solicito la ampliación de la suspensión del contrato, hasta tanto se realice la entrega de los postes y así poder continuar con la ejecución del ítem de alumbrado público, ítem final del Contrato del Obra en mención.

Cordialmente,

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA DE LA OBRA





Candelaria, septiembre 4 del 2024

Señor:
JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

ASUNTO: TIEMPO DE ENTREGA PEDIDO POSTE METALICOS 7M


Atendiendo solicitud, DIMEL INGENIERIA SAS informa que los postes solicitados, alumbrado público 7m en orden de compra, se encuentra listo para su respectiva entrega en obra, pero como es de conocimiento los temas de orden público sobre el paro nacional de transportadores de carga, informamos que por el momento no se realizara ningún despacho a nivel nacional.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,

DIMEL INGENIERIA S.A
AREA COMERCIAL

Pedro Lasso



Armenia Quindío, 09 de Septiembre de 2024

Ingeniera:

ISABEL CRISTINA OTIZ CORTES

Supervisora

Contrato de Obra Número 006 de 2024

Objeto: Construcción de Obras Complementarias en la Conexión Vial, Glorieta Malibu y el Barrio El Portal de Pinares de la ciudad de Armenia.

Secretaria de Infraestructura.


Asunto: **Solicitud Ampliación Suspensión del contrato de Obra.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente que teniendo en cuenta que ya se levantó el paro de transporte a nivel nacional, la empresa DIMEL INGENIERIA , proveedora de los postes metálicos para la ejecución de la actividad de alumbrado público contractual, definida por el ítem, 4.1 "Alumbrado público", comunica que aún se presentan retrasos en el transporte de los postes debido a la acumulación de los despachos pendientes por el paro de transporte que afecto al país hasta la semana pasada; por lo tanto es necesario continuar con la suspensión del contrato, hasta tanto la empresa DIMEL INGENIERIA logre solucionar la entrega de dichos postes.

Por lo anteriormente expuesto, para su conocimiento y aprobación, le solicito la ampliación de la suspensión del contrato.

Cordialmente,

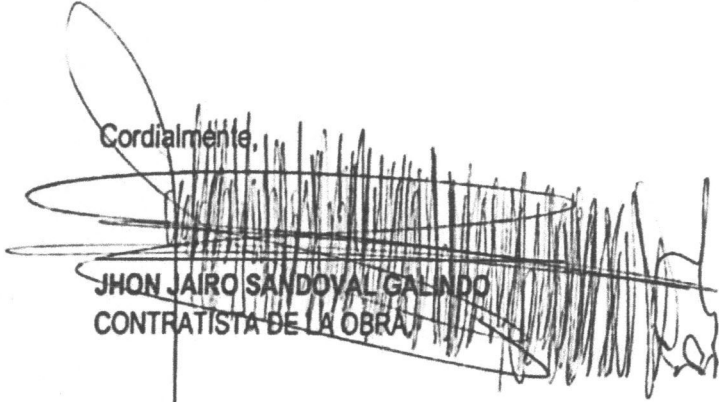
JHON JAIRÓ SANDOVAL GALINDO
CONTRATISTA DE LA OBRA
