

Medellín, 02 diciembre de 2024

DOCTOR

MAURICIO HOYOS SIERRA

DIRECTOR TERRITORIAL

INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud prórroga del Contrato No. 2246 de 2024

Estimado Director Territorial,

Por medio de la presente se permite solicitar una prórroga para el contrato 2246-2024, que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA", por un tiempo adicional de veinticinco (25) días calendario, obteniendo así una fecha final del contrato el próximo 31/12/2024, lo anterior justificado en que el contrato 3368-2024, al cual se le ejerce el control y vigilancia, solicita dicha ampliación de plazo, por lo tanto con el fin de garantizar que la supervisión y el seguimiento de las actividades del contratista se realicen de manera adecuada y conforme como lo requiere el Instituto, se deben tener nuevos tiempos establecidos.

Adjunto los documentos soporte para la solicitud realizada para su descarga, revisión y ajuste, en caso de que lo considere necesario.


Agradezco de antemano su atención a este asunto.

Cordialmente,



ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS														CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1			
															VERSIÓN 1			
															PÁGINA			
FECHA02/12/2024 (Día / Mes / Año)																		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL ANTIOQUIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No: 1																		
POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐ POR PRÓRROGA ☒ POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2246-2024							PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 3,8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/09/2024 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
INTERVENOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO							FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 74.594.413,00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
RESOLUCIÓN No.: N.A DE N.A (Indicar día/mes/año)							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 74.594.413,00											
CONTRATO DE OBRA No: 3468-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV																		
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.03 de fecha 01/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+	-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Director de interventoría	\$ 5.000.000,00		0,60	\$ 3.000.000,00					+	0,19	\$ 950.000,00	0,59	\$ 2.950.000,00	0,79	\$ 3.950.000,00	
2	1	Ingeniero residente de interventoría	\$ 3.800.000,00	\$ 180.000,00	3,00	\$ 11.940.000,00					+	0,6	\$ 2.388.000,00	2,6	\$ 10.348.000,00	3,6	\$ 14.328.000,00	
3	1	Especialista en estructuras	\$ 5.000.000,00		0,50	\$ 2.500.000,00					-	-0,1	\$ (500.000,00)			0,4	\$ 2.000.000,00	
4	1	Profesional ambiental	\$ 3.800.000,00		1,00	\$ 3.800.000,00					-	-0,2	\$ (760.000,00)			0,8	\$ 3.040.000,00	
5	1	Profesional de aseguramiento o gestión	\$ 3.800.000,00		0,30	\$ 1.140.000,00										0,3	\$ 1.140.000,00	
6	1	Auditor de calidad	\$ 3.800.000,00		0,10	\$ 380.000,00										0,1	\$ 380.000,00	
		PERSONAL TECNICO																
7	1	Topógrafo inspector	\$ 1.800.000,00		2,00	\$ 3.600.000,00					+	0,37	\$ 666.000,00	0,87	\$ 1.566.000,00	2,37	\$ 4.266.000,00	
8	1	Provisión jornadas 7X24	\$ 800.000,00			\$ 800.000,00					-		\$ (800.000,00)					
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 27.160.000							\$ 1.944.000		\$ 14.864.000		\$ 29.104.000	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,20							2,20		2,20		2,20	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						\$ 59.752.000							\$ 4.276.800		\$ 32.700.800		\$ 64.028.800	
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+	-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
9	GL	Viatcos Director y/o Especialistas	\$ 180.000,00	Día	10	\$ 1.800.000,00						-	-6	\$ (1.080.000,00)	0,5	\$ 90.000,00	4	\$ 720.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
10	1	Alquiler motocicleta (Incluye peajes y combustible)	\$ 380.000,00	Mes	3	\$ 1.140.000,00					+	2,47	\$ 938.600,00	3,47	\$ 1.318.600,00	5,47	\$ 2.078.600,00	
11	1	Equipo completo de topografía	\$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	2	\$ 3.600.000,00					-	-1	\$ (1.800.000,00)			1	\$ 1.800.000,00	
12	1	Ensayos de laboratorio	\$ 480.000,00	Según comprobante por mes	2	\$ 960.000,00					-	-1	\$ (480.000,00)			1	\$ 480.000,00	
13	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 580.000,00	Según comprobante por mes	3	\$ 1.740.000,00					+	0,6	\$ 348.000,00	2,6	\$ 1.508.000,00	3,6	\$ 2.088.000,00	
		OTROS COSTOS																
15	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 880.000,00	Según comprobante por mes	3	\$ 2.640.000,00					-	-2	\$ (1.760.000,00)			1	\$ 880.000,00	
16	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	\$ 130.000,00	Según comprobante por mes	3	\$ 390.000,00					+	0,5	\$ 65.000,00	2,5	\$ 325.000,00	3,5	\$ 455.000,00	

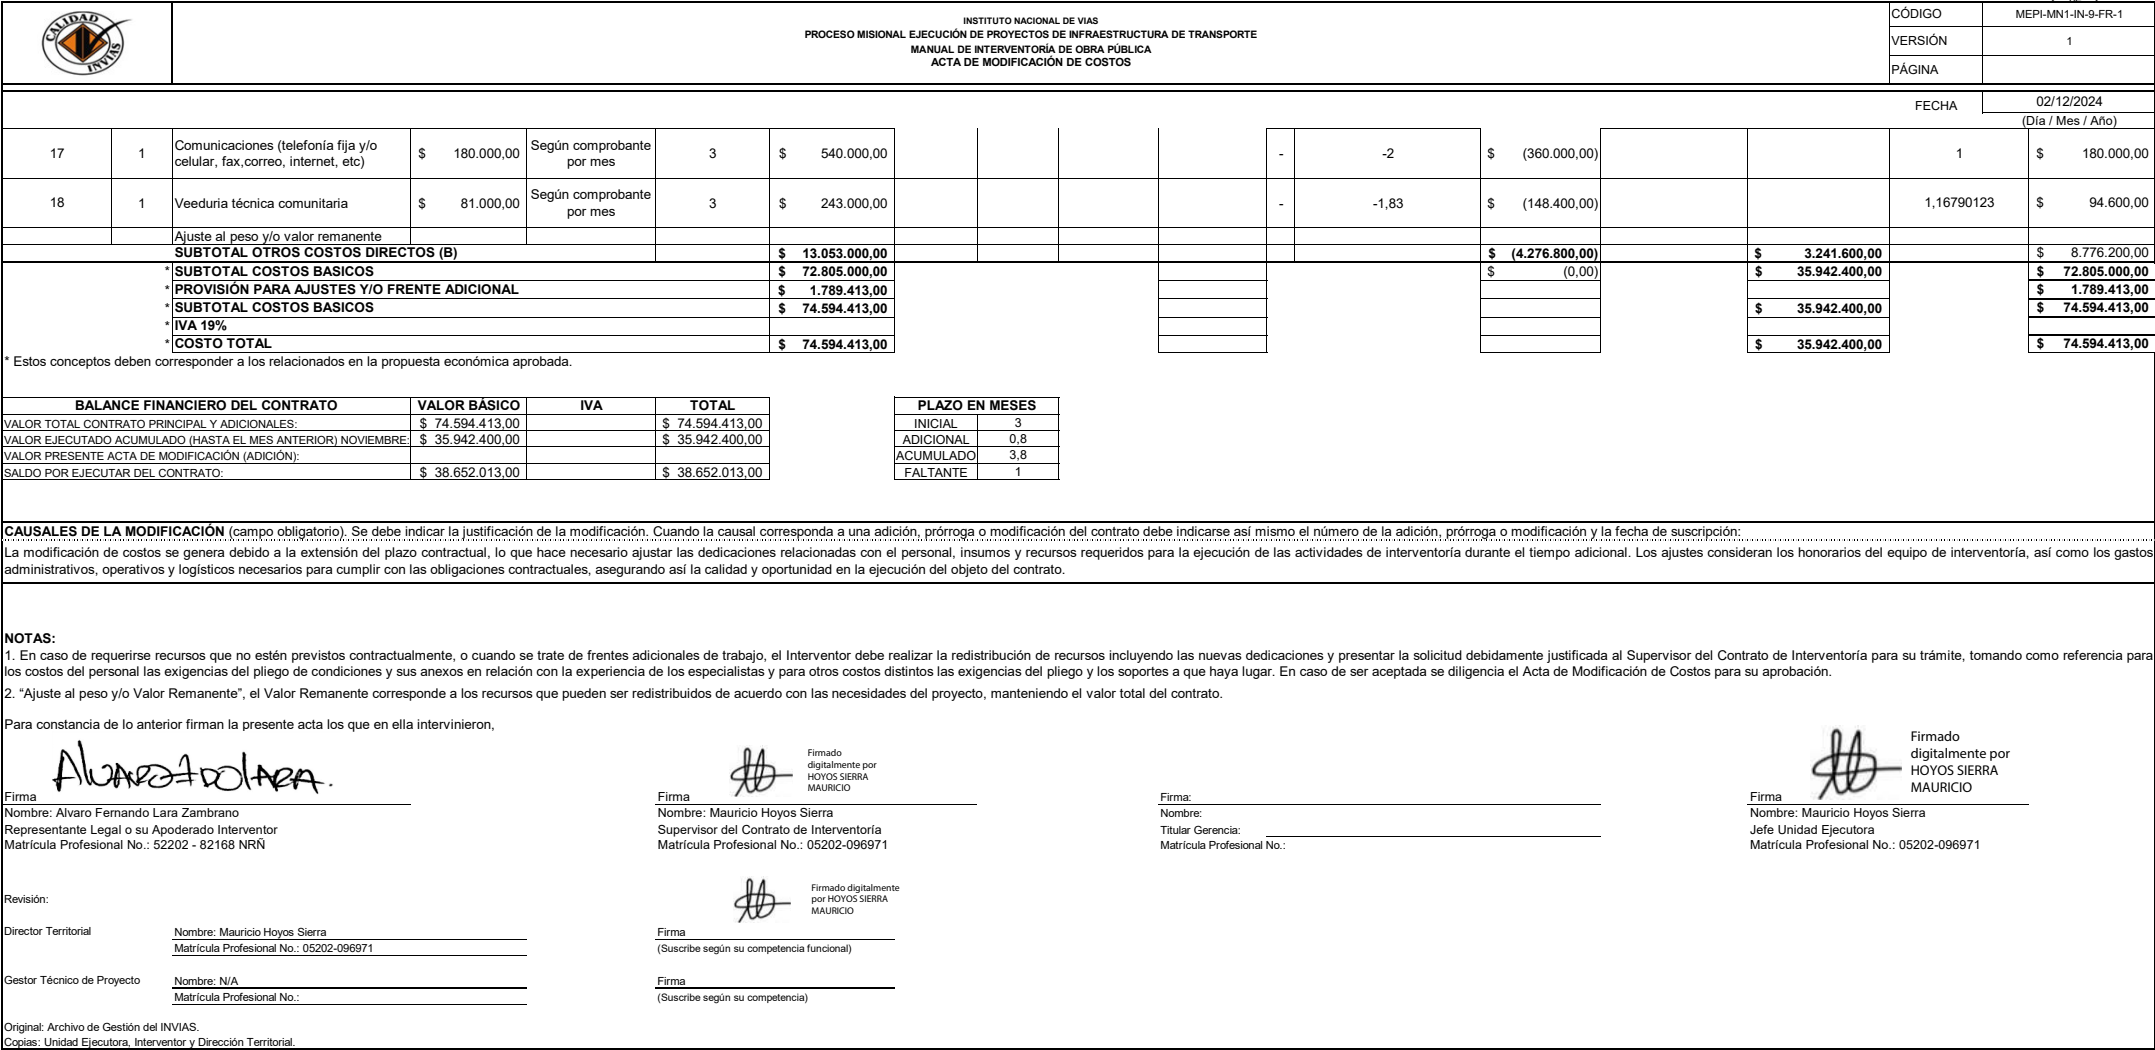



No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha ____		2024				TOTAL											
			Costos de Personal		Prima Regional	Total Dedicacion	Valor Total (\$)	Costos de	Prima Regional	Participacion	Valor Total (\$)	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	12M	VALOR									
												H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR							
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
PERSONAL PROFESIONAL																										
1	1	Director de interventoria	\$	5.000.000,00		0,60	\$	3.000.000,00			0,14	\$	100.000,00	0,20	\$	1.000.000,00	0,20	\$	1.000.000,00	0,79	\$	3.900.000,00				
2	1	Ingeniero residente de interventoria	\$	3.800.000,00	\$	180.000,00	3,00	\$	11.940.000,00			0,10	\$	3.380.000,00	1,00	\$	3.900.000,00	1,00	\$	3.900.000,00	3,40	\$	14.320.000,00			
3	1	Asistente en estructuras	\$	1.000.000,00		0,30	\$	3.000.000,00			0,10	\$	2.500.000,00	0,10	\$	2.600.000,00	0,10	\$	2.600.000,00	0,30	\$	2.600.000,00				
4	1	Profesional ambiental	\$	3.800.000,00		1,00	\$	3.800.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	3.800.000,00	-	\$	3.800.000,00	0,89	\$	3.900.000,00				
5	1	Profesional de aseguramiento o gestión	\$	3.800.000,00		0,30	\$	1.140.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	1.140.000,00	-	\$	1.140.000,00	0,30	\$	1.140.000,00				
6	1	Asesor de campo	\$	3.800.000,00		0,10	\$	380.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	380.000,00	-	\$	380.000,00	0,10	\$	380.000,00				
PERSONAL TECNICO																										
7	1	Topógrafo inspector	\$	1.800.000,00		2,00	\$	3.600.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	3.600,00	-	\$	3.600,00	2,20	\$	4.060.000,00				
8	1	Provisión jornadas 7204	\$	800.000,00			\$	800.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	800,00	-	\$	800,00	2,20	\$	4.060.000,00				
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$		27.140.000			\$				3.588.000,00	\$	4.980.000,00	\$	6.796.000,00	\$	14.240.000,00	\$	28.154.000,00		
FACTOR MULTIPLICADOR									2,20							2,20			2,20			2,20				
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$		69.712.000							\$		6.793.600,00	\$	10.956.000,00	\$	14.991.200,00	\$	31.328.000,00	\$	64.028.600,00
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total (\$)	ANO				TOTAL											
											MES		MES		MES		MES									
											H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR								
OTROS COSTOS DIRECTOS																										
VIATICOS																										
9	GL	Viaticos Director y/o Especialistas	\$	180.000,00	Dia	10	\$	1.800.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	60.000,00	0,00	\$	-	0,00	\$	600.000,00	4,08	\$	720.000,00	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
10	1	Alquiler motocicleta (incluye peajes y combustible)	\$	380.000,00	Mes	3	\$	1.140.000,00			0,00	\$	228.000,00	1,00	\$	380.000,00	1,87	\$	710.800,00	2,00	\$	760.000,00	5,47	\$	2.078.800,00	
11	1	Equipo completo de topografía	\$	1.800.000,00	Segun comprobante por mes	2	\$	3.600.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	1.800.000,00	1,00	\$	1.800.000,00	5,00	\$	1.800.000,00	
12	1	Ensayos de laboratorio	\$	480.000,00	Segun comprobante por mes	2	\$	960.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	480.000,00	1,00	\$	480.000,00	5,00	\$	480.000,00	
13	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$	580.000,00	Segun comprobante por mes	3	\$	1.740.000,00			0,00	\$	348.000,00	1,00	\$	580.000,00	1,00	\$	580.000,00	1,00	\$	580.000,00	3,00	\$	2.088.000,00	
OTROS COSTOS																										
15	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$	880.000,00	Segun comprobante por mes	3	\$	2.640.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	880.000,00	1,00	\$	880.000,00	5,00	\$	880.000,00	
16	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	\$	130.000,00	Segun comprobante por mes	3	\$	390.000,00			0,00	\$	65.000,00	1,00	\$	130.000,00	1,00	\$	130.000,00	1,00	\$	130.000,00	3,00	\$	485.000,00	
17	1	Comunicaciones (telefonía fija y celular, fax, correo, internet, etc)	\$	180.000,00	Segun comprobante por mes	3	\$	540.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	180.000,00	1,00	\$	180.000,00	5,00	\$	180.000,00	
18	1	Medicina/Monitoreo comunitaria	\$	81.000,00	Segun comprobante por mes	3	\$	243.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	-	\$	81.000,00	5,17	\$	94.600,00
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REGISTRADO																										
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							\$		13.063.000			\$				641.000,00	\$	1.180.000,00	\$	1.420.000,00	\$	5.534.000,00	\$	8.776.200,00		
SUBTOTAL COSTOS BASICOS							\$		72.805.000							\$		7.434.600,00	\$	12.136.000,00	\$	16.371.800,00	\$	36.862.800,00	\$	72.805.000,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL							\$		1.789.413															\$	1.789.413	
SUBTOTAL COSTOS BASICOS							\$		74.594.413															\$	74.594.413	
IVA 19%																										
COSTO TOTAL							\$		74.594.413							\$		7.434.600,00	\$	12.136.000,00	\$	16.371.800,00	\$	36.862.800,00	\$	74.594.413

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponde a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
La modificación de costos se genera debido a la extensión del plazo contractual, lo que hace necesario ajustar las dedicaciones relacionadas con el personal, insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades de intervención durante el tiempo adicional. Los ajustes consideran los honorarios del equipo de intervención, así como los gastos administrativos, operativos y logísticos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales, asegurando así la calidad y oportunidad en la ejecución del objeto del contrato.

<p>Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Original: Archivo de Gestión del INOAS Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial</p>	<p>Firma: Nombre: Álvaro Fernando Lara Zambrano Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRR</p>	<p>Firma: Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 52202-096971 (Describe según su competencia)</p>

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1																										
		VERSIÓN	1																										
		PÁGINA																											
		FECHA	3/12/2024 (Día / Mes / Año)																										
ADICIÓN	MODIFICACIÓN	PRÓRROGA																											
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ANTIOQUIA																										
RESPONSABILIDAD																													
1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida. 2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.																													
ANTECEDENTES																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024 (Indicar número de contrato y año)																													
INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO (Nombre o razón social del Interventor)																													
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA																													
CONTRATO DE OBRA No. 3368-2024 (Indicar número de contrato y año)																													
CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV																													
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3 Meses (Indique el plazo del contrato principal)																													
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)																													
MODIFICACIONES																													
<table><tr><th>Modificación No.</th><th>Fecha</th><th>Breve descripción</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				Modificación No.	Fecha	Breve descripción																							
Modificación No.	Fecha	Breve descripción																											
PRÓRROGAS																													
<table><tr><th rowspan="2">Contrato Adicional No.</th><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Desde (Día/Mes/Año)</th><th>Hasta (Día/Mes/Año)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				Contrato Adicional No.	Periodo		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)																					
Contrato Adicional No.	Periodo																												
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)																											
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN																													
<table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN				FECHA REANUDACIÓN																						
			DESDE	HASTA																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/12/2024 (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)																													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 74.594.413,00 50% EN SMMLV: 28,69 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)																													

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 74.594.413
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 02/12/2024 el Interventor solicita lo siguiente:
Ampliar el plazo por veinticinco (25) días calendario, obteniendo así una fecha final del contrato el próximo 31/12/2024, lo anterior justificado en que el contrato 3368-2024, al cual se le ejerce el control y vigilancia, solicita dicha ampliación de plazo, por lo tanto con el fin de garantizar que la supervisión y el seguimiento de las actividades del contratista se realicen de manera adecuada y conforme como lo requiere el Instituto, se deben tener nuevos tiempos establecidos.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ejercer el control y vigilancia técnica, administrativa, financiera y ambiental de las intervenciones realizadas en los puntos críticos asignados sobre la red erciaria a cargo del INVIAS.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.____ Fecha: _____		Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total					

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Octubre de 2024 \$ 35.942.400,00 (mes anterior a la presente solicitud) (año) Último mes facturado: octubre (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 38.652.013,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No Aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se da viabilidad a la solicitud, toda vez que es indispensable el acompañamiento de la interventoría, para la ejecución de las obras relacionadas con su objeto contractual.


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio solicitud prorroga al contrato.
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de modificación de costos No 1
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Reprogramación al plan de cargas No 1

Notas:

- Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
- Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
- Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.



Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría




Firmado digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS

 Firmado digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

Vo.Bo.Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial

N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma 
Nombre: YALILE ISAAC TOSCANO
Abogado Unidad Ejecutora



Firmado digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 05202-096971

N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:
