


PROGRAMACION PACORA

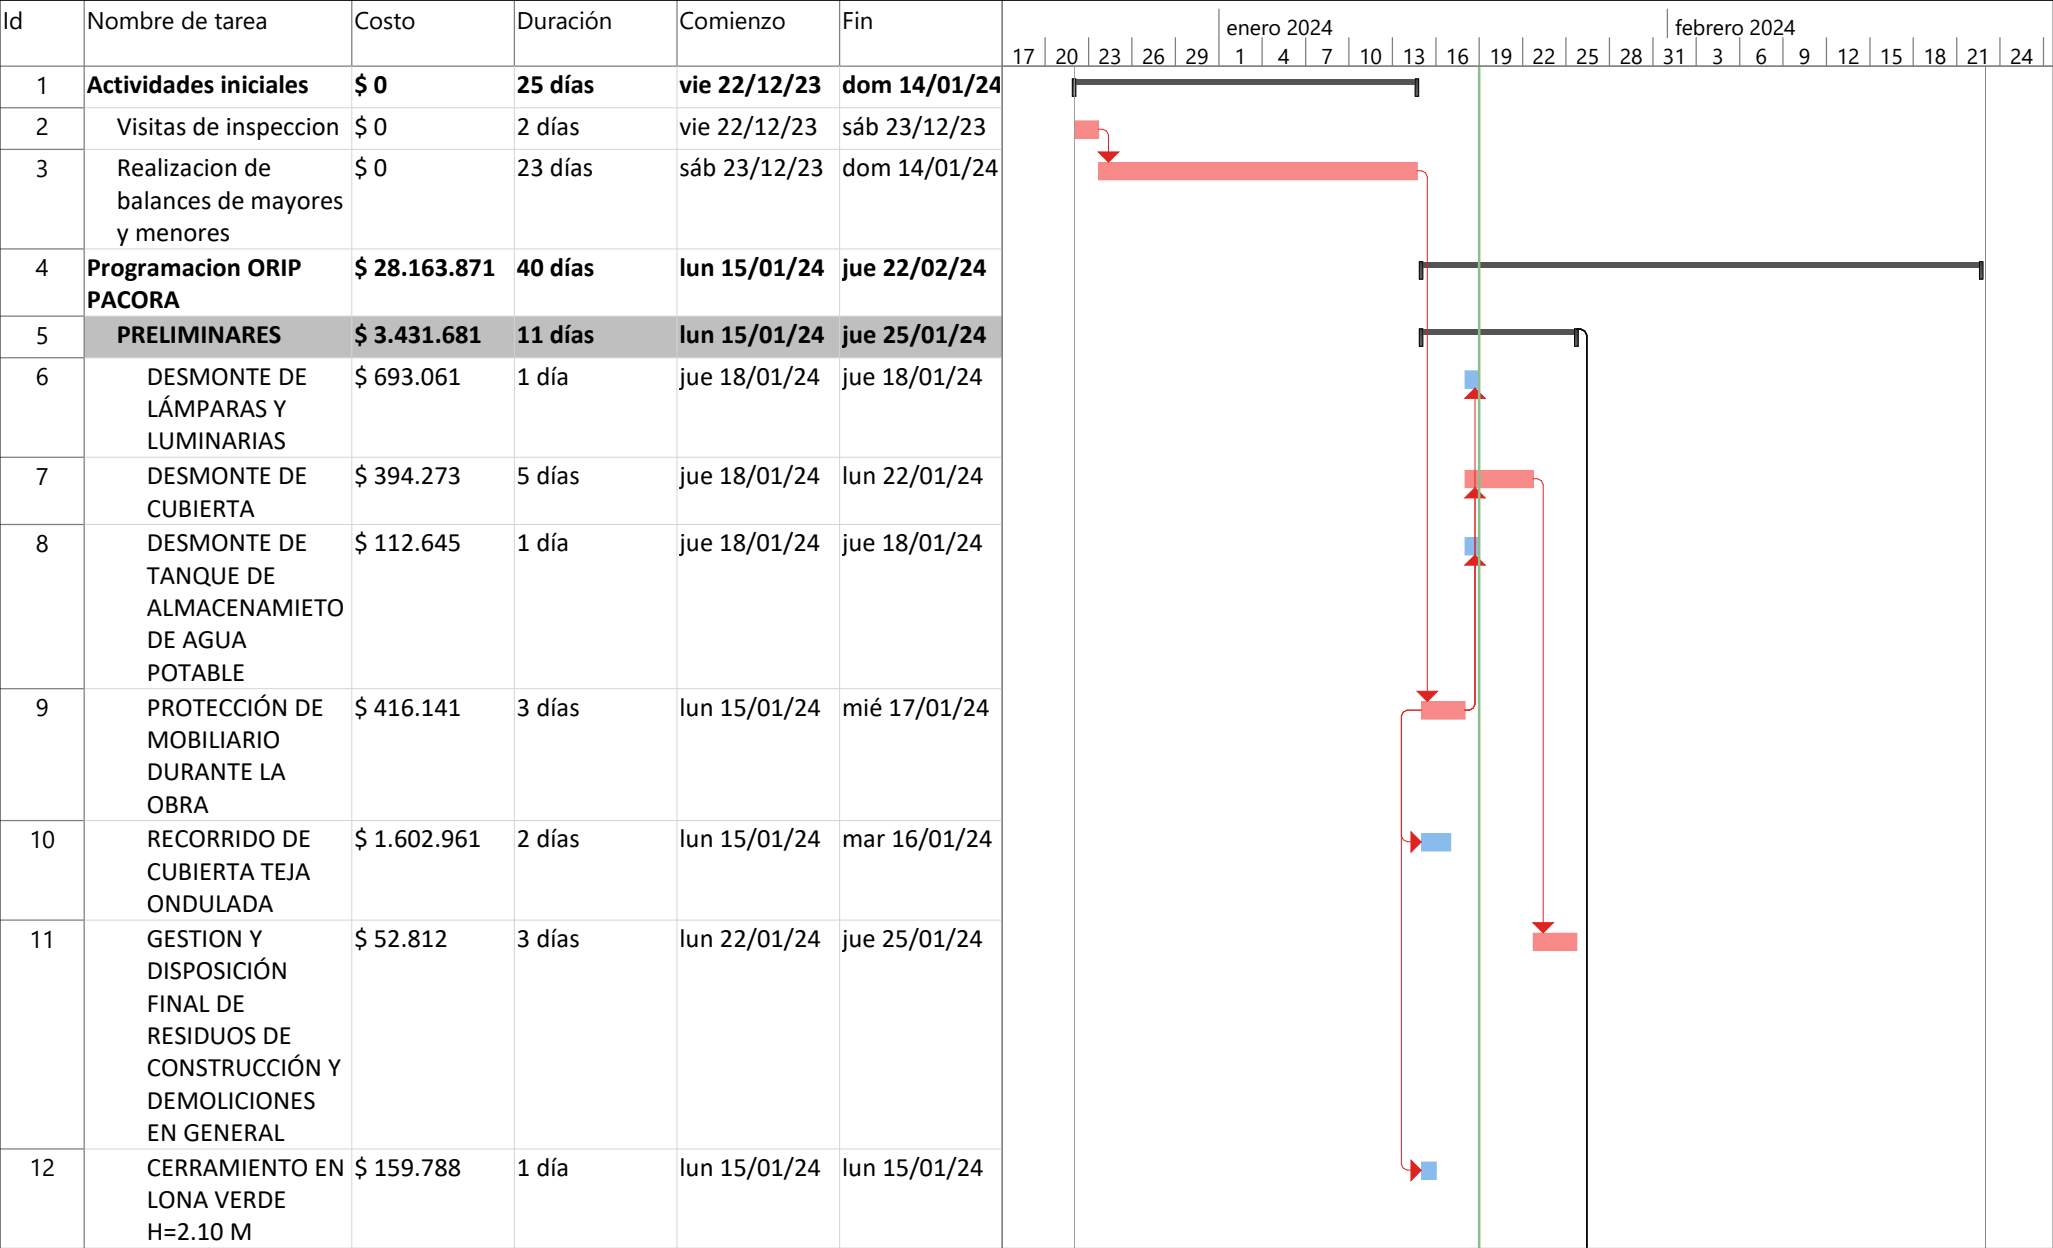

PROGRAMACION PACORA

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	enero 2024												febrero 2024												
						17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	
13	CARPINTERÍA EN MADERA	\$ 2.276.123	20 días	jue 25/01/24	mar 13/02/24																									
14	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	\$ 863.153	20 días	jue 25/01/24	mar 13/02/24																									
15	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	\$ 1.412.970	20 días	jue 25/01/24	mar 13/02/24																									
16	CARPINTERÍA METÁLICA	\$ 426.345	20 días	jue 25/01/24	mar 13/02/24																									
17	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	\$ 322.420	20 días	jue 25/01/24	mar 13/02/24																									
18	REJILLA DE PISO 30CM	\$ 103.925	20 días	jue 25/01/24	mar 13/02/24																									
19	ENCHAPE MUROS	\$ 89.339	3 días	jue 25/01/24	dom 28/01/24																									
20	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	\$ 89.339	3 días	jue 25/01/24	dom 28/01/24																									
21	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	\$ 748.210	2 días	mié 14/02/24	jue 15/02/24																									
22	GRANIPLAS	\$ 748.210	2 días	mié 14/02/24	jue 15/02/24																									
23	RED ELÉCTRICA	\$ 7.106.264	5 días	sáb 17/02/24	jue 22/02/24																									
24	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DES	\$ 6.943.038	3 días	sáb 17/02/24	mar 20/02/24																									
25	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	\$ 163.226	2 días	mar 20/02/24	jue 22/02/24																									
26	RED HIDRÁULICA	\$ 1.169.994	2 días	jue 25/01/24	sáb 27/01/24																									
27	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	\$ 129.267	2 días	jue 25/01/24	sáb 27/01/24																									

PROGRAMACION PACORA

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	enero 2024												febrero 2024												
						17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	
28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	\$ 1.040.727	2 días	jue 25/01/24	sáb 27/01/24																									
29	ASEO-SEÑALIZACIÓN	\$ 609.036	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24																									
30	ASEO GENERAL DE OBRA	\$ 431.662	4 días	sáb 10/02/24	mar 13/02/24																									
31	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	\$ 177.374	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24																									
32	NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$ 12.306.879	26 días	jue 25/01/24	lun 19/02/24																									
33	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	\$ 5.025.074	10 días	jue 1/02/24	dom 11/02/24																									
34	RESANE	\$ 690.881	4 días	dom 28/01/24	jue 1/02/24																									
35	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E= 14 CM	\$ 256.984	4 días	vie 16/02/24	lun 19/02/24																									
36	INSTALACION DE AVISO	\$ 460.696	1 día	mar 13/02/24	mar 13/02/24																									
37	SILICONA VENTANERIA	\$ 242.097	3 días	dom 11/02/24	mar 13/02/24																									
38	IMPERMEABILIZAC VIGA CANAL	\$ 1.160.934	3 días	jue 25/01/24	dom 28/01/24																									
39	RASPADA DE FACHADA	\$ 322.297	3 días	mar 6/02/24	vie 9/02/24																									
40	ENCOROZADA CUBIERTA VIGA CANAL	\$ 813.050	6 días	dom 28/01/24	sáb 3/02/24																									

PROGRAMACION PACORA

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	enero 2024														febrero 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTERPERIE (2 MANOS)	\$ 400.201	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
