



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151322009-104961222 CPNAA

**ARQUITECTO**

## INFORME PAGO FINAL DE CONSULTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 218 DE 2024

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA, ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ.

CONTRATISTA:

ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS

C.C.: 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ

PLAZO DE EJECUCIÓN

CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS

PERIODO DEL PRESENTE INFORME:

07 DE OCTUBRE DE 2024 A 15 DE MARZO DE 2025

MUNICIPIO MIRAFLORES - BOYACÁ

JUNIO 2025



Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	7
3. OBJETO.....	8
5. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA .....	9
5.1. Generalidades .....	9
5.2. Avance físico de la Consultoría a la fecha de corte. ....	10
5.3. Avance en el tiempo de la Consultoría a la fecha de corte. ....	10
5.4. Avance financiero a la fecha de corte. ....	10
6. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA.....	11
6.1. Información financiera de lo contratado.....	11
6.2. Información General: A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.....	13
6.3. Descripción de las Actividades ejecutadas .....	14
6.4. Balance financiero y control presupuestal .....	33
7. Aspectos ambientales, impacto y seguridad industrial .....	34
7.1. Seguridad social y parafiscal .....	34
7.2. Aspectos logísticos (PERSONAL).....	34
7.3. Aspectos Logísticos (EQUIPO) .....	35
8. CONCLUSIONES.....	35
9. RECOMENDACIONES.....	36



## 1. INTRODUCCIÓN

La infraestructura deportiva constituye un componente esencial en la planificación urbana, dado su impacto en la estructuración del espacio público, el bienestar social y la promoción del desarrollo comunitario. La demanda de equipamientos deportivos adecuados y normativamente viables ha impulsado la necesidad de proyectos que integren soluciones arquitectónicas, estructurales y urbanísticas, alineadas con las dinámicas poblacionales y las condiciones del entorno construido.

El municipio de Miraflores, Boyacá, identificado como la capital de la región de Lengupá, presenta deficiencias en la infraestructura de su cancha de fútbol 11 municipal, las cuales limitan su funcionalidad, accesibilidad y capacidad operativa para la realización de eventos deportivos de carácter local y regional. En respuesta a esta problemática, se formula el presente proyecto “estudios y diseños para la construcción de gradería, iluminación y obras exteriores de la cancha de fútbol 11 municipal de Miraflores, Boyacá” cuyo alcance contempla la materialización de una propuesta integral que optimice las condiciones del escenario deportivo y su relación con el contexto urbano.

El proyecto considera la implementación de graderías con camerinos, baterías sanitarias, depósitos y cuartos técnicos, garantizando una infraestructura funcional y acorde con los requerimientos de los usuarios. Asimismo, se plantea el diseño de un nuevo cerramiento, conforme a la redistribución espacial del equipamiento, permitiendo una delimitación eficiente y segura del área deportiva. En términos de infraestructura lumínica, se proyecta la instalación de un sistema de iluminación para la cancha de fútbol y la pista atlética, optimizando la operatividad del equipamiento en jornadas nocturnas y mejorando las condiciones de visibilidad y seguridad.

Como parte del desarrollo del espacio público y la integración de equipamientos complementarios, se contempla la construcción de un Bioparque infantil, concebido como un espacio de integración familiar con áreas de esparcimiento y juegos infantiles, junto con un gimnasio al aire libre, dotado de equipamiento especializado para la actividad física. De manera complementaria, se implementará una pista atlética perimetral de aproximadamente 700 metros lineales, cuyo trazado bordea la intervención urbanística, garantizando una conexión eficiente entre los distintos componentes del proyecto y facilitando la práctica de atletismo y otras actividades recreativas.

El diseño arquitectónico y urbanístico del proyecto responde a los lineamientos establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.), así como a la normativa vigente en materia de equipamientos deportivos. Su formulación busca garantizar la articulación del equipamiento con el entorno urbano, su accesibilidad universal y su impacto positivo en la dinámica social y económica de la región. Con esta intervención, se fortalece la infraestructura deportiva de Miraflores, consolidándolo como un nodo estratégico para la práctica deportiva en la región de Lengupá, beneficiando no solo a la población local, sino también a los habitantes de municipios aledaños.



## LOCALIZACIÓN GENERAL

El presente proyecto de “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA, ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ.”, se ubica en el municipio de Miraflores, capital de la región de Lengupá, en el suroriente del departamento de Boyacá. Este municipio se encuentra a 85 km de Tunja, capital departamental, y se ha consolidado como un punto estratégico de desarrollo económico, educativo y recreativo, con un impacto significativo en la dinámica regional.

El proyecto se emplaza específicamente en el Barrio El Cogollo, entre la Carrera 12 y la Calle 2, en un sector que alberga importantes equipamientos urbanos, como el Coliseo Municipal y la sede principal del Colegio Sergio Camargo. La intervención en esta zona responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa del municipio, generando espacios funcionales que promuevan el deporte, la recreación y la integración social.

Si bien la conectividad vial principal del municipio se encuentra a una distancia considerable del área de intervención, el acceso al proyecto se garantiza a través de la infraestructura vial secundaria y terciaria existente. La ubicación estratégica de Miraflores y su influencia en los municipios circundantes hacen que esta iniciativa no solo beneficie a la población local, sino también a los habitantes de otras localidades de la región, fortaleciendo su papel como un centro de referencia sociocultural dentro de Lengupá.

IMAGEN 1: Mapa de colombia



tomado de: [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boyaca\\_in\\_Colombia\\_%28mainland%29.svg](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boyaca_in_Colombia_%28mainland%29.svg)



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

N.P. A151322009-104261922E CPNAA

**ARQUITECTO**

IMAGEN 2: Mapa del departamento de Boyacá



Tomado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia\\_de\\_Lengup%C3%A1](https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lengup%C3%A1)

IMAGEN 3: Mapa del municipio de Miraflores



Tomado de: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://planeacion.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/MIRAFLORES-VEREDAL.pdf](https://planeacion.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/MIRAFLORES-VEREDAL.pdf)



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151332009-104261922E CPNAA

**ARQUITECTO**

IMAGEN 4: Mapa del casco urbano de Miraflores



**Fuente:** Propia

IMAGEN 5: Implantación general del estadio municipal



**Fuente:** Propia



## 2. ANTECEDENTES

La mejora en la infraestructura deportiva del municipio de Miraflores, Boyacá, representa una oportunidad para desarrollar un nuevo punto de encuentro que responda a los requerimientos del futuro en términos de sostenibilidad, calidad de vida y desarrollo urbano. Este proyecto busca fortalecer la identidad del municipio mediante la modernización de sus espacios deportivos, promoviendo la integración social y mejorando la experiencia de sus habitantes y visitantes.

El diseño y construcción de las nuevas graderías, la iluminación del estadio y las obras exteriores no solo transformarán la imagen del lugar, sino que también impulsarán una nueva dinámica urbana. Se generará un entorno eficiente y funcional que beneficiará tanto a los deportistas como a la comunidad en general, garantizando instalaciones adecuadas para la práctica deportiva, el esparcimiento y el desarrollo de eventos locales.

Este proyecto contempla la ejecución de estudios y diseños para la construcción de graderías con camerinos, baños públicos, depósitos y cuartos de máquinas, el cerramiento del predio, un Bioparque integrador de familias, una plazoleta o zona comercial, 100 parqueaderos y 700 metros lineales de pista atlética, además de la instalación de un sistema de iluminación adecuado para el estadio. Con ello, se busca dotar al municipio de un espacio óptimo para el desarrollo del deporte y la recreación, con estándares de calidad y sostenibilidad que permitan su proyección a futuro.





### **3. OBJETO**

En virtud a la necesidad de dinamizar actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, se plantea ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA, ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ. Este proyecto busca dotar al municipio de una infraestructura deportiva moderna y funcional, garantizando espacios adecuados para la integración social y el desarrollo urbano.

El planteamiento arquitectónico define detalladamente las unidades de obra que conformarán la intervención en el área de actuación urbanística, incluyendo las obras complementarias necesarias para su correcta integración con el entorno construido y natural. Para ello, se han tenido en cuenta los condicionantes físicos, normativos y técnicos, asegurando una intervención armónica con la morfología urbano-arquitectónica del municipio.

El desarrollo del proyecto se fundamenta en una visión integral que abarca aspectos socioculturales, económicos y urbano-ambientales, con el propósito de establecer una base técnica coherente para la materialización de una infraestructura sostenible y eficiente. La planificación contempla la ejecución por fases, en función de los condicionantes existentes, y define las calidades generales de las unidades de obra conforme a los estándares técnicos y normativos aplicables.

El alcance del proyecto se ajusta a las disposiciones urbanísticas y normativas vigentes a nivel municipal, departamental y nacional, así como a las directrices de las entidades competentes en la gestión de infraestructura deportiva y urbana. Con su implementación, se busca consolidar un equipamiento de alto impacto para la comunidad, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes no solo del municipio de Miraflores, sino además para los habitantes de la región de lengupá. no obstante, llevando a cabo el fortalecimiento de la estructura urbana del municipio.



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151322009-104261222 DPNA

**ARQUITECTO**

## 5. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

### 5.1. Generalidades

<b>CONTRATO DE - CONSULTORIA No.:</b>	218 DE 2024
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MIRAFLORES (BOYACÁ)
<b>NIT:</b>	800.029.660-1
<b>CONTRATISTA:</b>	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
<b>NIT Y/O C.C.:</b>	1.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
<b>OBJETO</b>	“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA, ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ”
<b>VALOR</b>	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 50.850.000,00)
<b>PLAZO INICIAL</b>	DOS (2) MESES
<b>FECHA CONTRATO</b>	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
<b>FECHA ACTA INICIO</b>	07 DE OCTUBRE DE 2024
<b>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL</b>	06 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE PRORROGA No. 01</b>	04 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 01</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE LA SUSPENSIÓN - No. 01</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE ACATA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01</b>	15 DE ENERO DE 2025
<b>FECHA DEL ACTA DE REINICIO No. 01</b>	23 DE ENERO DE 2025
<b>FECHA DE PRORROGA No. 02</b>	23 DE ENERO DE 2025



<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 02</b>	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE PRORROGA No. 03</b>	20 DE FEBRERO DE 2025
<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 03</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL</b>	15 DE MARZO DE 2025

**5.2. Avance físico de la Consultoría a la fecha de corte.**

<b>AVANCE FÍSICO A LA FECHA</b>	100.00 %
---------------------------------	----------

**5.3. Avance en el tiempo de la Consultoría a la fecha de corte.**

<b>TIEMPO TOTAL TRASCURRIDO</b>	100.00 %
---------------------------------	----------

**5.4. Avance financiero a la fecha de corte.**

<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		
	<b>CONTRATO REAL</b>	
	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 50.850.000,00	100,00%
<b>ANTICIPO</b>	\$ -	0,00%
<b>VALOR ADICIONAL 1</b>	\$ -	0,00%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ <b>50.850.000,00</b>	100,00%
<b>VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA</b>	\$ 50.850.000,00	100,00%
<b>VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES</b>	\$ -	0,00%
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	\$ <b>50.850.000,00</b>	100,00%
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	\$ -	0,00%
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ <b>50.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>



## 6. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA

### 6.1. Información financiera de lo contratado

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VALOR TOTAL
1	<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANÍMETRO Y ALTIMÉTRICO, INCLUYE:</b> PLANO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL), INDICANDO CAMBIOS DE NIVEL, LINDEROS, CONSTRUCCIONES EXISTENTES CUADRO DE COORDENADAS DE PUNTOS DE AMARRE DE LEVANTAMIENTO, CUADRO DE ÁREAS DE EDIFICACIONES EXISTENTES, IDENTIFICACIÓN DE NORTE GEOGRÁFICO, IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y CONSTRUCCIONES COLINDANTES, LEVANTAMIENTO DE VÍAS COLINDANTES AL ÁREA DE INFLUENCIA DENOTANDO MEDIDAS DE CALZADA, LEVANTAMIENTO DE RED DE COLECCIÓN PRINCIPAL DE DESAGÜE DENOTANDO DIÁMETROS DE TUBERÍAS Y SENTIDOS DE FLUJO, LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, PLANO DE PERFILES TOPOGRÁFICOS MOSTRANDO DENTRO DE ELLOS ALTURAS DE VOLÚMENES EXISTENTES, INFORME TOPOGRÁFICO EL CUAL DEBE INCLUIR LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, MÉTODO DE LEVANTAMIENTO, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO TABLA DE COORDENADAS GENERAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES CON EL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$3.000.000,00
2	<b>ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES</b> EL CUAL CONLLEVA LA EJECUCIÓN DE 3 PERFORACIONES A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CARACTERIZACIÓN EN LABORATORIO DE MUESTRAS DEL PERFIL DEL SUBSUELO E INFORME FINAL DE RESULTADOS OBTENIDOS INCLUYENDO TAMBIÉN LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, PLANO DE LOCALIZACIÓN DE SONDEOS DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADOS, DETALLE DE PERFILES ESTRATIGRÁFICOS PARA CADA SONDEO, DETALLE TÓPICO DE CIMIENTOS SEGÚN RESULTADOS DE LABORATORIO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES CON EL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD.	UND	1	\$5.000.000,00
3	<b>DISEÑO ARQUITECTÓNICO INCLUYE:</b> PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL, PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO MOSTRANDO CURVAS DE NIVEL, PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, CUBIERTAS, DOS CORTES LONGITUDINALES, DOS CORTES TRANSVERSALES, FACHADAS: NORTE, SUR, ORIENTE, OCCIDENTE, PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS, DETALLE DE CERRAMIENTO. MEMORIA DESCRIPTIVA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO INCLUYE LOCALIZACIÓN GENERAL DE PROYECTO CONCEPTUALIZACIÓN DEL ENTORNO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDICANDO ORIENTACIÓN Y SENTIDO DE CADA FOTOGRAFÍA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$8.000.000,00



4	<b>DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE</b> PLANO DE EJES CIMENTACIÓN, PLANO DE VIGAS DE CIMIENTOS Y VIGAS AÉREAS, PLANO DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA, PLANO DE DESPIECES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, COLUMNAS, PEDESTALES, VIGAS DE CIMIENTOS, VIGAS AÉREAS, PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN DONDE SE MUESTREN CORTES DE CIMIENTOS, COLUMNAS, PLANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA LA CUAL DEBE INCLUIR DETALLES DE EMPALMES DE TUBERÍA, DETALLE DE ANCLAJES MEMORIAS DE CALCULO DE DISEÑO ESTRUCTURAL, INFORME DE DISEÑO EL CUAL CONTENGA LOCALIZACIÓN GENERAL DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES AL PROYECTO, CERTIFICACIÓN FIRMADA POR UN INGENIERO CIVIL DONDE CONSTE QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON LA NORMA NSR 10, DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$11.000.000,00
5	<b>DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO, AGUAS LLUVIAS DISEÑO HIDRÁULICO INCLUYE:</b> PLANO DE PLANTA DISEÑO HIDRÁULICO EN EL CUAL SE MUESTREN LONGITUDES Y DIÁMETROS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS, PLANO ISOMÉTRICO, DETALLES CONSTRUCTIVOS. <b>DISEÑO SANITARIO INCLUYE:</b> PLANO DE PLANTA DISEÑO SANITARIO EN DONDE SE MUESTRE LOCALIZACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN, LOCALIZACIÓN DE REDES DE DESAGÜES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS LAS CUALES DEBEN MOSTRAR LONGITUDES, DIÁMETROS, PENDIENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS. INFORME DE DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EL CUAL DEBE CONTENER LOCALIZACIÓN GENERAL DE PROYECTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDE AL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$6.000.000,00
6	<b>DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN INCLUYE:</b> PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DONDE SE MUESTREN LONGITUDES PARA CADA UNO DE LOS CIRCUITOS, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MODELADO POR SOFTWARE, ANÁLISIS DE RIESGO, INFORME DE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EL CUAL DEBE CONTENER LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE MATERIALES EMPLEADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES AL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$9.000.000,00
7	<b>PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INCLUYE:</b> PRESUPUESTO DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS), MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES, ANÁLISIS DEL AIU, ANÁLISIS DE INTERVENTORÍA, CRONOGRAMA DE OBRA, FLUJO DE FONDOS, ANÁLISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR, DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$4.000.000,00
8	<b>ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN,</b> PROCESO CONSTRUCTIVO, PLAN DE MANTENIMIENTO, PLAN DE CONTINGENCIA, MODELACIÓN 3D, ELABORACIÓN DE 10 RENDERS: IMÁGENES DIGITALES DE DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL MODELO 3D DEL PROYECTO.	UND	1	\$2.000.000,00



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A1513328009-1042612222 CPNAA

**ARQUITECTO**

9	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EL CUAL DEBE CONTENER LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES AL ALCANCE DEL PROYECTO LO DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1	\$2.850.000,00
<b>VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA MAS IVA (19%)</b>				<b>\$50.850.000,00</b>

## 6.2. Información General: A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.

<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ACTUAL</b>		
	<b>CONTRATO REAL</b>	
	<b>\$</b>	<b>%</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 50.850.000,00	100,00%
ANTICIPO	\$ -	0,00%
VALOR ADICIONAL 1	\$ -	0,00%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 50.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 50.850.00.00	100,00%
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	\$ -	0,00%
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 50.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
VALOR POR EJECUTAR	\$	0,00%
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 50.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>




### 6.3. Descripción de las Actividades ejecutadas

Las actividades realizadas en el avance del proyecto son las siguientes:

#### 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANÍMETRO Y ALTIMÉTRICO

Incluye: plano de localización geográfica (departamental y municipal), indicando cambios de nivel, linderos, construcciones existentes cuadro de coordenadas de puntos de amarre de levantamiento, cuadro de áreas de edificaciones existentes, identificación de norte geográfico, identificación de los predios y construcciones colindantes, levantamiento de vías colindantes al área de influencia denotando medidas de calzada, levantamiento de red de colección principal de desagüe denotando diámetros de tuberías y sentidos de flujo, levantamiento de redes eléctricas, plano de perfiles topográficos mostrando dentro de ellos alturas de volúmenes existentes, informe topográfico el cual debe incluir localización general del proyecto, método de levantamiento, descripción de actividades realizadas en campo tabla de coordenadas general, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones acordes con el alcance del proyecto, documentos de profesional responsable (matrícula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).

REGISTO FOTOGRAFICO:

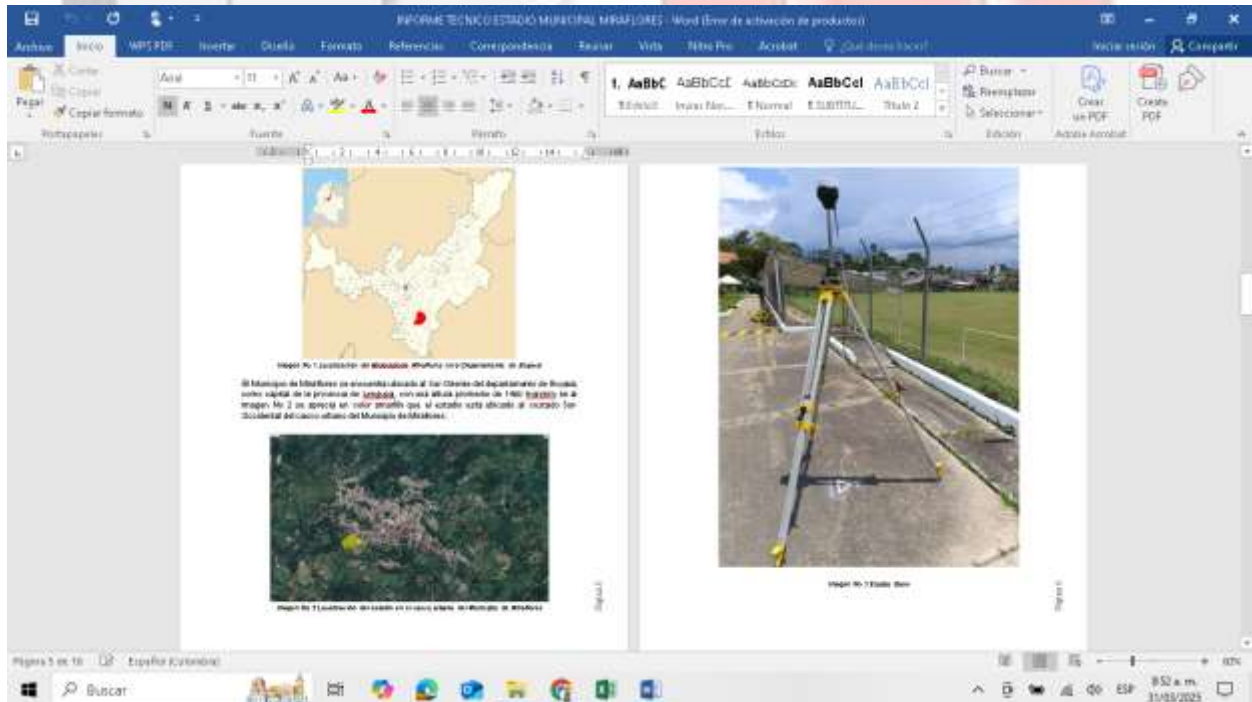


*Fuente: Elaboración Propia*




**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151332009-1049619222 OPNAA

**ARQUITECTO**

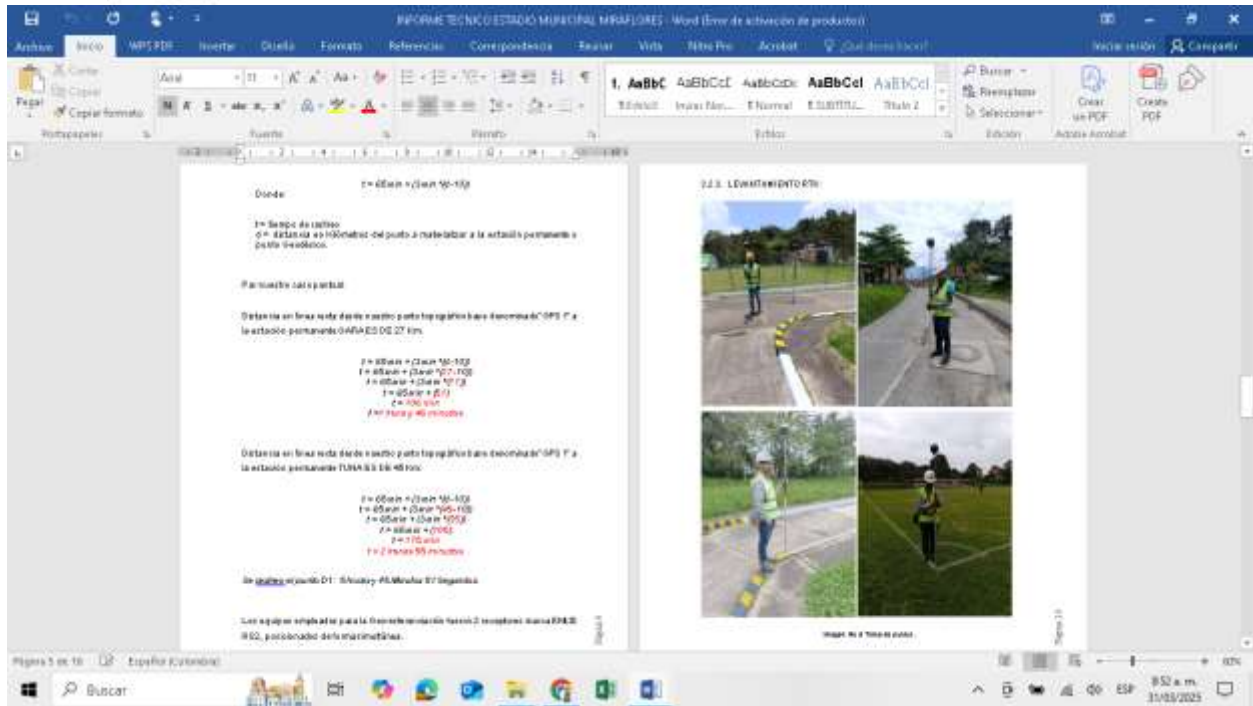

*Fuente: Elaboración Propia*

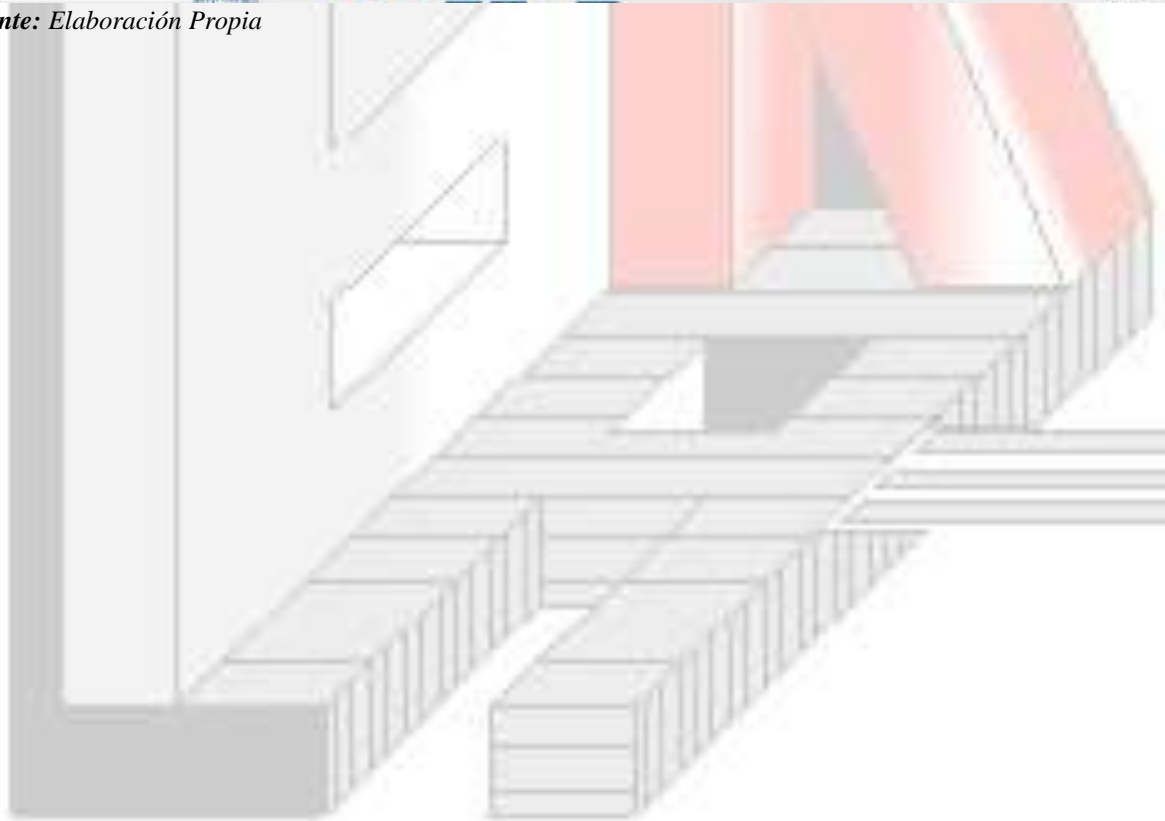



GONZALO RIVERA BALLESTEROS


M.P. A151332009-104261922E CPNAA

ARQUITECTO

## 2. ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES

El cual conlleva la ejecución de 3 perforaciones a 6.00 metros de profundidad, incluye caracterización en laboratorio de muestras del perfil del subsuelo e informe final de resultados obtenidos incluyendo también localización general del proyecto, plano de localización de sondeos debidamente georreferenciados, detalle de perfiles estratigráficos para cada sondeo, detalle tópico de cimientos según resultados de laboratorio, registro fotográfico de actividades realizadas en campo, conclusiones y recomendaciones acordes con el alcance del proyecto, documentos de acreditación de idoneidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

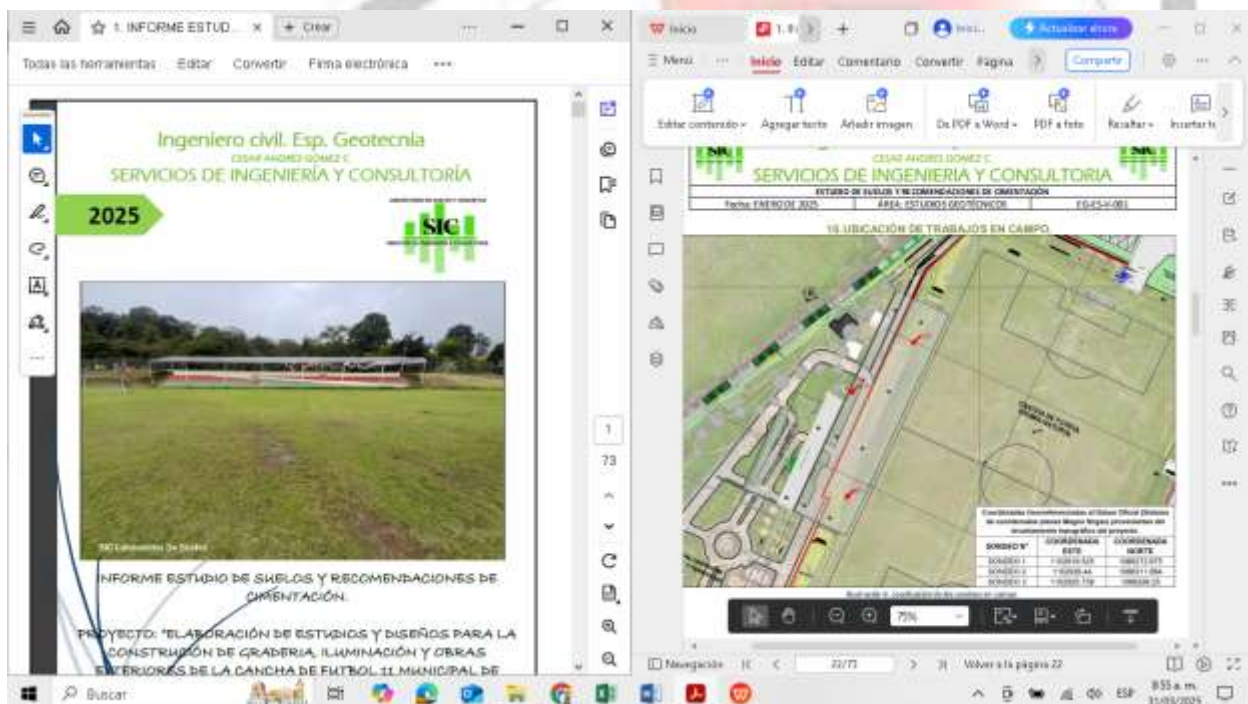

Fuente: Elaboración Propia




**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151332009-1042619222 OPNAA

**ARQUITECTO**

DESCRIPCION DEL SUELO (PROFUNDIDAD)	CLASIFICACION	COTAS
Caja digital		
Medida de 0.30m. Registro de color, humedad y temperatura. Se toma muestra de suelo a 0.30m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 0.60m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 0.90m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 1.20m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 1.50m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 1.80m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 2.10m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 2.40m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 2.70m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 3.00m de profundidad.		
Muestra de suelo		
Medida de 0.30m. Registro de color, humedad y temperatura. Se toma muestra de suelo a 0.30m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 0.60m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 0.90m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 1.20m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 1.50m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 1.80m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 2.10m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 2.40m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 2.70m de profundidad. Se toma muestra de suelo a 3.00m de profundidad.		

*Fuente: Elaboración Propia*

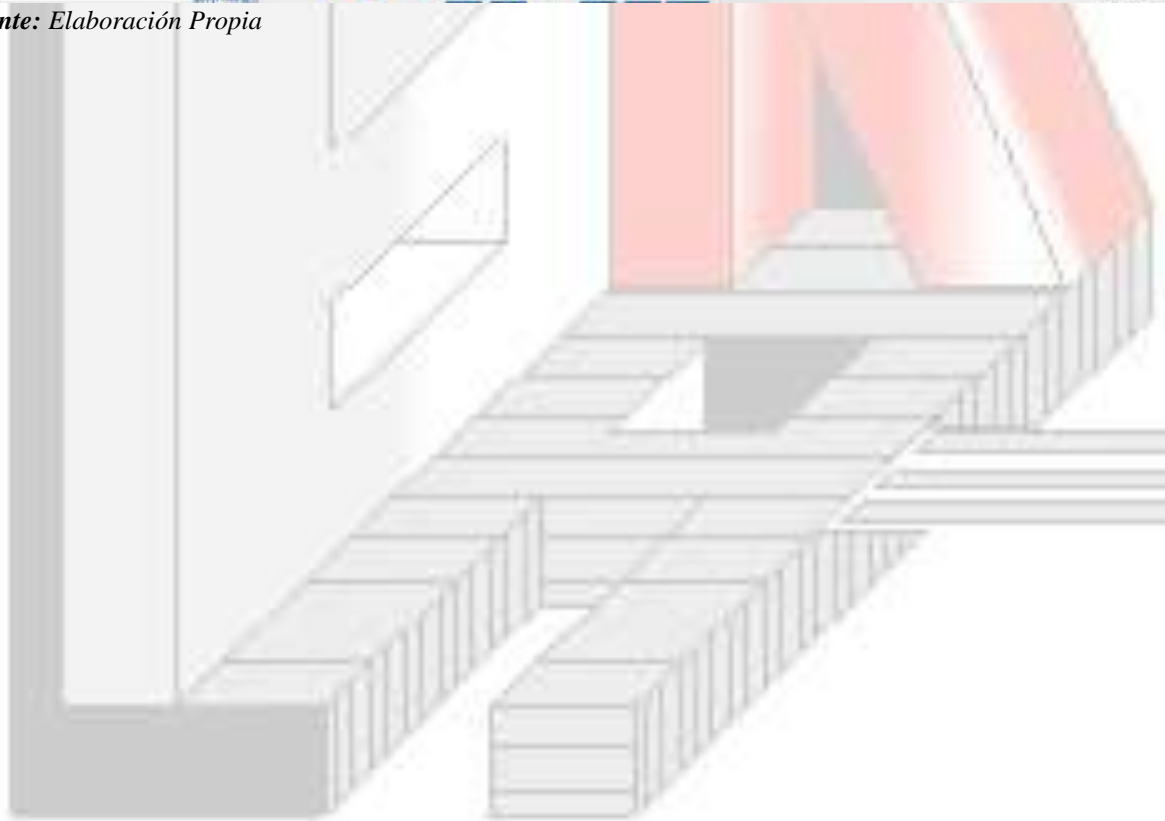



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**


M.P. A151332009-104961922E CPNAA

**ARQUITECTO**

### 3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Incluye: plano de localización general, plano de implantación general del proyecto mostrando curvas de nivel, plantas arquitectónicas, cubiertas, dos cortes longitudinales, dos cortes transversales, fachadas: norte, sur, oriente, occidente, plano de detalles constructivos, detalle de cerramiento. Memoria descriptiva de diseño arquitectónico incluye localización general de proyecto conceptualización del entorno, registro fotográfico del área de influencia indicando orientación y sentido de cada fotografía, conclusiones y recomendaciones específicas del proyecto, documentos de idoneidad del profesional responsable (matrícula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).

#### REGISTRO FOTOGRAFICO

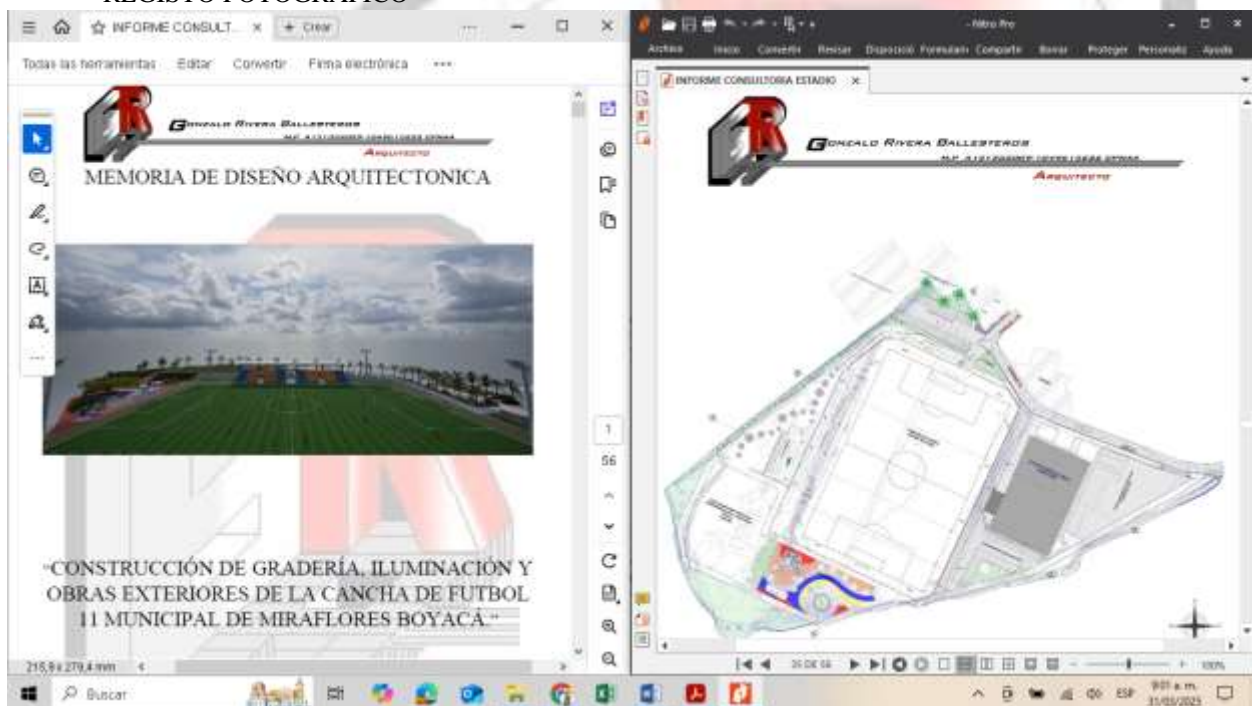

*Fuente: Elaboración Propia*



GONZALO RIVERA BALLESTEROS

M.P. A151332007-1042619222 OPNAA

ARQUITECTO


**TERMINANTES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO**

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
IMPLANTACIÓN-SOLUCIÓN-VENTILACIÓN	<p><b>IMPLANTACIÓN:</b> Se implantó en terreno de 207m<sup>2</sup> con una superficie de 10m de ancho y una longitud de 20m, en las condiciones de las parcelas y zonas a la que se le otorga la implantación de la parcela de 10m de ancho y una longitud de 20m, en las condiciones de las parcelas y zonas a la que se le otorga la implantación de la parcela de 10m de ancho y una longitud de 20m.</p> <p><b>SOLUCIÓN:</b> Se diseñó un sistema de solución de 10m de ancho y una longitud de 20m, en las condiciones de las parcelas y zonas a la que se le otorga la implantación de la parcela de 10m de ancho y una longitud de 20m.</p> <p><b>VENTILACIÓN:</b> Se diseñó un sistema de ventilación de 10m de ancho y una longitud de 20m, en las condiciones de las parcelas y zonas a la que se le otorga la implantación de la parcela de 10m de ancho y una longitud de 20m.</p>

DESCRIPCIÓN	TIPO DE	CANTIDAD	DETALLE	ESTADO	NOTAS
CANCHA DE FUTBOL	ABRERTO TIPO DE NATURAL	1	Ancho: 10m Largo: 20m Área: 200m <sup>2</sup>	CONSTRUCION	Hasta 2 personas en construcion por depende de terreno construido, 1 persona, 2 personas para un total de 10 personas.
ZONA DE BANCOS	ABRERTO TIPO DE NATURAL	2	Ancho: 10m Largo: 10m Área: 100m <sup>2</sup>	CONSTRUCION	Hasta 2 personas en construcion por depende de terreno construido, 1 persona, 2 personas para un total de 10 personas.
GRADERO CUBIERTO	CUBIERTO	1	Ancho: 10m Largo: 10m Área: 100m <sup>2</sup>	CONSTRUCION	Hasta 2 personas en construcion por depende de terreno construido, 1 persona, 2 personas para un total de 10 personas.
ZONA COMERCIAL	ABRERTO TIPO DE NATURAL	1	Área:	CONSTRUCION	Hasta 2 personas en construcion por depende de terreno construido, 1 persona, 2 personas para un total de 10 personas.
ZONA DE CULTIVO	ABRERTO TIPO DE NATURAL	1	Área:	CONSTRUCION	2 personas en construcion por depende de terreno construido, 1 persona, 2 personas para un total de 10 personas.
ZONA DE JARDINES	TIPO DE	2	Área:	CONSTRUCION	2 personas en construcion
ZONA DE JARDIN	CUBIERTO	10	Área:	CONSTRUCION	2 personas en construcion
ZONA DE JARDIN	CUBIERTO	10	Área:	CONSTRUCION	2 personas en construcion
ZONA DE JARDIN	CUBIERTO	1	Área:	CONSTRUCION	1 persona en construcion
<b>TOTAL DE PERSONAS EN EL PROYECTO</b>					10 personas en construcion por depende de terreno construido, 1 persona, 2 personas para un total de 10 personas.

Fuente: Elaboración Propia



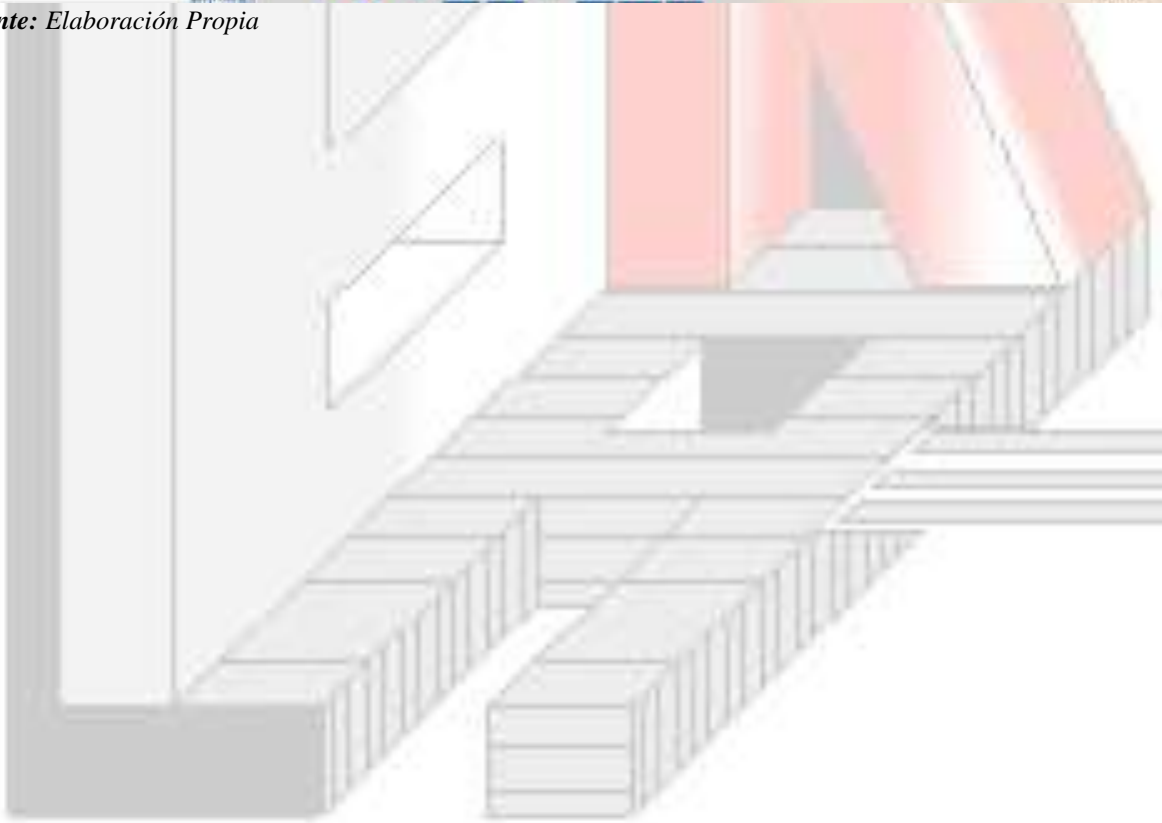

GONZALO RIVERA BALLESTEROS


N.P. A151322009-104261222 OPNAA

ARQUITECTO

#### 4. DISEÑO ESTRUCTURAL

El cual debe contener plano de ejes cimentación, plano de vigas de cimientos y vigas aéreas, plano de cubierta de estructura metálica, plano de despieces de elementos estructurales como zapatas, columnas, pedestales, vigas de cimientos, vigas aéreas, plano de perfiles longitudinales y transversales en donde se muestren cortes de cimientos, columnas, planos de estructura metálica de cubierta la cual debe incluir detalles de empalmes de tubería, detalle de anclajes memorias de cálculo de diseño estructural, informe de diseño el cual contenga localización general de proyecto, especificaciones técnicas de elementos estructurales, conclusiones y recomendaciones acordes al proyecto, certificación firmada por un ingeniero civil donde conste que los diseños cumplen con la norma nsr 10, documentos de idoneidad del profesional responsable (matrícula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).

#### REGISTO FOTOGRAFICO

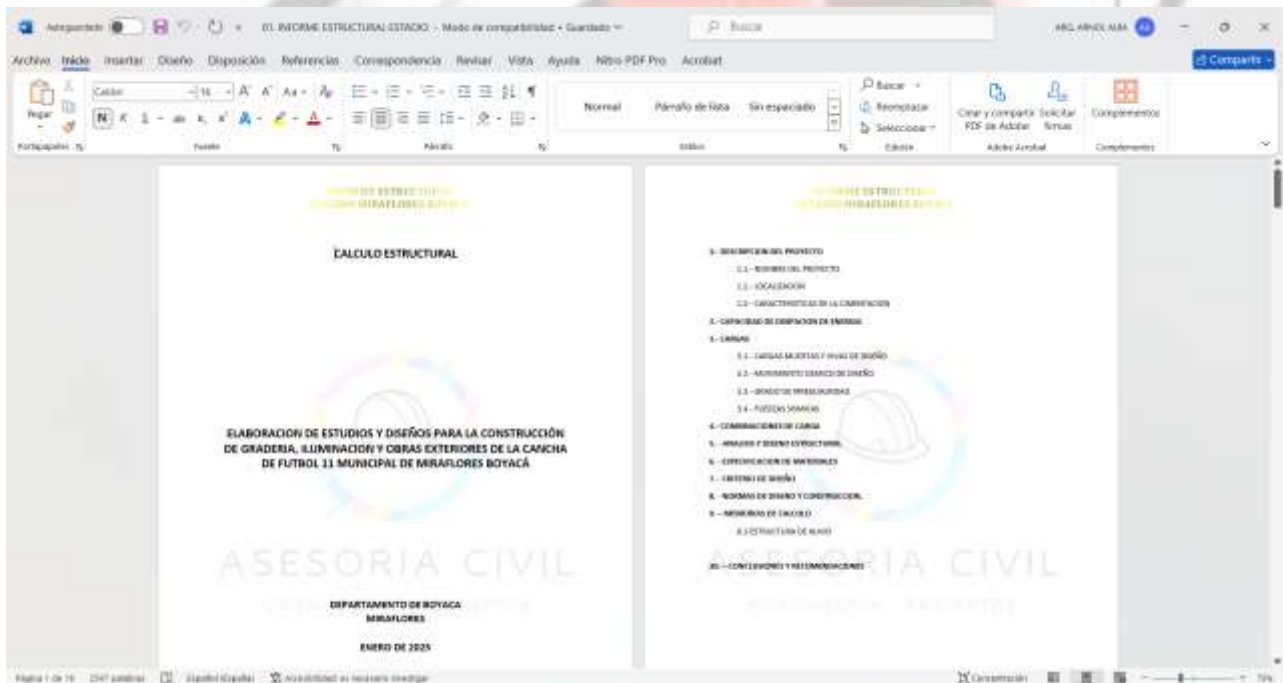


Fuente: Elaboración Propia



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

N.P. A151332009-104261922E OPNAA

**ARQUITECTO**



Fuente: Elaboración Propia



Fuente: Elaboración Propia



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**


M.P. A151332009-104961922E CPNAA

**ARQUITECTO**

## 5. DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO, AGUAS LLUVIAS

El cual debe contener: plano de planta diseño hidráulico en el cual se muestren longitudes y diámetros, especificaciones técnicas de materiales empleados, plano isométrico, detalles constructivos. Diseño sanitario incluye: plano de planta diseño sanitario en donde se muestre localización de cajas de inspección, localización de redes de desagües sanitarias y de aguas lluvias las cuales deben mostrar longitudes, diámetros, pendientes, especificaciones técnicas de materiales empleados. Informe de diseño de redes hidráulicas y sanitarias el cual debe contener localización general de proyecto conclusiones y recomendaciones acorde al alcance del proyecto, documentos de idoneidad del profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).

### REGISTO FOTOGRAFICO



*Fuente: Elaboración Propia*







**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151332009-1042619228 OPNAA

**ARQUITECTO**

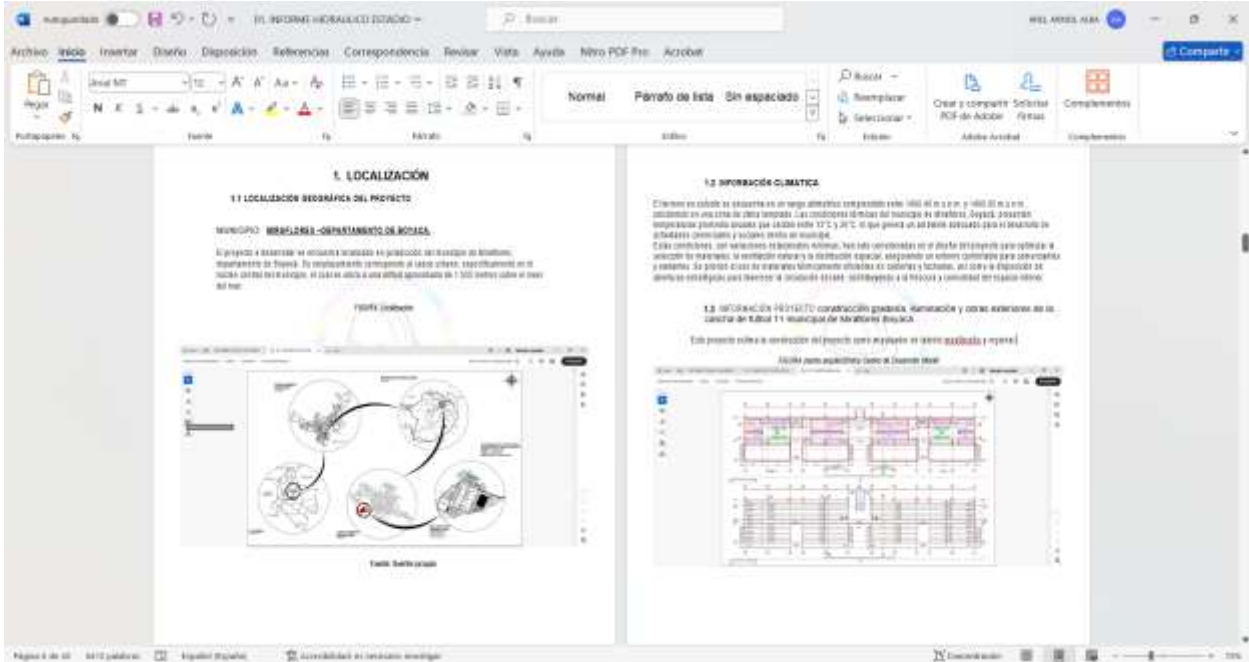

Fuente: Elaboración Propia

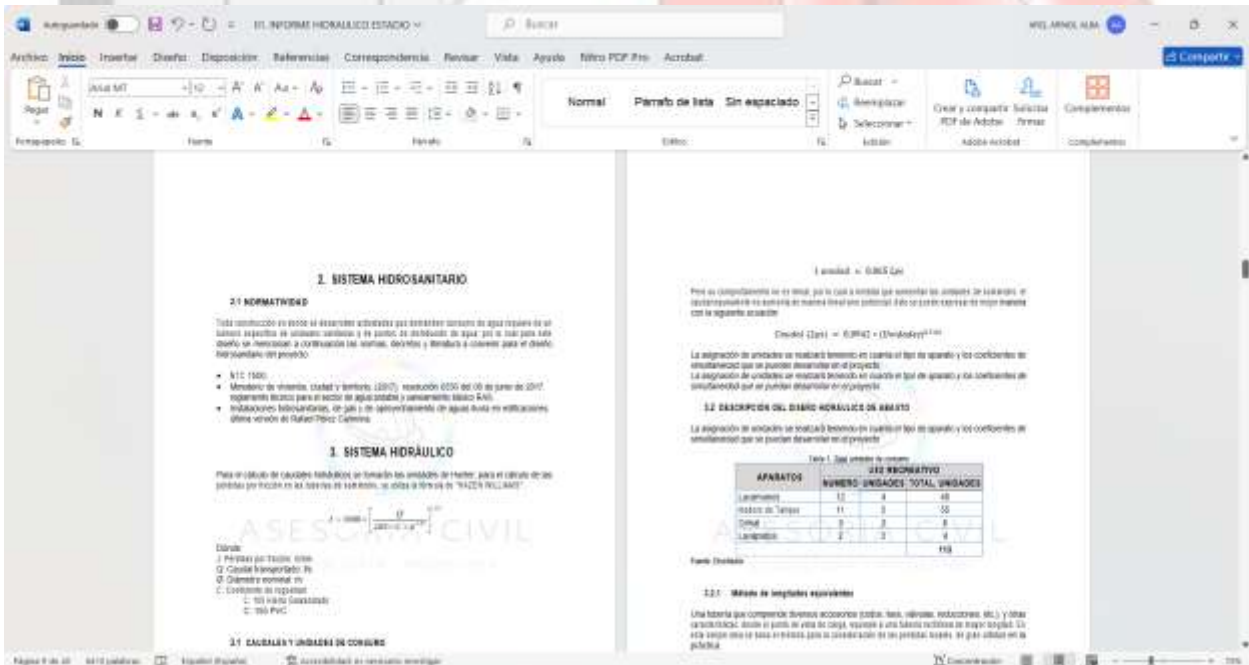


Fuente: Elaboración Propia



## 6. DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN

El cual debe contener: planos de instalaciones eléctricas en donde se muestren longitudes para cada uno de los circuitos, diseño de iluminación modelado por software, análisis de riesgo, informe de diseño de redes eléctricas y de iluminación el cual debe contener localización general del proyecto descripción de materiales empleados, especificaciones técnicas eléctricas, conclusiones y recomendaciones acordes al alcance del proyecto, documentos de idoneidad del profesional responsable (matrícula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).

### REGISTRO FOTOGRAFICO

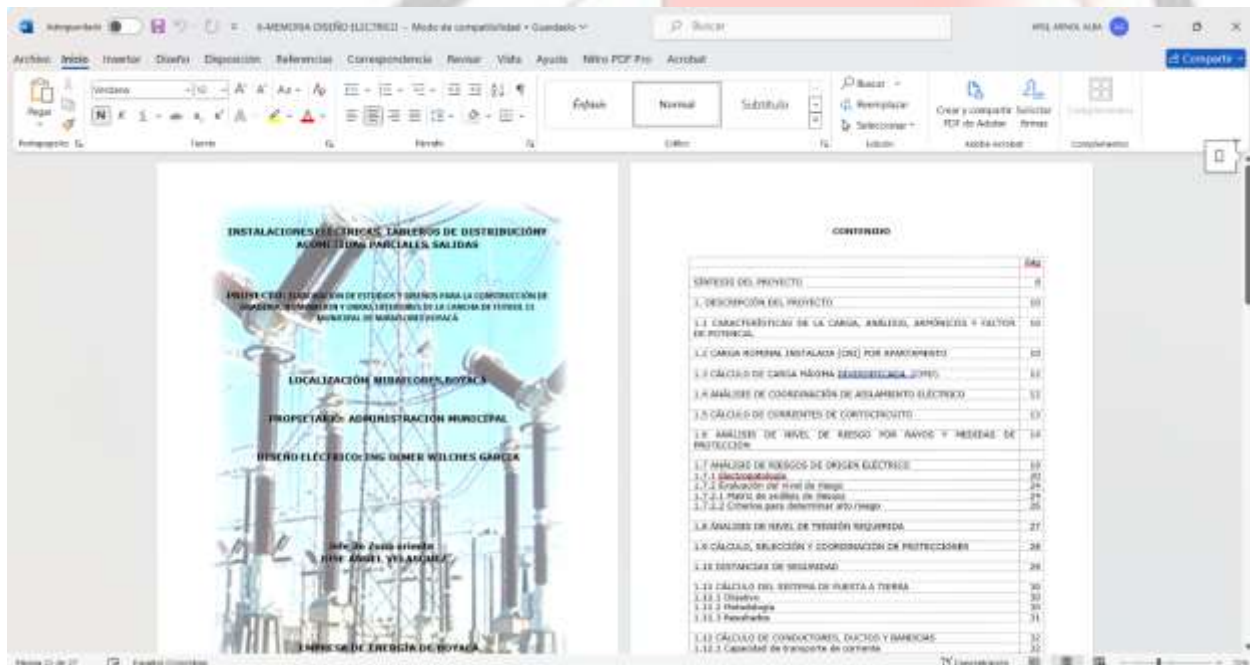

Fuente: Elaboración Propia







**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

N.P. A151332009-104961922E CPNAA

**ARQUITECTO**

PREBUDGETO BASE ESTADO v2 (Modo de computación) - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Referencia Vista Ayuda Herramientas PDF Print Compartir

Formato de celdas Formato de bordes Formato de números Formato de fechas Formato de texto Formato de estilos de celdas

42577

**Boyacá** FORMULARIO ESTADÍSTICO DE PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO

PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CONCRETO ARMADO

UBICACIÓN: BOYACÁ - MUNICIPIO DE SAN CARLOS


OBJETIVO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA, LUBRICACIÓN Y OBRAS DE BARRERAS DE LA CUBIERTA DE TETOS, TIPOSEÑAL DE MANGUEROS DE VENTILACIÓN"

MEMORIAL DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
1.00	M <sup>2</sup>	CONCRETO DE 200 KG/M <sup>3</sup>	M <sup>2</sup>	1.00	M <sup>2</sup>	1.00
1.50	M <sup>3</sup>	CONCRETO DE 200 KG/M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1.50	M <sup>3</sup>	1.50
0.50	M <sup>3</sup>	CONCRETO DE 200 KG/M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	0.50	M <sup>3</sup>	0.50
<b>TOTAL</b>						<b>3.00</b>

SECCIONES Y DETALLES DE CARGADOS

Fuente: Elaboración Propia

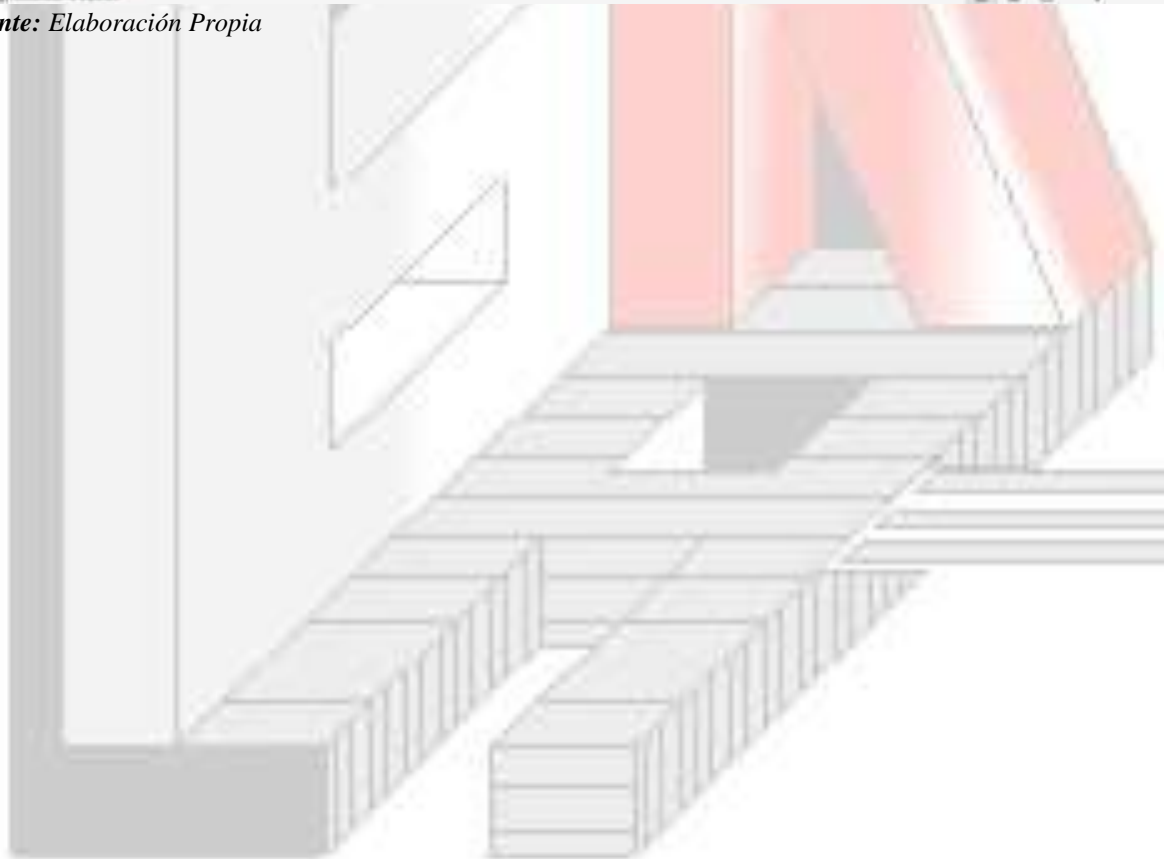



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**


M.P. A151332009-104961922E CPNAA

**ARQUITECTO**

## 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Elaboración de especificaciones técnicas de construcción, proceso constructivo, plan de mantenimiento, plan de contingencia, modelación 3d, elaboración de 10 renders: imágenes digitales de diferentes perspectivas del modelo 3d del proyecto.

### REGISTO FOTOGRAFICO



*Fuente: Elaboración Propia*







**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151332009-104261922E OPNAA

**ARQUITECTO**

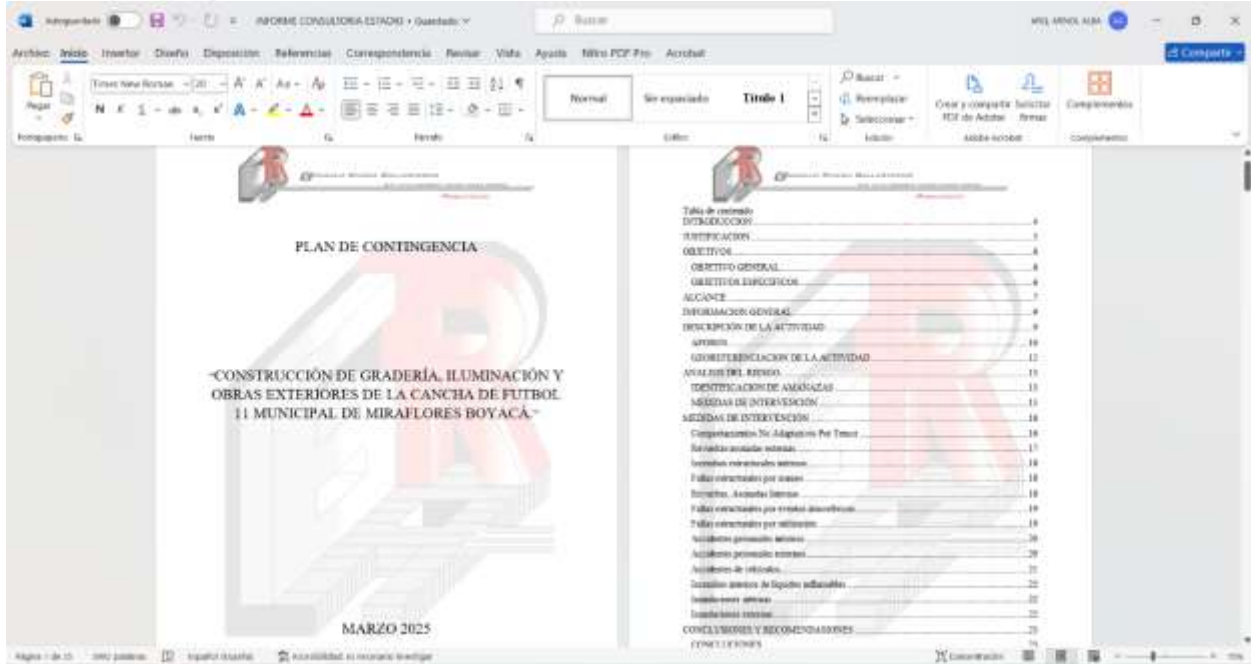

Fuente: Elaboración Propia




Fuente: Elaboración Propia




GONZALO RIVERA BALLESTEROS

N.P. 4151332009-1049619222 OPNAA

ARQUITECTO

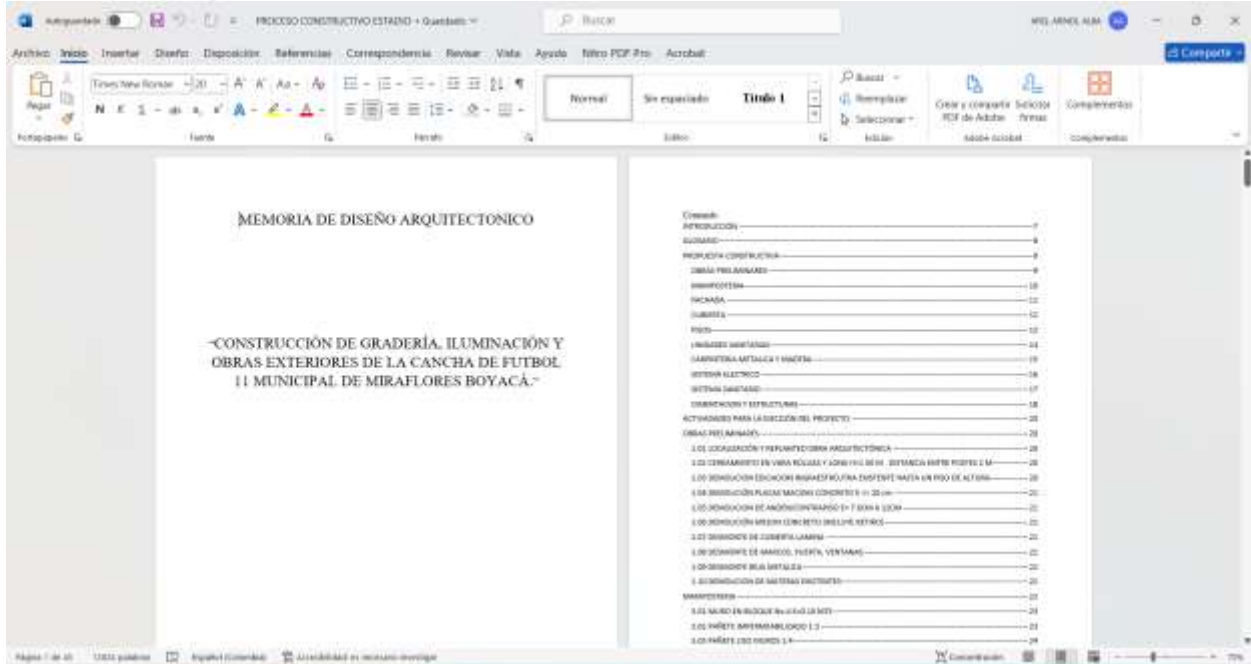

Fuente: Elaboración Propia

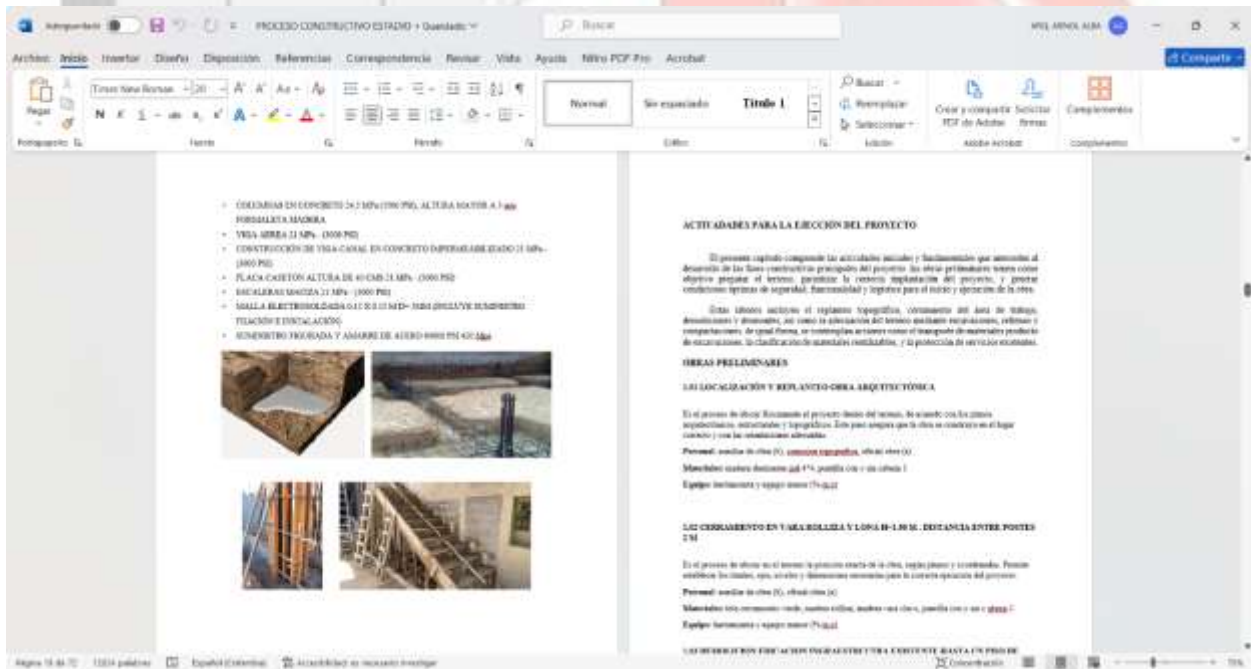

Fuente: Elaboración Propia



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**


N.P. A151332009-104261922E OPNAA

**ARQUITECTO**

## 9. ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El cual debe contener localización general del proyecto, conclusiones y recomendaciones acordes al alcance del proyecto lo documentos de idoneidad del profesional responsable (matrícula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).

### REGISTO FOTOGRAFICO

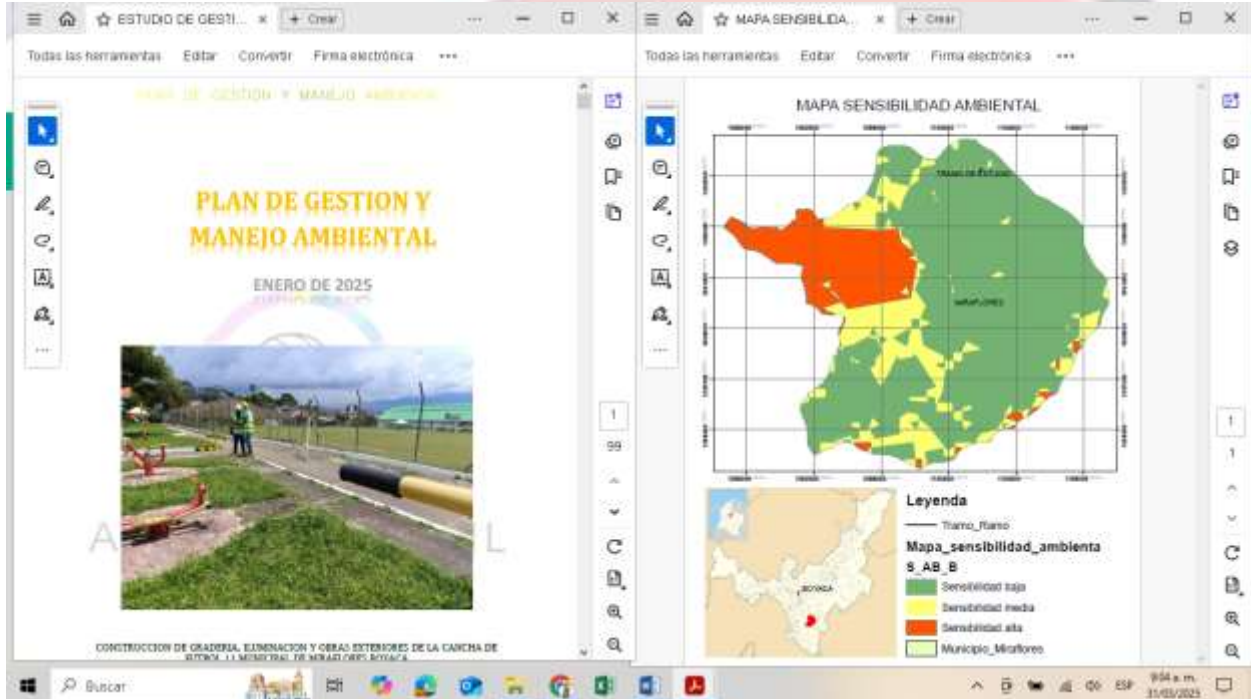

*Fuente: Elaboración Propia*







**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. A151332009-104261922E OPNAA

**ARQUITECTO**

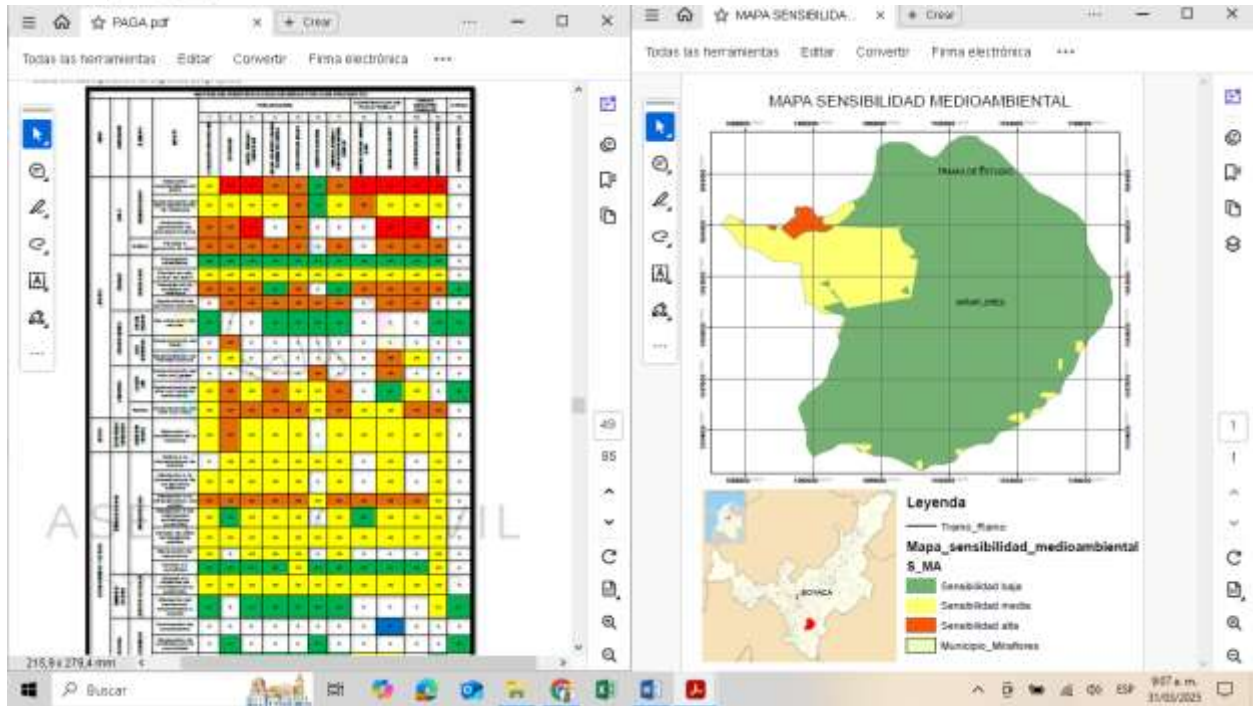

*Fuente: Elaboración Propia*

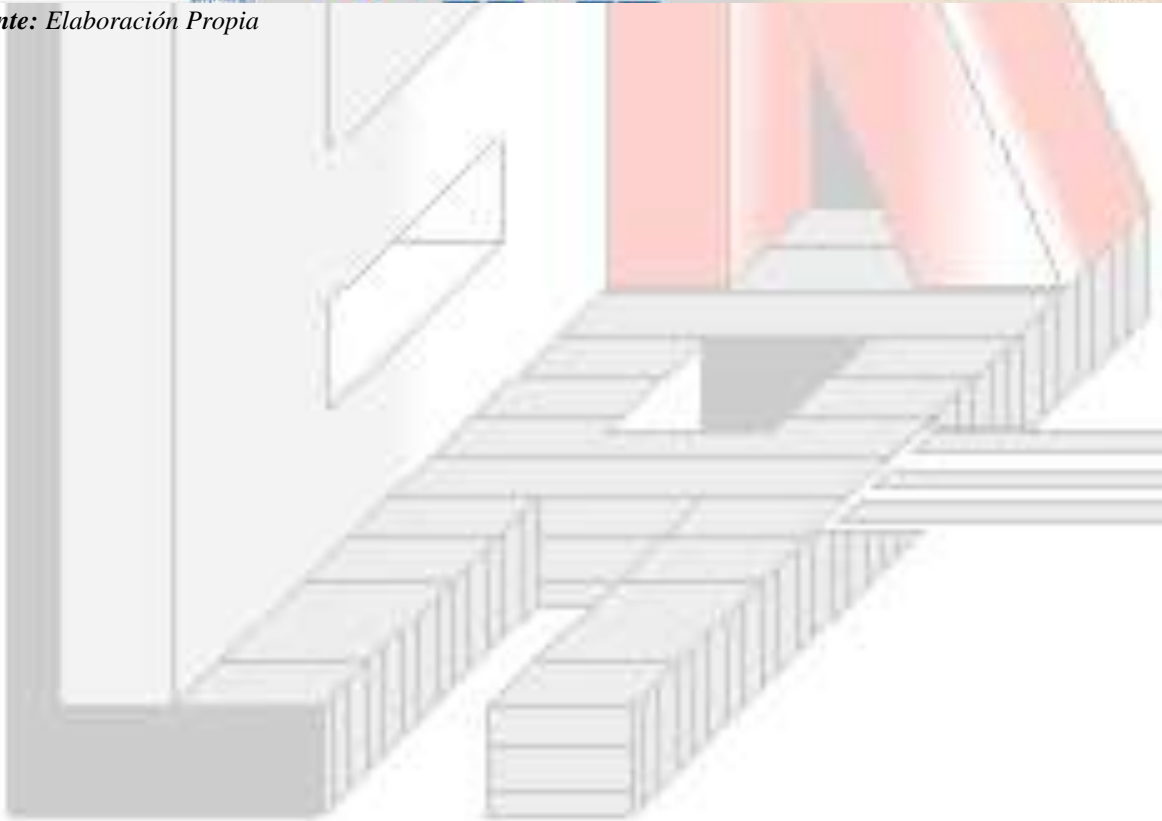



RESUMEN EN LA SIGUIENTE SABANA:

CONDICIONES ORIGINALES							PAGO PARCIAL No. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL	CANT. ACTA 01	VALOR TOTAL
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANÍMETRO Y ALTIMÉTRICO	UND	1,00	\$ 2.521.008,40	\$ 478.991,60	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00
2	ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES	UND	1,00	\$ 4.201.680,67	\$ 798.319,33	\$ 5.000.000,00	1,00	\$ 5.000.000,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND	1,00	\$ 6.722.689,08	\$ 1.277.310,92	\$ 8.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000,00
4	DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1,00	\$ 9.243.697,48	\$ 1.756.302,52	\$ 11.000.000,00	1,00	\$ 11.000.000,00
5	DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO, AGUAS LLUVIAS	UND	1,00	\$ 5.042.016,81	\$ 957.983,19	\$ 6.000.000,00	1,00	\$ 6.000.000,00
6	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN	UND	1,00	\$ 7.563.025,21	\$ 1.436.974,79	\$ 9.000.000,00	1,00	\$ 9.000.000,00
7	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA	UND	1,00	\$ 3.361.344,54	\$ 638.655,46	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00
8	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO	UND	1,00	\$ 1.680.672,27	\$ 319.327,73	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00
9	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	\$ 2.394.957,98	\$ 455.042,02	\$ 2.850.000,00	1,00	\$ 2.850.000,00
<b>VALOR COSTO DIRECTO + INCLUYE IVA (19%)</b>						\$ 50.850.000,00		\$ 50.850.000,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>						\$ 50.850.000,00		\$ 50.850.000,00

#### 6.4. Balance financiero y control presupuestal

A continuación, se presente el control de inversiones realizadas hasta la fecha en las diferentes actividades de obra.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	CONTRATO REAL	
	\$	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 50.850.000,00	100,00%
ANTICIPO	\$ -	0,00%
VALOR ADICIONAL 1	\$ -	0,00%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 50.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 50.850.000,00	100,00%



**GONZALO RIVERA BALLESTEROS**

M.P. 4151332009-1042612222 CPNAA

**ARQUITECTO**

VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	\$	-	0,00%
VALOR PRESENTE ACTA	\$	<b>50.850.000,00</b>	100.00%
VALOR POR EJECUTAR	\$		0.00%
VALOR A PAGAR	\$	<b>50.850.000,00</b>	<b>100.00%</b>

*Tabla Resumen De Inversiones Realizadas*

## **7. Aspectos ambientales, impacto y seguridad industrial**

### **7.1. Seguridad social y parafiscal**

#### **PLANILLAS**

PLANILLA DE OCTUBRE N°

PLANILLA DE NOVIEMBRE N°

PLANILLA DE DICIEMBRE N°

PLANILLA DE ENERO N°

PLANILLA DE FEBRERO N°

### **7.2. Aspectos logísticos (PERSONAL)**

El personal que laboró está debidamente afiliado a su vez se realizaron los aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

<b>PERSONAL DE LA OFERTA</b>		
<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE DEL PROFESIONAL</b>	<b>% DE DEDICACION</b>
DIRECTOR DE PROYECTOS	GONZALO RIVERA BALLESTEROS	20 %
APOYO EN ESTRUCTURAS	LAURA LISETH LACHE TAPIAS	20 %
APOYO HIDROSANITARIO	RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS	20 %
APOYO ELECTRICO	WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ	20 %



### 7.3. Aspectos Logísticos (EQUIPO)

EQUIPO	MARCA	CANTIDAD
ESTACION TOPOGRAFICA O RTK	EMLID REACH 2	1
PLANTA ELECTRICA	HONDA	1
ROTO TALADRO ELECTRICO	BOSCH	1
HERRAMIENTA MENOR	-	VARIOS

## 8. CONCLUSIONES

El presente informe arquitectónico ha desarrollado un análisis detallado para la adecuación y mejoramiento de la cancha de fútbol municipal de Miraflores, Boyacá, con el propósito de brindar un espacio deportivo funcional, accesible y en armonía con su entorno. A través del diseño propuesto, se garantiza una adecuada integración con las condiciones topográficas y climáticas del lugar, optimizando el uso del espacio y mejorando la experiencia tanto para deportistas como para espectadores.

El proyecto contempla una infraestructura moderna y eficiente, con graderías cubiertas, camerinos, zonas comerciales y espacios complementarios que potencian el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales. Asimismo, se han diseñado accesos estratégicos para garantizar la movilidad segura de los usuarios, priorizando la conectividad peatonal y vehicular.

En cuanto a los materiales y sistemas constructivos, se ha dado especial atención a su comportamiento frente a las condiciones climáticas de la zona, seleccionando opciones que aseguren durabilidad, sostenibilidad y bajo mantenimiento.

En conclusión, este escenario deportivo no solo fortalecerá el desarrollo del fútbol en el municipio, sino que también servirá como un espacio de integración social, promoviendo el deporte y la recreación en beneficio de la comunidad de Miraflores.



**G**ONZALO RIVERA BALLESTEROS

M.P. A151322009-1049615222 CPNAA

**ARQUITECTO**

## 9. RECOMENDACIONES

Para la correcta ejecución del proyecto, se recomienda mantener un enfoque integral que garantice la viabilidad técnica y funcional del diseño propuesto. Es fundamental priorizar materiales resistentes a las condiciones climáticas locales para asegurar la durabilidad de la edificación. La accesibilidad y la seguridad de los usuarios deben ser aspectos clave en la planificación y ejecución, implementando recorridos incluyentes y señalización adecuada. Además, se recomienda establecer estrategias de mantenimiento periódico para conservar en óptimas condiciones las graderías, zonas deportivas y áreas complementarias, promoviendo la sostenibilidad del escenario deportivo a largo plazo.

Asimismo, es importante garantizar una adecuada gestión del espacio público, fomentando su uso para diversas actividades deportivas, recreativas y culturales. Se recomienda coordinar con las autoridades locales para establecer normativas de uso y mantenimiento del escenario deportivo, asegurando su correcta administración. Finalmente, se sugiere involucrar a la comunidad en el proceso de apropiación del espacio, promoviendo su participación activa en la conservación y buen uso de las instalaciones.

ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS

M.P.A A1532009-1049615222 CPNAA

CONTRATISTA



**G**ONZALO RIVERA BALLESTEROS


M.P. A151332009-104261922E CPNAA

**ARQUITECTO**



## **ANEXO 1**

### *SABANA DE PAGO CONSULTORIA*



REPUBLICA DE COLOMBIA													
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ													
ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES													
ACTA DE PAGO FINAL DE CONSULTORIA													
	CONTRATO No.	218 DE 2024						FECHA DEL CONTRATO:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
	OBJETO:	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA, ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ						FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE OCTUBRE DE 2024				
	CONTRATISTA:	ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS						FECHA DE PRORROGA No. 01:	04 DE DICIEMBRE DE 2024				
	C.C.:	1.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ						FECHA DE LA SUSPENSIÓN NO 01:	26 DE DICIEMBRE DE 2024				
	SUPERVISOR:	ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ						FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE ENERO DE 2025				
	VALOR INICIAL:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	\$ 50.850.000,00	FECHA DEL ACTA DE REINICIO No. 01:	23 DE ENERO DE 2025								
	VALOR ADICIONAL:	-	\$ -	FECHA DE PRORROGA No. 02:	23 DE ENERO DE 2025								
VALOR FINAL:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	\$ 50.850.000,00	FECHA DE PRORROGA No. 03:	20 DE FEBRERO DE 2025									
							FECHA DE TERMINACION:	15 DE MARZO DE 2025					
							PRESENTE ACTA:	27 DE JUNIO DE 2025					
CONDICIONES ORIGINALES							ACTA DE PAGO FINAL		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO. INCLUYE: PLANO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (DEPARTAMENTAL, Y MUNICIPAL), INDICANDO CAMBIOS DE NIVEL, LINDEROS, CONSTRUCCIONES EXISTENTES, CUADRO DE COORDENADAS DE PUNTOS DE AMARRÉ DE LEVANTAMIENTO, CUADRO DE ÁREAS DE EDIFICACIONES EXISTENTES, IDENTIFICACIÓN DE NORTE GEOGRÁFICO, IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y CONSTRUCCIONES COLINDANTES, LEVANTAMIENTO DE VIGAS COLINDANTES, AL ÁREA DE INFLUENCIA DETERMINANDO MEDIDAS DE CALZADA, LEVANTAMIENTO DE RED DE COLECCIÓN PRINCIPAL DE DESAGÜE DETERMINANDO DIÁMETROS DE TUBERÍAS Y SENTIDOS DE FLUJO, LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, PLANO DE PERFILES TOPOGRÁFICOS MOSTRANDO DENTRO DE ELLOS ALTURAS DE VOLÚMENES EXISTENTES, INFORME TOPOGRÁFICO EL CUAL DEBE INCLUIR LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, MÉTODO DE LEVANTAMIENTO, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO, TABLA DE COORDENADAS GENERAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES CON EL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRÍCULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 2.521.008,40	\$ 478.991,60	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.000.000,00	
2	ESTUDIOS DE SUELOS Y OMIENTACIONES EL CUAL CONLLEVA LA EJECUCIÓN DE 3 PERFORACIONES A 6,00 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CARACTERIZACIÓN EN LABORATORIO DE MUESTRAS DEL PERFIL DEL SUBSUELO E INFORME FINAL DE RESULTADOS OBTENDOS INCLUYENDO TAMBIÉN LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, PLANO DE LOCALIZACIÓN DE SONDEOS DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADOS, DETALLE DE PERFILES ESTRATIGRÁFICOS PARA CADA SONDEO, DETALLE TIPOO DE OMIENTOS SEGUN RESULTADOS DE LABORATORIO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES CON EL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE ACREDTACIÓN DE DONEIDAD.	UND	1,00	\$ 4.201.680,67	\$ 798.319,33	\$ 5.000.000,00	1,00	\$ 5.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.000.000,00	
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO INCLUYE: PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL, PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO MOSTRANDO CURVAS DE NIVEL, PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, CUBIERTAS, DOS CORTES LONGITUDINALES, DOS CORTES TRANSVERSALES, FACHADAS, NORTE, SUR, ORIENTE, OCCIDENTE, PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS, DETALLE DE CERRAMIENTO, MEMORIA DESCRIPTIVA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO INCLUYE LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, CONCEPTUALIZACIÓN DEL ENTORNO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDICANDO ORIENTACIÓN Y SENTIDO DE CADA FOTOGRAFÍA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE DONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRÍCULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 6.722.689,08	\$ 1.277.310,92	\$ 8.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 8.000.000,00	
4	DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE PLANO DE EJES OMIENTACIÓN, PLANO DE VIGAS DE OMIENTOS Y VIGAS AÉREAS, PLANO DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA, PLANO DE RESPECES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, COLUMNAS, PERESTILES, VIGAS DE OMIENTOS, VIGAS AÉREAS, PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN DONDE SE MUESTREN CORTES DE OMIENTOS, COLUMNAS, PLANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA LA CUAL DEBE INCLUIR DETALLES DE EMPALMES DE TUBERÍA, DETALLE DE ANCLAJES MEMORIAS DE CALCULO DE DISEÑO ESTRUCTURAL, INFORME DE DISEÑO EL CUAL CONTIENE LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES AL PROYECTO, CERTIFICACIÓN FIRMADA POR UN INGENIERO CIVIL DONDE CONSTE QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON LA NORMA NSR 10, DOCUMENTOS DE DONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRÍCULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 9.243.697,48	\$ 1.756.302,52	\$ 11.000.000,00	1,00	\$ 11.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 11.000.000,00	
5	DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO, AGUAS LLUVIAS DISEÑO HIDRÁULICO INCLUYE: PLANO DE PLANTA DISEÑO HIDRÁULICO EN EL CUAL SE MUESTREN LONGITUDES Y DIÁMETROS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS, PLANOS ISOMÉTRICOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, DISEÑO SANITARIO INCLUYE: PLANO DE PLANTA DISEÑO SANITARIO EN DONDE SE MUESTRE LOCALIZACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN, LOCALIZACIÓN DE REDES DE DESAGÜES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS LAS CUALES DEBEN MOSTRAR LONGITUDES, DIÁMETROS, PENDIENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS, INFORME DE DISEÑO DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EL CUAL DEBE CONTENER LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDE AL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE DONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRÍCULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 5.042.016,81	\$ 957.983,19	\$ 6.000.000,00	1,00	\$ 6.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 6.000.000,00	
6	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN INCLUYE: PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DONDE SE MUESTREN LONGITUDES PARA CADA UNO DE LOS CIRCUITOS, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MODELO POR SOFTWARE, ANÁLISIS DE REGDO, INFORME DE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EL CUAL DEBE CONTENER LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN DE MATERIALES EMPLEADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES AL ALCANCE DEL PROYECTO, DOCUMENTOS DE DONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRÍCULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 7.563.025,21	\$ 1.436.974,79	\$ 9.000.000,00	1,00	\$ 9.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 9.000.000,00	



REPUBLICA DE COLOMBIA														
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ														
ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES														
ACTA DE PAGO FINAL DE CONSULTORIA														
	<b>CONTRATO No.</b>			218 DE 2024				<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
	<b>OBJETO:</b>			ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA, ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ				<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>		07 DE OCTUBRE DE 2024				
	<b>CONTRATISTA:</b>			ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS				<b>FECHA DE PRORROGA No. 01:</b>		04 DE DICIEMBRE DE 2024				
	<b>C.C.:</b>			1.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ				<b>FECHA DE LA SUSPENSIÓN NO 01:</b>		26 DE DICIEMBRE DE 2024				
	<b>SUPERVISOR:</b>			ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ				<b>FECHA DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSIÓN No 01:</b>		15 DE ENERO DE 2025				
	<b>VALOR INICIAL:</b>			CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE		\$ 50.850.000,00		<b>FECHA DEL ACTA DE REINICIO No. 01:</b>		23 DE ENERO DE 2025				
	<b>VALOR ADICIONAL:</b>			-		\$ -		<b>FECHA DE PRORROGA No. 02:</b>		23 DE ENERO DE 2025				
	<b>VALOR FINAL:</b>			CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE		\$ 50.850.000,00		<b>FECHA DE PRORROGA No. 03:</b>		20 DE FEBRERO DE 2025				
							<b>FECHA DE TERMINACION:</b>		15 DE MARZO DE 2025					
							<b>PRESENTE ACTA:</b>		27 DE JUNIO DE 2025					
<b>CONDICIONES ORIGINALES</b>														
<b>ACTA DE PAGO FINAL</b>														
<b>ACUMULADO ACTAS ANTERIORES</b>														
<b>ACUMULADO FINAL</b>														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR		
7	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INCLUYE: PRESUPUESTO DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS), MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES, ANÁLISIS DEL APL, ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN, CRONOGRAMA DE OBRA, FLUJO DE FONDOS, ANÁLISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR, DOCUMENTOS DE EDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 3.361.344,54	\$ 638.655,46	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.000.000,00		
8	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO CONSTRUCTIVO, PLAN DE MANTENIMIENTO, PLAN DE CONTINGENCIA, MODELACIÓN 3D, ELABORACIÓN DE 10 RENDER: IMÁGENES DIGITALES DE DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL MODELO 3D DEL PROYECTO.	UND	1,00	\$ 1.680.672,27	\$ 319.327,73	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.000.000,00		
9	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EL CUAL DEBE CONTENER (LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO), CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDES AL ALCANCE DEL PROYECTO LO DOCUMENTOS DE EDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE (MATRICULA PROFESIONAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, VIGENCIA Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DEBIDAMENTE FIRMADO).	UND	1,00	\$ 2.394.957,98	\$ 455.042,02	\$ 2.850.000,00	1,00	\$ 2.850.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.850.000,00		
<b>VALOR COSTO DIRECTO + INCLUYE IVA (19%)</b>						<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 50.850.000,00</b>		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>						<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 50.850.000,00</b>		
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>										<b>\$ -</b>		<b>\$ 50.850.000,00</b>		
<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>														
<b>CONTRATO REAL</b>														
				\$		%								
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 50.850.000,00		100,00%								
	ANTICIPO			\$ -		0,00%								
	VALOR ADICIONAL 1			\$ -		0,00%								
	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>100,00%</b>								
	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			\$ 50.850.000,00		100,00%								
	VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			\$ -		0,00%								
	<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>			<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>100,00%</b>								
	VALOR POR EJECUTAR			\$ -		0,00%								
	<b>VALOR A PAGAR</b>			<b>\$ 50.850.000,00</b>		<b>100,00%</b>								
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:</b>							CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE				<b>\$ 50.850.000,00</b>			
Se firma por quienes intervinieron en la presente acta, a los VEINTISIETE (27) días del mes de JUNIO de 2025.														
CONTRATISTA:				SUPERVISOR:				APOYO A LA SUPERVISIÓN:						
 ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ				ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				ING. SERGIO MORALES APOYO A SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						



MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA



CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRO Y ALTIMETRICO			
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB	
		Incluye: plano de localización geográfica (departamental y municipal), indicando cambios de nivel, linderos, construcciones existentes cuadro de coordenadas de puntos de amarre de levantamiento, cuadro de áreas de edificaciones existentes, identificación de norte geográfico, identificación de los predios y construcciones colindantes, levantamiento de vías colindantes al área de influencia denotando medidas de catzada, levantamiento de red de colección principal de desagüe denotando diámetros de tuberías y sentidos de flujo, levantamiento de redes eléctricas, plano de perfiles topográficos mostrando dentro de ellos alturas de volúmenes existentes, informe topográfico el cual debe incluir localización general del proyecto, método de levantamiento, descripción de actividades realizadas en campo tabla de coordenadas general, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones acordes con el alcance del proyecto, documentos de profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).			
DETALLE		ITEM GLOBALES			TOTAL
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA		CANTIDAD DE ENTREGABLES			
		1			1
TOTAL					1



CONTRATISTA:

  
 ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.09.615.222 DE TUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA




MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA



CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		2. ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES			
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB	
DETALLE		ITEM GLOBALES CANTIDAD DE ENTREGABLES			TOTAL
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA		1			1
TOTAL					1

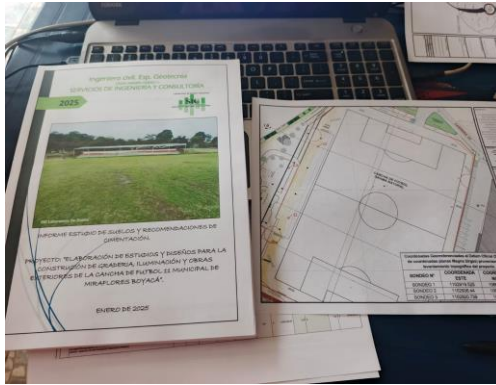

CONTRATISTA:

  
 ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA




CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO		
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB
DETALLE		ITEM GLOBALES		TOTAL
		CANTIDAD DE ENTREGABLES		
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ		1		1
TOTAL				1

Incluye: plano de localización general, plano de implantación general del proyecto mostrando curvas de nivel, plantas arquitectónicas, cubiertas, dos cortes longitudinales, dos cortes transversales, fachadas: norte, sur, oriente, occidente, plano de detalles constructivos, detalle de cerramiento. Memoria descriptiva de diseño arquitectónico incluye localización general de proyecto conceptualización del entorno, registro fotográfico del área de influencia indicando orientación y sentido de cada fotografía, conclusiones y recomendaciones específicas del proyecto, documentos de idoneidad del profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).



CONTRATISTA:

  
 ARO. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA




MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA



CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		4. DISEÑO ESTRUCTURAL			
ITEM	1	DESCRIPCION	Incluye plano de ejes cimentación, plano de vigas de cimientos y vigas aéreas, plano de cubierta de estructura metálica, plano de despieces de elementos estructurales como zapatas, columnas, pedestales, vigas de cimientos, vigas aéreas, plano de perfiles longitudinales y transversales en donde se muestren cortes de cimientos, columnas, planos de estructura metálica de cubierta la cual debe incluir detalles de empalmes de tubería, detalle de anclajes memorias de calculo de diseño estructural, informe de diseño el cual contenga localización general de proyecto, especificaciones técnicas de elementos estructurales, conclusiones y recomendaciones acordes al proyecto, certificación firmada por un ingeniero civil donde conste que los diseños cumplen con la norma nsr 10, documentos de idoneidad del profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).	UND	GLB
DETALLE		ITEM GLOBALES			TOTAL
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ		CANTIDAD DE ENTREGABLES			
		1			1
TOTAL					1

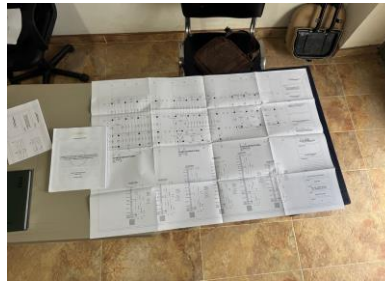

CONTRATISTA:

  
 \_\_\_\_\_  
 ARO. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 7.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA





MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA



CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		5. DISEÑO HIDRAULICO,SANITARIO,AGUAS LLUVIAS		
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB
		Incluye: plano de planta diseño hidráulico en el cual se muestren longitudes y diámetros, especificaciones técnicas de materiales empleados, plano isométrico, detalles constructivos. Diseño sanitario incluye: plano de planta diseño sanitario en donde se muestre localización de cajas de inspección, localización de redes de desagües sanitarias y de aguas lluvias las cuales deben mostrar longitudes, diámetros, pendientes, especificaciones técnicas de materiales empleados. Informe de diseño de redes hidráulicas y sanitarias el cual debe contener localización general de proyecto conclusiones y recomendaciones acorde al alcance del proyecto, documentos de idoneidad del profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).		
DETALLE		ITEM GLOBALES		TOTAL
		CANTIDAD DE ENTREGABLES		
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA		1		1
TOTAL				1

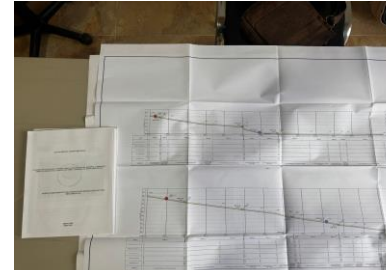

CONTRATISTA:

  
 ARO. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA




MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA




CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		6.DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION		
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB
DETALLE		ITEM GLOBALES		TOTAL
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA		CANTIDAD DE ENTREGABLES		
		1		1
TOTAL				1

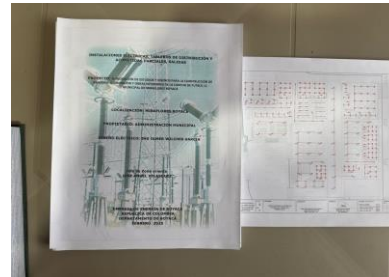

CONTRATISTA:

  
 ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



ALCALDIA DE MIRAFLORES


### MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA



#### CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO		7. PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA		
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB
DETALLE		ITEM GLOBALES		TOTAL
		CANTIDAD DE ENTREGABLES		
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ		1		1
TOTAL				1

Incluye: presupuesto de obra, análisis de precios unitarios (apus), memorias de calculo de cantidades, análisis del aiu, análisis de interventoría, cronograma de obra, flujo de fondos, análisis de factor multiplicador, documentos de idoneidad del profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).



CONTRATISTA:

  
 ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.049.615.222 DE TUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



ALCALDIA DE MIRAFLORES

### MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA




#### CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA 8. ESPECIFICACION TECNICAS

CAPITULO	8. ESPECIFICACION TECNICAS			
ITEM	1	DESCRIPCION	UND	GLB
		Elaboración de especificaciones técnicas de construcción, proceso constructivo, plan de mantenimiento, plan de contingencia, modelación 3d, elaboración de 10 renders: imágenes digitales de diferentes perspectivas del modelo 3d del proyecto.		
<b>DETALLE</b>		<b>ITEM GLOBALES</b>		<b>TOTAL</b>
		<b>CANTIDAD DE ENTREGABLES</b>		
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ		1		1
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>



CONTRATISTA:

  
 \_\_\_\_\_  
 ARO. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
 1.049.615.222 DE ITUNJA BOYACA

SUPERVISOR:

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO MORALES  
 APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA






ALCALDIA DE MIRAFLORES

### MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA



#### CANTIDADES DE ENTREGABLES DE CONSULTORIA

CAPITULO	9.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
ITEM	1	DESCRIPCION	Incluye: localización general del proyecto, conclusiones y recomendaciones acordes al alcance del proyecto lo documentos de idoneidad del profesional responsable (matricula profesional, cedula de ciudadanía, vigencia y memorial de responsabilidad debidamente firmado).	UND	GLB
DETALLE		ITEM GLOBALES			TOTAL
ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ		CANTIDAD DE ENTREGABLES			
		1			1
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>			<b>1</b>

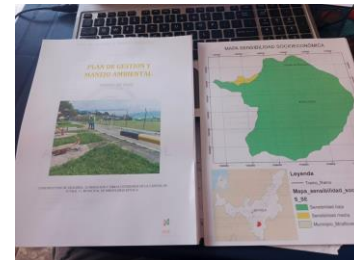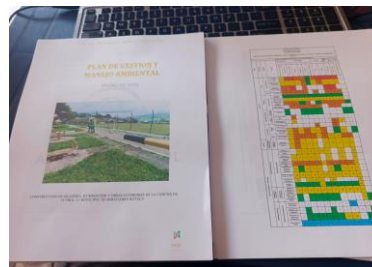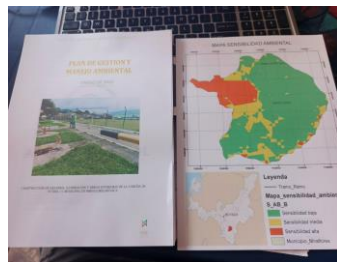

CONTRATISTA:

ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
1.049.615.222 DE TUNJA BOYACÁ

SUPERVISOR:

ING. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ  
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APOYO:

ING. SERGIO MORALES  
APOYO A PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



**G**ONZALO RIVERA BALLESTEROS

M.P. A151322009-1042612222 CPNAA

**ARQUITECTO**

## **ANEXO 2**

*PLANILLA DE SEGURIDAD DE OCTUBRE*

*PLANILLA DE SEGURIDAD DE NOVIEMBRE*

*PLANILLA DE SEGURIDAD DE DICIEMBRE*

*PLANILLA DE SEGURIDAD DE ENERO*

*PLANILLA DE SEGURIDAD DE FEBRETO*

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					NÚMERO PLANILLA:					TIPO DE PLANILLA:				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					GONZALO RIVERA BALLESTROS					7971484221					E-EMPLEADOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					GARAGOA DEPARTAMENTO:					MES					AÑO				
DIRECCIÓN:					CARRERA 7 N 13BIS-17					octubre					2024				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					DÍAS DE MORA:					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					186					MES noviembre AÑO				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO					2025/05/13					NUMERO AUTORIZACION:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO										995448665				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 104.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.700	\$ 0	\$ 104.100	\$ 12.700	\$ 116.800		
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300	\$ 0	\$ 34.700	\$ 4.300	\$ 39.000		
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 138.800</b>	<b>\$ 17.000</b>	<b>\$ 155.800</b>		

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 0	\$ 3.300	\$ 0	\$ 27.100	\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.300	\$ 0	\$ 9.900	\$ 0	\$ 81.300	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 108.400</b>	<b>\$ 13.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 121.600</b>		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200	\$ 15.200	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 17.100		
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 15.200</b>	<b>\$ 1.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17.100</b>	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	\$ 34.800	\$ 4.300	\$ 39.100									
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 34.800</b>	<b>\$ 4.300</b>	<b>\$ 39.100</b>		

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 26.400	\$ 3.300	\$ 29.700									
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 26.400</b>	<b>\$ 3.300</b>	<b>\$ 29.700</b>		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA				ICBF				ESAP				MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 1049614691	LACHE TAPIAS LAURA LIZETH	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	26																	230301-PORVENIR	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 2.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0					
2	CC 1049615222	RIVERA BALLESTROS GONZALO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	26																	230301-PORVENIR	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS017-FAMISANAR	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 5.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0					
3	CC 7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	26																	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 5.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0					
4	CC 74184678	AYALA GOMEZ WILMAR DARLEY	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	26																	230301-PORVENIR	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 2.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0					

**TOTAL PAGADO: \$ 363.300**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: GARAGOA DEPARTAMENTO: CARRERA 7 N 13BIS-17 DEPARTAMENTO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA CLASE APORTANTE: ÚNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7971485897 MES noviembre AÑO 2024 158 2025/05/13				
										TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NUMERO AUTORIZACION: E-EMPLEADOS 2024 995448745									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 104.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700	\$ 0	\$ 104.100	\$ 10.700	\$ 114.800				
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600	\$ 0	\$ 34.700	\$ 3.600	\$ 38.300				
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 138.800</b>	<b>\$ 14.300</b>	<b>\$ 153.100</b>				

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 0	\$ 2.800	\$ 0	\$ 27.100	\$ 2.800	\$ 29.900				
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.300	\$ 0	\$ 8.300	\$ 0	\$ 81.300	\$ 8.300	\$ 89.600				
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 108.400</b>	<b>\$ 11.100</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 119.500</b>			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES							
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200	\$ 0	\$ 15.200	\$ 1.600	\$ 0	\$ 16.800					
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 15.200</b>	<b>\$ 1.600</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 16.800</b>			

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES													
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO											
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	\$ 34.800	\$ 3.600	\$ 38.400											
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 34.800</b>	<b>\$ 3.600</b>	<b>\$ 38.400</b>				

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES													
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO											
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 26.400	\$ 2.700	\$ 29.100											
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 26.400</b>	<b>\$ 2.700</b>	<b>\$ 29.100</b>				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	SALUD		ARP		PARAFISCALES													
																											DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA				SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP
1	CC 1049614691	LACHE TAPIAS LAURA LIZETH	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	05																	230301-PORVENIR	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 2.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0
2	CC 1049615222	RIVERA BALLESTEROS GONZALO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	05																	230301-PORVENIR	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS017-FAMISANAR	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 5.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0
3	CC 7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	05																	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 5.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0
4	CC 74184678	AYALA GOMEZ WILMAR DARLEY	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	05																	230301-PORVENIR	5	\$ 216.667	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 216.667	\$ 27.100	\$ 0	\$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 216.667	\$ 2.300	\$ 216.667	CCF10-COMFABOY	\$ 8.700	\$ 0	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 356.900**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: GARAGOA DEPARTAMENTO: CARRERA 7 N 13BIS-17 DEPARTAMENTO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA CLASE APORTANTE: ÚNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7971486931 MES diciembre AÑO 2024 124 2025/05/13					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO E-EMPLEADOS 2025 995459876				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 171.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 0	\$ 171.400	\$ 13.700	\$ 185.100		
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 0	\$ 38.000	\$ 3.100	\$ 41.100		
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 209.400</b>	<b>\$ 16.800</b>	<b>\$ 226.200</b>		

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.100	\$ 0	\$ 8.100	\$ 0	\$ 101.100	\$ 8.100	\$ 109.200			
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.500	\$ 0	\$ 5.000	\$ 0	\$ 62.500	\$ 5.000	\$ 67.500			
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 163.600</b>	<b>\$ 13.100</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 176.700</b>		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.800	\$ 0	\$ 21.800	\$ 1.800	\$ 0	\$ 23.600			
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 21.800</b>	<b>\$ 1.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 23.600</b>	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	\$ 52.400	\$ 4.200	\$ 56.600									
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 52.400</b>	<b>\$ 4.200</b>	<b>\$ 56.600</b>		

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 39.500	\$ 3.200	\$ 42.700									
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 39.500</b>	<b>\$ 3.200</b>	<b>\$ 42.700</b>		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																	
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					SENA					ICBF					ESAP					MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE							
1	CC 1049614691	LACHE TAPIAS LAURA LIZETH	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		NO	26																	230301-PORVENIR	5	\$ 333.334	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.400	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 333.334	\$ 41.700	\$ 0	\$ 41.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 333.334	\$ 8.200	\$ 333.334	CCF10-COMFABOY	\$ 13.400	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0													
2	CC 1049615222	RIVERA BALLESTEROS GONZALO	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO		NO	26																	230301-PORVENIR	5	\$ 500.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 80.000	EPS017-FAMISANAR	5	\$ 500.000	\$ 62.500	\$ 0	\$ 62.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 500.000	\$ 5.300	\$ 500.000	CCF10-COMFABOY	\$ 20.000	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0													
3	CC 7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	DEPEND		\$ 1.423.000	FIJO		NO	26																	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 237.167	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 38.000	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 237.167	\$ 29.700	\$ 0	\$ 29.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 237.167	\$ 2.500	\$ 237.167	CCF10-COMFABOY	\$ 9.500	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0													
4	CC 74184678	AYALA GOMEZ WILMAR DARLEY	DEPEND		\$ 1.423.000	FIJO		NO	26																	230301-PORVENIR	5	\$ 237.167	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 38.000	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 237.167	\$ 29.700	\$ 0	\$ 29.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 237.167	\$ 5.800	\$ 237.167	CCF10-COMFABOY	\$ 9.500	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0													

**TOTAL PAGADO: \$ 525.800**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901899023-6					NÚMERO PLANILLA: 7971487539					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: GARAGOA DEPARTAMENTO: BOYACA					UNION TEMPORAL SOLAR 2024					PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2025					PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2025				
CIUDAD/MUNICIPIO: CARRERA 7 N 13BIS-17					TELÉFONO: 7500208					DÍAS DE MORA: 95									
DIRECCIÓN: 01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/05/13					NÚMERO AUTORIZACION: 995471029				
TIPO APORTANTE: PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.														
TIPO EMPRESA: ÚNICO																			
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 171.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500	\$ 0	\$ 171.400	\$ 10.500	\$ 181.900				
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 0	\$ 38.000	\$ 2.400	\$ 40.400				
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 209.400</b>	<b>\$ 12.900</b>	<b>\$ 222.300</b>				

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.100	\$ 0	\$ 6.200	\$ 0	\$ 101.100	\$ 6.200	\$ 0	\$ 107.300			
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.500	\$ 0	\$ 3.900	\$ 0	\$ 62.500	\$ 3.900	\$ 0	\$ 66.400			
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 163.600</b>	<b>\$ 10.100</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 173.700</b>			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES							
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.800	\$ 0	\$ 21.800	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200				
<b>SUBTOTALES:</b>								<b>\$ 21.800</b>	<b>\$ 1.400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 23.200</b>				

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES													
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO											
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	\$ 52.400	\$ 3.300	\$ 55.700											
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 52.400</b>	<b>\$ 3.300</b>	<b>\$ 55.700</b>											

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES													
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO											
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 39.500	\$ 2.500	\$ 42.000											
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 39.500</b>	<b>\$ 2.500</b>	<b>\$ 42.000</b>											

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP		PARAFISCALES																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 74184678	WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		NO	05																	230301-PORVENIR	5	\$ 333.334	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.400	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 333.334	\$ 41.700	\$ 0	\$ 41.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 333.334	\$ 8.200	\$ 0	\$ 8.200	CCF10-COMFABOY	\$ 13.400	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0
2	CC 1049615222	RIVERA BALLESTEROS GONZALO	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO		NO	05																	230301-PORVENIR	5	\$ 500.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 80.000	EPS017-FAMISANAR	5	\$ 500.000	\$ 62.500	\$ 0	\$ 62.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 500.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	CCF10-COMFABOY	\$ 20.000	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0
3	CC 7331445	PARRA VALLEJO GERARDO ANTONIO	DEPEND		\$ 1.423.000	FIJO		NO	05																	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 237.250	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 38.000	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 237.250	\$ 29.700	\$ 0	\$ 29.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 237.250	\$ 2.500	\$ 0	\$ 2.500	CCF10-COMFABOY	\$ 9.500	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0
4	CC 7330681	ROA VALLEJO JULIO FLORENCIO	DEPEND		\$ 1.423.000	FIJO		NO	05																	230301-PORVENIR	5	\$ 237.250	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 38.000	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 237.250	\$ 29.700	\$ 0	\$ 29.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	\$ 237.250	\$ 2.500	\$ 0	\$ 2.500	CCF10-COMFABOY	\$ 9.500	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 516.900**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: GONZALO RIVERA BALLESTROS GARAGOA DEPARTAMENTO: CARRERA 7 N 13BIS-17 DEPARTAMENTO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA CLASE APORTANTE: ÚNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7971488543 MES febrero AÑO 2025 67 2025/05/13				
										TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MORA NUMERO AUTORIZACION: E-EMPLEADOS 2025 104381883									

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 0	\$ 224.000	\$ 9.700	\$ 0	\$ 233.700	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 0	\$ 64.000	\$ 2.800	\$ 0	\$ 66.800	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 288.000</b>	<b>\$ 12.500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 300.500</b>	

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 6.500	\$ 0	\$ 150.000	\$ 6.500	\$ 0	\$ 156.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.000	\$ 0	\$ 3.300	\$ 0	\$ 75.000	\$ 3.300	\$ 0	\$ 78.300
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 225.000</b>	<b>\$ 9.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 234.800</b>		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.500	\$ 38.500	\$ 1.700	\$ 0	\$ 40.200		
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 38.500</b>	<b>\$ 1.700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 40.200</b>	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	\$ 72.000	\$ 3.100	\$ 75.100									
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 72.000</b>	<b>\$ 3.100</b>	<b>\$ 75.100</b>		

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 54.000	\$ 2.400	\$ 56.400									
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 54.000</b>	<b>\$ 2.400</b>	<b>\$ 56.400</b>		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	SALUD		ARP		PARAFISCALES														
																												DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA				SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 1049614691	LACHE TAPIAS LAURA LIZETH	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO			NO	23	28																230301-PORVENIR	6	\$ 400.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 64.000	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 400.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	\$ 400.000	\$ 4.200	\$ 400.000	CCF10-COMFABOY	\$ 16.000	\$ 0	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0
2	CC 1049615222	RIVERA BALLESTROS GONZALO	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO			NO	23	28																230301-PORVENIR	6	\$ 600.000	\$ 96.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 96.000	EPS017-FAMISANAR	6	\$ 600.000	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	\$ 600.000	\$ 14.700	\$ 600.000	CCF10-COMFABOY	\$ 24.000	\$ 0	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0
3	CC 7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO			NO	23	28																25-14 COLPENSIONES	6	\$ 400.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 64.000	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 400.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	\$ 400.000	\$ 9.800	\$ 400.000	CCF10-COMFABOY	\$ 16.000	\$ 0	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0
4	CC 74184678	AYALA GOMEZ WILMAR DARLEY	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO			NO	23	28																230301-PORVENIR	6	\$ 400.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 64.000	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 400.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	\$ 400.000	\$ 9.800	\$ 400.000	CCF10-COMFABOY	\$ 16.000	\$ 0	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 707.000**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: GONZALO RIVERA BALLESTROS GARAGOA DEPARTAMENTO: CARRERA 7 N 13BIS-17 DEPARTAMENTO: 01-EMPLEADOR TELEFONO: PRIVADA CLASE APORTANTE: ÚNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7971496953 marzo AÑO 2025 36 2025/05/13				
										TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NUMERO AUTORIZACION: E-EMPLEADOS 2025 115389886									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 0	\$ 74.700	\$ 1.800	\$ 76.500				
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 261.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 0	\$ 261.400	\$ 6.200	\$ 267.600				
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 336.100</b>	<b>\$ 8.000</b>	<b>\$ 344.100</b>				

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.500	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 87.500	\$ 2.100	\$ 0	\$ 89.600	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.200	\$ 0	\$ 4.100	\$ 0	\$ 175.200	\$ 4.100	\$ 0	\$ 179.300	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 262.700</b>	<b>\$ 6.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 268.900</b>			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES							
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.300	\$ 51.300	\$ 1.200	\$ 0	\$ 52.500				
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 51.300</b>	<b>\$ 1.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 52.500</b>			

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES													
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO											
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	\$ 84.100	\$ 2.000	\$ 86.100											
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 84.100</b>	<b>\$ 2.000</b>	<b>\$ 86.100</b>				

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES													
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO											
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 63.300	\$ 1.500	\$ 64.800											
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 63.300</b>	<b>\$ 1.500</b>	<b>\$ 64.800</b>				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES				
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ADMIN	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE
1	CC 1049614691	LACHE TAPIAS LAURA LIZETH	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		NO	01	07																230301-PORVENIR	7	\$ 466.667	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 74.700	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 466.667	\$ 58.400	\$ 0	\$ 58.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	\$ 466.667	\$ 11.400	\$ 466.667	CCF10-COMFABOY	\$ 18.700	\$ 0	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	
2	CC 1049615222	RIVERA BALLESTROS GONZALO	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO		NO	01	07																230301-PORVENIR	7	\$ 700.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 112.000	EPS017-FAMISANAR	7	\$ 700.000	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	\$ 700.000	\$ 17.100	\$ 700.000	CCF10-COMFABOY	\$ 28.000	\$ 0	\$ 21.000	\$ 0	\$ 0	
3	CC 7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		NO	01	07																25-14 COLPENSIONES	7	\$ 466.667	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 74.700	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 466.667	\$ 58.400	\$ 0	\$ 58.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	\$ 466.667	\$ 11.400	\$ 466.667	CCF10-COMFABOY	\$ 18.700	\$ 0	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	
4	CC 74184678	AYALA GOMEZ WILMAR DARLEY	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		NO	01	07																230301-PORVENIR	7	\$ 466.667	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 74.700	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 466.667	\$ 58.400	\$ 0	\$ 58.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	\$ 466.667	\$ 11.400	\$ 466.667	CCF10-COMFABOY	\$ 18.700	\$ 0	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	

**TOTAL PAGADO: \$ 816.400**



**G**ONZALO RIVERA BALLESTEROS

M.P. A151332009-104261922E CPNAA

**ARQUITECTO**

## ANEXO 3

*FACTURA ELECTRONICA*

*RUT*



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
5566ac5f335cdf969254765fb4ba060f2dd26d6da7cfaa5b5d33f7070ecb509e2637e6c48d4e9e163da6b1534e3c26bb

Número de Factura: FE-36      Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 27/06/2025      Medio de Pago: Consignación bancaria  
Fecha de Vencimiento: 02/07/2025      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIVERA BALLESTEROS GONZALO  
Nombre Comercial: RIVERA BALLESTEROS GONZALO  
Nit del Emisor: 1049615222      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: Boyacá  
Régimen Fiscal: O-23      Municipio / Ciudad: Miraflores  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Dirección: CR 12 2 15 BRR EL COGOLLO  
Actividad Económica: 4290      Teléfono / Móvil: 3108671851  
Correo: miitarquitecturaeingenierias@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MIRAFLORES  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 800029660      Departamento: Boyacá  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Miraflores  
Régimen fiscal: O-23      Dirección: Calle2 No 9 -50  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Teléfono / Móvil: 3143810011  
Correo: tesoreria@miraflores-boyaca.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FE	PAGO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA No 218 2024 OBJETO ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIA ILUMINACION Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA	NIU	1,00	\$ 42.731.092,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.118.907,56	19,00			\$ 42.731.092,44

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 27/06/2025 08:54:04  
**Documento validado por la DIAN:**  
 27/06/2025 08:54:05  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	42731092.44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	42731092.44
IVA	8118907.56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	8118907.56
<b>Total neto factura (=)</b>	50850000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 50850000</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	42.731.092,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	42.731.092,44
IVA	8.118.907,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	8.118.907,56
<b>Total neto factura (=)</b>	50.850.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 50.850.000,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


Numero de Autorización: 18764079614721 Rango desde: 31 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-09-16



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155028507



(415)7707212489984(8020) 000014115502850 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 4 9 6 1 5 2 2 2	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	14. Buzón electrónico 2 0
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 7 4 1 1 7 0 1	150. DV 7	151. Número de tarjeta profesional 2 9 7 3 2 9
	152. Primer apellido HERREÑO	153. Segundo apellido LANCHEROS	154. Primer nombre MARIANA	155. Otros nombres DEL PILAR
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 5 2 5			

