

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 1 de 7

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ		
IDENTIFICACIÓN:	800.178.307-2		
CÓDIGO ACTIVIDAD	9499	Responsabilidad DIAN: PN ☐ PJ ☒	
RUT:	DECLARA:	SI ☒ NO ☐	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		
SUPERVISOR:	MARIO DIAZ MANTILLA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO		
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE-SOC-2024-033	FECHA: 17/12/2024	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	NUEVE (9) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
PRORROGA N°1	Hasta el 28 de febrero de 2025		
VALOR:	El valor total del presente convenio solidario es la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000,00) MCTE aportados de la siguiente manera: - APOORTE DEL MUNICIPIO: la alcaldía municipal del Socorro aportará la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00) MCTE, representados en materiales - APOORTE OAC: El OAC, aporta la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.000.000,00), representados en mano de obra no calificada		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7152734		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-01137	FECHA: 03/12/2024	
	25-00217	FECHA: 20/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-01675	FECHA: 18/12/2024	
	25-00209	FECHA: 20/02/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: FMAQ FONDO DE MAQUINARIA 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada		

<div>República de Colombia</div> <div>Departamento de Santander</div> <div></div> <div>Municipio del Socorro</div> <div>NIT 890.203.688-8</div>	<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO</div> <div>INFORME DE SUPERVISION</div>			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 2 de 7	Código: F-PGC-02-027

	<p>Fondo/ Fte de financiación: BFMQ RECURSOS DEL BALANCE FONDO DE MAQUINARIA</p> <p>2: GASTOS</p> <p>2.3: INVERSION</p> <p>2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS</p> <p>2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA</p> <p>2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: CCAM CONTRIBUCION CAMINOS</p> <p>2: GASTOS</p> <p>2.3: INVERSION</p> <p>2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS</p> <p>2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA</p> <p>2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: SGPL S.G.P. LIBRE DESTINACION</p> <p>2: GASTOS</p> <p>2.3: INVERSION</p> <p>2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS</p> <p>2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA</p> <p>2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional</p> <p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES</p> <p>2: GASTOS</p> <p>2.3: INVERSION</p> <p>2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS</p> <p>2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA</p>
--	---

<div>República de Colombia</div> <div>Departamento de Santander</div> <div></div> <div>Municipio del Socorro</div> <div>NIT 890.203.688-8</div>	<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO</div> <div>INFORME DE SUPERVISION</div>			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 3 de 7	Código: F-PGC-02-027

	<p>2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: CCAM CONTRIBUCION CAMINOS RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP. 2: GASTOS RP. 2.3: INVERSION RP. 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RP. 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RP. 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS RP. 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA RP. 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS RP. 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance) RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0001. CP24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: FMAQ FONDO DE MAQUINARIA RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP.2: GASTOS RP 2.3: INVERSION RP 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RP 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RP 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS RP 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA RP 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS RP 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION</p>
--	---

<div>República de Colombia</div> <div>Departamento de Santander</div> <div></div> <div>Municipio del Socorro</div> <div>NIT 890.203.688-8</div>	<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO</div> <div>INFORME DE SUPERVISION</div>			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 4 de 7	Código: F-PGC-02-027

	<p>RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE</p> <p>RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional</p> <p>RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance)</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0001: CP24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: SGPL S.G.P. LIBRE DESTINACION</p> <p>RP. RESERVAS PRESUPUESTALES</p> <p>RP.2: GASTOS</p> <p>RP.2.3: INVERSION</p> <p>RP.2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>RP.2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>RP.2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance)</p> <p>RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0001: CP24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA</p>
--	---

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 5 de 7
			Código: F-PGC-02-027

	Fondo/ Fte de financiación: BFMQ RECURSOS DEL BALANCE FONDO DE MAQUINARIA RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP. 2: GASTOS RP. 2.3: INVERSION RP. 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RP. 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RP. 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS RP. 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA RP. 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS RP. 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance) RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0002: P24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100057012 / B-100015406
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	FECHA EXPEDICIÓN:	23/12/2024
	FECHA DE APROBACIÓN:	23/12/2024
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un primer desembolso por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez ejecutada el cincuenta (50%) por ciento de la obra, B) Un pago final por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000), equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ.	

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 6 de 7

FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/12/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	27/12/2024		
FECHA DE REINICIO N°1	27/01/2025		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	28/02/2025		
PERIODO DE COBRO	31/01/2025 28/02/2025		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO	
	NUMERO DE PLANILLA	32617504	
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	
	NUMERO DE PLANILLA	32617504	
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	
	NUMERO DE PLANILLA	32617504	

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR	Se realizo el suministro e instalación de 14.82m3 de subbase granular se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	NINGUNA	CUMPLE
1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000PSI PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS	Se realizo el suministro e instalación de 0.83m3 de concreto de 2000psi para solado de estructuras, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	NINGUNA	CUMPLE
1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI PARA ESTRUCTURAS	Se realizo el suministro e instalación de 15m3 de concreto de 3000psi para estructuras, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	NINGUNA	CUMPLE
1.4 SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA Fy=420 MPA	Se realizo el suministro de 823.255Kg de acero de refuerzo, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	NINGUNA	CUMPLE
1.5 CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3000 PSI, PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	Se realizo el suministro e instalación de 5.8m3 de concreto tipo ciclópeo, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	NINGUNA	CUMPLE

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION			
Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 7 de 7	Código: F-PGC-02-027	

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO


Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 09 de junio de 2025

Supervisor



MARIO DIAZ MANTILLA
 Secretario de Infraestructura

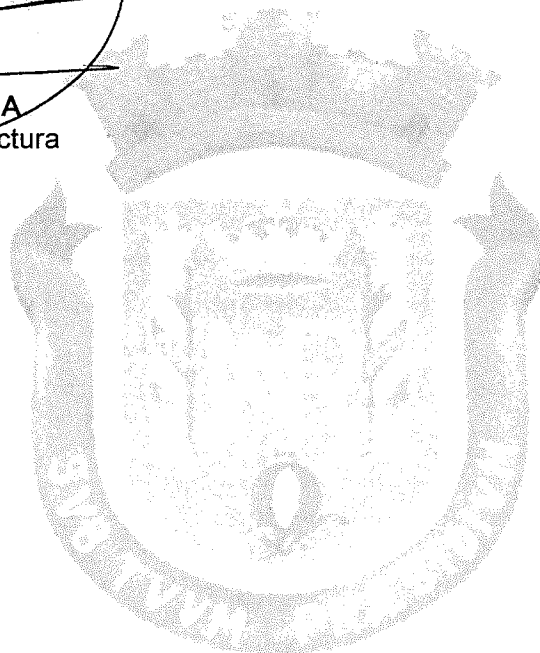



MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


ITEM

1.1	Suministro e instalacion de Sub-base granular	UNIDAD	M3
-----	---	--------	----

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	1	42,96	3,60	154,651194	0,15	23,20
2	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	2	42,96	0,50	21,4793325	0,15	6,44
CANTIDAD							29,64

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

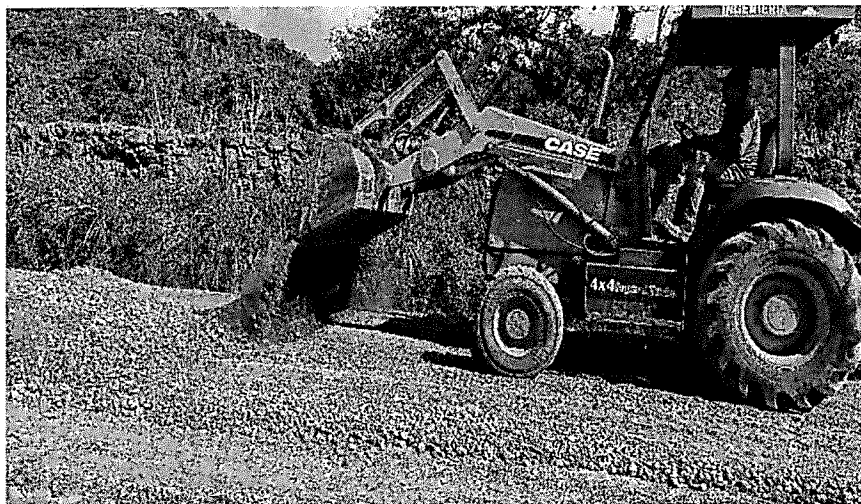

Arq. Mario Díaz Mantilla
Secretario de Infraestructura



MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM

1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3
-----	--	--------	----

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	2	42,96	0,20	8,591733	0,05	0,8591733
2	SUMINISTRO CONCRETO PARA RIOSTRAS	16	5,00	0,20	1	0,05	0,8
CANTIDAD							1,66

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS



Arq. Mario Díaz Mantilla
Secretario de Infraestructura

**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM

1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3
-----	--	--------	----

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS HUELLAS	2	42,96	0,90	38,6627985	0,15	11,5988396
2	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS CUNETA	2	42,96	0,55	23,6272658	0,15	7,08817973
3	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS bordillo	2	42,96	0,20	8,591733	0,55	9,45090631
4	Resta de Area bordillo inclinacion (2 triangulos)	-1	42,96	0,05	2,14793325	0,25	-0,53698331
5	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS riostras vigas	16	5,00	0,20	1	0,15	2,4
CANTIDAD							30,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS



Arq. Mario Díaz Mantilla
Secretario de Infraestructura



MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


ITEM

1.4	Suministro de Acero de refuerzo con varilla corrugada $F_y=420$ MPA	UNIDAD	KG
-----	---	--------	----

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	DIAMETRO		kgxml	Kg
1	Acero de refuerzo longitudinal	22,00	42,96	1/2" ó N.4		0,996	941,31
2	Acero de ganchos	574,00	0,60	3/8" ó N.3		0,56	192,86
3	Acero transversal	144	2,20	N.2		0,25	79,20
4	Acero riostra flejes viga	31	1,00	N.2	16	0,25	124,00
5	Acero riostra longitudinal viga	4	4,85	1/2" ó N.4	16	0,996	309,16
						CANTIDAD	1646,53

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

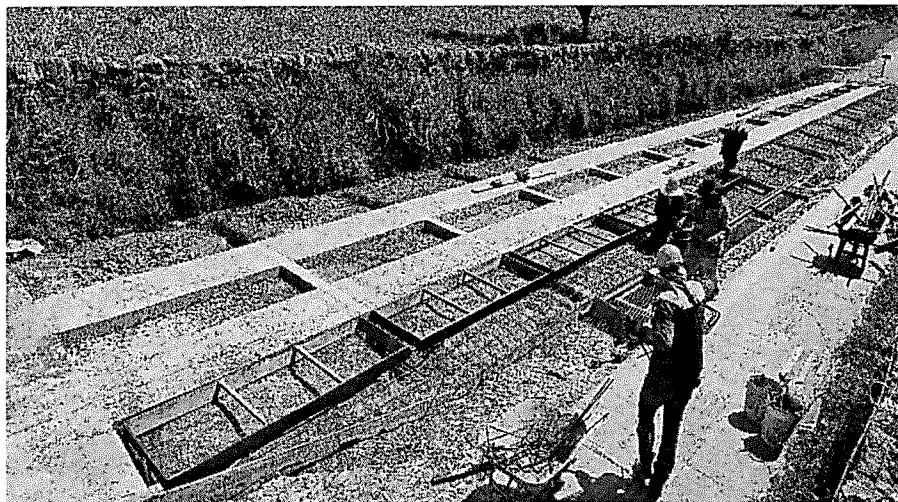

Arq. Mario Díaz Mantilla
Secretario de Infraestructura



MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM

1.5	CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	UNIDAD	M3
-----	---	--------	----

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Concreto ciclopeo huellas	1	42,96	1,80	77,325597	0,15	11,60
CANTIDAD							11,60


REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS



Arq. Mario Diaz Mantilla
Secretario de Infraestructura

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

BALANCE GENERAL DE OBRA						
CANTIDADES PRESUPUESTO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	
1.0	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO					
1.1	Suministro e instalacion de Sub-base granular	M3	29,64	\$ 117.196,00	\$ 3.473.862,76	
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS	M3	1,66	\$ 386.749,00	\$ 641.683,61	
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	30,00	\$ 438.036,00	\$ 13.141.492,75	
1.4	Suministro de Acero de refuerzo con varilla corrugada Fy=420 MPA	KG	1.646,53	\$ 5.233,00	\$ 8.616.305,45	
1.5	CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	M3	11,60	\$ 334.406,00	\$ 3.878.721,54	
SUB TOTAL TRAMO DE VIA					\$ 29.752.066,12	
ADMINISTRACION					20,00%	5.950.413,22
IMPREVISTOS					1,00%	297.520,66
UTILIDAD					0,00%	-
VALOR TOTAL DE OBRA						\$ 36.000.000,00



Arq. Mario Díaz Mantilla
Secretario de Infraestructura

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 1 de 8	Código: F-PGC-02-027

INFORME DE SUPERVISION PARA EL PAGO N°02

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ		
IDENTIFICACIÓN:	800.178.307-2		
CÓDIGO ACTIVIDAD	9499	Responsabilidad DIAN: PN ☐ PJ ☒	
RUT:	DECLARA:	SI ☒ NO ☐	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO		
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE-SOC-2024-033	FECHA: 17/12/2024	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	NUEVE (9) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
PRORROGA N°1	Hasta el 28 de febrero de 2025		
VALOR:	El valor total del presente convenio solidario es la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000,00) MCTE aportados de la siguiente manera: - APOORTE DEL MUNICIPIO: la alcaldía municipal del Socorro aportará la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00) MCTE, representados en materiales - APOORTE OAC: El OAC, aporta la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.000.000,00), representados en mano de obra no calificada		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7152734		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-01137	FECHA: 03/12/2024	
	25-00217	FECHA: 20/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-01675	FECHA: 18/12/2024	
	25-00209	FECHA: 20/02/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: FMAQ FONDO DE MAQUINARIA 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION		

<div>República de Colombia</div> <div>Departamento de Santander</div> <div></div> <div>Municipio del Socorro</div> <div>NIT 890.203.688-8</div>	<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO</div> <div>INFORME DE SUPERVISION</div>			
Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 2 de 7	Código: F-PGC-02-027	

	<p>2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: BFMQ RECURSOS DEL BALANCE FONDO DE MAQUINARIA 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: CCAM CONTRIBUCION CAMINOS 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: SGPL S.G.P. LIBRE DESTINACION 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p>
--	--

<div>República de Colombia</div> <div>Departamento de Santander</div> <div></div> <div>Municipio del Socorro</div> <div>NIT 890.203.688-8</div>	<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO</div> <div>INFORME DE SUPERVISION</div>			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 3 de 7	Código: F-PGC-02-027

	<p> 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada </p> <p> Fondo/ Fte de financiación: CCAM CONTRIBUCION CAMINOS RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP. 2: GASTOS RP. 2.3: INVERSION RP. 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RP. 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RP. 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS RP. 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA RP. 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS RP. 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance) RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0001. CP24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA </p> <p> Fondo/ Fte de financiación: FMAQ FONDO DE MAQUINARIA RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP.2: GASTOS RP 2.3: INVERSION RP 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RP 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RP 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS RP 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA </p>
--	---

<div>República de Colombia</div> <div>Departamento de Santander</div> <div></div> <div>Municipio del Socorro</div> <div>NIT 890.203.688-8</div>	<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO</div> <div>INFORME DE SUPERVISION</div>			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 4 de 7	Código: F-PGC-02-027

	<p>RP 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS RP 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional RP 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance) RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0001: CP24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP-II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Fondo/ Fte de financiación: SGPL S.G.P. LIBRE DESTINACION RP. RESERVAS PRESUPUESTALES RP.2: GASTOS RP.2.3: INVERSION RP.2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RP.2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RP.2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS RP.2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA RP.2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS RP.2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance) RP.2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0001: CP24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y</p>
--	--

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 5 de 7
			Código: F-PGC-02-027

	URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	Fondo/ Fte de financiación: BFMQ RECURSOS DEL BALANCE FONDO DE MAQUINARIA	
	RP. RESERVAS PRESUPUESTALES	
	RP. 2: GASTOS	
	RP. 2.3: INVERSION	
	RP. 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
	RP. 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	RP. 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS	
	RP. 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041 Vía terciaria mejorada (Recursos del balance)	
	RP. 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402041.0002: P24-01675 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA CRUZ – CD24-01137, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL No 2024-68755-0009 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONVENIO SOLIDARIO No CDRE-SOC-2024-033 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, NUMERO ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNETR.7152734, PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DIEZ (10) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100057012 / B-100015406
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	FECHA EXPEDICIÓN:	23/12/2024
	FECHA DE APROBACIÓN:	23/12/2024
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un primer desembolso por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez ejecutada el cincuenta (50%) por	

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION			
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 6 de 7	Código: F-PGC-02-027

	ciento de la obra, B) Un pago final por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000), equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/12/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	27/12/2024		
FECHA DE REINICIO N°1	27/01/2025		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	28/02/2025		
PERIODO DE COBRO	31/01/2025		
	28/02/2025		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO	
	NUMERO DE PLANILLA	32617504	
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	
	NUMERO DE PLANILLA	32617504	
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	
	NUMERO DE PLANILLA	32617504	

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR	Se realizo el suministro e instalación de 14.82m3 de subbase granular se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	De acuerdo con el certificado de supervisor e informe de cumplimiento de actividades suscrito por el Arq. Mario Diaz Mantilla como supervisor durante el periodo del 31/01/2025 al 28/02/2025	CUMPLE
1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000PSI PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS	Se realizo el suministro e instalación de 0.83m3 de concreto de 2000psi para solado de estructuras, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	De acuerdo con el certificado de supervisor e informe de cumplimiento de actividades suscrito por el Arq. Mario Diaz Mantilla como supervisor durante el periodo del 31/01/2025 al 28/02/2025	CUMPLE
1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI PARA ESTRUCTURAS	Se realizo el suministro e instalación de 15m3 de concreto de 3000psi para estructuras, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	De acuerdo con el certificado de supervisor e informe de cumplimiento de actividades suscrito por el Arq. Mario Diaz Mantilla como supervisor durante el periodo del 31/01/2025 al 28/02/2025	CUMPLE
1.4 SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO CON	Se realizo el suministro de 823.255Kg de acero de refuerzo, se verifica con	De acuerdo con el certificado de supervisor e informe de	CUMPLE

República de Colombia Departamento de Santander  Municipio del Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO INFORME DE SUPERVISION		
	Versión: 01	Fecha: 18/03/2024	Página 7 de 7

VARILLA CORRUGADA Fy=420 MPA	visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	cumplimiento de actividades suscrito por el Arq. Mario Diaz Mantilla como supervisor durante el periodo del 31/01/2025 al 28/02/2025	
1.5 CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3000 PSI, PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	Se realizo el suministro e instalación de 5.8m3 de concreto tipo ciclópeo, se verifica con visita realizada al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexadas al presente informe	De acuerdo con el certificado de supervisor e informe de cumplimiento de actividades suscrito por el Arq. Mario Diaz Mantilla como supervisor durante el periodo del 31/01/2025 al 28/02/2025	CUMPLE

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$39.000.000,00	
VALOR ANTICIPO		
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL		\$3.000.000,00
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 01/07/2025		\$18.000.000,00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA Fecha: 02/07/2025		\$18.000.000,00
VALOR POR COBRAR		\$00,00
SUMAS IGUALES	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FE-2	FECHA: 26/05/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEGUNDO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	NO APLICA	FECHA:


OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: SI

Que de acuerdo con certificación y el informe de cumplimiento de actividades suscrito por el ARQ. Mario Diaz Mantilla supervisor durante el periodo comprendido del 31 de enero de 2025 al 28 de febrero de 2025 se dio cumplimiento a las actividades anteriormente descritas y verificadas

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 02 de julio de 2025

Supervisor


CAMILLO JOSÉ BLANCO RANGEL
 Secretario de Infraestructura
