



ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA LA GUAJIRA NIT: 892.170.008-3			
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN			
DESDE 12/09/2025 – HASTA 11/10/2025			
CONTRATO	x	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	4	INFORME FINAL	
1. OBJETIVO			
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO			
2. DATOS GENERALES			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
CONTRATO/CONVENIO	001 – 2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	10-06-2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MTGUAJIRA		
NIT	901.954.185-6		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$20.336.207.500,00 MDA/CTE.		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	<p>El Municipio de Fonseca pagará al contratista seleccionado el valor del contrato a través de la presentación de actas parciales de recibido. Dichos pagos se harán previo los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar. Para la presentación de las cuentas de cobro se deberá acreditar los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Acta de recibido en la cual se reconozca las cantidades de bienes entregados.2) La respectiva factura3) El informe del contratista de las actividades ejecutadas4) Certificación a satisfacción suscrita por el Interventor y/o Supervisor5) Constancia del pago de los aportes al sistema de salud y parafiscales, por parte del contratista. <p>El Municipio efectuará los pagos de las cuentas de cobro del contrato que resulte del presente proceso dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de radicación de la cuenta/factura.</p> <p>Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Fonseca, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.</p>		
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	OCHO (08) MESES.		
FECHA DE INICIO	DOCE (12) DE JUNIO DE 2025		
FECHA FINAL	ONCE (11) DE FEBRERO DE 2026		
SUPERVISIÓN	NOMBRE	ANA KARINA MENDOZA MOYA	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	10 de junio de 2025	



3. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1425	VALOR(ES)	\$20.440.542.800	FECHA(S)	26/05/2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	1625	VALOR(ES)	\$20.336.207.500	FECHA(S)	12/06/2025
4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
TIPO DE APORTE		PLANILLA N°		MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	
PERSONA JURIDICA					
G.L.C.T. S.A.S. TECNOSOFT VIRTUAL S.A.S.		34708989 - 35009303 34708911 - 35009240		SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025	
5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA					
El objetivo del presente proyecto es aumentar la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas oficiales mediante la adquisición e instalación de elementos tecnológicos (aulas interactivas multifuncionales) que garanticen a la comunidad educativa la disponibilidad de herramientas tecnológicas y los elementos de apoyo que permitan el acceso a los contenidos educativos para el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje.					
El alcance del contrato corresponde al suministro e instalación de los elementos tecnológicos en los siguientes Municipios e Instituciones Educativas:					
Municipio	Establecimiento Educativo	Sede	Zona	# Puestos de Trabajo	
DIBULLA	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	Principal	Urbana	41	
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	Principal	Rural	41	
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	Principal	Rural	41	
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS	Principal	Rural	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	Principal	Rural	41	
SAN JUAN DEL CESAR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ	Principal	Rural	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HUGUES MANUEL LACOUTURE	Principal	Rural	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	Principal	Urbana	31	
MAICAO	INSTITUCION EDUCATIVA No. 1	Principal - María Colombia Meneses	Urbana	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 5	Principal - Técnico San José	Urbana	41	
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 6	Principal - Jorge Arrieta	Urbana	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 11	Pilar Antonia Ojeda	Urbana	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 14	Principal - El Paraíso	Urbana	41	
	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 2	Sede Parrantial	Rural	31	
RIOHACHA	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	Nuevo Horizonte	Urbana	41	
		Doce de Octubre	Urbana	31	
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	El Cooperativo	Urbana	31	
MANAURE	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	Principal	Urbana	31	
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	Principal	Urbana	31	
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA	Principal	Urbana	31	
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI	Principal	Rural	31	
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISHACHIMANA	Principal	Rural	31	
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARI	Principal	Rural	31	
FONSECA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA	Clotilde Povea de Romero	Urbana	31	
		San Rafael Arcángel	Urbana	31	



	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	Calixto Maestre	Urbana	31
URUMITA	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE URUMITA	14 de junio	Urbana	31
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	Principal	Urbana	41
URIBIA	INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	Principal	Urbana	41
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – NAZARETH	Principal	Rural	62
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA CARASUA	Principal	Rural	31
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE SIAPANA	Principal	Rural	41

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones y cumplió satisfactoriamente con estas y el objeto contractual.

5.1. Actividades Desarrolladas

Durante el periodo señalado en este informe el contratista Unión Temporal MTGUAJIRA, ha realizado las actividades de intervención en las siguientes sedes educativas de los municipios descritos a continuación:

Municipio de Dibulla

- Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo Sede principal (1 aula interactiva de 41 puestos de trabajo).
- Institución Educativa Rural Miguel Pinedo Barros Sede principal (1 aula interactiva de 31 puestos de trabajo).
- Institución Educativa Rural San Antonio de Palomino Sede principal (1 aula interactiva de 41 puestos de trabajo).

Distrito de Riohacha

- Institución Educativa Centro de Integración Popular Sede Nuevo Horizonte (1 aula interactiva de 41 puestos de trabajo).
- Institución Educativa Centro de Integración Popular Sede Doce de Octubre (1 aula interactiva de 31 puestos de trabajo).
- Institución Educativa José Antonio Galán Sede El Cooperativo (1 aula interactiva de 31 puestos de trabajo).

Descripción de actividades

1. Reconocimiento de los espacios a intervenir
2. Actividades de descargue de materiales y elementos en las Instituciones Educativas
3. Suministro, montaje e instalación de redes eléctricas y de datos en cada aula
4. Suministro, montaje e instalación de aires acondicionados 2 por cada aula
5. Suministro, montaje e instalación de atril interactivo y sus componentes

6. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

- N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA:

- VALOR DEL CONTRATO: \$ 20.336.207.500,00 M/CTE.
- VALOR EJECUTADO ACTUAL: \$ 3.580.063.592,00 M/CTE.
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL: 17,60%
- VALOR EJECUTADO ANTERIOR: \$ 7.951.523.356,00 M/CTE.
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANTERIOR: 39,10%
- VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 11.531.586.948,00 M/CTE.
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA: 56,70%
- SALDO POR EJECUTAR: \$ 8.804.620.552,00 M/CTE
- PORCENTAJE POR EJECUTAR: 43,30%

7. OBSERVACIONES FINALES

EJECUCIÓN FINANCIERA: (Ver tabla siguiente página)



EJECUCION FISICO FINANCIERA POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CONTRATADO		EJECUCION INFORME 1		EJECUCION INFORME 2		EJECUCION INFORME 3		EJECUCION INFORME 4		EJECUCION ACUMULADA		POR EJECUTAR	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DIBULLA (5)	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	750.342.362	3,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	750.342.362	3,69%
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	689.016.783	3,39%	689.016.783	3,39%	39.223.709	0,19%
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTONIO MINDOLA ROBLES	750.342.362	3,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	750.342.362	3,69%
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	533.313.613	2,62%	39.223.709	0,19%
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	689.016.783	3,39%	689.016.783	3,39%	39.223.709	0,19%
SAN JUAN DEL CESAR (3)	TOTAL DIBULLA	3.529.703.030	17,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.911.347.179	9,40%	1.911.347.179	9,40%	1.618.355.851	7,96%
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	39.223.709	0,19%
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HUGUES MANUEL LACOUTURE	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	39.223.709	0,19%
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	572.537.322	2,82%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	-	0,00%	-	0,00%	533.313.613	2,62%	39.223.709	0,19%
	TOTAL SAN JUAN	1.717.611.966	8,45%	0,00	0,00%	533.313.613	2,62%	1.066.627.226	5,24%	-	0,00%	1.599.940.839	7,87%	117.671.127	0,58%
MAICAO (6)	INSTITUCION EDUCATIVA No. 1	572.537.322	2,82%	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%	-	0,00%
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 5	728.240.492	3,58%	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	728.240.492	3,58%	-	0,00%
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 6	572.537.322	2,82%	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%	-	0,00%
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 11	529.073.524	2,60%	529.073.524	2,60%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	529.073.524	2,60%	-	0,00%
	INSTITUCION EDUCATIVA No. 14	728.240.492	3,58%	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	728.240.492	3,58%	-	0,00%
RIOHACHA (3)	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 2	572.537.322	2,82%	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%	-	0,00%
	TOTAL MAICAO	3.703.166.474	18,21%	3.703.166.474	18,21%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.703.166.474	18,21%	0,00	0,00%
	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	720.991.012	3,55%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	689.016.783	3,39%	689.016.783	3,39%	31.974.229	0,16%
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	521.824.044	2,57%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	489.849.815	2,41%	31.974.229	0,16%
	TOTAL RIOHACHA	1.771.888.580	8,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	1.668.716.413	8,21%	1.668.716.413	8,21%	103.172.167	0,51%



MUNICIPIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CONTRATADO		EJECUCION INFORME 1		EJECUCION INFORME 2		EJECUCION INFORME 3		EJECUCION INFORME 4		EJECUCION ACUMULADA		POR EJECUTAR	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
MANAURE (6)	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISHACHIMANA	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARI	572.537.322	2,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	572.537.322	2,82%
FONSECA (3)	TOTAL MANAURE	3.435.223.932	16,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.435.223.932	16,89%
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA	521.824.044	2,57%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	-	0,00%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	31.974.229	0,16%
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	529.073.524	2,60%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	-	0,00%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	31.974.229	0,16%
	TOTAL FONSECA	1.572.721.612	7,73%	0,00	0,00%	1.489.549.445	7,23%	-	0,00%	-	0,00%	1.489.549.445	7,23%	103.172.167	0,51%
URUMITA (2)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE URUMITA	529.073.524	2,60%	-	0,00%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	-	0,00%	489.849.815	2,41%	39.223.709	0,19%
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LINAN	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	689.016.783	3,39%	-	0,00%	689.016.783	3,39%	39.223.709	0,19%
	TOTAL URUMITA	1.257.314.016	6,18%	0,00	0,00%	-	0,00%	1.178.866.598	5,80%	-	0,00%	1.178.866.598	5,80%	78.447.418	0,39%
URIBIA (5)	INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	728.240.492	3,58%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - NAZARETH	1.130.575.684	5,56%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.130.575.684	5,56%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERIADO INDIGENA CARASUA	761.521.222	3,74%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	761.521.222	3,74%
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERIADO INDIGENA DE SIAPANA	728.240.492	3,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	728.240.492	3,58%
	TOTAL URIBIA	3.348.577.890	16,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	3.348.577.890	16,47%
TOTALES		20.336.207.500	100,00%	3.703.166.474	18,21%	2.002.863.058	9,85%	2.245.493.824	11,04%	3.580.063.592	17,60%	11.531.586.948	56,70%	8.804.620.552	43,30%



EJECUCION FISICO FINANCIERA POR ITEMS

CONTRATADO						INFORME 1			INFORME 2			INFORME 3			INFORME 4			EJECUCION ACUMULADA			POR EJECUTAR		
Item	Unidad medida	Cant	Valor Unit	Valor Total	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cant	Avance financiero	Avance físico			
1	Atil Interactivo Estructura metálica fabricada en lamina coil rolled calibre 22. Pintura electroestática. Empotrado al piso. Estructura de diseño para conexión de puntos de red eléctricos y datos. Dimensiones Alto: 120 cm (tolerancia 5 cm +/-), ancho: 55 cm, fondo: 43 cm. Vidrio protector templado transparente de 4 mm de espesor y marco metálico cerrado. CP All in One. Pantalla Full HD (1920 x 1080), IPS, nits, 72% NTSC. de 21.5 pulgadas en la diagonal. Procesador Intel core i5, 4GB de memoria DDR4-2400 SDRAM. Unidad de estado sólido M.2 NVME. PCIe de 256 GB 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi y bluetooth combinados compatible con MU-MIMO. Cámara de privacidad HP Truevision HD con matriz de microfono digital doble integrada. 2 USB SuperSpeed Type-A, 2 USB 2.0 Type-A. Salida HDMI. Auriculares de auricular combinado. Graficas Intel UHD 600. SO FreeDOS Windows 10 pro educacion licenciado a perpetuidad. Teclado Mouse audifonos. Software educativo Interdiscinario para los grados de 1° a 11° y Butaca ergonomico con sistema de elevación neumático.	Und	824	10,711,000	8,825,864,000	43.40%	175	1,874,425,000	9.22%	31	332,041,000	1.53%	103	1,103,233,000	5.42%	154	1,649,494,000	8.11%	361	3,866,671,000	19.01%		
2	Atil Interactivo Estructura metálica fabricada en lamina coil rolled calibre 22. Pintura electroestática. Empotrado al piso. Estructura de diseño para conexión de puntos de red eléctricos y datos. Dimensiones Alto: 120 cm (tolerancia 5 cm +/-), ancho: 55 cm, fondo: 43 cm. Vidrio protector templado transparente de 4 mm de espesor y marco metálico cerrado. CP All in One. Pantalla Full HD (1920 x 1080), IPS, nits, 72% NTSC. de 21.5 pulgadas en la diagonal. Procesador Intel core i5, 4GB de memoria DDR4-2400 SDRAM. Unidad de estado sólido M.2 NVME. PCIe de 256 GB 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi y bluetooth combinados compatible con MU-MIMO. Cámara de privacidad HP Truevision HD con matriz de microfono digital doble integrada. 2 USB SuperSpeed Type-A, 2 USB 2.0 Type-A. Salida HDMI. Auriculares de auricular combinado. Graficas Intel UHD 600. SO FreeDOS Windows 10 pro educacion licenciado a perpetuidad. Teclado Mouse audifonos. Software educativo Interdiscinario para los grados de 1° a 5° y Butaca ergonomico con sistema de elevación neumático.	Und	217	9,532,800	2,068,617,600	10.17%	31	296,516,800	1.45%	93	886,550,400	4.35%	31	296,516,800	1.45%	62	591,033,600	2.91%	0	-	0.00%		



CONTRATADO						INFORME 1			INFORME 2			INFORME 3			INFORME 4			EJECUCION ACUMULADA			POR EJECUTAR		
Item	Descripción de actividades ejecutadas	Unidad medida	Cant	Valor Unit	Valor Total	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cant	Avance financiero	Avance físico		
3	Anti interactivo convertible. Estructura metálica colli rolled calibre 22. Pintura electroestática. Empotrado al piso. Sistema fijo tipo retráctil de apertura automática. Funcionalidad. Permite guardar el teclado, mouse y la pantalla del estudiante para convertir a sill en mesa de estudio. Suepon de seguridad y llave de aseguramiento. tiempo de apertura inferior a 10 segundos, cierre manual. Estructura de diseño para conexión de puntos de red dedicados y datos. Medidas Superficie metálica 159mm metal 26 x 26. CPU con boar embebida en chasis. Procesador Intel dual-core, osieron J4125. Pantalla HD 19" Velocidad del procesador 2.00GHz. Cache 4 MB. Memoria RAM 8 GB - DDR4-2400 SDRAM (1x8GB). Almacenamiento 512 GB 1xM-SATA3.0. Gráficos Intel UHD600. Sistema Operativo Windows 10 pro educación licenciado a perpetuidad. Teclado USB. Mouse, audífonos. Software educativo interdisciplinario para los grados de 1° al 11° y búfaco ergonómico con sistema de elevación neumático.	Und	82	11 164 000	915 448 000	4.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	82	915 448 000	4.50%		
4	Pizarra digital interactiva - Tablero blanco de superficie metálica esmaltada en cerámica de alta durabilidad. Superficie anti rayones y manchas. Con estructura maestra de trabajo que garantiza su alta resistencia a impactos sin deformarse. Superficie magnética que permite el uso de manos y el uso de marcadores secos y de tinta borrable. La construcción de la superficie debe ser maestra no hueca. Medidas aproximadas: Total 2.24 m x 1.26 m. Área Activa 2.17 m x 1.17 m (97") (10mm +/-). Operación Touch y Multitouch. Sensores Infrarrojos. Incluye Proyector de lente corta 3400 ANSI lúmenes Resolución Nativa XGA 1024 x 768 Nivel de contraste 20.000:1. Entrada VGA y HDMI.	Und	33	20 777 100	685 644 300	3.37%	6	124 662 600	0.61%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	6	124 662 600	0.61%	27	560 981 700	2.76%	
5	Camara de documentos - Capturar y digitalizar imágenes sólidas o de texto, acalatos, líneas, negativos y fotos en tiempo real para ser mostradas y proyectadas en el PC, TV o video beam. Sistema de iluminación led, enfoque automático. Autoenfoque para ajustar la calidad de la imagen rápidamente. Sensor de imagen de exploración progresiva. Zoom óptico 12x, Zoom digital de 8x. Función colorínegro, postnavigativo de la película control de brillo, configuración de imagen, Vista previa, Volumen electrónico. Lente vertical u horizontal de 360. Panel de botones, Lámparas Led, Piezas giratorias con amortiguacion. Dos tomas de entrada externa y salida Rdo. Vendo a distancia. Suministro de energía de 12 V externa. Incluye mesa (base metálica, talcón y 2 superficies en frmiós).	Und	33	5 459 500	180 163 500	0.89%	6	32 757 000	0.16%	4	21 838 000	0.11%	4	21 838 000	0.16%	6	32 757 000	0.54%	13	70 973 500	0.35%		



CONTRATADO					INFORME 1			INFORME 2			INFORME 3			INFORME 4			EJECUCION ACUMULADA			POR EJECUTAR		
Item	Unidad medida	Cant	Valor Unit	Valor Total	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cantidad ejecutada	Avance financiero	Avance físico	Cant	Avance financiero	Avance físico		
6	Software de control educativo - Este software permite tener la administración total de los equipos en la sala, enseñar, monitorear e interactuar con los estudiantes. Controla y coordina el trabajo con los estudiantes y dirige el uso de internet.	Und	743.700	835.175.100	4,11%	206	153.202.200	0,75%	124	92.218.800	0,45%	134	99.655.800	0,49%	216	160.639.200	0,79%	443	329.459.100	1,62%		
7	Software de laboratorio de idiomas - Provee los canales de audio para realizar todas las funciones de laboratorio de idiomas, transmisión de audio conversación, grabación y comparación de voz, edición de texto, visualización de videos, monitoreo de estudiante.	Und	33	25.734.000	849.222.000	4,18%	6	154.424.000	0,76%	4	102.936.000	0,51%	4	102.936.000	0,51%	6	154.404.000	0,76%	13	334.542.000	1,65%	
8	UPS 1200 VA - Capacidad 1200 VA. Voltaje de entrada de 110 V. voltaje de salida de 110 V. frecuencia de 50 Hz y tiempo de autonomía de 10-20 minutos	Und	33	946.500	31.234.500	0,15%	6	5.679.000	0,03%	4	3.786.000	0,02%	4	3.786.000	0,02%	6	5.679.000	0,03%	13	12.304.500	0,06%	
9	UPS 750 VA - Capacidad 750 VA. Voltaje de entrada de 110 V. voltaje de salida de 110 V. frecuencia de 50 Hz y tiempo de autonomía de 10-20 minutos	Und	1090	510.500	556.445.000	2,74%	200	102.100.000	0,50%	120	61.290.000	0,30%	130	66.365.000	0,33%	210	107.205.000	0,53%	430	219.515.000	1,08%	
10	Instalación de red eléctrica y datos - Categoría 6 con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 41 puestos.	Und	10	45.883.000	458.830.000	2,26%	2	91.766.000	0,45%	0	-	0,00%	1	45.883.000	0,23%	3	137.649.000	0,68%	4	183.532.000	0,90%	
11	Instalación de red eléctrica y datos - Categoría 6 con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 31 puestos.	Und	23	34.652.000	797.916.000	3,92%	4	138.768.000	0,68%	4	138.768.000	0,68%	3	104.076.000	0,51%	3	104.076.000	0,51%	9	312.228.000	1,54%	
24	Aire acondicionado- Capacidad de 24000 BTU. Tipo mini split, motor, monodisco de dos caballos (incluye instalación con materiales y puesta en funcionamiento).	Und	64	5.450.000	349.440.000	1,72%	12	65.520.000	0,32%	8	43.680.000	0,21%	8	43.680.000	0,21%	12	65.520.000	0,32%	24	131.040.000	0,64%	
13	Taller de inducción - Manejo y funcionamiento de elementos tecnológicos instalados a través de talleres dirigidos a docentes. Duración 15 horas.	Und	30	12.184.000	365.520.000	1,80%	6	73.104.000	0,36%	0	-	0,00%	0	-	0,00%	0	-	0,00%	24	292.416.000	1,44%	
14	Genera solar para generación de energía con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 31 puestos. (incluye instalación y puesta en funcionamiento en sitio).	Und	1	130.250.000	130.250.000	0,64%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0	-	0,00%	1	130.250.000	0,64%	
15	Aire acondicionado solar - Capacidad de 12000 BTU - 100% solar se compone de unidad interior, unidad exterior, paneles solares, controlador solar, baterías, cables fotovoltaicos y soportes (incluye instalación y puesta en funcionamiento).	Und	2	19.740.000	39.480.000	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0	-	0,00%	2	39.480.000	0,19%	
SUB-TOTAL							17.089.250.000	84,03%		3.111.944.600	15,30%		1.896.595.600	9,26%		3.008.456.800	14,79%		7.398.840.800	36,38%		
IVA							3.246.957.500	15,97%		591.261.874	2,91%		368.524.224	1,76%		571.605.792	2,81%		1.405.779.752	6,91%		
TOTAL							20.336.207.500	100,00%		3.703.196.474	18,21%		2.245.493.824	11,04%		3.580.063.592	17,60%		8.804.620.552	43,30%		



8. INFORME FOTOGRAFICO (Evidencia de Actividades)

Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo Sede principal – Dibulla



Institución Educativa Rural Miguel Pinedo Barros Sede principal – Dibulla







ALCALDIA MUNICIPAL DE
FONSECA
NIT: 892.170.008-3



Institución Educativa Rural San Antonio de Palomino Sede principal – Dibulla

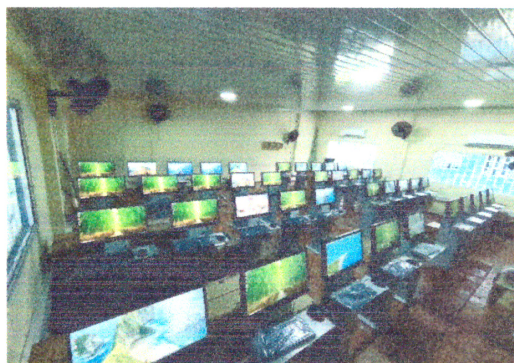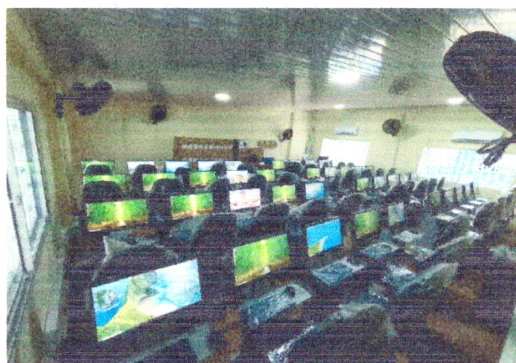


Institución Educativa Centro de Integración Popular Sede Nuevo Horizonte - Riohacha





Institución Educativa Centro de Integración Popular Sede Doce de Octubre – Riohacha

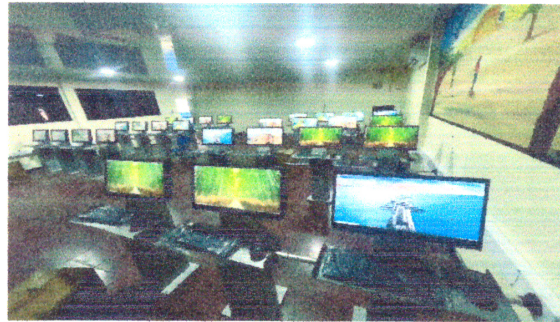

Institución Educativa José Antonio Galán Sede El Cooperativo – Riohacha



9. Ciudad y fecha de emisión:

Fonseca – La Guajira, 15 de octubre de 2025.

10. Firma del interventor y/o supervisor
