

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

30_10_2025

CTO. 0-286-2021, "INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS DETALLADOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, RICAURTE."



Bogotá D.C., octubre 28 de 2025

GIA-095-186-25

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACIÓN

ATN. HERNANDO ALFONSO ENCISO OSORIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA.

ATN. WILLIAM ROZO

DIRECTOR DE LA UAEGRD

GEODIM INGENIERÍA SAS

ATN. MILTON CABALLERO NAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad.

REFERENCIA: CTO. 0-286-2021, "INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS DETALLADOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, RICAURTE."

ASUNTO: Citación a Comité de Seguimiento.

Respetados Señores:

En cumplimiento de nuestras obligaciones, se convoca a reunión el próximo miércoles 30 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., de manera virtual, mediante el enlace <https://meet.google.com/cvs-wgeh-drs>, Por lo que solicito respetuosamente su participación para celebrar el comité de seguimiento (Consultor, Interventoría, Supervisión).

Agradecemos su amable atención, esperamos su respuesta.

Sin otro al respecto, se suscribe de ustedes.

Atentamente,

GIA CONSULTORES LTDA.

NIT: 830.106.944-5

JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Temas de escritorio... WhatsApp Gmail YouTube Maps Crear Sistema de Co... SAS Planet: descarg... Delimitar automátic... Análisis morfométr... Delimitar cuenca hi... Todos los marcadores

Lindon Losada

Oscar Nolberto Saldaña Bar...

Natalia Velasquez Marroquin

10 más

Diana Carolina Alvarado

10:14 | cvs-wgeh-drs

Personas

- Edwin Fernando Sierra ...
- Gia Consultores Ltda
Anfitrión de la reunión
- HERNANDO ALFONSO ...
- ING. ERICK ALFONSO T...
- jhon jairo pico hernandez
- Juan Mauricio Gonzalez
- laura daniela triviño var...
- Natalia Velasquez Marro...
- Oscar Nolberto Saldaña...

Personas

Colaboradores 20

- Lindon Losada (Tú)
- Angela Gonzalez
- asesorías y consultas
- AVR GEODIMING
- carlos andres preciado ...
- Diana Carolina Alvarado
- Edwin Fernando Sierra ...
- esteban gonzalez

Personas

- esteban gonzalez
- Gia Consultores Ltda
Anfitrión de la reunión
- HERNANDO ALFONSO ...
- ING. ERICK ALFONSO T...
- jhon jairo pico hernandez
- Juan Mauricio Gonzalez
- laura daniela triviño var...
- Natalia Manosalva Carv...
- Natalia Velasquez Marro...

Personas

- jhon jairo pico hernandez
- Juan Mauricio Gonzalez
- laura daniela triviño var...
- Natalia Manosalva Carv...
- Natalia Velasquez Marro...
- Oscar Nolberto Saldaña...
- RED JURIDCA HCC
- Roger A. Casas Prieto

Gia Consultores Ltda (Presentar)

28-10-2025 AVR-0125 - OFICIO SOLICITUD DE AMPLIAC... 2 / 4 150% +

parciales o técnicamente insuficientes que frustrarían el fin público perseguido.

El análisis de estas nuevas áreas por municipio ha generado una serie de trabajos adicionales que ha generado retrasos en el normal cumplimiento del cronograma definido en el reinicio del presente contrato.

2. Necesidad de Actualización de Datos de Referencia (Cartografía Básica) por Obsolescencia:

Al retomar el contrato se advirtió que ciertos insumos cartográficos (Información Básica) y/o bases de datos requeridas para el estudio estaban desactualizados y obligan a la recolección, compra, validación de nuevas fuentes para cumplir técnicamente con el objeto. Esto ha implicado actividades previas de actualización que demandan tiempo.

3. Ajustes de Exigencias Técnica solicitadas por la Entidad Contratante y/o la Interventoría:

Posterior a la fecha de reinicio, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo en Cundinamarca y la Interventoría ha solicitado ajustes, aclaraciones y/o modificaciones metodológicas que han alterado el alcance técnico originalmente (Ajuste al Plan de Exploración de Campo, Ajuste a los Productos Técnicos Presentados, Ajustes de Calidad de los Productos Técnicos Presentados). Las exigencias técnicas solicitadas anteriormente han requerido la replanificación de las actividades y de los tiempos pactados.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir. Quitar.

Juan Mauricio ...
Diana Carolina ...
RED JURIDCA ...
AVR GEODIMING
Natalia Velasqu...
HERNANDO AL...
11 más
Lindon Losada

28-10-2025 AVR-0126 - OFICIO SOLICITUD DE AMPLIAC... 2 / 4 150% +

Al retomar el contrato se advirtió que ciertos insumos cartográficos (Información Básica) y/o bases de datos requeridas para el estudio estaban desactualizados y obligan a la recolección, compra, validación de nuevas fuentes para cumplir técnicamente con el objeto. Esto ha implicado actividades previas de actualización que demandan tiempo.



3. Ajustes de Exigencias Técnica solicitadas por la Entidad Contratante y/o la Interventoría:

Posterior a la fecha de reinicio, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo en Cundinamarca y la Interventoría ha solicitado ajustes, aclaraciones y/o modificaciones metodológicas que han **alterado el alcance técnico originalmente** (Ajuste al Plan de Exploración de Campo, Ajuste a los Productos Técnicos Presentados, Ajustes de Calidad de los Productos Técnicos Presentados). Las exigencias técnicas solicitadas anteriormente han requerido la replanificación de las actividades y de los tiempos pactados.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir. Quitar.

Lindon Losada
Juan Mauricio Gonzalez
Diana Carolina Alvarado
16 más

-drs

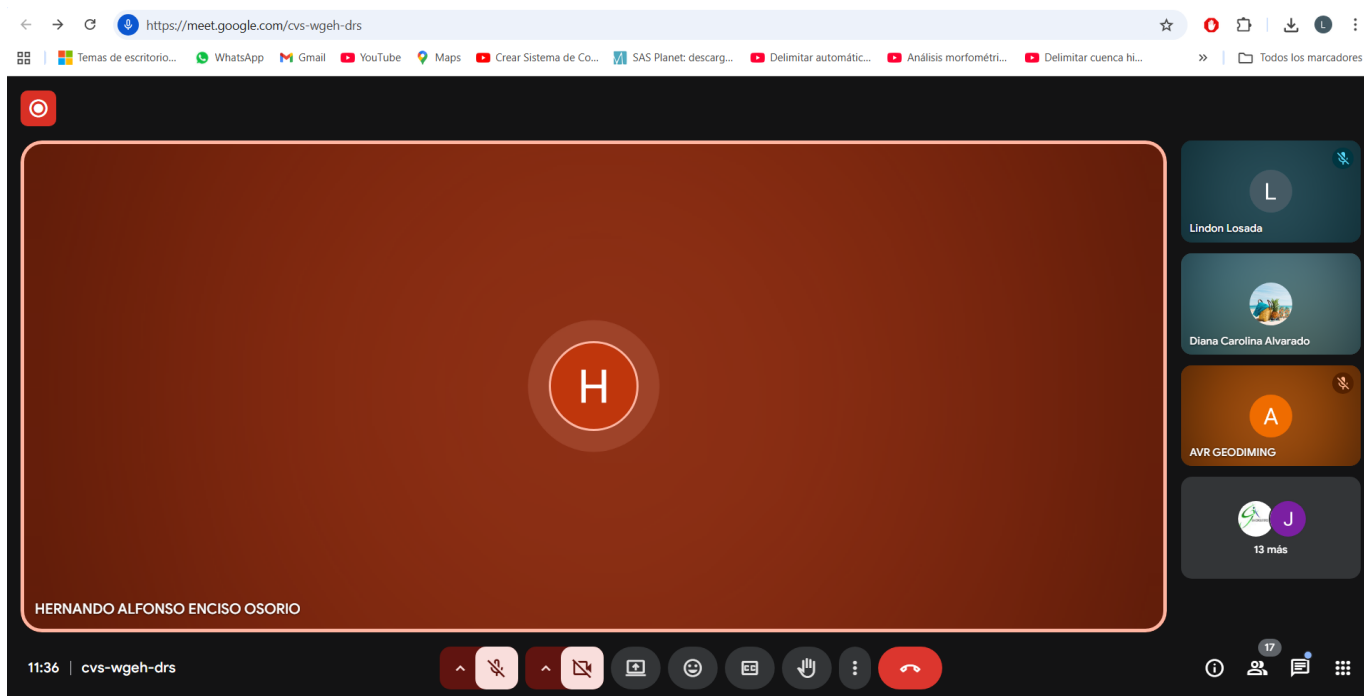

ORDEN DEL DÍA

Avances:

se presentan los avances en cada uno de los componentes

Geología, geomorfología 85%

Inventario movimientos en masa 100%

Mapas amenaza MM 2K 5K 25K terminados

Mapas de inundaciones Ajustados para verificación y análisis

Amenaza por torrencialidad se avanzó en topo batimetría en total avance menor

Vulnerabilidad encuestas 100%

Incendios Forestales entregado 100%

Exploración quinta versión pendiente aprobación por parte interventoría

Riesgos y medidas no se ha avanzado.

Prorroga:

Queda solo un mes de ejecución, se debe ajustar incorporando importancia sentencia rio Bogotá.

Igualmente aspectos como socialización con corporaciones y Municipios y la importancia de la entrega del producto y entrega de cartografía al IGAC.

Se pidieron 6 meses la corporación solicita verificar si el tiempo es suficiente.

Compromiso entregar los ajustes 31 de octubre de 2025 medio día

Interventoria entrega concepto 31 de octubre en la tarde

Tramite de cuenta:

Pendiente entrega de informe por parte de la interventoría.

Falta subir información al drive de la UAEGRD

Ya se entregó RAS y SUPERVISA.

Una vez se entreguen los pendientes se continua con el proceso

Compromisos y otros

- Entrega por parte de GEODING de informes técnicos subsanados de pago 2 segunda semana de noviembre (18 de nov) al 100%.
- Entrega y ajuste solicitud de prorroga 31 octubre, concepto de interventoría 31 octubre.
- Entrega supervisa RAS e informe más documentos 30 octubre.
- Radicación de cuenta en gobernación 6 Nov
- Radicado CORMAGDALENA para interventoría 5 de noviembre
- Traslado DP para dar respuesta por parte de la Interventoría 30 octubre. Interventoría da respuesta el 6 noviembre.
- UAEGRD soportes calamidad pública en el departamento.
