


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1								
										VERSIÓN	1									
										PÁGINA										
										16	12	2023								
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA		ACTA N° 4	POR CANTIDADES DE OBRA X							
										POR CONTRATO ADICIONAL		No.								
CONTRATO No.: 1006 de 2021										PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de agosto de 2031		PLAZO ACUMULADO: Hasta el 26 de julio de 2031								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALESTARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/07/2031								
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 990 de 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 300.149.391.398,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): N.A.								
INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 300.149.391.398,00										
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICCOIV	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICCOIV	GPP	ESPECIFIC.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
						DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
59	3	11608	3-11608	T	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m³-km	16.236.449,00	\$ 1.118	\$ 18.152.349.982	16.236.449,00	\$ 18.152.349.982			-	388.615,80	\$ 434.472.465	16.236.449,00	\$ 18.152.349.982	
60	3	11608	3-11608	T	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m³-km	5.549.440,00	\$ 1.118	\$ 6.204.273.920	5.549.969,40	\$ 6.204.865.789			-	19.333,60	\$ 21.614.965	5.549.969,40	\$ 6.204.865.789	
SUBTOTAL TRANSPORTES										\$ 24.377.548.702		\$ 24.378.083.229				\$ 469.436.648		\$ 24.378.083.229		
61	6	11603	6-11603	PC	500.1P-13	Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m³		\$ 972.717		23.908,00	\$ 23.255.718.036			-	13085,70	\$ 12.728.682.848	23.908,00	\$ 23.255.718.036	
62	2	11602	2-11602	SB	350.1P-13	Reciclado suelo cemento	m³		\$ 203.876		25.957,00	\$ 5.292.009.332			-	12700,90	\$ 2.589.408.689	25.957,00	\$ 5.292.009.332	
63	6	11604	6-11606	OA	663.1P-13	Tubería perforada para drenaje de 4"	m		\$ 26.267		47.998,00	\$ 1.260.763.466			-	13038,00	\$ 342.469.146	47.998,00	\$ 1.260.763.466	
64	6	11604	6-11604	OA	610-1P	Relleno para estructuras con subbase	m³		\$ 108.962		4.700,00	\$ 510.241.400			-	1944,70	\$ 211.120.521	4.700,00	\$ 510.241.400	
65	6	11604	6-11604	OA	630.7P-13	Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo	m³		\$ 400.932		500,00	\$ 200.466.000			-	243,10	\$ 97.466.569	500,00	\$ 200.466.000	
66	6	11606	6-11606	OA		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé.	m		\$ 3.832.328		1.040,00	\$ 3.985.621.120			-	160,00	\$ 613.172.480	1.040,00	\$ 3.985.621.120	
67	6	11604	6-11604	OA	670.5.1P	Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m	m3		\$ 2.159.925		300,00	\$ 647.977.500			-	0,00	\$ -	300,00	\$ 647.977.500	
68	6	11604	6-11604	OA	610.2P	Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)	m3		\$ 13.869		3.875,00	\$ 53.742.375			-	0,00	\$ -	3.875,00	\$ 53.742.375	
69	1	11601	1-11601	E	230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)	m3		\$ 90.881		1.120,00	\$ 101.786.720			-	858,40	\$ 78.012.250	1.120,00	\$ 101.786.720	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS												35.308.325.949				\$ 16.660.332.503		\$ 35.308.325.949		
AJUSTE AL PESO												\$ 75		826				\$ 901		
SUBTOTAL OBRAS (A)										\$ 239.068.605.409		\$ 239.068.605.409		-\$ 1.557.311.951		\$ 35.452.799.340		\$ 237.511.293.458		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										\$ 35.510.276.968		\$ 35.510.276.968		\$ -		\$ 6.292.665.999		\$ 35.510.276.968		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										\$ 1.100.000.000		\$ 1.100.000.000		-\$ 1.000.000.000,00		\$ -		\$ 100.000.000		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)										\$ 275.678.882.377		\$ 275.678.882.377		-\$ 2.557.311.951		\$ 41.745.465.339		\$ 273.121.570.426		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)										\$ 2.014.576.448		\$ 2.014.576.448		-\$ 16.688.049		\$ 305.063.018		\$ 1.995.888.399		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)										\$ 277.693.458.825		\$ 277.693.458.825		-\$ 2.576.000.000		\$ 42.050.528.357		\$ 275.117.458.825		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										\$ 1.725.000.000		\$ 1.725.000.000		\$ -		\$ 1.245.450.000		\$ 1.725.000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA										\$ 327.750.000		\$ 327.750.000		\$ -		\$ 236.635.500		\$ 327.750.000		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA										\$ 2.052.750.000		\$ 2.052.750.000		\$ -		\$ 1.482.085.500		\$ 2.052.750.000		
PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL										\$ -		\$ -		\$ 2.436.974.790,00		\$ -		\$ 2.436.974.790		
IVA - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL										\$ -		\$ -		\$ 463.025.210		\$ -		\$ 463.025.210		
TOTAL - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL										\$ -		\$ -		\$ 2.900.000.000		\$ -		\$ 2.900.000.000		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19)										\$ 20.079.182.573		\$ 20.079.182.573		\$ -		\$ -		\$ 20.079.182.573		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)										\$ 324.000.000		\$ 324.000.000		-\$ 324.000.000,00		\$ -		\$ -		
VALOR TOTAL										\$ 300.149.391.398		\$ 300.149.391.398		\$ -		\$ 43.532.613.857		\$ 300.149.391.398		
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción.																				
De acuerdo con la minuta de Modificación No 2, de fecha 16 de diciembre de 2023.																				
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.																				
Firma						Ing. CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 CONTRATISTA MAT PROF: 25202-19017 CND										ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA CONSORCIO ICAYECO 189 C.E. 1180018				
Revisión:																Ing. RICARDO BAEZ GARCIA JEFE UNIDAD EJECUTORA MAT PROF: 25202-086579 CND				
Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Matricula Profesional No.-19202-79853 CAU															Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON				
Director Territorial	Nombre: JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Matricula Profesional No.-19202-79853 CAU															Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON				
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA Matricula Profesional No.: 2520273263 CND.															Firmado digitalmente por ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA				
Original: Archivo Gestión del INVIAES. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial																				



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA		FECHA		16	12	2023
USUARIO EJECUTORA				PROGRAMA DE INVERSIONES		X		
				REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No.		1		
CONTRATO No: 1006 de 2021				PLAZO INICIAL:		122 MESES Y 3 DIAS		PLAZO ACUMULADO: 122 MESES Y 3 DIAS
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALESTARÁ (SOLUCIÓN SOSTE LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030)				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio de 2031		
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064				FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 990 de 2021		INTERVENIDOR: CONSORCIO CAYECO 189		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$300.149.391.398		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$0.00		
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 300.149.391.398				

[illegible][illegible]

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP.
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "valor básico de obra programada".
5. El porcentaje programado se calcula considerando el "valor básico de la obra" (sin incluir inversiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor de la OPA (A) y el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considerará aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se encuentren clasificados por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

PROVISIONES Y PASIVOS	V. ACTUAL	VALOR ELEGIDO	% DE ELEGIDO
PROVISION PARA PAGOS, OTRAS COMPENSACIONES Y/O ACCIONES	35,510,277	\$	
	35,510,277	\$ 4,198,521.80	11.82%
PROVISION PARA GASTOS DE TRABAJO A HORAS DIARIAS Y OVE DE LA EMBARC.	1,130,000	\$	
	1,000,000	\$	0.00%
PROVISION PARA PAGOS, AJUSTES Y OTRAS DE TRABAJO POR 24 HORAS	1,956,588	\$	
	1,726,000	\$ 190,105.75	9.44%
PROVISION PARA OTROS ACTIVOS Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS E INFORMES	1,726,000	\$	
	1,726,000	\$ 949,612.00	55.05%
IVA - REVERSION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS E INFORMES	307,350	\$	
	307,350	\$ 180,408.38	59.05%
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	2,638,975	\$	
	2,638,975	\$	0.00%
IVA- PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	853,025	\$	
	853,025	\$	0.00%
GESTION SOCIAL Y PREVEN. (IMPORTE IVA)	20,579,183	\$	
	324,000	\$	0.00%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CON COVID-19 (INCLuye IVA)	324,000	\$	
	324,000	\$	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (E)	61,880,786	\$	
VALOR TOTAL PROVISIONES (E) INCLUYENDO (F)	62,838,386	\$ 5,518,672.42	9.44%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CHAVE	668,391	\$	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CHAVE	668,391	\$ 50,299,201.03	13.42%

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la minuta de la


Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGÜEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 21502-40138 CND


Revisó: Firma: _____
Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU



Aprobado: Firma: _____
Nombre: ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1180218

Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTELLÓN
Director Territorial Cauca (E)
Matrícula Profesional No.: 15202-79653 CAJ

Rendo Firmo: 
 Nombre RICARDO BAEZ GARCIA
 Gerencia Grupo Sur Occidente
 Matrícula Profesional No. 25322/086579 CND

Revisó: Firma: _____
Nombre: ARIANA CAROLINA PAPA CARRANZA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 2520273263 CND

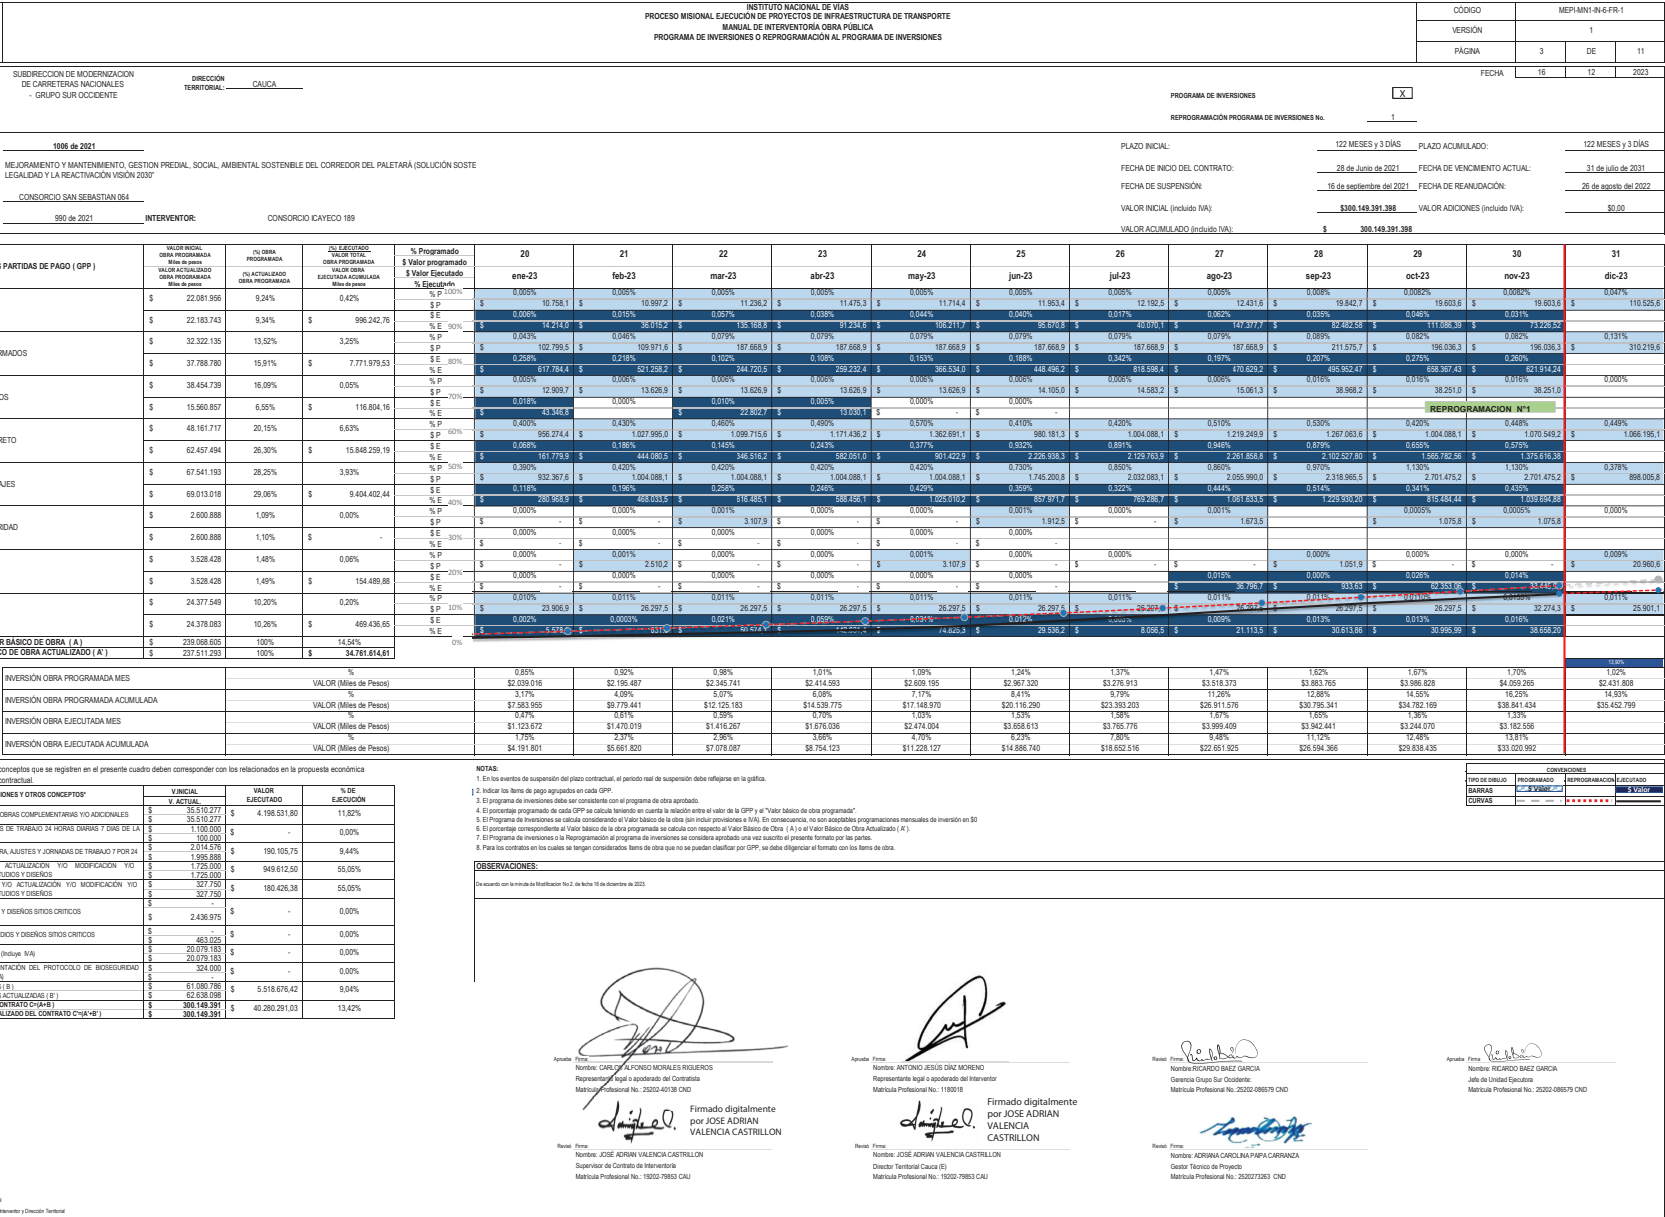



SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	FECHA		16	12	2023
UNIDAD EJECUTORA:			PROGRAMA DE INVERSIONES		X		
			REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.		1		
CONTRATO No:	1006 de 2021		PLAZO INICIAL:	122 MESES y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	122 MESES y 3 DÍAS	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARA LA REACTIVACIÓN VISION 2030)		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de Junio de 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 de Julio de 2021	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 864		FECHA DE SUSPENSIÓN:	16 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	26 de agosto del 2022	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	990 de 2021	INTERVENIDOR:	CONSORCIO CAYECO 189		VALOR INICIAL (Incluido IVA):	\$300.149.391.398	
			VALOR ACUMULADO (Incluido IVA):	\$ 300.149.391.398	VALOR ADICIONES (Incluido IVA):	\$0.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el "Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al "Valor Básico de Obra (A)" o el "Valor Básico de Obra Actualizado (A')".
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

OBSERVACIONES:	
De acuerdo con la minuta de la	

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor		\$ Valor
CURVAS			


Aprobado: Firma
Nombre: ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1190218


Firmado digitalmente
por JOSÉ ADRIAN
VALENCIA
CASTELLÓN

Revisó: Firma
Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTELLÓN
Director Técnico Cauca (S)
Matrícula Profesional No.: 11902-79603 CAU

Rascado Firmado

 Nombre RICARDO BAEZ GARCIA
 Generencia Grupo Sur Occidente
 Matricula Profesional No. 25202-086579 CND

Rascado Firmado

 Nombre ADRIANA CAROLINA PAPPACARRANZA
 Gestor Técnico de Proyecto
 Matricula Profesional No. 2520273263 CND

Aprobado Firma: 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 26202.086579 CND



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11

PROGRAMA DE INVERSIONES X

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	% VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor		\$ Valor
CURVAS	XXXX XXXX XXXX X	*****	

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la minuta de Modificación No 2, de fecha 16 de diciembre de 2023.

Agrado Firma 

Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: 25202-086579 CND



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11

PROGRAMA DE INVERSIONES X

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	% VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor		\$ Valor
CURVAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la minuta de Modificación No 2, de fecha 16 de diciembre de 2023.

Aprobó: Firma 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202/08579 CND

Revisó Firma: 

Nombre: ACRUNA CAROLINA PAIPA CARRANZA
 Gestor Técnico de Proyecto
 Matrícula Profesional No.: 2520273263 CND



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA
-------------------	---	------------------------------

☐

VALOR ACUMULADO (INCLUISS IMA):	\$	300.149.391.398
---------------------------------	----	-----------------

[illegible]

CONVERSIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	S Valor		S Valor
CURVAS	XXXX XXXXX XXXXXX X	*****	

OBSERVACIONES:	
De acuerdo con la minuta de Modificación No 2, de fecha 16 de diciembre de 2023.	

[Signature]



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11

		FECHA	16	12	2023
PROGRAMA DE INVERSIONES			X		
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.			1		
PLAZO INICIAL:	122 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	122 MESES Y 3 DÍAS		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de Junio de 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 de Julio de 2031		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	16 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	26 de agosto del 2022		
VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$300,145,391.388	VALOR ADICIONES (incluido IVA)	\$0.00		
VAL (O ACUM) (O ADO) (incluido IVA)	\$ 300,145,391.388				

[illegible]

CONVERSIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor		\$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:	
De acuerdo con la minuta de Modificación No 2, de fecha 15 de diciembre de 2023.	

Aprobó: Firms 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202.086579 CND


 Rueda Firma
 Nombre: ADRUNA CAROLINA PAPA CARRANZA
 Gestor Técnico de Proyecto
 Matrícula Profesional No.: 2520273263 CND



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR REAL OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos		OBRAS PROGRAMADAS % OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos	VALOR REAL OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos		OBRAS PROGRAMADAS % OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos	% Programado \$ Valor programado % Ejecutado	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	112 sep-30	113 oct-30	114 nov-30	115 dic-30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos			VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos																
	VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos			VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos																
	VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos			VALOR ACTUALIZADO OBRAS PROGRAMADAS \$ Mil de pesos																
EXPLICACIONES	\$ 22.183.956	9,24%	\$ 996.242,76	0,42%	\$ 22.183.956	9,24%	\$ 996.242,76	0,42%	\$ 22.183.956	9,24%	\$ 996.242,76	0,42%	\$ 22.183.956	9,24%	\$ 996.242,76	0,42%	\$ 22.183.956	9,24%	\$ 996.242,76	0,42%
BASE, SUB BASES Y AFIRMADOS	\$ 32.302.135	13,52%	\$ 3.259	0,00%	\$ 32.302.135	13,52%	\$ 3.259	0,00%	\$ 32.302.135	13,52%	\$ 3.259	0,00%	\$ 32.302.135	13,52%	\$ 3.259	0,00%	\$ 32.302.135	13,52%	\$ 3.259	0,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 37.788.780	15,91%	\$ 7.771.979,53	3,25%	\$ 37.788.780	15,91%	\$ 7.771.979,53	3,25%	\$ 37.788.780	15,91%	\$ 7.771.979,53	3,25%	\$ 37.788.780	15,91%	\$ 7.771.979,53	3,25%	\$ 37.788.780	15,91%	\$ 7.771.979,53	3,25%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$ 38.454.739	16,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 38.454.739	16,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 38.454.739	16,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 38.454.739	16,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 38.454.739	16,09%	\$ 0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 15.560.857	6,55%	\$ 116.804,16	0,05%	\$ 15.560.857	6,55%	\$ 116.804,16	0,05%	\$ 15.560.857	6,55%	\$ 116.804,16	0,05%	\$ 15.560.857	6,55%	\$ 116.804,16	0,05%	\$ 15.560.857	6,55%	\$ 116.804,16	0,05%
SERIALIZACION Y SEGURIDAD	\$ 48.161.717	20,15%	\$ 6,63%	0,00%	\$ 48.161.717	20,15%	\$ 6,63%	0,00%	\$ 48.161.717	20,15%	\$ 6,63%	0,00%	\$ 48.161.717	20,15%	\$ 6,63%	0,00%	\$ 48.161.717	20,15%	\$ 6,63%	0,00%
OBRAS VARIAS	\$ 62.457.494	26,30%	\$ 15.848.259,19	6,55%	\$ 62.457.494	26,30%	\$ 15.848.259,19	6,55%	\$ 62.457.494	26,30%	\$ 15.848.259,19	6,55%	\$ 62.457.494	26,30%	\$ 15.848.259,19	6,55%	\$ 62.457.494	26,30%	\$ 15.848.259,19	6,55%
TRANSPORTES	\$ 67.541.913	28,25%	\$ 3,93%	0,00%	\$ 67.541.913	28,25%	\$ 3,93%	0,00%	\$ 67.541.913	28,25%	\$ 3,93%	0,00%	\$ 67.541.913	28,25%	\$ 3,93%	0,00%	\$ 67.541.913	28,25%	\$ 3,93%	0,00%
	\$ 69.013.018	29,06%	\$ 9.404.402,44	3,93%	\$ 69.013.018	29,06%	\$ 9.404.402,44	3,93%	\$ 69.013.018	29,06%	\$ 9.404.402,44	3,93%	\$ 69.013.018	29,06%	\$ 9.404.402,44	3,93%	\$ 69.013.018	29,06%	\$ 9.404.402,44	3,93%
	\$ 2.600.888	1,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 2.600.888	1,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 2.600.888	1,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 2.600.888	1,09%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 2.600.888	1,09%	\$ 0,00%	0,00%
	\$ 2.600.888	1,10%	\$ -	0,00%	\$ 2.600.888	1,10%	\$ -	0,00%	\$ 2.600.888	1,10%	\$ -	0,00%	\$ 2.600.888	1,10%	\$ -	0,00%	\$ 2.600.888	1,10%	\$ -	0,00%
	\$ 3.528.428	1,48%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 3.528.428	1,48%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 3.528.428	1,48%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 3.528.428	1,48%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 3.528.428	1,48%	\$ 0,00%	0,00%
	\$ 3.528.428	1,49%	\$ 154.489,88	0,01%	\$ 3.528.428	1,49%	\$ 154.489,88	0,01%	\$ 3.528.428	1,49%	\$ 154.489,88	0,01%	\$ 3.528.428	1,49%	\$ 154.489,88	0,01%	\$ 3.528.428	1,49%	\$ 154.489,88	0,01%
	\$ 24.377.549	10,20%	\$ 0,20%	0,00%	\$ 24.377.549	10,20%	\$ 0,20%	0,00%	\$ 24.377.549	10,20%	\$ 0,20%	0,00%	\$ 24.377.549	10,20%	\$ 0,20%	0,00%	\$ 24.377.549	10,20%	\$ 0,20%	0,00%
	\$ 24.379.083	10,26%	\$ 489.436,85																	

Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

OBSERVACIONES:	
De acuerdo con la minuta de Modificación No. 2, de fecha 16 de diciembre de 2023.	

Jonathan Flores 

Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

