






		ACTA DE REUNIÓN GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		COORD: F-GIA-01
				VERSIÓN: 2
FECHA: 3/11/2023	LUGAR: Videoconferencia	Pág: 1	De: 2	
HORA DE INICIO: 4:00 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	ACTA No.	030	
ASISTENTES				
NOMBRE		CARGO		
David Tovar		Coordinador de la intervención.		
Mara Portilla		Ing. Civil		
Andrés Martín		Ing. Apoyo de la consultoría		
Camila Obando		Supervisora Gobernación de Nariño		
Diego Gavidia		Ing. Apoyo de la intervención		
Eleen Cuevas		Ing. Apoyo de la intervención		
João Lozano		Director de la intervención		
OBJETO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento GIA-097-Tablón.				
AVANCES Y ACUERDOS				
<p>Se da inicio a la reunión con la presentación de cada una de las partes, como orden del día esta:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Avances contrato de consultoría ② Actividades revisadas y evaluadas y revisadas por interventoría. <p>El Ing. Diego realizó intervención explicando la entrega 1 de la consultoría que se centra en generalidades como la topografía, geología, geomorfología, etc. mencionando el Ing. Diego que todo fue recibido y evaluado.</p> <p>Segundo producto: fue recibido avalado y aprobado (Supervisor).</p> <p>Métodos: Ing. David menciona que este avance se encuentra al 50% pero por inconvenientes por parte del consultor, se obtiene un porcentaje de la mitad, actualmente esta semana fue recibido un documento estipulando en los compromisos anteriores y está en proceso de reunión.</p> <p>- prospección geotécnica: los laboratorios aún no se han ejecutado según última versión 7 del cronograma de actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de perforación si fueron recibidos. • Consolidaciones son 15 el Ing. Diego de interventoría opina con laboratorios. • Consultoría envía el plan completo para que sea recibido y evaluado por interventoría antes de las fechas. • Caracterización: atraso del 90% no se ha recibido evidencia (Están en reunión por parte de interventoría). • Se va a trabajar los laboratorios de caracterización interventoría y consultoría empezando con la curva. • Se realizó entrega de secciones de perfiles. • fueron evaluados el día 2 de nov. los diferentes métodos con sus correcciones, interventoría está cambiando. • Consultoría deja en carta radica la solicitud por todas las medidas solicitando los datos a la alcaldía de Nariño. • la Supervisión menciona que para este tipo de información de datos se copie o agite a ella para mayor facilidad de datos. 				

		ACTA DE REUNIÓN GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		Codigo: F-GIA-01 Version: 2	
FECHA: 03/11/2023 HORA DE INICIO: 4:00 p.m.		LUGAR: videoconferencia HORA DE FINALIZACIÓN:		Pág: 1 De: 2 ACTA No.: 030	
AVANCES Y ACUERDOS					
<ul style="list-style-type: none"> - la supervisión menciona que para culminar el proyecto queda un mes y quiere saber si se puede culminar el desarrollo del contrato. - El director de interventoría Jairo responde que no es posible culminar y habla sobre una solución y el lunes deberá recibirse el tomo de incendios forestales, mientras se sigue en interventoría, El director habla sobre un documento con todas las actividades. - Solución reunión con consultoría y Director de interventoría con un tiempo de promesa. (Debe ser enviada antes del 20 de noviembre) - Ing. Diego realiza una intervención a la supervisión de la consultoría. - la Ing. María Angélica inicia con la presentación para la elección del método de incendios forestales. El Ing. Fabian menciona la valoración del método desde el anterior censo vunitario. - El Ing. Fabian habla sobre los datos que obtuvo la geología por parte de interventoría Lisseth. - El director Jairo sugiere que los intervalos de las variables deben adaptarse al medio en el que se desarrolla el fenómeno. - Recomendado por interventoría el método de densidad a través de zonas de condición única que involucren la geomorfología, la cobertura 					
COMPROMISOS					
DESCRIPCIÓN		RESPONSABLE		FECHA	
plan completo		consultoría		7/11/2023.	
sección (Perfiles)		consultoría		8/11/2023.	
Envío Método de densidad.		consultoría		8/11/2023.	
EN CONSTANCIA FIRMAN:					
NOMBRE	CARGO	FIRMA			
David Tovar	Coordinador Interventoría				
Eleen Echeverri	Ing. Apoyo Interventoría				
maría Portilla	Ing. civil de la consultoría				
Andrés Martín	Ing. Apoyo de consultoría				
Carmela Obando	Supervisora Gobernación				
Jairo Lozano	Director de Interventoría				
Diego Gavidia	Ing. Apoyo de Interventoría	 Diego Gavidia.			



GIA Consultores

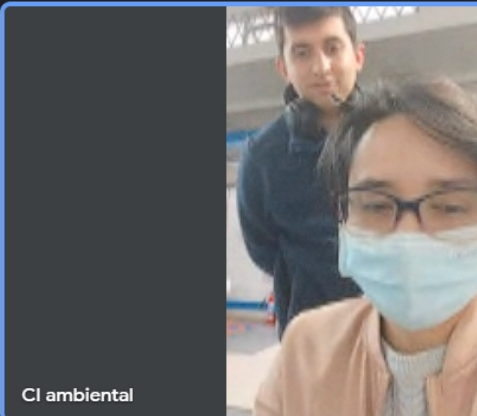

CI ambiental




Andres Martin



Camila Obando



Fabian Alejandro Cruz Martinez

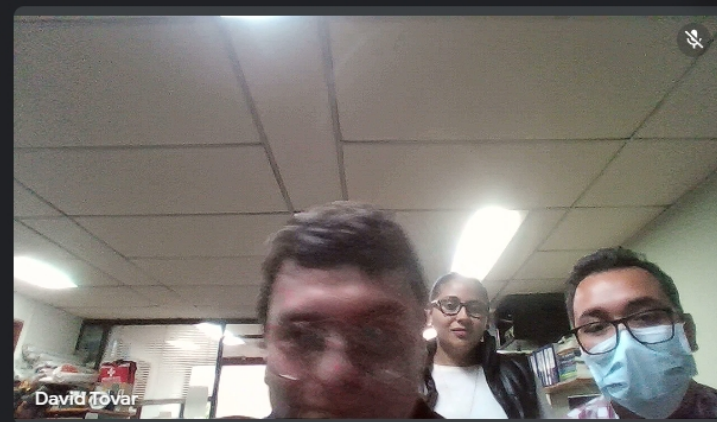

David Iovar

16:08 | fwxf-gsz-paj

