

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_009	LUGAR: Presencial Sede Principal MinTic y Virtual Microsoft Teams	FECHA: 26/03/2025	HORA DE INICIO: 9:54 am	HORA FINAL: 10:22 am

OBJETO DE LA REUNION
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de marzo de 2025.

ORDEN DEL DÍA
1. Avances Generales. 2. Actividades Claves.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4.	En Proceso (Pendiente de Aprobación Memorias de Calculo por parte de la Supervisión)
2	Realizar la Proyección de entrega de los Municipios.	En proceso (En Revisión por parte de la Supervisión)
3	Realizar mesa de trabajo para realizar la entrega de la expansión de red.	Culminado
4	Realizar mesa de trabajo para la actualización de las memorias de Cálculo.	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Específico N. 4, entre InterNexa y el equipo de MinTic, el propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 1. Avances Generales Internexa informó que la entrega de los 13 (trece) municipios está programada para el mes de abril de 2025, los cuales tienen capacidad terrestre y algunos tienen respaldo satelital. Actualmente, el avance es del 90% y hasta el momento no existe ningún riesgo materializado. Se realizaron las mesas técnicas para culminar la entrega formal de la expansión, y con ello programar la revisión en campo por parte de MinTic.

Sobre los 5 (Cinco) municipios (Certegui, Unión Panamericana, Tadó, Istmina y Condoto) de los 6 municipios (Atrato) que fueron habilitados y entregados MinTic indica que se podría avanzar con el fin de incluirlos en la convocatoria de remanentes.


1. Actividades Claves

Durante la sesión InterNexa hizo énfasis en la importancia de la definición de la tecnología para brindar la capacidad de los trece (13) municipios (Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Litoral de San Juan, Jurado, Medio Atrato, Nuquí, Sipí, Unguía, Vigía del Fuerte), los cuales están programados contractualmente para entrega en el mes de septiembre de 2025. Este cronograma se basa en el hecho de que el despliegue debería iniciarse la primera semana del mes de marzo 2025, considerando que todos son nodos de construcción, sin embargo, aún se siguen evaluando en conjunto con MinTIC las alternativas en radio que pueden ser utilizadas para el despliegue en estos municipios

InterNexa y MinTIC señalaron que será necesario llevar a cabo una reingeniería para pasar la solución a Radio en estos municipios, ya que estos municipios fueron contemplados con una solución satelital en el Acuerdo 3. Para ello se deberá cumplir con la debida diligencia y la documentación necesaria para garantizar que todas las alternativas sean evaluadas de manera adecuada y así poder validar una suspensión del cronograma y el posible aplazamiento de las futuras entregas.

Se indicó que el municipio de Bagadó tiene una fecha de entrega prevista para el 13 de abril de 2025. Sin embargo, se evaluará la posibilidad de adelantar la entrega con el fin de facilitar la suscripción de los contratos con Fomento a través de la fiduciaria.

MinTic indicó estar de acuerdo con los ajustes realizados, sin embargo, aún no se emite concepto de aprobación en las memorias de cálculo e Internexa indica que adicional a la memoria de cálculo se dará a conocer una base donde se muestre los ajustes que se realizaron. Por otro lado, se indicó que para el municipio de Turbo se presentó un ISP, el cual fue rechazado. En este sentido, MinTic informó que tiene programado para finales de la próxima semana el lanzamiento de la convocatoria de remanentes y posteriormente se llevará a cabo la convocatoria tipo 2.

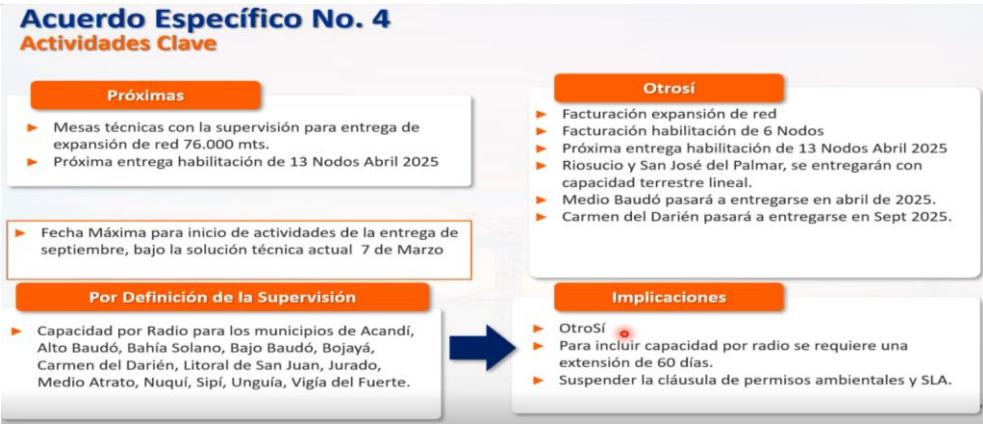



	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Realizar el envío del comunicado correspondiente sobre la debida diligencia para la entrega de los municipios del mes de septiembre.	Internexa	31/03/2025
Realizar el estudio de los municipios que actualmente están en Satelital y que pasarán a Radio.	Internexa	31/03/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
John Jairo González	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Oscar Julian Ayala	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Marco Fontecha	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
Sebastián Chaparro	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Luis Fernando Jiménez	Profesional Especializado Dirección de Infraestructura	MinTic
Monica del Rosario Paz	Profesional Especializada Subdirección de Estructuración	MinTic
Gloria Patricia Perdonó Rangel	Oficina Fomento Regional	MinTic
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Gómez	Gerente de Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Melissa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Juan Diego Bedoya	Especialista PNC Jr • Dirección PNC	Internexa
Juliana Saldarriaga	Especialista Jurídico y Relaciones Institucionales	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Angela Ríos	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa
Andres esteban Vasquez	Especialista Expansion	Internexa
Nina Elizabeth Pinto	Especialista Compliance	Internexa
Juan Gabriel Guacaneme	Analista Administrativo	Internexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo	Internexa
Katherine Camargo	Analista Administrativo	Internexa

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	Inicial JFCR Inicial km DocuSigned by: DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO 76AFED9F38FE430...
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Inicial Luis F. Acero Firmado por:  6AAA3E2A9BB14AF
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Inicial LFRC Inicial MRPS Firmado por:  C99EA4CCE7F348A...

Anexos
• 13. Comité Operativo 26032025

Comité Operativo

Proyecto Conectividad Para Cambiar Vidas

Convenio 790 de 2023




Honrando el pasado, celebrando
el presente, y proyectando el
futuro para seguir construyendo
un mundo digitalmente humano.





Acuerdo Específico 2

Timeline Expansión de Red

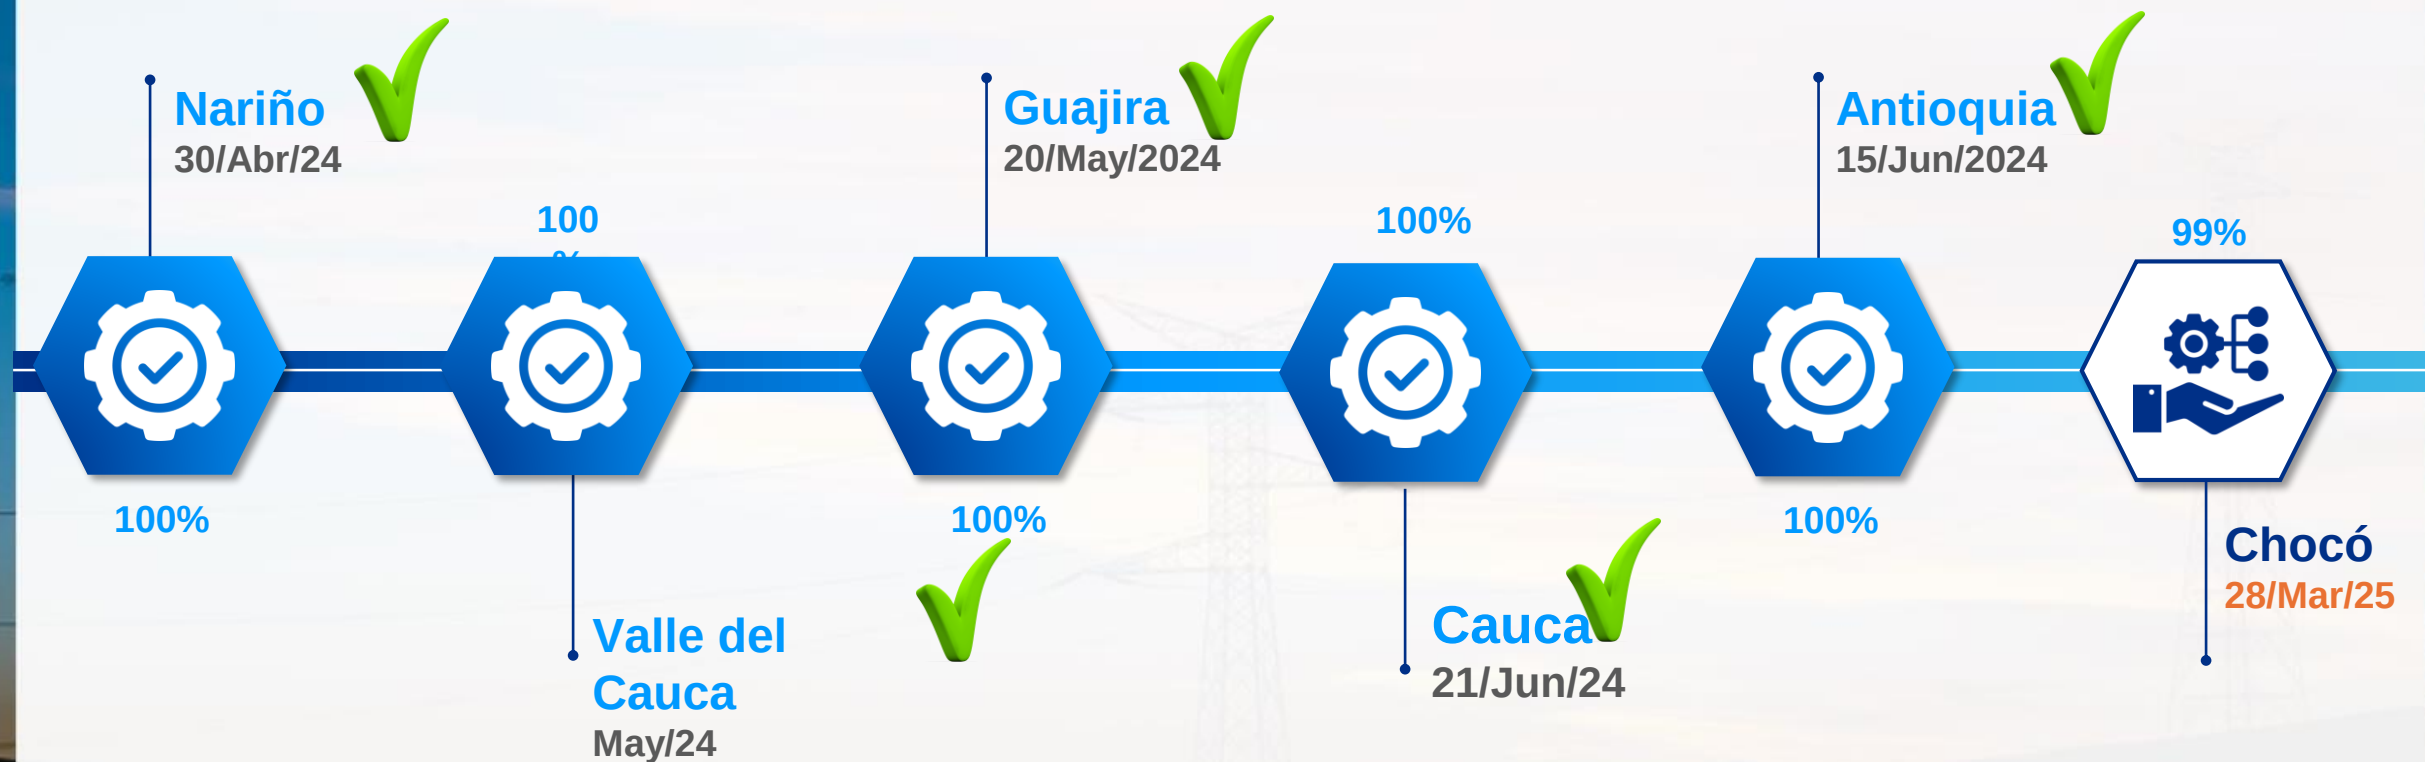

Avances Implementación

TRAMO	ORIGEN	DESTINO	KM A CONSTRUIR (Incluye reservas)	KM CONSTRUIDOS	ESTADO
Tramo 1	Medellín	Peñalisa	78.3 Km	78.3 Km	Terminado En proceso de pruebas
Tramo 2	Peñalisa	Carmen de Atrato	58 Km	58 Km	Terminado En proceso de pruebas
Tramo 3	Carmen de Atrato	Quibdó	105 Km	105 Km	Terminado En proceso de pruebas



- Tramo 1
Medellín – Peñalisa
- Tramo 2
Peñalisa – Carmen de Atrato
- Tramo 3
Carmen de Atrato - Quibdó

Ejecución Financiera

Valor Total del AE2 \$ 270,588,385,506

Red Troncal ITX \$ 172,313,115,309

Recursos Desembolsados a ITX \$ 76,636,561,912

➡ 44%

En proceso de legalización
\$ 5.126.097.281 (5%)

Facturas Emitidas \$ 8,737,434,241

➡

- ▶ Capacidad Fija Diciembre y Enero
- ▶ Capacidad Variable Diciembre y Enero


Pendiente Facturación \$ 0

➡


- ▶ Capacidad Fija Febrero
- ▶ Capacidad Variable Febrero

Ejecución Financiera

Ejecución Presupuestal

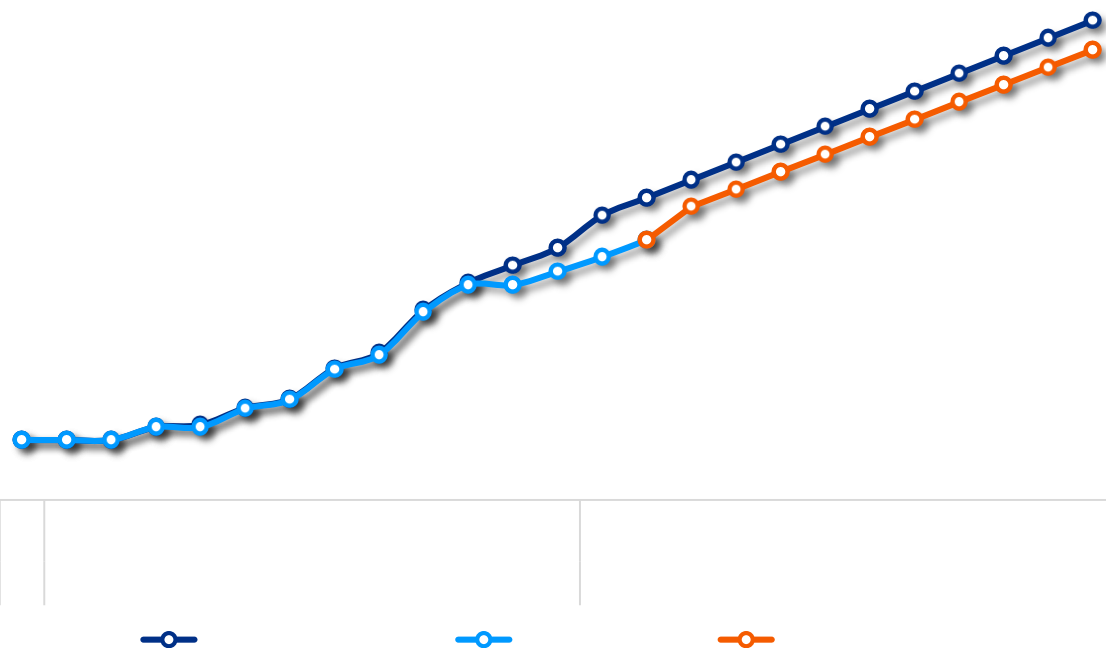

Pendiente aprobación comité:

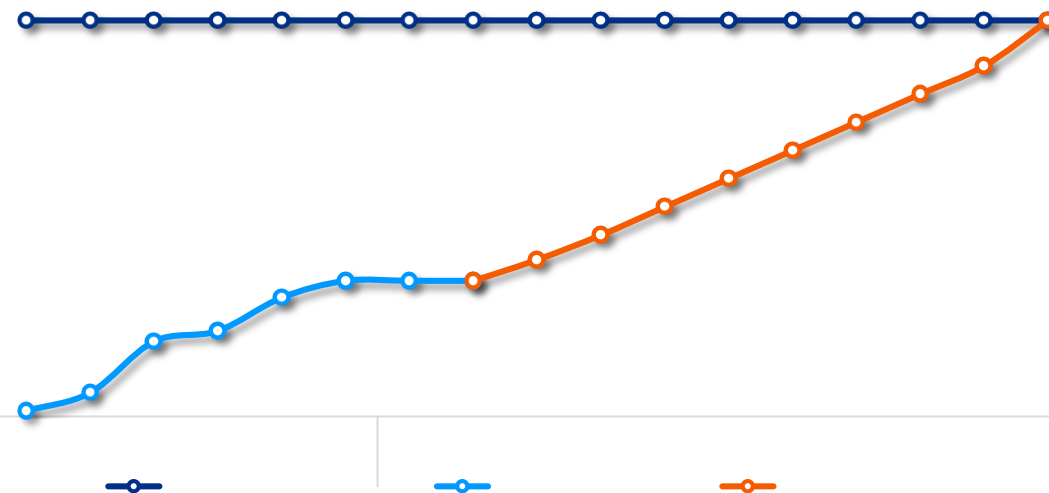

- ▶ Ejecución financiera de la red troncal al 99% - 4% red de Acceso: 40% sobre presupuestado en 2024
- ▶ Ejecución financiera luego de medidas ~ 50% Pago inicial por habilitación de Municipios adicionales + hogares legalizados

Etapa de Operación

			Observaciones supervisión	
				En revisión de interventoría
				En revisión de interventoría
				En revisión de interventoría

Etapa de Operación

R1 – Riesgo Reputacional derivado de la administración de los recursos

R2 – Dificultades para lograr la

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y

R4 – Falta de alineación en los acuerdos y comunicaciones entre los grupos de interés del proyecto

R5 – Desfase o desviaciones en el diseño / implementación de la red

R6 – Fallas en la integración del

R7 – Distorsión de mercado y afectación de competencia

R8 – Dificultades de gestión

R9 – Dificultades para realizar una planeación adecuada del proyecto

R10 – No disponer oportunamente

R11 – Riesgo de liquidez

Etapa de Operación

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y



1. Demoras o no obtención de permisos ambientales (licencia ambiental, permisos ambientales).
2. Dificultades en el relacionamiento con comunidades del área de influencia del proyecto (consulta previa).
3. Situaciones sociopolíticas de las zonas adversas.
4. Inconvenientes en gestión de servidumbres o paso por predios privados.
5. Situaciones adversas en zonas de conflicto armado y orden público complejo.

Situación identificada en



En la expansión del departamento de Chocó, específicamente para el tramo de Carmen de Atrato – Quibdó, comunidades indígenas que no permiten la instalación

Interventoría reconoció los Eventos de Fuerza Mayor que se presentaron en Chocó y por consiguiente se presenta un corrimiento de la fecha de entrega de la expansión


21 Febrero se radicó actualización, solicitando ampliación de fecha para entregar la expansión de Chocó

Acompañamiento ISP's

Convocatoria 1 2023 AE2

Fecha adjudicación: 1 de febrero 2024

Avance Conexión hogares



Avance: 91%

Ejecución: \$ 3.853.499.956,19

Convocatoria 1 y 2 2024 AE2



Fecha adjudicación: 30 de julio 2024

Avance Conexiones hogares




Avance: 9 %

Ejecutado : 0

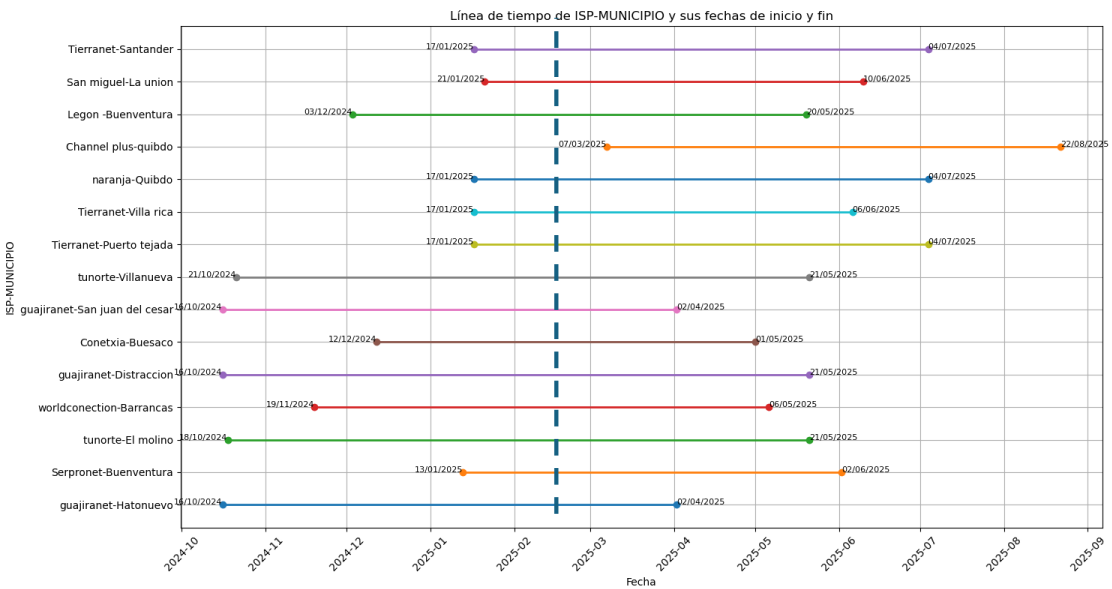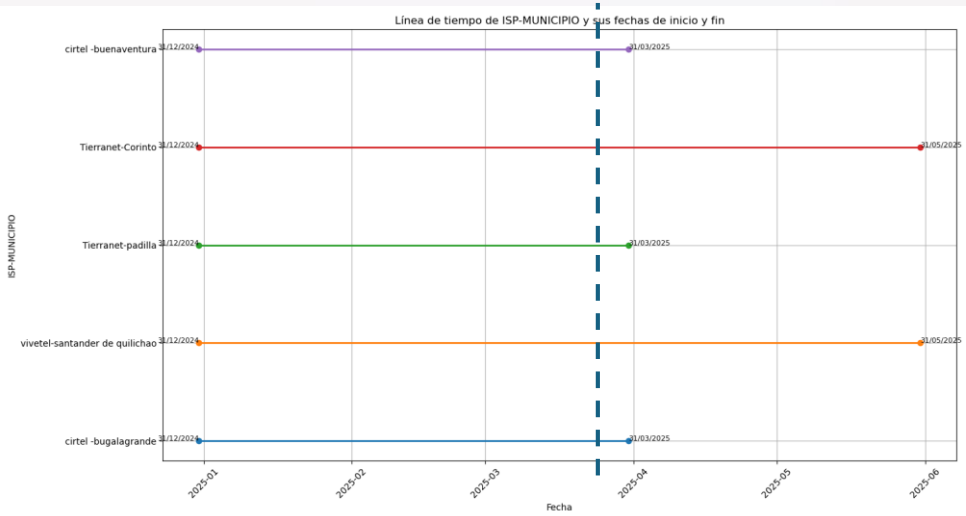

Acompañamiento ISP's

Fecha adjudicación: 26
noviembre 2024

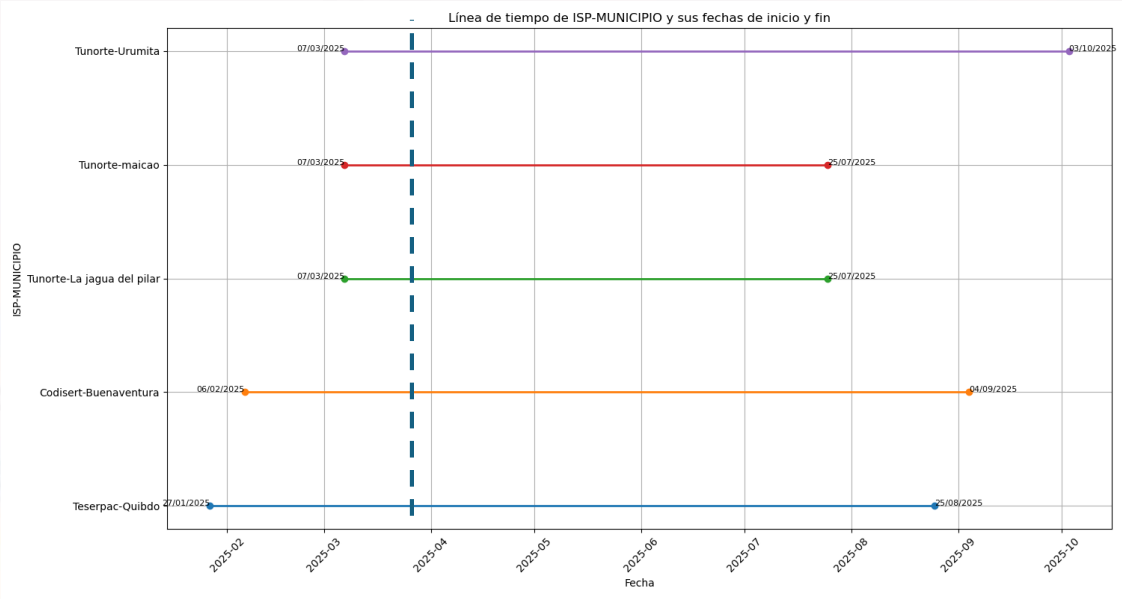

: Subsanación
Fecha adjudicación

: Validación subsanación
Fecha adjudicación

Acompañamiento ISP's

- ▶ Material de validación de soporte de hogares
- ▶ Videos de iniciación y explicación de proceso completo
- ▶ Construcción de tablero de seguimiento asistencia



TEMA	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost
APROPIACION DE CONOCIMIENTO EN EL USO DE INTERNET							
COMO LEGALIZAR SU EMPRESA ISP							
CONTRATOS DEL ESTADO QUE DEBE TENER EN CUENTA							
SST IMPORTANCIA							
CONFIGURACION DE BW MICROTIC, MEJORES PRACTICAS							
TEMAS FINANCIEROS PARA TI							
MODELOS OPERACIONALES							
COMERCIALIZACION Y VENTAS							
SERVIDUMBRES							
CRECION DE MARCA							
WEBMINARS Routers MICROTIC							
TRIBUTACION SOBRE ISP							
MINIFORO FTTx Conectividad sin limite							

Contratos y pólizas

Pólizas	Otrosíes
reportar a la aseguradora (Otrosíes) >>	Otrosí No 2 Otrosí No 2 Net Otrosí No 2
Pendiente pólizas>>	Otrosí No 3
Otrosíes >>	Net Otrosí No 3 Otrosí No 4

Pólizas	Otrosíes
Otrosíes >>	Guajiranet Otrosí No 1 Tunorte Otrosí No 1

Pólizas	Otrosíes

- ▶ Retomar mesas de trabajo jurídicas (ANS).
- ▶ Aprobación facturación ISP.
- ▶ Revisión memorias de cálculo ajustadas (Otrosí).
- ▶ Autorización de pago facturas aprobadas en el Comité Asesor 46 – Orden de pago.



Acuerdo Específico 1



Acuerdo Específico 3

Cierre y Liquidación

▶ Acta de liquidación





Acuerdo Específico 4

- Convocatoria ISP AE4 en proceso de revisión por parte de Supervisión e ISP.

Elaboración Anexos Técnicos

8 Jul – 20 Ago. 2024.




Avance Expansión de Red

% Avance tendido	Acondicionamiento	ML Tendidos	Pendiente por tender
100 %	74000	76000	0



Habilitación de Nodos

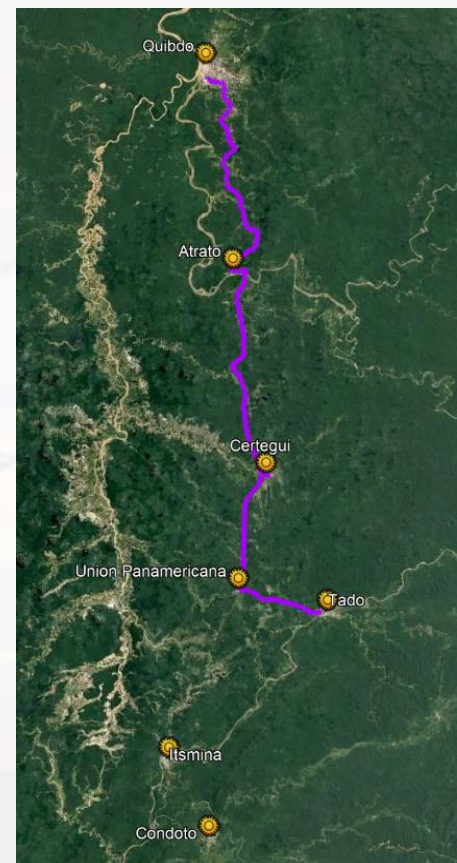

-
- Cértegui
- Unión
-
- Tadó
-
-

Habilitación de Nodos



Habilitación de Nodos



Unión Panamericana

Acuerdo Específico

Próximas

- ▶ Mesas técnicas con la supervisión para entrega de expansión de red 76.000
- ▶ Próxima entrega habilitación de 13 Nodos Abril 2025

- ▶ Fecha Máxima para inicio de actividades de la entrega de septiembre, bajo la solución técnica actual 7 de Marzo

Por Definición de la Supervisión

- ▶ Capacidad por Radio para los municipios de Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Litoral de San Juan, Jurado, Medio Atrato, Nuquí, Sipí Unguía, Vigía del Fuerte.



OtroSí

- ▶ Facturación expansión de red
- ▶ Facturación habilitación de 6 Nodos
- ▶ Próxima entrega habilitación de 13 Nodos Abril 2025
- ▶ Riosucio y San José del Palmar, se entregarán con
- ▶ Medio Baudó pasará a entregarse en abril de 2025.
- ▶ Carmen del Darién pasará a entregarse en Sept 2025.

- ▶ OtroSí
- ▶ Para incluir capacidad por radio se requiere una extensión de 60 días.
- ▶ Suspender la cláusula de permisos ambientales y



Acuerdo Específico 5

Acuerdo Específico



Información Acuerdo

Actividades Foco

- ▶ Otrosí para unificar cronograma de entrega Grupo2 y Grupo 3 (140 a 200 juntas).
- ▶ **Alineación de actividades PBS.**
- ▶ **Cumplimiento requisitos Desembolso 2.**
- ▶ Segunda parte del Desembolso No. 1 a Fiducia (Recursos Nación)
- ▶ **Facturación entrega G1.**

Principales Riesgos

- ▶ Restricción de acceso a veredas por temas de orden público o de índole natural.
- ▶ Posible cambio de tipo de tecnología a la hora de
- ▶ Cronograma de implementación de los integradores:

Acuerdo Específico No.5

Confirmación G4

Confirmación G5



Adjudicación 10/03

• Corte 10/03/25

Implementación

- Distribución de las 59 juntas satelitales instaladas



Atlántico	
Bolívar	
Boyacá	
	7
Córdoba	
Quindío	
	59

Estado actual G1:

- Aprobación documental 59 juntas 25/03, inicio mes de estabilización 06/03.
- Pendiente definición con respecto a las visitas a sitio
- Cronograma de implementación de los integradores:



-




Google Maps

Quindío	
Boyacá	
Bolívar	
Córdoba	
Atlántico	
Caquetá	
Nariño	

- ▶ Se han encontrado 5 juntas con novedades en terreno o que se ha informado cancelación de implementación por parte de la comunidad a MinTIC.



Proceso Diciembre

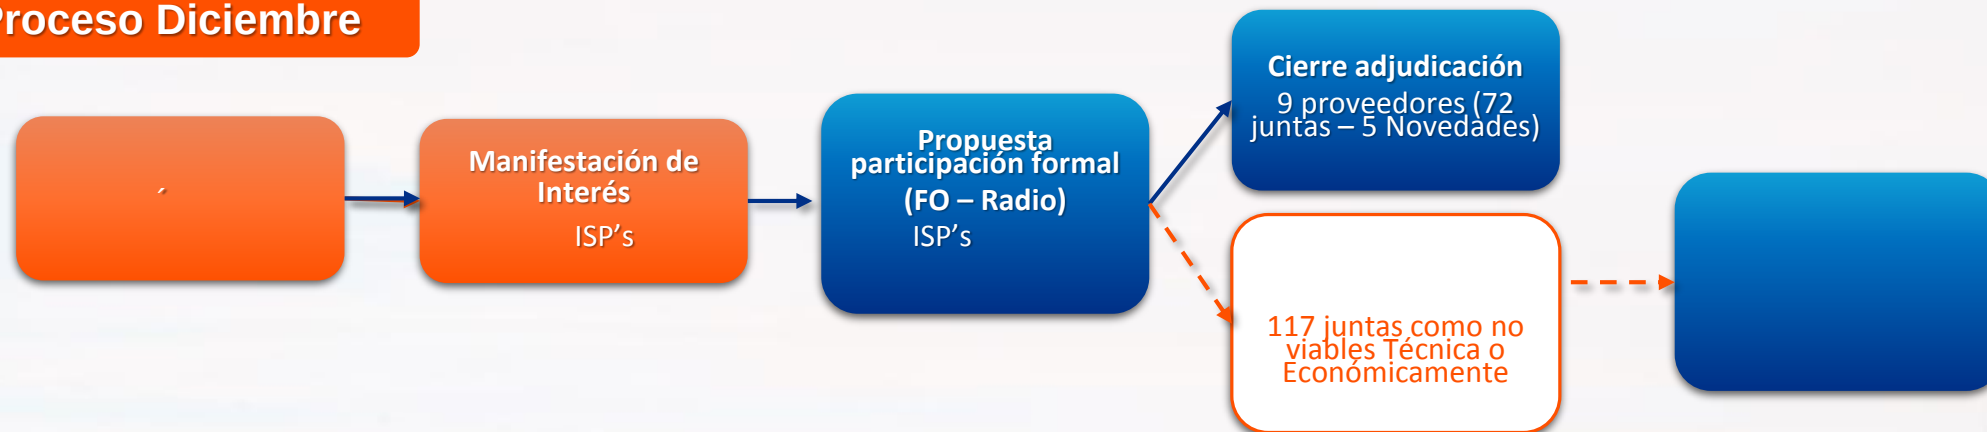

Proceso Enero



			Observaciones supervisión	
			Correo electrónico 30 diciembre	
		251021580 del 28/02/2025		
				En revisión MINTIC





- ▶ Se entregó el informe mensual de
- ▶ Publicación respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar, del informe final de evaluación y listado
- ▶ Aprobación Reglamento del Comité



- ▶ Revisión Escalamiento retenciones
- ▶
- ▶ Optimización de los tiempos de respuesta para la firma de contratos y aprobación de pólizas.
- ▶ Actualización del Manual Operativo.

¿Qué sigue?





¡Gracias!



Operador **Mayorista** de
servicios e infraestructura
de **Conectividad**

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 8456A2D9-7982-4F93-A001-4175EECA8AE1
Asunto: GDO-TIC-FM-009_Acta_de_reunion_AE4.pdf, 13. Comité Operativo 26032025
A. Número de contrato:
B. Tipo:
C. Número de cláusula:
D. Correo del ordenador de gastos:
Sobre de origen:
Páginas del documento: 38
Páginas del certificado: 6
Firma guiada: Activado
Sello del identificador del sobre: Activado
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Estado: Completado

Autor del sobre:
KATHERINE MILENA CAMARGO CASTAÑO
Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5
Medellín, Bogota 00000
ITX_E_kcamargo@internexa.com
Dirección IP: 45.238.182.255

Seguimiento de registro

Estado: Original
21/04/2025 15:47:55
Titular: KATHERINE MILENA CAMARGO
CASTAÑO
ITX_E_kcamargo@internexa.com

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante

JOHN FREDY CHIA R
jchia@internexa.com
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 186.86.32.37

Fecha y hora

Enviado: 21/04/2025 16:00:43
Visto: 21/04/2025 16:03:50
Firmado: 21/04/2025 16:04:14

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 21/04/2025 16:03:50
ID: 16c5c5d7-7cb7-4948-a46e-493d69ca6b3e

Luis Fernando Jiménez
ljimenez@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 190.0.240.4

Enviado: 21/04/2025 16:00:44
Visto: 22/04/2025 8:59:51
Firmado: 22/04/2025 9:04:48

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 22/04/2025 8:59:51
ID: b4287e8c-e061-453a-aac0-5ac583354a47

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)



Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 190.0.240.4

Enviado: 21/04/2025 16:00:43
Visto: 21/04/2025 18:34:36
Firmado: 21/04/2025 18:35:18

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 21/04/2025 18:34:36
ID: f73e5d49-56c8-4baa-862f-26724a1cd030

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
MELISSA LOZANO klozano@internexa.com PMO COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.67.246.142	Enviado: 21/04/2025 16:00:44 Visto: 21/04/2025 16:08:48 Firmado: 21/04/2025 16:09:08
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
Mónica del Rosario Paz mpaz@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 47.230.11.3	Enviado: 21/04/2025 16:00:44 Reenviado: 22/04/2025 9:57:46 Reenviado: 24/04/2025 16:40:28 Visto: 25/04/2025 10:21:37 Firmado: 25/04/2025 10:28:23
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 25/04/2025 10:21:37 ID: d22c1bcd-319c-49a5-96ee-aaaa89eb9be8		
Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 181.59.3.91	Enviado: 25/04/2025 10:28:25 Visto: 25/04/2025 10:55:49 Firmado: 25/04/2025 10:56:24
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 25/04/2025 10:55:49 ID: 41b495ed-2a13-4b09-b549-59d668686716		
DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO djaramillo@internexa.com DIRECTOR PNC COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 152.200.155.46	Enviado: 25/04/2025 10:28:25 Reenviado: 25/04/2025 11:28:16 Visto: 25/04/2025 13:41:43 Firmado: 25/04/2025 13:41:53
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 190.0.240.4	Enviado: 25/04/2025 10:28:25 Reenviado: 25/04/2025 11:28:16 Reenviado: 28/04/2025 17:07:55 Reenviado: 29/04/2025 10:49:40 Reenviado: 30/04/2025 11:13:46 Reenviado: 30/04/2025 11:17:41 Reenviado: 02/05/2025 9:31:28 Reenviado: 05/05/2025 9:19:43 Reenviado: 06/05/2025 8:52:22 Reenviado: 06/05/2025 14:14:25 Visto: 06/05/2025 14:28:49 Firmado: 06/05/2025 14:29:07
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 06/05/2025 14:28:49 ID: a17a188a-4c20-41eb-8c1d-51f9cd3fd4a3		
Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Fabian Yesid Yanquen Botia fyanquen@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 11/02/2025 17:19:53 ID: d56d7ae1-8160-4162-aa80-fc139f7322ec	Copiado	Enviado: 06/05/2025 14:29:09
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	21/04/2025 16:00:44
Certificado entregado	Seguridad comprobada	06/05/2025 14:28:49
Firma completada	Seguridad comprobada	06/05/2025 14:29:07
Completado	Seguridad comprobada	06/05/2025 14:29:09
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Divulgación de firma y Registro electrónicos		

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Internexa:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com

To advise Internexa of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from Internexa

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Internexa

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum

Enabled Security Settings:	Allow per session cookies
----------------------------	---------------------------

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Internexa during the course of my relationship with you.
