

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_011	LUGAR: Presencial Sede Principal MinTic y Virtual Microsoft Teams	FECHA: 30/05/2025	HORA DE INICIO: 11:00 a.m.	HORA FINAL: 11:30 a.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) ITX – FUTIC - con corte al mes de mayo 2025.

ORDEN DEL DÍA
1) Avances generales 2) Actividades clave 3) Etapa de operación 4) Acompañamiento ISP 5) Riesgos 6) Estado de los Contratos de Fomento y pólizas de los ISP

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Acordar Otrosí No.1	En Proceso (pendiente de aprobación ajustes a las memorias de cálculo por parte de la supervisión)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al Comité Operativo del Acuerdo Específico No. 4 entre InterNexa y el equipo de MinTIC, con el propósito de revisar y discutir los puntos de la agenda propuesta para alinear esfuerzos, compartir avances y abordar desafíos, y otras obligaciones pertinentes. 1. Avances generales  InterNexa informa que, a la fecha, se ha realizado la entrega de siete de los trece nodos previstos para el mes de abril. Se recuerda que los seis municipios restantes se vieron afectados por el evento de fuerza mayor notificado a la supervisión en el mes de abril de 2025, relacionado con retrasos en la instalación derivados del proceso de reorganización empresarial de Azteca Comunicaciones Colombia SAS, único proveedor del servicio en estos municipios.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

En atención a esta situación, InterNexa radicó una solicitud formal de prórroga, inicialmente por 30 días (que va hasta el 10 de mayo), y posteriormente se solicitó ampliar el alcance hasta el 10 de junio. InterNexa informa que durante las últimas semanas ha realizado seguimiento a la situación, y se han reportado avances en los municipios y asegura que se prevé cumplir con las entregas dentro del nuevo plazo establecido. Se confirma que el 28 de mayo de 2025 se recibió comunicación con radicado No. 252083120 con el concepto de conformidad por parte de la supervisión.

Otrosí – memorias de cálculo

InterNexa informa que se han venido desarrollando mesas técnicas con el equipo de apoyo a la supervisión del MinTIC para avanzar en los temas relacionados con el otrosí y el ajuste respectivo en las memorias de cálculo. El equipo de apoyo a la supervisión indica que se deberán retomar las mesas de trabajo para avanzar en la aprobación de los ítems a incluir.

Expansión de red y habilitación de nodos

En cuanto a la expansión de red, InterNexa confirma que esta fase fue culminada exitosamente en el mes de diciembre de 2024. Los días 24 y 25 de abril de 2025, el equipo de apoyo a la supervisión realizó la visita correspondiente y emitió un concepto favorable.

% Avance tendido	Acondicionamiento	ML Tendidos	Pendiente por tender
100 %	74000	76000	0




12/32 Nodos
100 % operativos

- Atrato
- Certegui
- Unión Panamericana
- Tadó
- Istmina
- Condoto
- El Cantón de San Pablo
- Lloro
- Medio San Juan
- Novita
- Río Iro
- Medio Baudó

Topología lógica

InterNexa presentó la topología de red correspondiente a los municipios de los departamentos de Chocó y Nariño, programados inicialmente para abril de 2025. Se indicó que los municipios marcados en color amarillo ya fueron entregados y reportados, mientras que los identificados en rojo corresponden a los que aún están pendientes y respaldados por el EFM reportado por InterNexa.

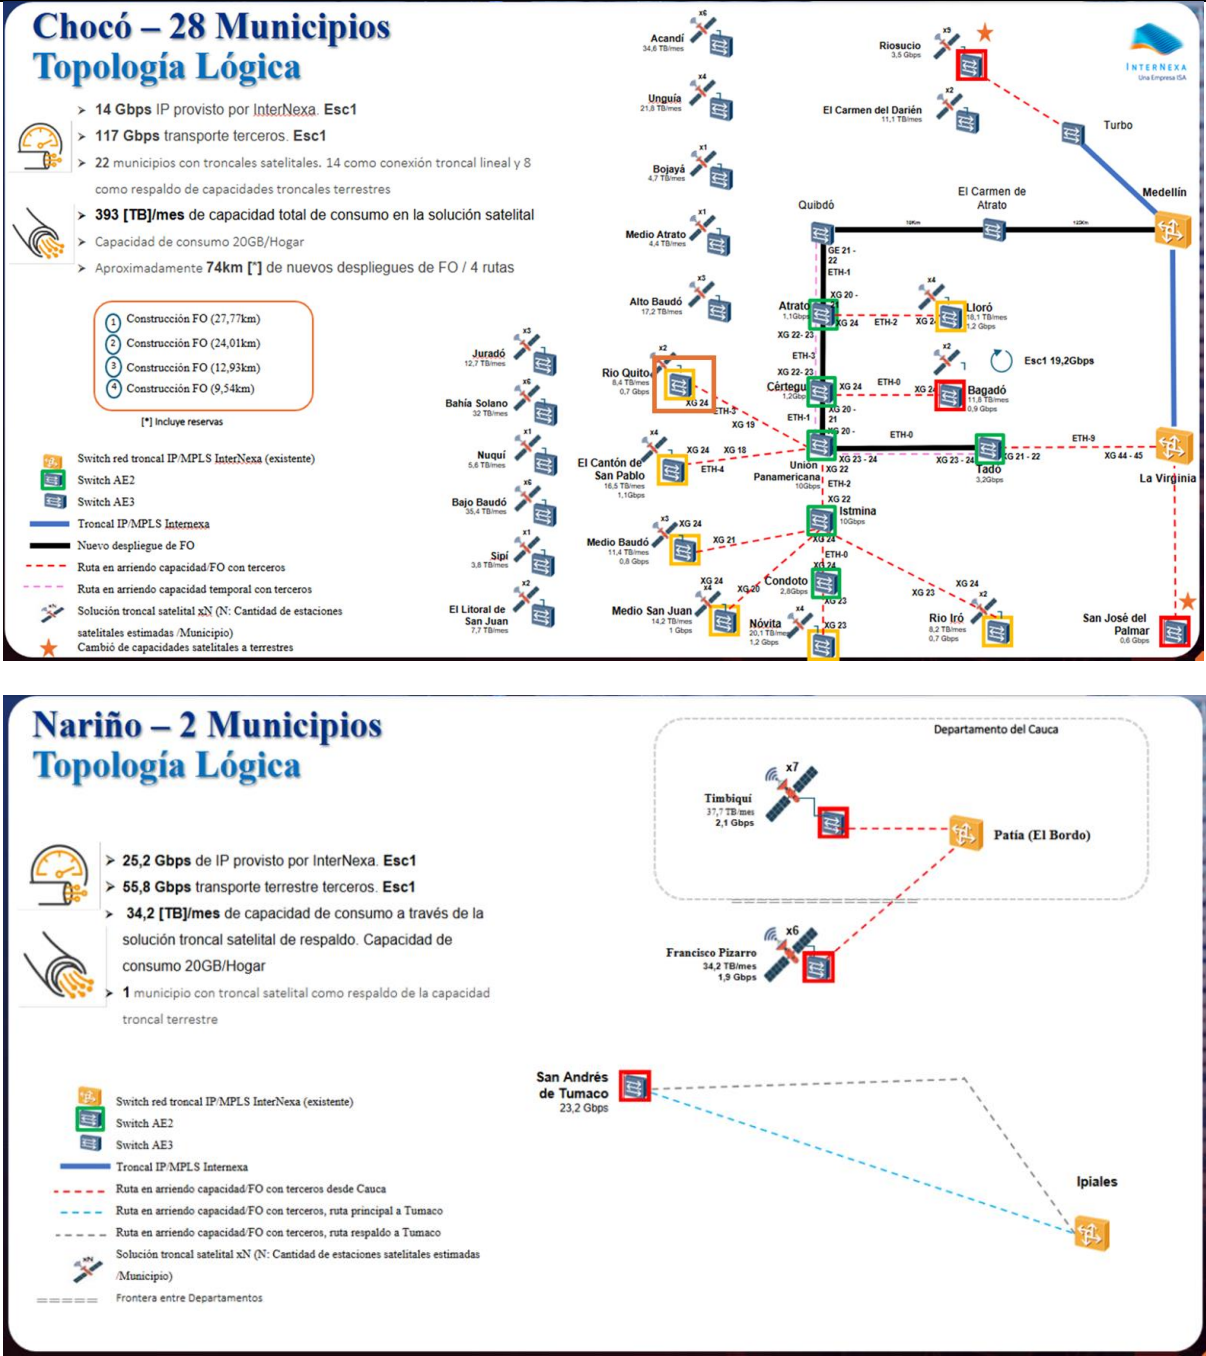

• Levantamiento de Observaciones Nodos AE4

InterNexa informa que, en atención a los hallazgos identificados durante la visita técnica realizada en abril de 2025 por parte de la supervisión, InterNexa elaboró un plan de acción que actualmente se encuentra en fase de ejecución. El cronograma de implementación fue remitido previamente al MinTIC mediante comunicación oficial.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



2. Actividades Claves

InterNexa señala que las próximas actividades previstas son las siguientes:

- Emisión, por parte del MinTIC, del concepto de conformidad de los 13 nodos entregados, una vez se subsanen las observaciones.
- Integración de 7 ISP en 11 municipios.
- Entrega de la habilitación de los seis nodos restantes, prevista para después del 10 de junio de 2025.

En relación con el otrosí:

- Facturación habilitación de 13 Nodos
- Reportar que Medio Baudó pasó a entregarse en abril de 2025 (Antes estaba programado para Sep/25).
- Reportar que Carmen del Darién pasará a entregarse en Sept 2025 (Antes estaba programado para Abr/25).

Adicionalmente, InterNexa propuso iniciar la prestación del servicio de conectividad a los ISP, lo cual implicaría el inicio del pago por capacidad fija. No obstante, se aclara que no se facturarían las habilitaciones de nodo hasta que estos se encuentren subsanados.

Por su parte, el MinTIC propuso priorizar la entrega de los municipios que ya cuentan con ISP adjudicados, y señaló que las visitas de verificación podrían realizarse de manera virtual.

Además, InterNexa informó que el 29 de mayo radicó ante el MinTIC la solicitud de modificación del Acuerdo Específico No. 4, con el fin de incluir ítems asociados a nodos tipo *indoor* y adecuaciones civiles no contempladas inicialmente en las memorias de cálculo y se está a la espera de respuesta por parte del equipo de apoyo a la supervisión. La Supervisión indica que se encuentra validando la información suministrada y propone adelantar mesa de trabajo el viernes 02 de junio de 2025.

Adicional a lo anterior, InterNexa informa que se encuentra pendiente por respuesta de la supervisión de las siguientes comunicaciones:

- Facturación habilitación de 13 Nodos
- Modificación de fecha de entrega para Medio Baudó pasó a entregarse en abril de 2025 (Antes Sep./25).
- Modificación de fecha de entrega para Carmen del Darién pasará a entregarse en Sept 2025 (Antes Abr/25).
- 13 municipios del Litoral que se encuentran por capacidad satelital actualmente y sobre los que se presentó una propuesta por Radios a solicitud de la supervisión

InterNexa informa que remitió un comunicado el 23 de mayo de 2025 relacionado con alternativas técnicas para conectar 13 municipios del litoral pacífico contemplando la conexión mediante tecnología terrestre por radioenlaces, utilizando la infraestructura de Andired. La empresa advierte que la falta de definición sobre la solución tecnológica está afectando el cronograma de implementación de los municipios inicialmente previstos con tecnología satelital por lo que se solicita

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

instrucciones claras, por parte del Ministerio, para poder avanzar, o en caso dado evaluar la posible suspensión de la instalación de estos municipios, tema que ya se había mencionado en comunicados previos.

El equipo de apoyo a la supervisión, por su parte, se comprometió a revisar el contenido del comunicado y emitir una respuesta durante la semana del 1 de junio de 2025.

3. Etapa de operación

- **Actas pendientes**

InterNexa presentó al equipo de apoyo a la supervisión el listado de actas que, a la fecha se encuentran pendientes por revisión, aprobación y/o firma por parte del MinTic, quienes se comprometen a emitir respuesta sobre estas durante la siguiente semana:

Nº Acta	Tema	Fecha reunión	Observación
Trámite para firma por parte de MinTic			
013	Mesa Técnica Chocó Habilitación de Nodo	19/12/2024	Docusign – Ing. Josué
014	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Chocó AE4	08/01/2025	Docusign – Ing. Josué
024	Seguimiento del Acuerdo Específico No. 4.	16/05/2025	Aprobada - confirmar firmantes
Revisión y aprobación por parte de MinTic			
022	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de cálculo y capacidades)	21/03/2025	Revisión Ing. Luis F. R.
023	Análisis Memoria de Calculo AE4	31/03/2025	Revisión Ing. Josué
025	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	21/04/2025	Revisión Ing. Josué
026	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	22/04/2025	Revisión Ing. Josué
027	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	23/04/2025	Revisión Ing. Josué
028	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	24/04/2025	Revisión Ing. Josué
029	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	25/04/2025	Revisión Ing. Josué
030	Seguimiento del Acuerdo Específico No. 4.	16/05/2025	Revisión Ing. Luis F. R.

- **Comunicados pendientes de respuesta por parte de la supervisión**


InterNexa también presentó el listado de Comunicados pendientes de respuesta por parte de la supervisión.

Asunto	Fecha	Radicado
Respuesta 252075233 del 15 de mayo de 2025 – Notificación entrega habilitación de nodos de Chocó	23/05/2025	251061007
Comunicado Respuesta solicitud información litoral pacifico	23/05/2025	251057504
Procesos de abastecimiento AE4	29/05/2025	251063943
Integración con ISP Choco AE4	29/05/2025	251063945

4. Acompañamiento ISP's

InterNexa presentó el cronograma elaborado a partir de las reuniones sostenidas con los ISP, quienes ya han venido adelantando trabajos de campo para su integración.

El equipo de apoyo a la supervisión propuso que, de manera ideal, se realicen visitas virtuales para verificar la subsanación a las adecuaciones identificadas a los nodos. Una vez el MinTIC emita el concepto de favorabilidad correspondiente, se podrá dar inicio al proceso de interconexión con los ISP.

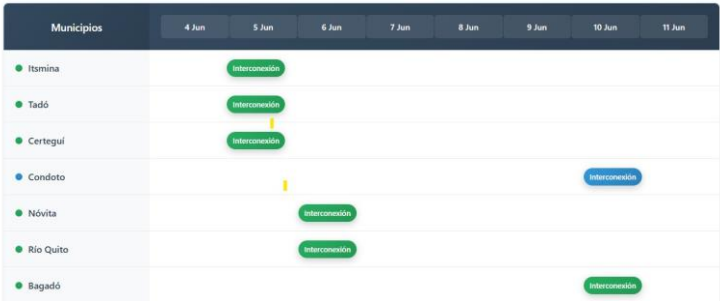

5. Riesgos

InterNexa señaló que uno de los riesgos actuales más relevantes está relacionado con la integración del modelo operativo con los ISP, lo cual podría representar un desafío para la continuidad del cronograma si no se gestiona oportunamente.



6. Estado de los Contratos de Fomento y pólizas de los ISP

InterNexa informó que todos los contratos de fomento y las pólizas correspondientes ya se encuentran formalizados y completos.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



La presente acta recoge los temas y participaciones presentados y discutidos en la sesión de Comité Operativo Acta CO_AE4_011 llevado a cabo el día 30 de mayo de 2025. En consecuencia, la misma se suscribe por quien en ella participaron el día 30 de mayo de 2025.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIONES A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Emitir respuesta a la solicitud por parte de InterNexa sobre la definición solución técnica de los municipios del Litoral Chocó AE4	MinTic	06/06/2025
Emitir respuestas sobre las actas que a la fecha se encuentran en trámite (revisión, aprobación y/o firma) por parte del MinTic	MinTic	06/06/2025
Acordar Otrosí No.1	MinTic - InterNexa	20/06/2025
Adelantar mesa de trabajo para validar información enviada de los RFP compartidos por ITX.	MinTic - InterNexa	02/06/2025



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnico	MinTic
Marco Esteven Fontecha	Grupo de Apoyo a la Supervisión – Aspectos técnicos	MinTic
John Jairo González	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Fabian Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Sebastián Chaparro Jiménez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
Julián Ayala Sierra	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Camilo Rodríguez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Jurídicos	MinTic
Diana Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa
Erika Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa
Juan Diego Bedoya	Especialista JR Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa
Daniel Gómez	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa
Melissa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa
Daniel Cruz Rodríguez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - ISP's	InterNexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	InterNexa

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTic (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	InterNexa
Angela Ríos	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	InterNexa
Juliana Saldarriaga	Especialista Jurídico y Relaciones Institucionales	InterNexa
Yina González	Ingeniero Preventa SR	InterNexa
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	InterNexa
Vanessa Torres	Analista Administrativo	InterNexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo	InterNexa
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo	InterNexa

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... DS 
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE...
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Inicial LFRC

Anexos
Presentación 2025/05/30



Acuerdo Específico 4

Avances Generales



Entrega Abril

MUNICIPIOS
EL CANTÓN DE SAN PABLO
LLORÓ
MEDIO SAN JUAN
NOVITA
RIO IRÓ
MEDIO BAUDO
RIO QUITO

Pendiente EFM

MUNICIPIOS
TIMBIQUÍ
BAGADÓ
RIOSUCIO
SAN JOSE DEL PALMAR
FRANCISCO PIZARRO
SAN ANDRÉS DE TUMACO

Avances Generales

Avance Expansión de Red


% Avance tendido	Acondicionamiento	ML Tendidos	Pendiente por tender
100 %	74000	76000	0



Habilitación de Nodos

12/32 Nodos
100 % operativos

- Atrato
- Cértegui
- Unión Panamericana
- Tadó
- Istmina
- Condoto
- El Cantón de San Pablo
- Lloro
- Medio San Juan
- Novita
- Río Iro
- Medio Baudo

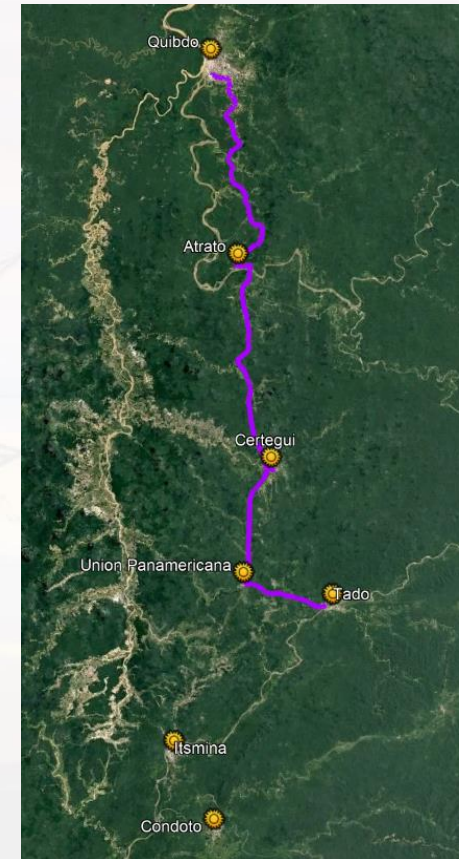

Avances Generales

Chocó – 28 Municipios Topología Lógica




- > 14 Gbps IP provisto por InterNexa. Esc1
- > 117 Gbps transporte terceros. Esc1
- > 22 municipios con troncales satelitales. 14 como conexión troncal lineal y 8 como respaldo de capacidades troncales terrestres
- > 393 [TB]/mes de capacidad total de consumo en la solución satelital
- > Capacidad de consumo 20GB/Hogar
- > Aproximadamente 74km [*] de nuevos despliegues de FO / 4 rutas



- 1 Construcción FO (27,77km)
- 2 Construcción FO (24,01km)
- 3 Construcción FO (12,93km)
- 4 Construcción FO (9,54km)

[*] Incluye reservas

- Switch red troncal IP/MPLS InterNexa (existente)
- Switch AE2
- Switch AE3
- Troncal IP/MPLS InterNexa
- Nuevo despliegue de FO
- Ruta en arriendo capacidad/FO con terceros
- Ruta en arriendo capacidad temporal con terceros
- Solución troncal satelital xN (N: Cantidad de estaciones satelitales estimadas /Municipio)
- Cambio de capacidades satelitales a terrestres

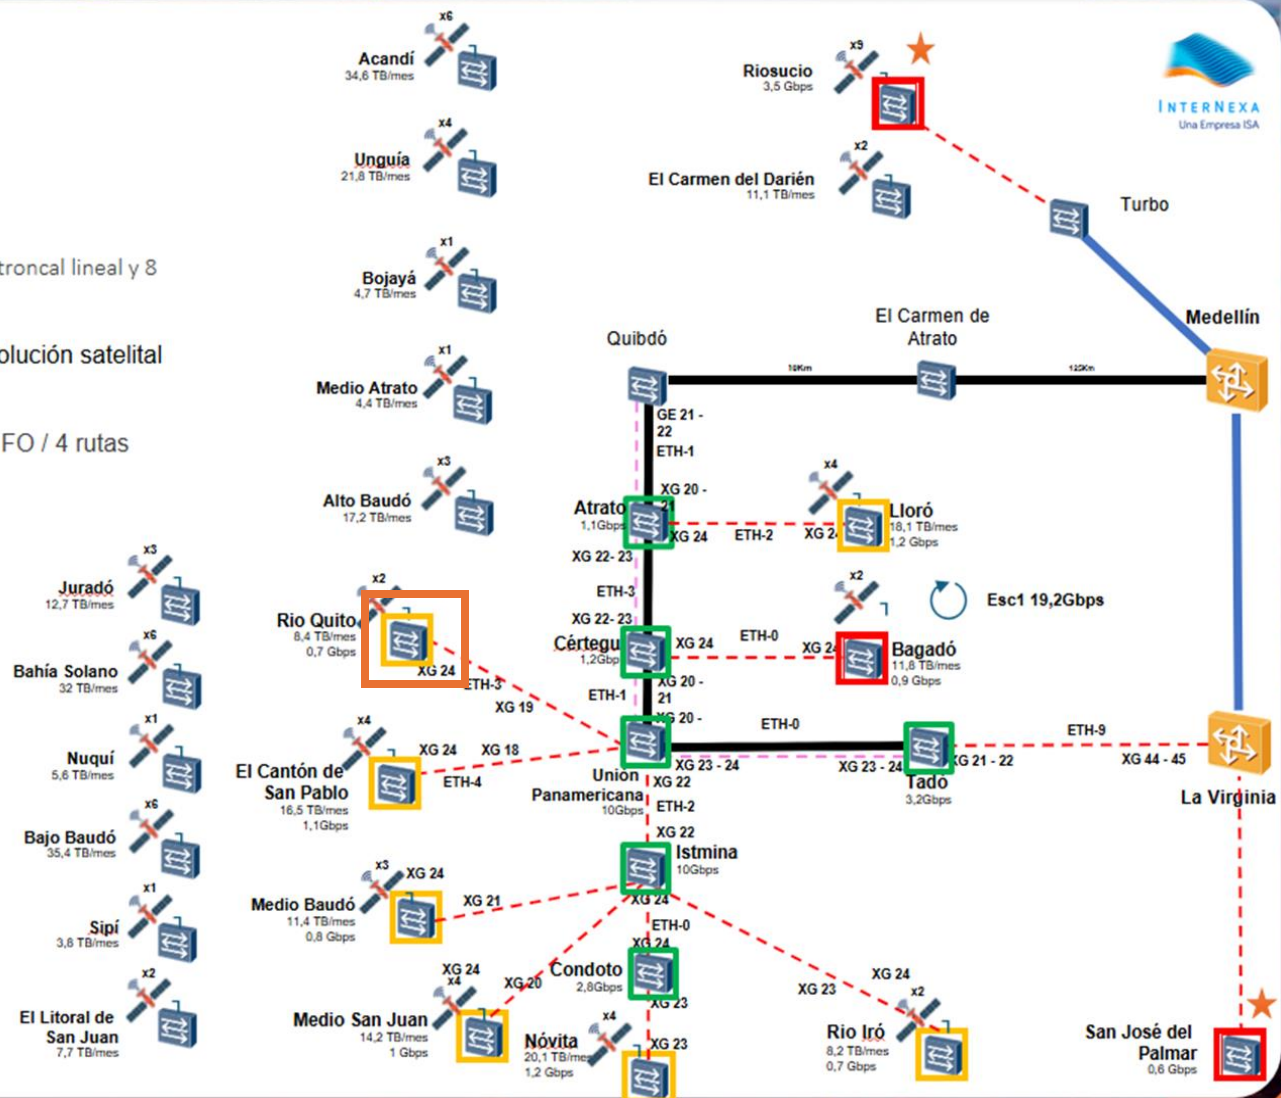

Avances Generales

Nariño – 2 Municipios Topología Lógica



- **25,2 Gbps** de IP provisto por InterNexa. **Esc1**
- **55,8 Gbps** transporte terrestre terceros. **Esc1**
- **34,2 [TB]/mes** de capacidad de consumo a través de la solución troncal satelital de respaldo. Capacidad de consumo 20GB/Hogar



- **1** municipio con troncal satelital como respaldo de la capacidad troncal terrestre



Switch red troncal IP/MPLS InterNexa (existente)



Switch AE2



Switch AE3

Troncal IP/MPLS InterNexa

--- Ruta en arriendo capacidad/FO con terceros desde Cauca


- - - Ruta en arriendo capacidad/FO con terceros, ruta principal a Tumaco

--- Ruta en arriendo capacidad/FO con terceros, ruta respaldo a Tumaco



Solución troncal satelital xN (N: Cantidad de estaciones satelitales estimadas /Municipio)

===== Frontera entre Departamentos

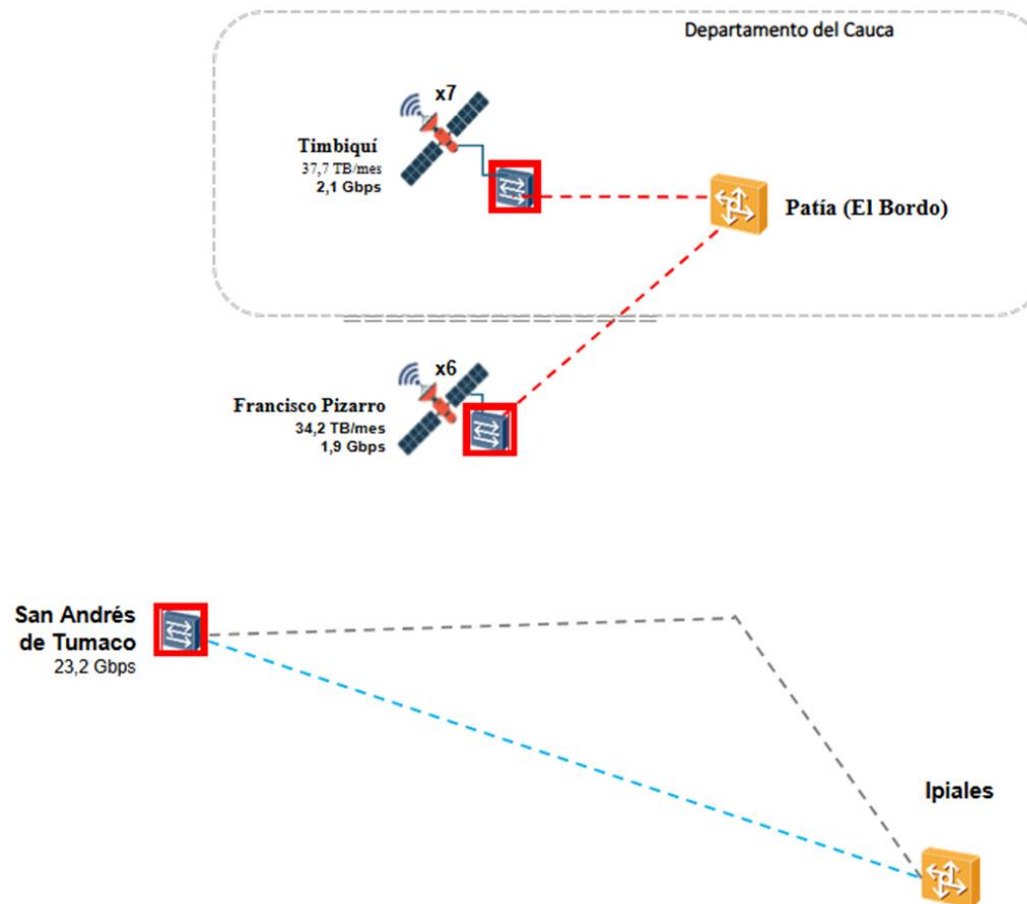

Acuerdo Específico No. 4

Levantamiento de Observaciones Nodos AE4

ITEM	ACTIVIDADES	Mayo					Junio																														Julio								
		27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6			
1	Quibdó	X	X	X																																									
2	Carmen de Atrato	X	X	X																																									
3	Atrato				X	X		X																																					
4	Certegui				X	X		X																																					
5	Unión Panamericana								X	X	X																																		
6	Tadó								X	X	X																																		
7	Istmina									X	X	X																																	
8	Condoto												X		X	X																													
9	Lloró															X	X	X																											
10	Nóvita																X	X	X																										
11	Cantón de San Pablo																		X		X	X																							
12	Medio Baudó																						X	X	X																				
13	Medio San Juan																								X	X	X																		
14	Río Iró																									X	X				X														
15	Río Quito																										X	X	X																

Acuerdo Específico No. 4

Actividades Clave

Próximas

- ▶ Concepto de conformidad con observaciones, 13 Nodos AE4.
- ▶ Integración con 7 ISP (11 Municipios).
- ▶ Próxima entrega habilitación de 6 Nodos - 10 Junio 2025.

Otrosí

- ▶ Facturación habilitación de 13 Nodos
- ▶ Medio Baudó pasó a entregarse en abril de 2025 (Antes Sep/25).
- ▶ Carmen del Darién pasará a entregarse en Sept 2025 (Antes Abr/25).

Por Definición de la Supervisión

- ▶ Mesa de trabajo definición municipios litoral.
- ▶ Municipios de Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Litoral de San Juan, Jurado, Medio Atrato, Nuquí, Sipí, Unguía, Vigía del Fuerte.



Implicaciones

- ▶ OtroSí capacidad Satelital o Radio.
- ▶ Suspensión parcial del cronograma de Septiembre

Etapa de Operación

Actas Pendientes

N° Acta	Tema	Fecha reunión	Observación
Trámite para firma por parte de MinTic			
013	Mesa Técnica Chocó Habilitación de Nodo	19/12/2024	Docusign – Ing. Josué
014	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Chocó AE4	08/01/2025	Docusign – Ing. Josué
024	Seguimiento del Acuerdo Específico No. 4.	16/05/2025	Aprobada - confirmar firmantes
Revisión y aprobación por parte de MinTic			
022	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de cálculo y capacidades)	21/03/2025	Revisión Ing. Luis F. R.
023	Análisis Memoria de Calculo AE4	31/03/2025	Revisión Ing. Josué
025	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	21/04/2025	Revisión Ing. Josué
026	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	22/04/2025	Revisión Ing. Josué
027	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	23/04/2025	Revisión Ing. Josué
028	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	24/04/2025	Revisión Ing. Josué
029	Mesa Técnica Entrega Habilitación de Nodos Chocó	25/04/2025	Revisión Ing. Josué
030	Seguimiento del Acuerdo Específico No. 4.	16/05/2025	Revisión Ing. Luis F. R.

Etapas de Operación

Comunicados pendientes de respuesta por la supervisión

Asunto	Fecha	Radicado
Respuesta 252075233 del 15 de mayo de 2025 – Notificación entrega habilitación de nodos de Chocó	23/05/2025	251061007
Comunicado Respuesta solicitud información litoral pacifico	23/05/2025	251057504
Procesos de abastecimiento AE4	29/05/2025	251063943
Integración con ISP Choco AE4	29/05/2025	251063945

Acompañamiento ISP's

Conexión ISP- Internexa

[illegible]

Etapa de Operación AE4

Riesgos

Riesgo Alto

R1 – Riesgo Reputacional derivado de la administración de los recursos por parte de actores diferentes a InterNexa

R2 – Dificultades para lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales

Riesgo Medio

R4 – Falta de alineación en los acuerdos y comunicaciones entre los grupos de interés del proyecto

R5 – Desfase o desviaciones en el diseño / implementación de la red

R6 – Fallas en la integración del modelo operativo con ISPs

R7 – Distorsión de mercado y afectación de competencia

Riesgo Bajo

R8 – Dificultades de gestión derivadas del principio de anualidad en el proyecto

R9 – Dificultades para realizar una planeación adecuada del proyecto

R10 – No disponer oportunamente de personal con competencias y capacidades requeridas

R11 – Riesgo de liquidez

AE4 - Estado de los Contratos de Fomento y pólizas de los ISP

Convocatoria 4 2024

Contratos Firmados	Pólizas Aprobadas	Otrosíes	Ordenes Firmadas
7/7	7/7	NA	11/11

ISP

Makro Sistem

Alfotel

Naranja

Servicios Informáticos del Chocó

Global Connections Tics

Soluciones Pacífico

Teserpac

Varios

- ▶ **Aprobación nodos (diciembre – abril)**
- ▶ **Conexión ISP**
- ▶ **Otrosí AE4**

¡Gracias!

¡Juntos hacemos que pase!



Operador **Mayorista** de
servicios e infraestructura
de **Conectividad**

Certificado de finalización

Identificador del sobre: FFAACCAB-D1C4-49CD-BA30-D57EBC69F83E

Estado: Completado

Asunto: Acta CO_AE4_011- PNC-20250530

A. Número de contrato:

B. Tipo:

C. Número de cláusula:

D. Correo del ordenador de gastos:

Sobre de origen:

Páginas del documento: 22

Firmas: 3

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 5

Iniciales: 2

VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA

Firma guiada: Activado

Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5

Sello del identificador del sobre: Activado

Medellín, Bogota 00000

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

ITX_E_vtorres@internexa.com

Dirección IP: 186.155.18.74

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA

Ubicación: DocuSign

28/07/2025 9:32:37

ITX_E_vtorres@internexa.com

Eventos de firmante

Firma

Fecha y hora

ERIKA JOHANA FERRO PARDO

eferro@internexa.com

GERENTE PROYECTO PNC

COLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)

DS

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 181.119.85.4

Enviado: 28/07/2025 9:42:18

Visto: 28/07/2025 10:18:10

Firmado: 28/07/2025 10:18:20

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de Docusign

Luis Fernando Roncancio Campos

lfroncancio@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial
LFRC

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4

Enviado: 28/07/2025 9:42:18

Visto: 28/07/2025 9:47:31

Firmado: 28/07/2025 9:47:58

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 28/07/2025 9:47:31

ID: 4b6937ed-c5ab-4e83-9d8f-3f7babf0d238

Denice Bibiana Acero

dacero@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado por:

6AAA3F2A9BB14AE...

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4

Enviado: 28/07/2025 10:18:23

Visto: 30/07/2025 8:38:30

Firmado: 30/07/2025 8:44:51

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 30/07/2025 8:44:50

ID: 001c8245-0478-49c1-aa77-5b4611efeec0

DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO

djaramillo@internexa.com

DIRECTOR PNC

COLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

75AFED9F3BFE439...


Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 179.51.115.10

Enviado: 28/07/2025 10:18:22

Visto: 28/07/2025 11:07:59

Firmado: 28/07/2025 11:08:17

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
Juan Manuel Guerrero jguerrero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4	Enviado: 28/07/2025 10:18:23 Visto: 28/07/2025 10:19:07 Firmado: 28/07/2025 10:19:23
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 28/07/2025 10:19:07 ID: 8d650217-18b7-4035-847b-9254b added3f9d		
Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	28/07/2025 9:42:18
Certificado entregado	Seguridad comprobada	28/07/2025 10:19:07
Firma completada	Seguridad comprobada	28/07/2025 10:19:23
Completado	Seguridad comprobada	30/07/2025 8:44:51
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Divulgación de firma y Registro electrónicos		

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Internexa:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com

To advise Internexa of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from Internexa

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Internexa

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum

Enabled Security Settings:	Allow per session cookies
----------------------------	---------------------------

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Internexa during the course of my relationship with you.
