

Seguimiento Findenter

10:08

Chat

Gente

Participar

Reaccionar

Vista

Notas

Aplicaciones

Más

Cámara

Micro

Compartir

Salir

OT

Olga Lucia Rodriguez Tobar

CG

Clara Isabel Espinosa Gonzalez

RJ

Rita Ines Calle Jaramillo

RC

Rodolfo Orlando Beltran Cubillos

JM

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA

CR

Camilo Augusto Pardo Rocha

Buscar

18°C

Parc soleado

3:02 p.m.

6/03/2025



**CONTRATO 002 DE 2025
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO
VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO "P.A
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y
ACCESO A LA VIVIENDA" Y LA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. - FINDETER**

Reunión de Seguimiento No. 6
06/03/2026

SECRETARÍA DEL
HÁBITAT



5. Avances Ejecución Mejoramiento- INVERCONE

Luis Alfredo Triana Pira CHIP: AAA0163TFJH

10 Hogares Res. SFM:

**2 viviendas terminadas 100%
(24/02/2026) *En tramite
certificación Exist. Findeter.**

**4 viviendas con avances
porcentual del 60% .**

**2 viviendas con avance
porcentual menor al 20%.**

**1 vivienda sin iniciar por reajuste
presupuestal.**

**1 vivienda sin iniciar por
evaluación técnica (material).**



Deyanira Delgado Garay CHIP: AAA0028TETD



4. Cumplimiento Entrega de Avaes Modalidad Oferentes

TOTAL ENTREGADO OFICIALMENTE AL 6 DE MARZO	COMPROMISO FINDETER ENTREGA HOY 6 DE MARZO	SI SE ENTREGA
6-mar	6-mar	6-mar
148	40	184

- En Drive Findeter se encuentran cargados 550 diagnósticos.
- Se encuentra pendiente de entrega oficial 402 Avaes de Diagnóstico y Estructuración divididos en :
 - Diagnostico Primera visita Oferentes cargados a Drive 248 , pendientes 100.
 - Diagnostico Segunda visita Oferentes cargados a Drive, 284, pendientes 284.
 - Hogares no viables 8

INICIATIVA DEL
HABITAT



Seguimiento Trámites

20:11

Controlar

Comunicar

Chat

Centro

Participar

Reunirse

Vista

Notas

Aplicaciones

Mapa

Cámara

Idioma

Compartir

Salir

5. Ejecución Subsidios Asignados

Razon Social Oferente	ASIGNADAS EN RESOLUCION SDHT	POR INICIAR	INICIADAS	TERMINADOS	CERTIFICADAS
ADKUA SAS	0	0	0	0	0
CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.	14	14	0	0	0
COINCO	15	15	0	0	0
INVERCONE SAS	10	2	6	2	0
CONSTRUCCIONES MAHOLICA SAS	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS	3	2	1	0	0
FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ	7	6	1	0	0
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS BOGOTÁ	1	1	0	0	0
SUBTOTAL No. 1	50	40	8	2	0

SECRETARÍA DEL HABITAT

CG

RJ

RC

JM

CR

OT

20:11

Buscar

16°C

Paro soleado


3:12 p.m.

6/02/2025

5. Avances Ejecución Mejoramiento- Fund. MINUTO DE DIOS

1 Vivienda con avances porcentual del 8%

Cecilia Gómez Bonilla CHIP: AAA0028XUJZ

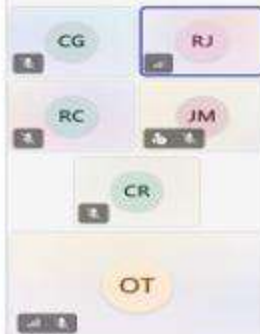

6. Cumplimiento Entrega de avales y visitas modalidad Convenios

Convenios Argos - Minuto de Dios

No	CONVENIOS	Cupos	Diagnosticos Cargados en el Drive	Visitas Realizadas por Findeter	Rechazadas	VISITAS PENDIENTES	Total Hogares Potenciales Aval
12	ARGOS Convenio 1	91	20	5		86	20
13	ARGOS Convenio 2	200	0	0		200	0
13	Minuto de Dios	79	15	0		15	15
TOTAL CONVENIOS		370	35	5	0	324	35

SECRETARÍA DEL
HABITAT



- Remitir el listado de los veinticuatro (24) hogares señalados por FINDETER para su validación y envío de avales. SDHT Fecha: 4 de marzo de 2026.
- Realizar la socialización con los oferentes de los ajustes efectuados en los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y presupuestos correspondientes, con la participación de FINDETER para la explicación de los cambios realizados. SDHT / FINDETER. Fecha: Primera semana de marzo de 2026.
- Remitir el Plan de Acción y el Manual Operativo del proceso para conocimiento de la SDHT. FINDETER, Fecha: 27 de febrero de 2026.
- Realizar jornada adicional de capacitación del sistema dirigida a oferentes y equipos técnicos, con el fin de resolver inquietudes sobre su funcionamiento y uso. FINDETER. Fecha: 2 de marzo de 2026.
- Socializar con FINDETER los formatos y lineamientos del componente de sostenibilidad antes de su implementación con los oferentes. SDHT. Fecha: Primera semana de marzo de 2026.
- Programar y ejecutar las noventa y una (91) visitas correspondientes al convenio Argos, de manera progresiva según el cargue de hogares en el sistema de información. FINDETER. Fecha: Primera semana de abril de 2026.
- Llevar registro de las visitas realizadas, así como de los casos no viables y novedades identificadas durante las visitas de campo. FINDETER/SDHT



The diagram shows a 2x2 grid of rooms. The top-left room is labeled 'CG' (Catheterization and Gynecology) and has a small icon of a person. The top-right room is labeled 'RJ' (Respiratory and Joint) and has a small icon of a person. The bottom-left room is labeled 'RC' (Respiratory and Cardiac) and has a small icon of a person. The bottom-right room is labeled 'JM' (Joint and Musculoskeletal) and has a small icon of a person. Below the grid is a central room labeled 'OT' (Operating Theater) with a small icon of a person.
