

Programacion Riohacha 25.05.26.mpp


	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1003
0	24.04.30-Red doble base refuerzo y 4.2	1,513,75 días	jue 2/03/23 6:	jue 17/06/27 11:	
1	INICIO	0 días	jue 2/03/23 6:	jue 2/03/23 6:00	
2	ETAPA 1 -DISEÑO	495 días	jue 2/03/23 7:	mié 17/07/24 1:	
108	DISEÑOS COMPLEMENTARIOS	232 días	vie 17/10/25 1:	jue 11/06/26 9:	
112	OTRAS ACTIVIDADES - REFORMULACION	465,75 días	jue 20/11/25 1:	lun 8/03/27 15:	
113	Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS	11 días	mié 24/02/27	lun 8/03/27 15:	
114	Plan de Manejo de Tráfico PMT	9 días	vie 26/02/27 8:	lun 8/03/27 15:	
115	Gerencia Social Estrategica (plan de comunicaciones y Gestión social)	280 días	jue 20/11/25 13:00	lun 31/08/26 14:00	
116	ETAPA 3 (Sectorización y Macromedición)	1,118,44 días	jue 2/03/23 6:	mié 13/05/26 1:	
117	SUMINISTROS ETAPA 3	976,44 días	jue 2/03/23 6:	vie 19/12/25 8:	
202	OBRA CIVIL ETAPA 3	971,56 días	vie 28/07/23 1:	mié 13/05/26 1:	
203	OBRA CIVIL - CÁMARAS EMM Y VÁLVULAS MACROMEDIDORES	185 días	mié 5/11/25 17:29	mié 13/05/26 11:29	
319	OBRA CIVIL - REFUERZO	902,86 días	vie 28/07/23 1:	mié 4/03/26 11:	
397	IMPREVISTOS E IMPUESTOS ETAPA 3	1 día	vie 2/01/26 13	lun 5/01/26 9:53	
400	ETAPA 2 (Distribución y Normalización acometidas)	1,018,75 días	mié 17/07/24	jue 17/06/27 11	
401	SUMINISTROS - ETAPA 2 - DISTRIBUCIÓN	705 días	jue 25/07/24 1:	mar 11/08/26 1:	
402	SUMINISTROS SECTOR 4	705 días	jue 25/07/24 1:	mar 11/08/26 1:	
403	Suministro tubería	400 días	jue 25/07/24 1:	vie 3/10/25 19:	
409	Suministro accesorios	615 días	jue 24/10/24 1:	mar 11/08/26 1:	
422	Acometidas domiciliarias	180 días	mar 29/07/25	mié 28/01/26 9:	
428	SUMINISTROS SECTOR 5	530 días	vie 14/02/25 1:	lun 10/08/26 11	
429	Suministro tubería	270 días	vie 14/02/25 1:	mar 18/11/25 1:	
436	Suministro accesorios	500 días	mar 18/03/25	lun 10/08/26 11	
441	Acometidas domiciliarias	273 días	mar 29/07/25	vie 1/05/26 17:	
447	OBRA CIVIL - ETAPA 02 - DISTRIBUCIÓN	1,018,75 días	mié 17/07/24	jue 17/06/27 11	
448	Red de Distribución Sector 4	1,018,75 días	mié 17/07/24	jue 17/06/27 11	
449	Preliminares de Obra	180 días	jue 18/07/24 1:	vie 14/02/25 18	
453	Obras Civiles - Sector 4	1,018,75 días	mié 17/07/24	jue 17/06/27 11	
454	Localización y Excavación	671 días	jue 18/07/24 1:	mar 30/06/26 1:	
455	Localización y replanteo línea acueducto	90,5 días	jue 18/07/24 7	mar 30/06/26 1:	
456	Excavacion red<=Ø300 mm (12) protección temporal H<=3 m	112,38 días	jue 18/07/24 16:00	mié 10/06/26 12:00	
457	Demolicion Rodadura Existente	30 días	jue 18/07/24 7	vie 16/08/24 17:	
458	Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20	509,63 días	jue 18/07/24 7	vie 16/01/26 15:	
459	Retiro y disposic. materiales sobrantes	117,38 días	jue 18/07/24 1	mar 16/06/26 8:	
460	Retiro y disposición de material sobrante producto de la excavación a distancia mayor de 250m	566 días	vie 18/10/24 9:00	mar 16/06/26 17:00	
461	Demolición de andén e=10 a 15 cm	530 días	vie 18/10/24 9	lun 11/05/26 15	
462	Demolición de pavimento rígido e≥20 cm	580 días	jue 19/09/24 1	mar 2/06/26 15:	
463	Instalación de tubería	656 días	jue 18/07/24 1:	mar 16/06/26 1:	
464	Inst tub flexibles acueducto, Ø3 y 4"	656 días	jue 18/07/24 1	mar 16/06/26 1:	
465	Inst tub flexibles acueducto, Ø6 y 8"	97 días	jue 18/07/24 1	vie 25/10/24 10:	
466	Inst tub flexibles acueducto, Ø10 y 12	7 días	jue 18/07/24 1	jue 25/07/24 17	
467	Relleno	1,018,63 días	jue 18/07/24 1:	jue 17/06/27 11	
468	Arena de Peña Compactada	537,63 días	vie 15/11/24 1	vie 17/07/26 9:0	
469	Recebo Compactado	451 días	jue 13/03/25 1	lun 14/09/26 15	
470	Material seleccionado para reuso proveniente de la excavación	485 días	vie 9/05/25 13:00	jue 1/10/26 15:00	
471	Base granular tipo B600 Compactada	1 día	vie 11/09/26 1	lun 14/09/26 15	
472	Construcción de andén en concreto e=10cm Concreto 3000 PSI	330 días	vie 18/10/24 9:00	lun 20/10/25 9:00	
473	Suministro e instalación de geomalla de separación T-2 o similar	0 días	mar 2/06/26 15:00	mar 2/06/26 15:00	
474	Construcción de pavimento rígido MR 41	538 días	vie 15/11/24 1	mar 16/06/26 1:	
475	Concreto 21 Mpa - 3000 PSI	70 días	lun 6/04/26 18	mar 16/06/26 1:	
476	Acero de refuerzo	270 días	mar 9/09/25 1	jue 11/06/26 9:	
477	Transporte interno camión turbo 3,5 Ton	380 días	lun 26/05/25 1	mar 16/06/26 1:	
478	Suministro e instalación de Junta de dilatación Pavimento Rígido, Incluye Corte	295 días	mié 20/08/25	jue 17/06/27 11:00	
479	Corte vertical en pavimento rígido hasta 20 cm	639 días	jue 18/07/24 8	mar 16/06/26 1:	
480	Base estabilizada con cemento	530 días	lun 25/11/24 1	vie 16/10/26 11:	
481	Actividades varias Sector 4 - vaciado pozas sépticas, manejo de agua y apiques	564,38 días	lun 21/10/24 11:00	mar 16/06/26 17:00	
482	Otras actividades Sector 4 - INST + SIST VALV+INST ACCESORIOS, Desconexiones reparaciones y empates	731 días	jue 18/07/24 7:00	dom 30/08/26 14:00	
483	Acometidas	656 días	jue 18/07/24 1:	mar 16/06/26 8:	
489	Entibados	0 días	mar 9/06/26 1	mar 9/06/26 16	
491	Otras Actividades PGAS - PMT	656 días	mié 17/07/24	mar 16/06/26 8:	
495	Imprevistos e Impuestos Sector 4	569 días	mar 15/10/24	mar 16/06/26 8:	
498	Red de Distribución Sector 5	614 días	jue 18/07/24 1:	lun 4/05/26 14:	
547	AJUSTES ICOCIV	73,75 días	mar 17/03/26	vie 29/05/26 19:	
548	Ajustes icociv	73,75 días	mar 17/03/26	vie 29/05/26 19:	

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea


División
Progreso de tarea
Línea base
División de la línea base

Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen


Resumen del proyecto
Resumen línea base

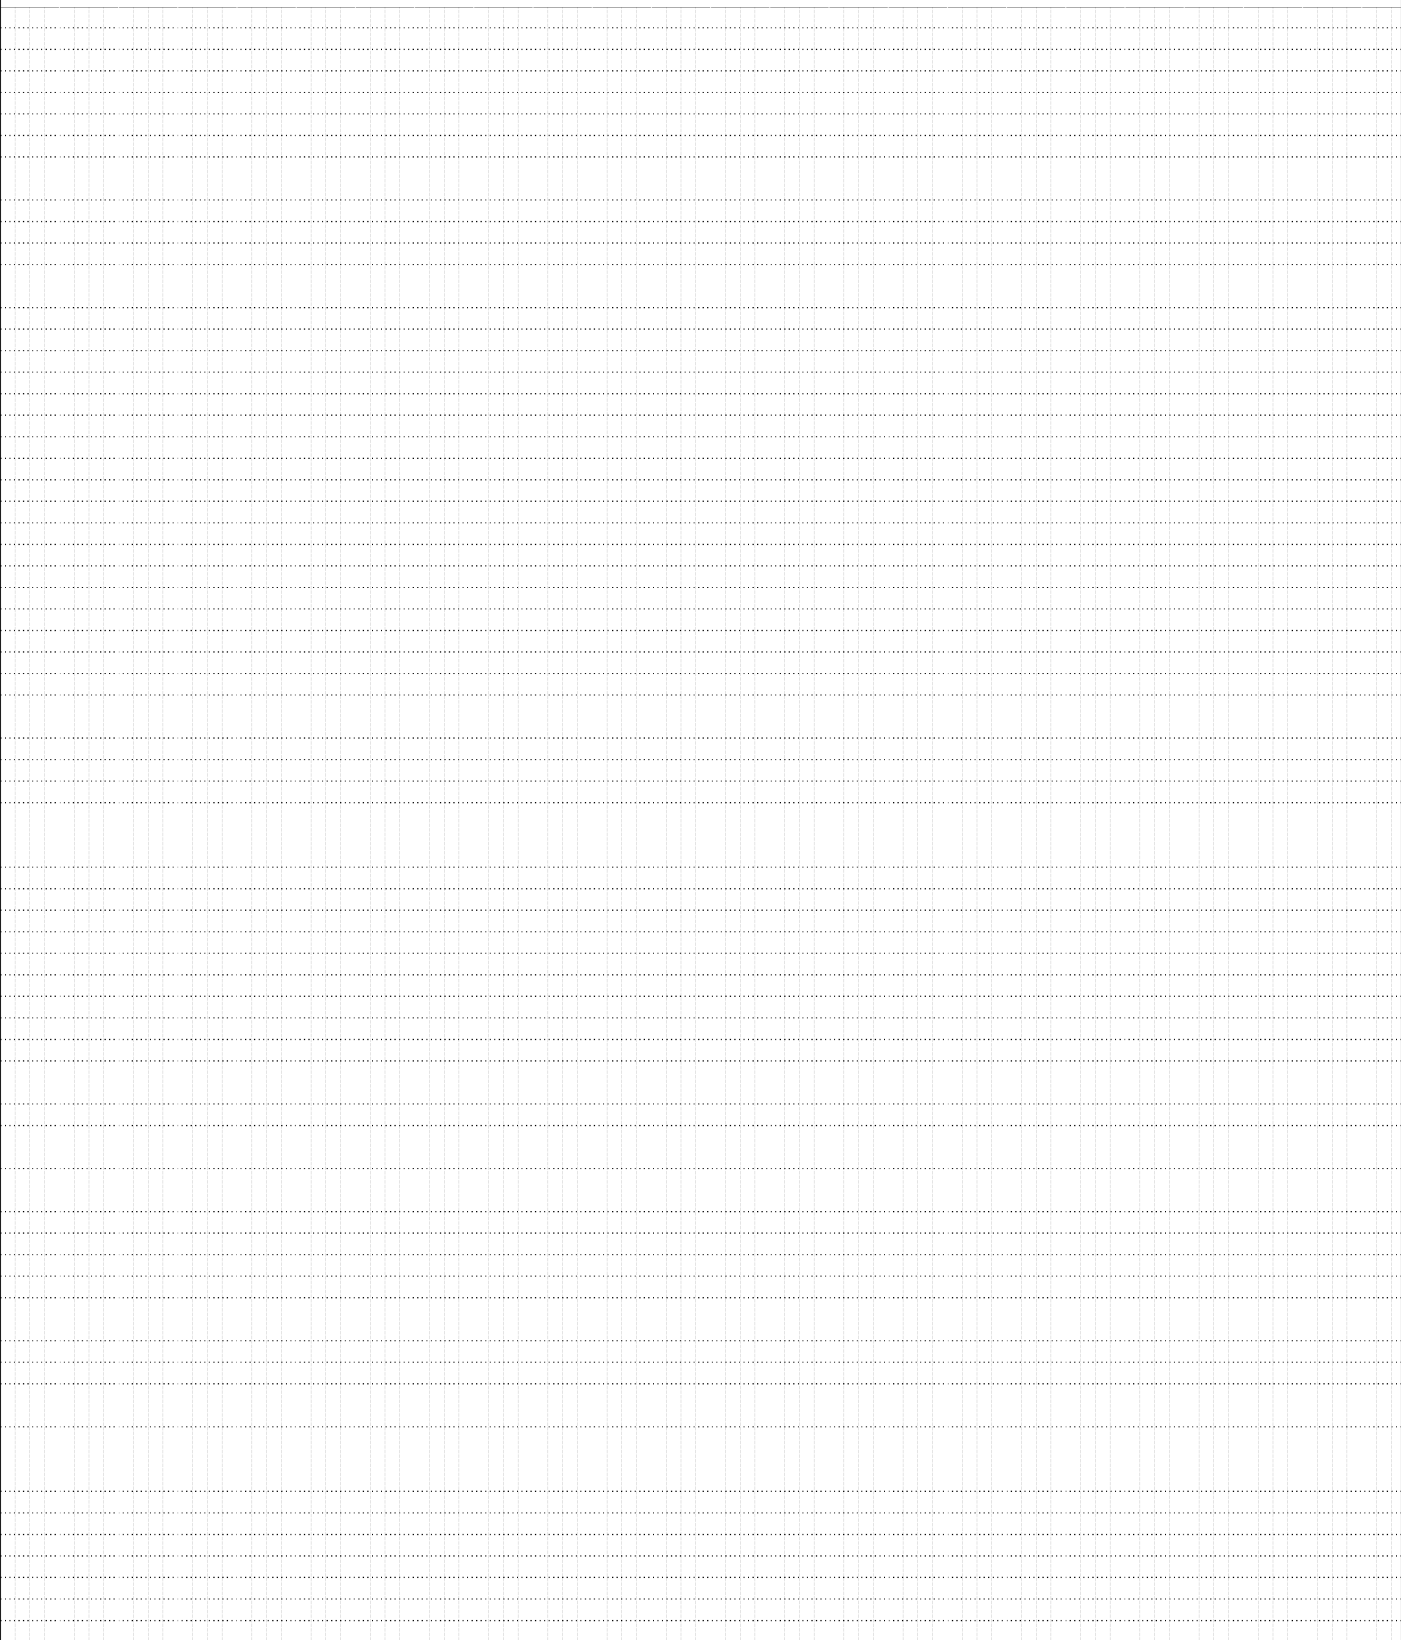

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

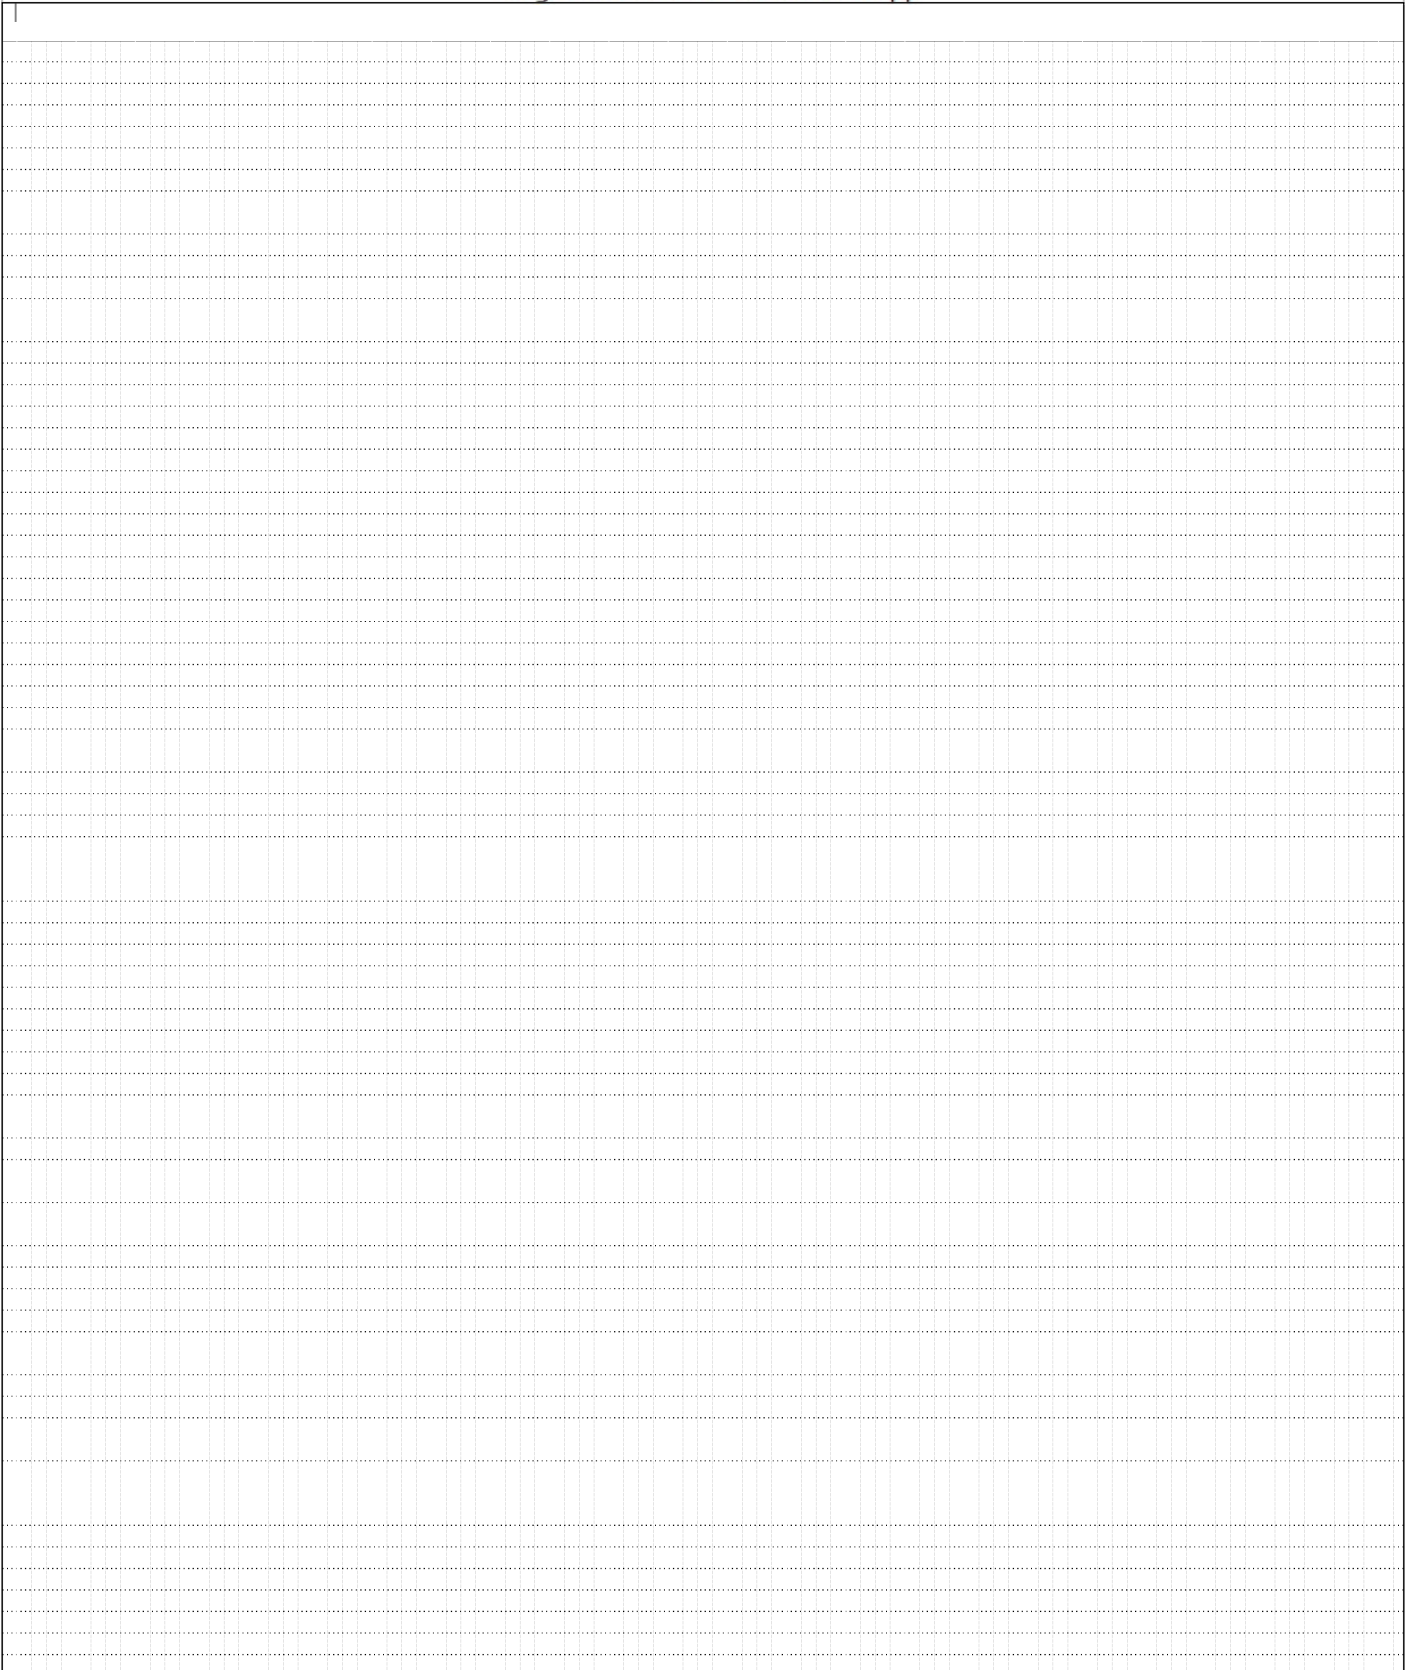

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			


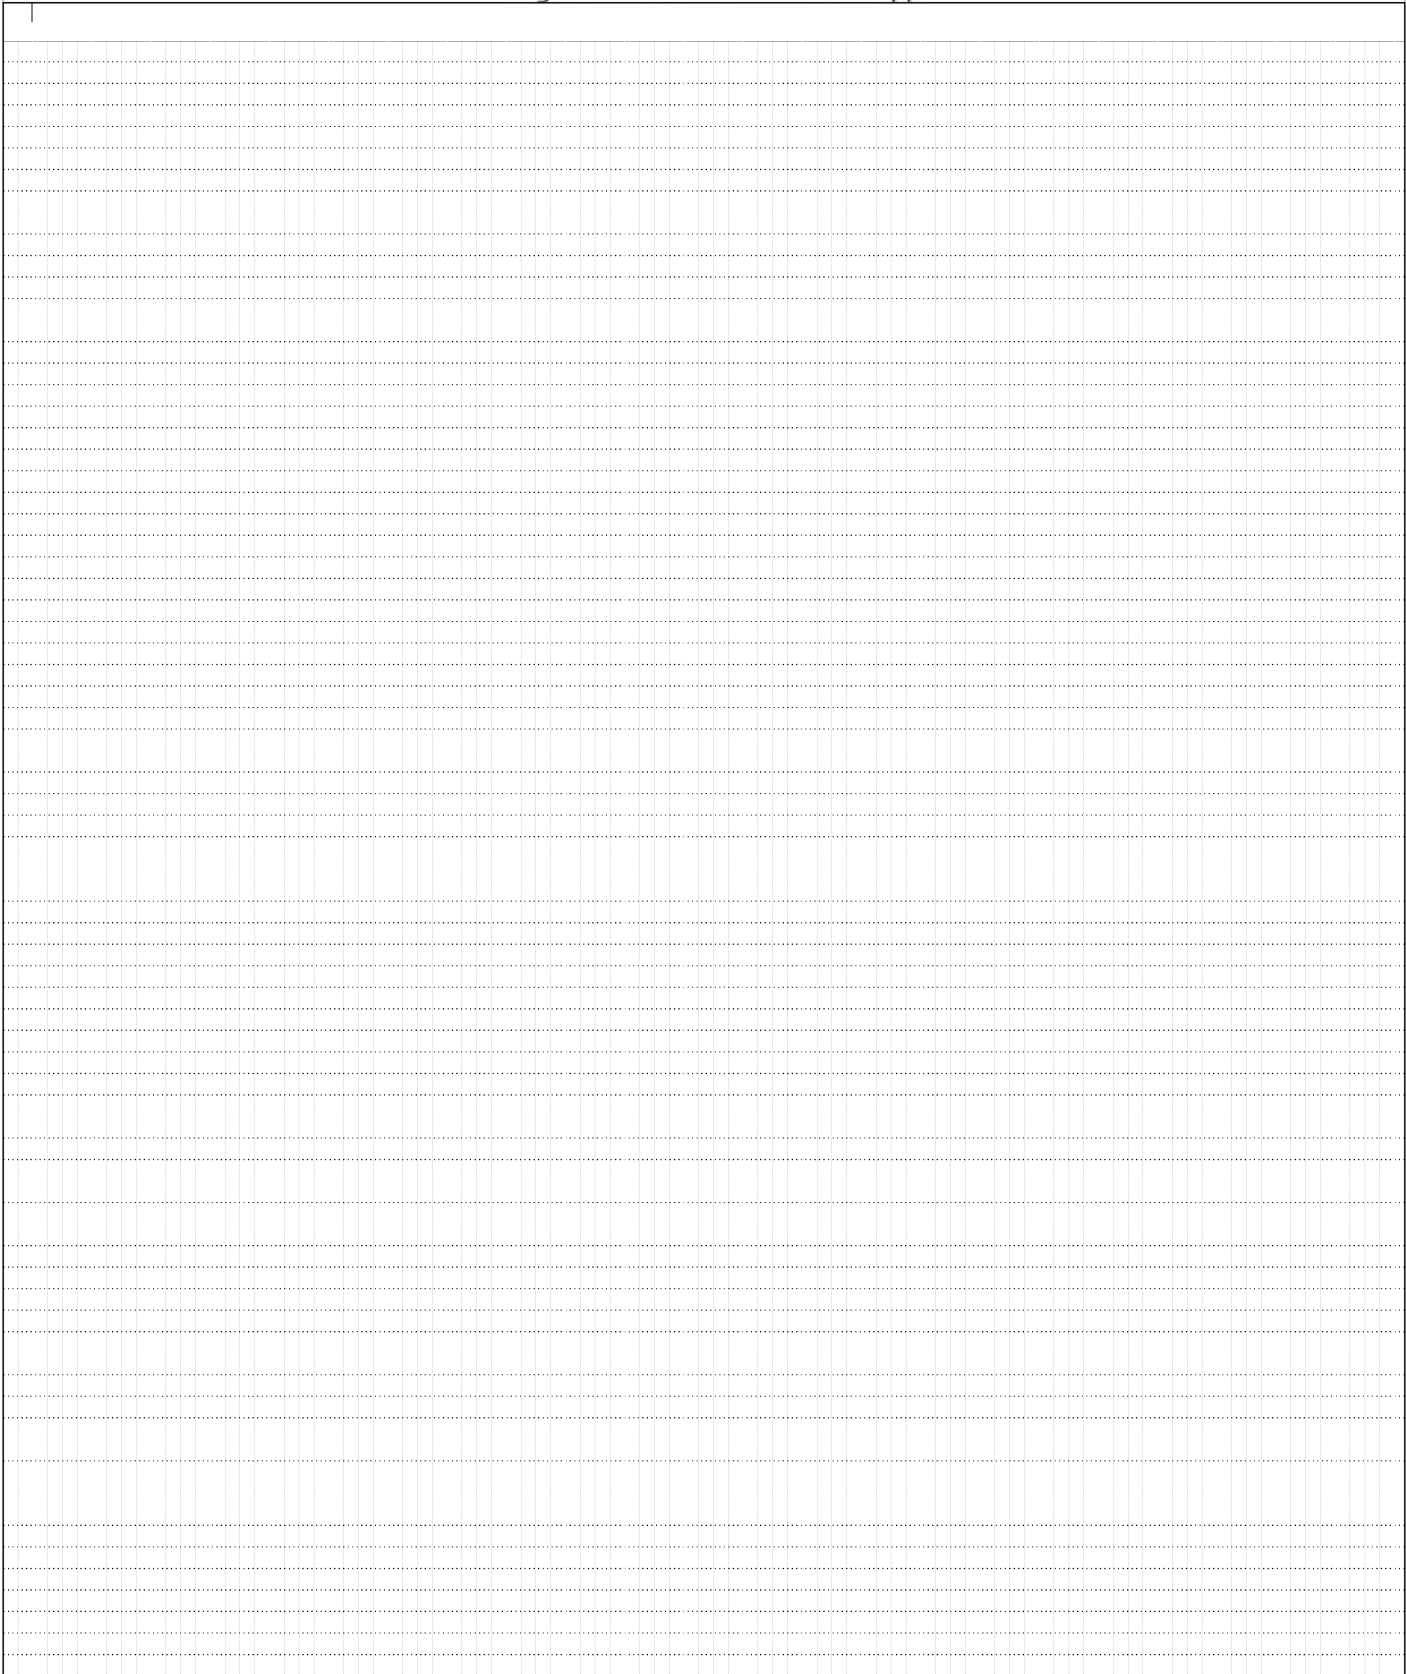



Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			




Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

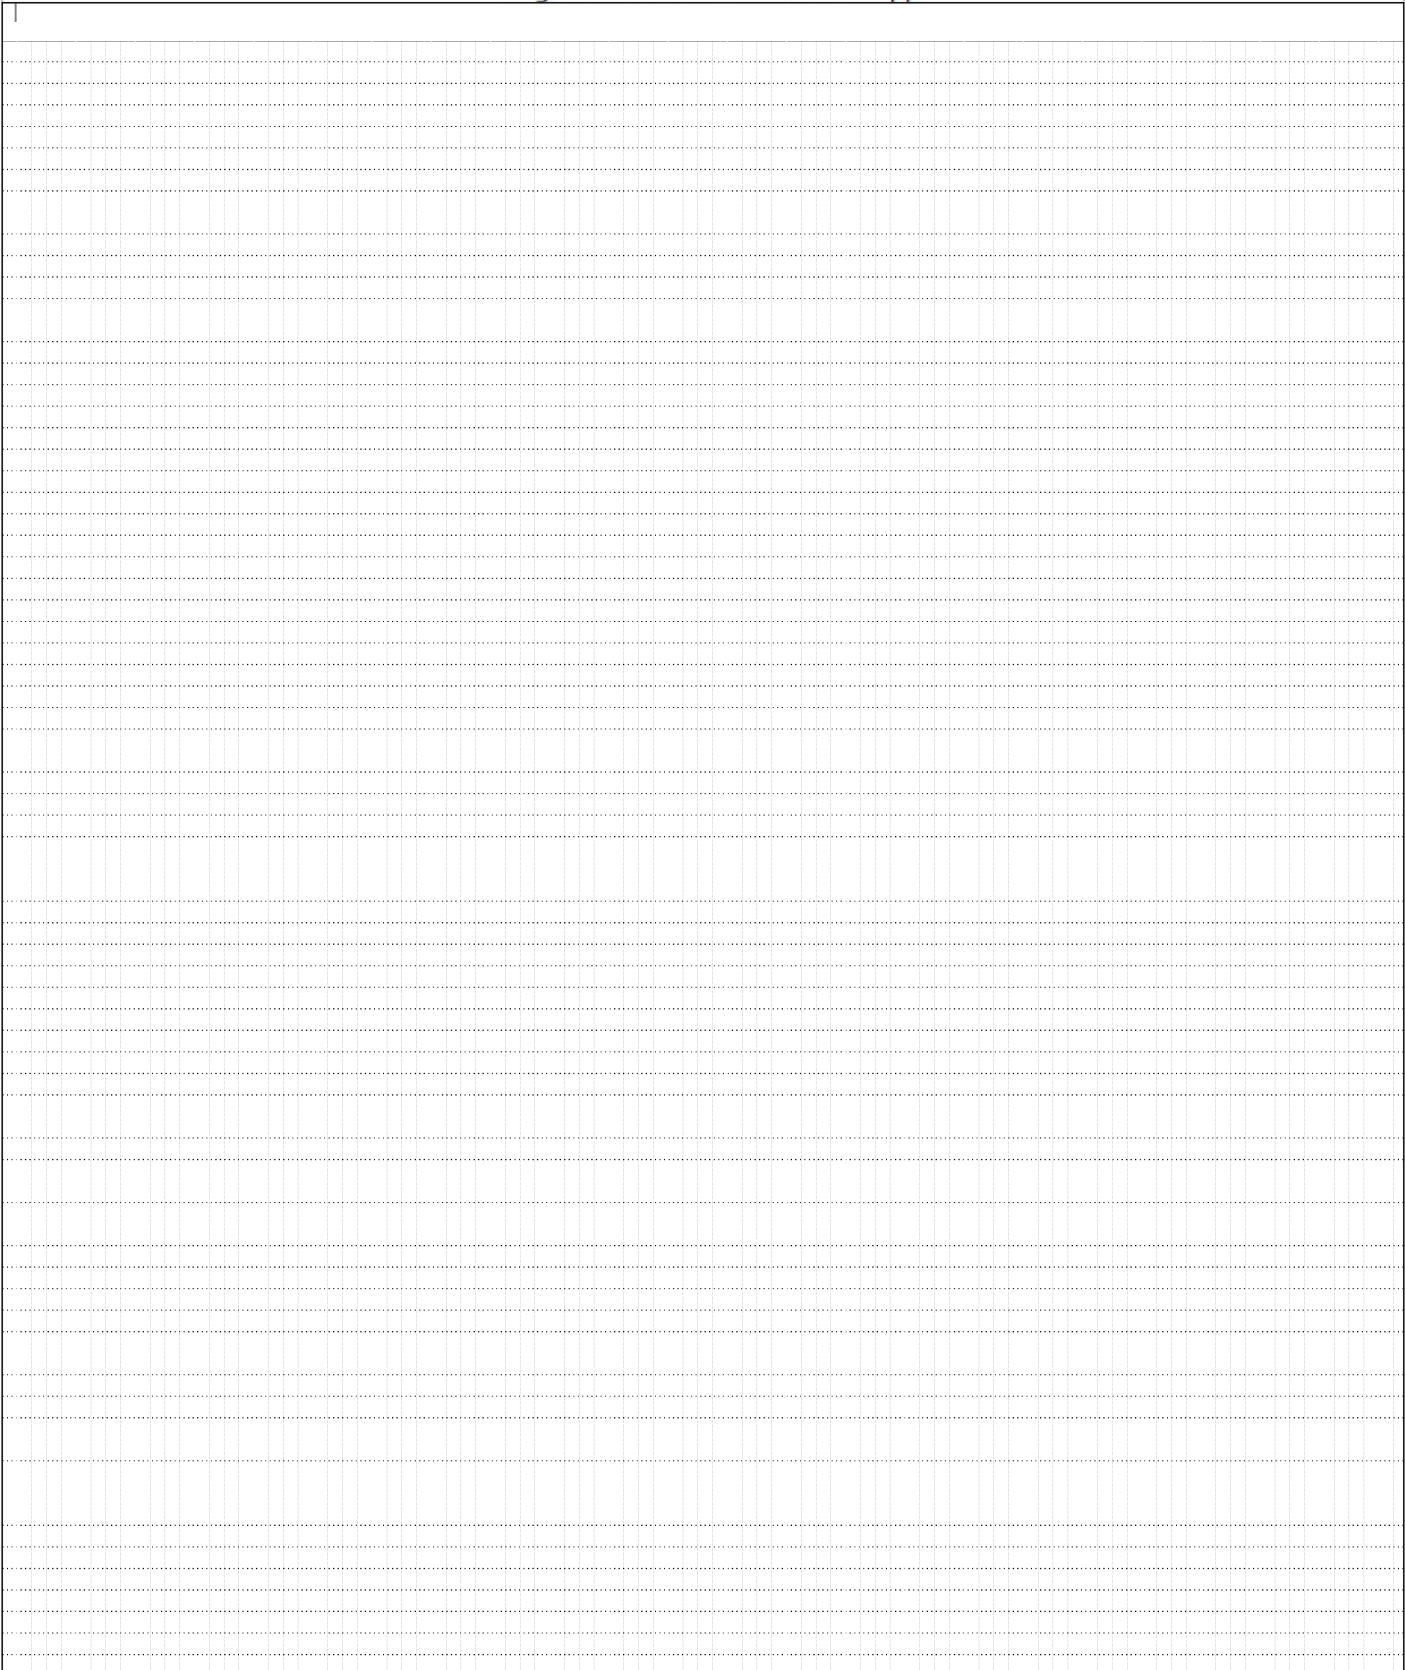

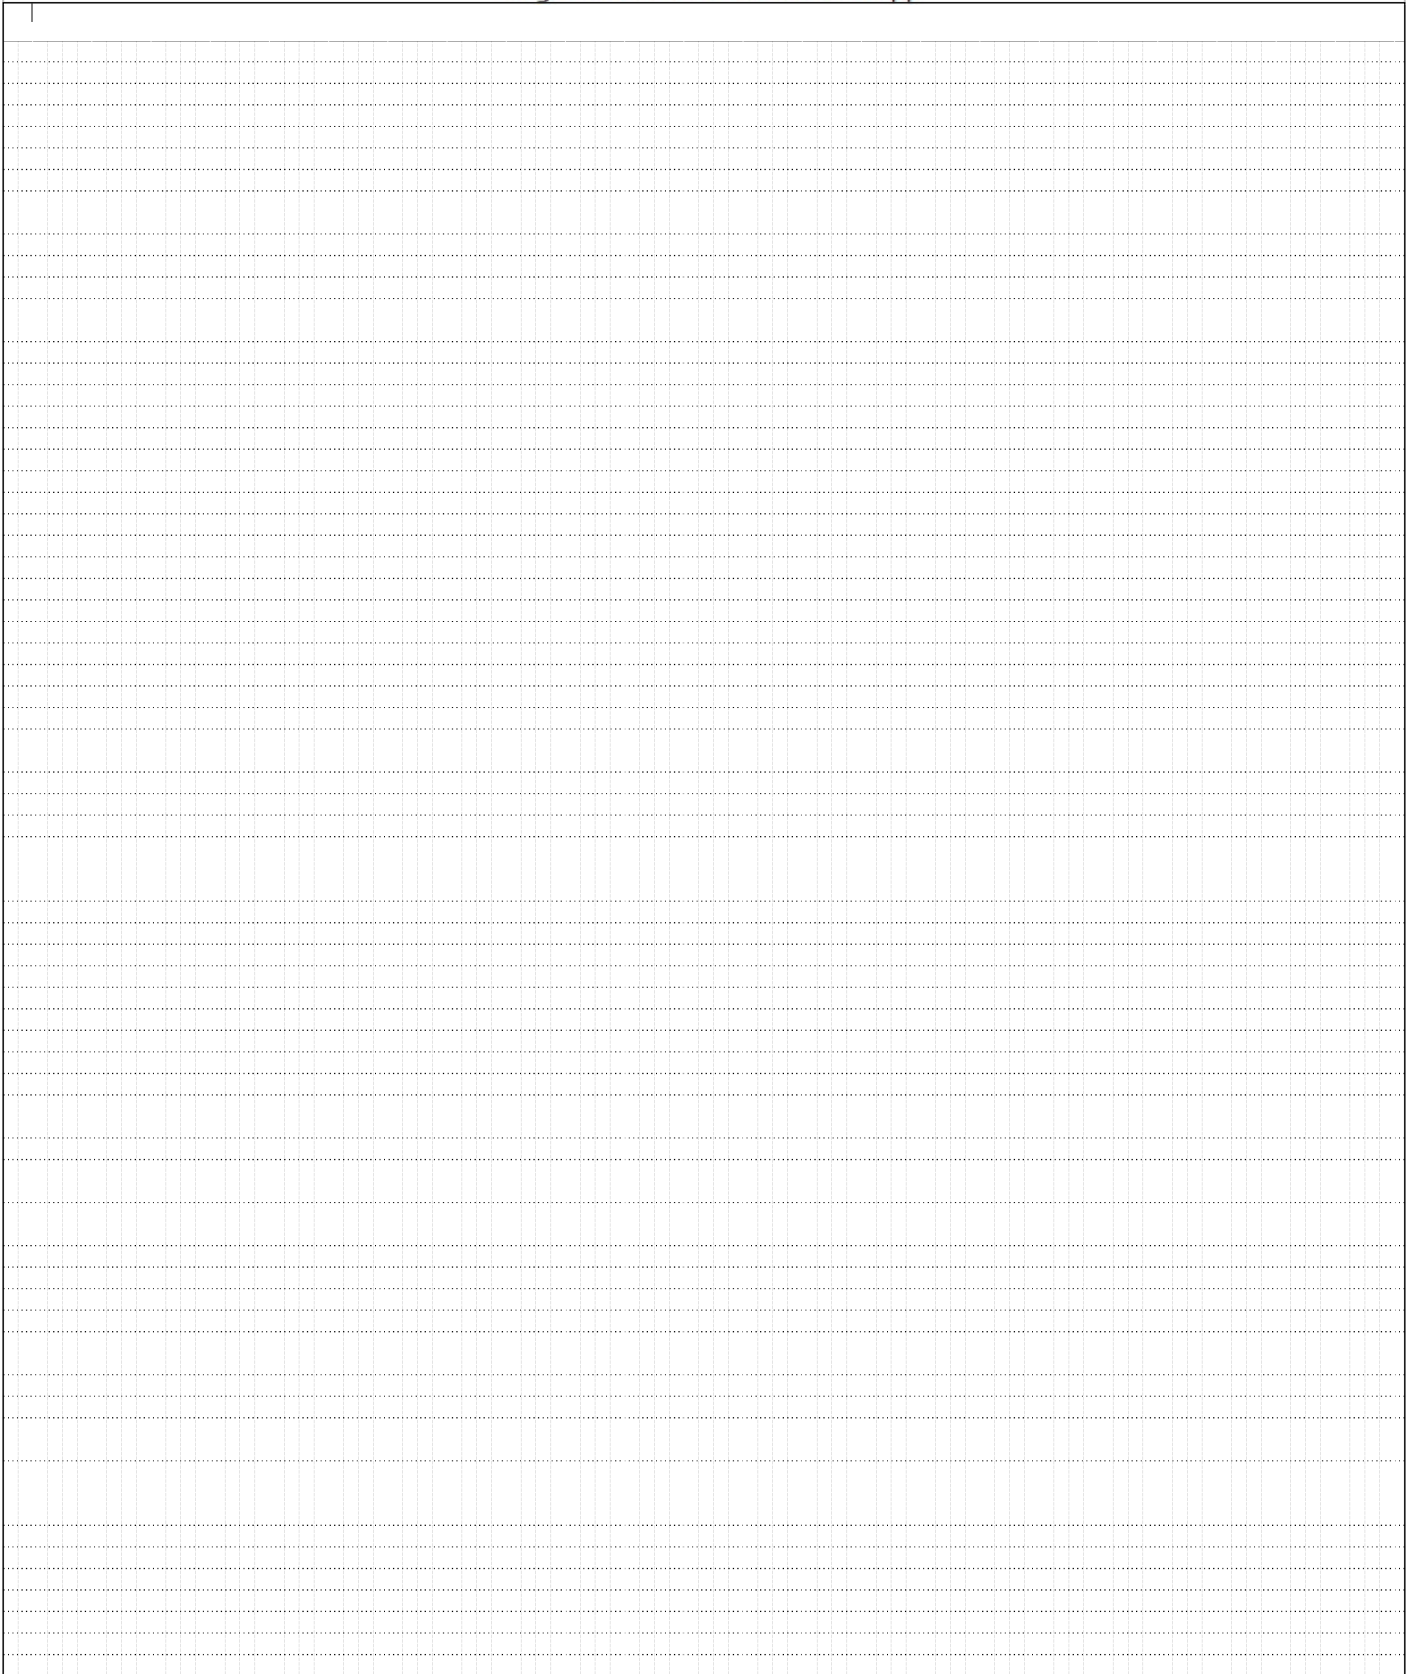


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

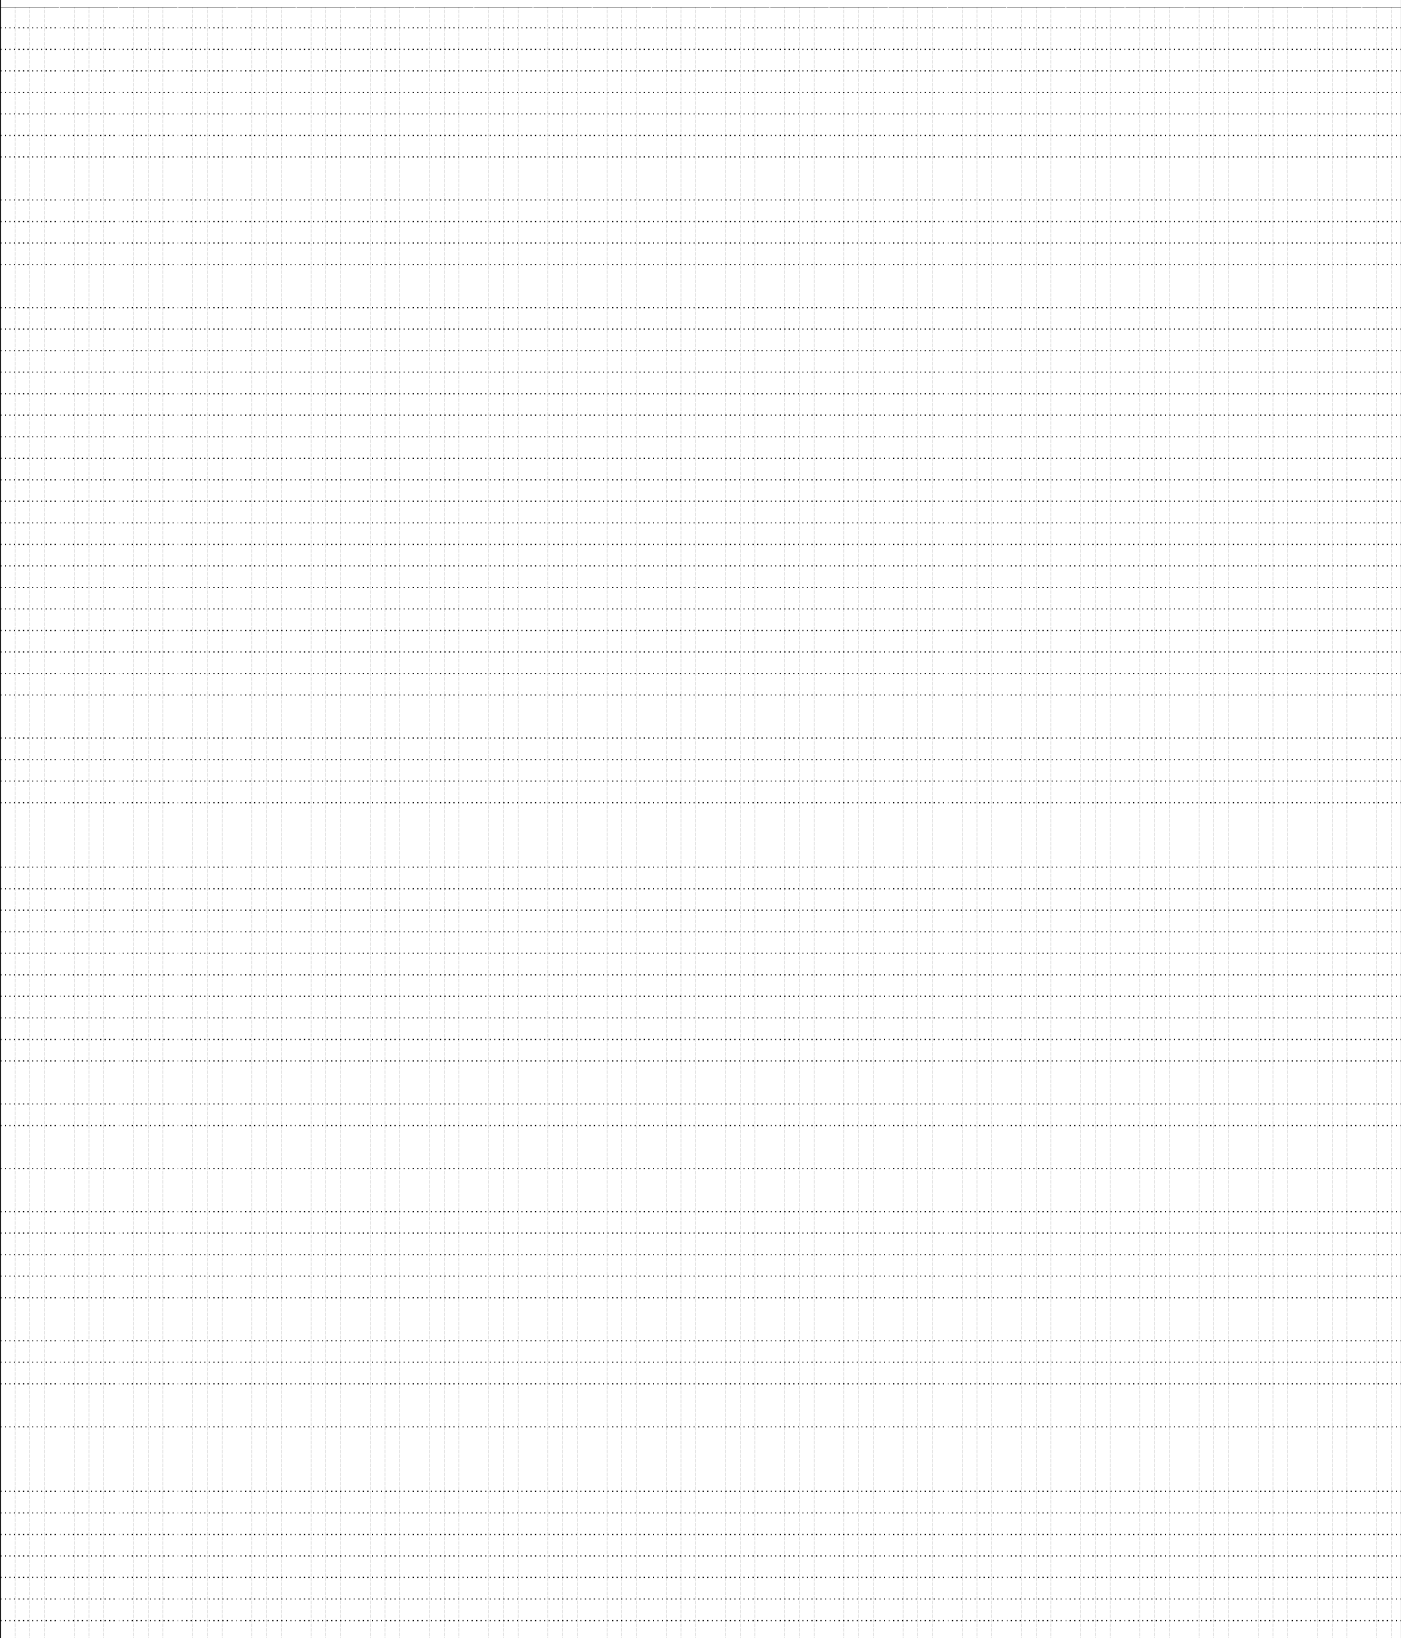


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

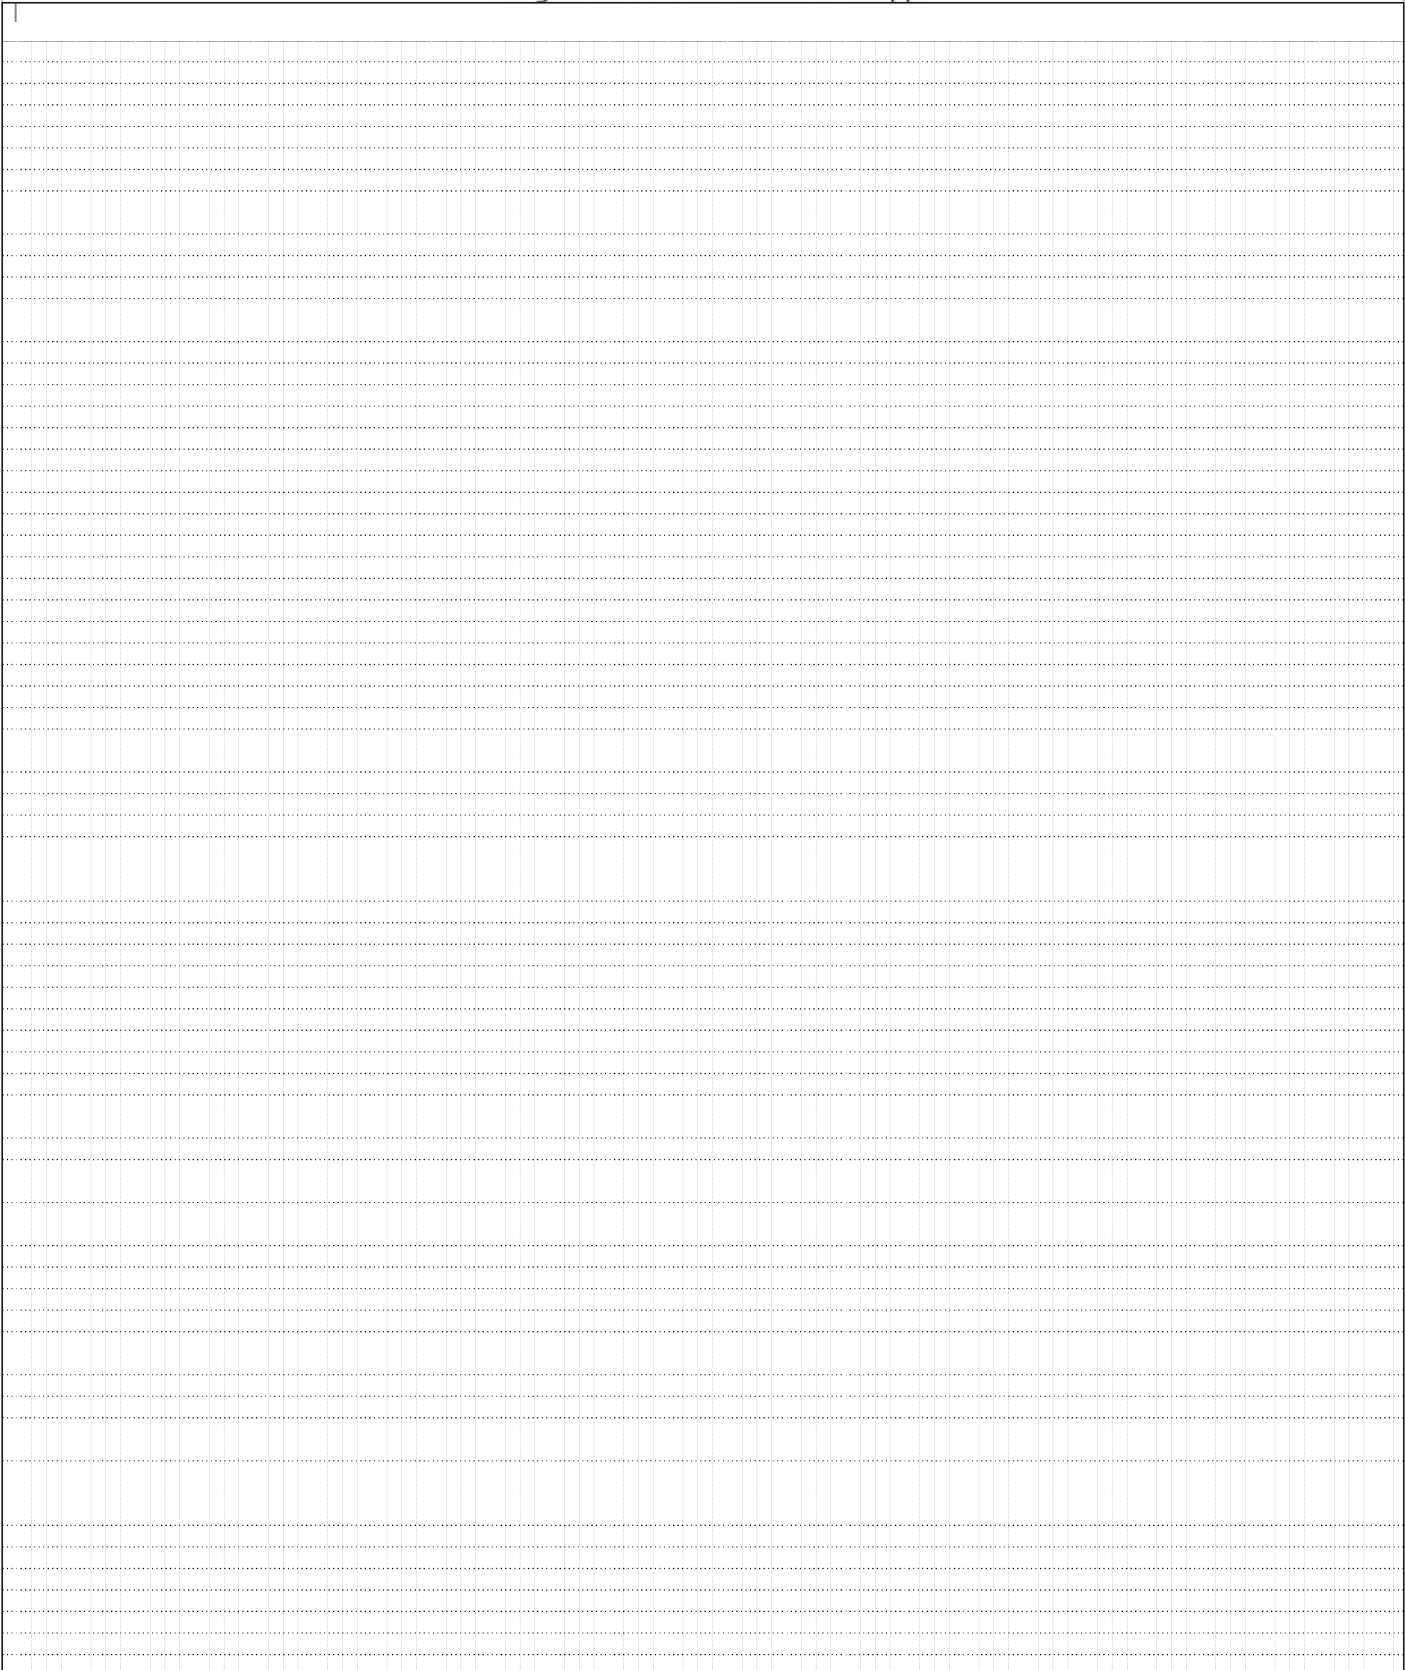


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

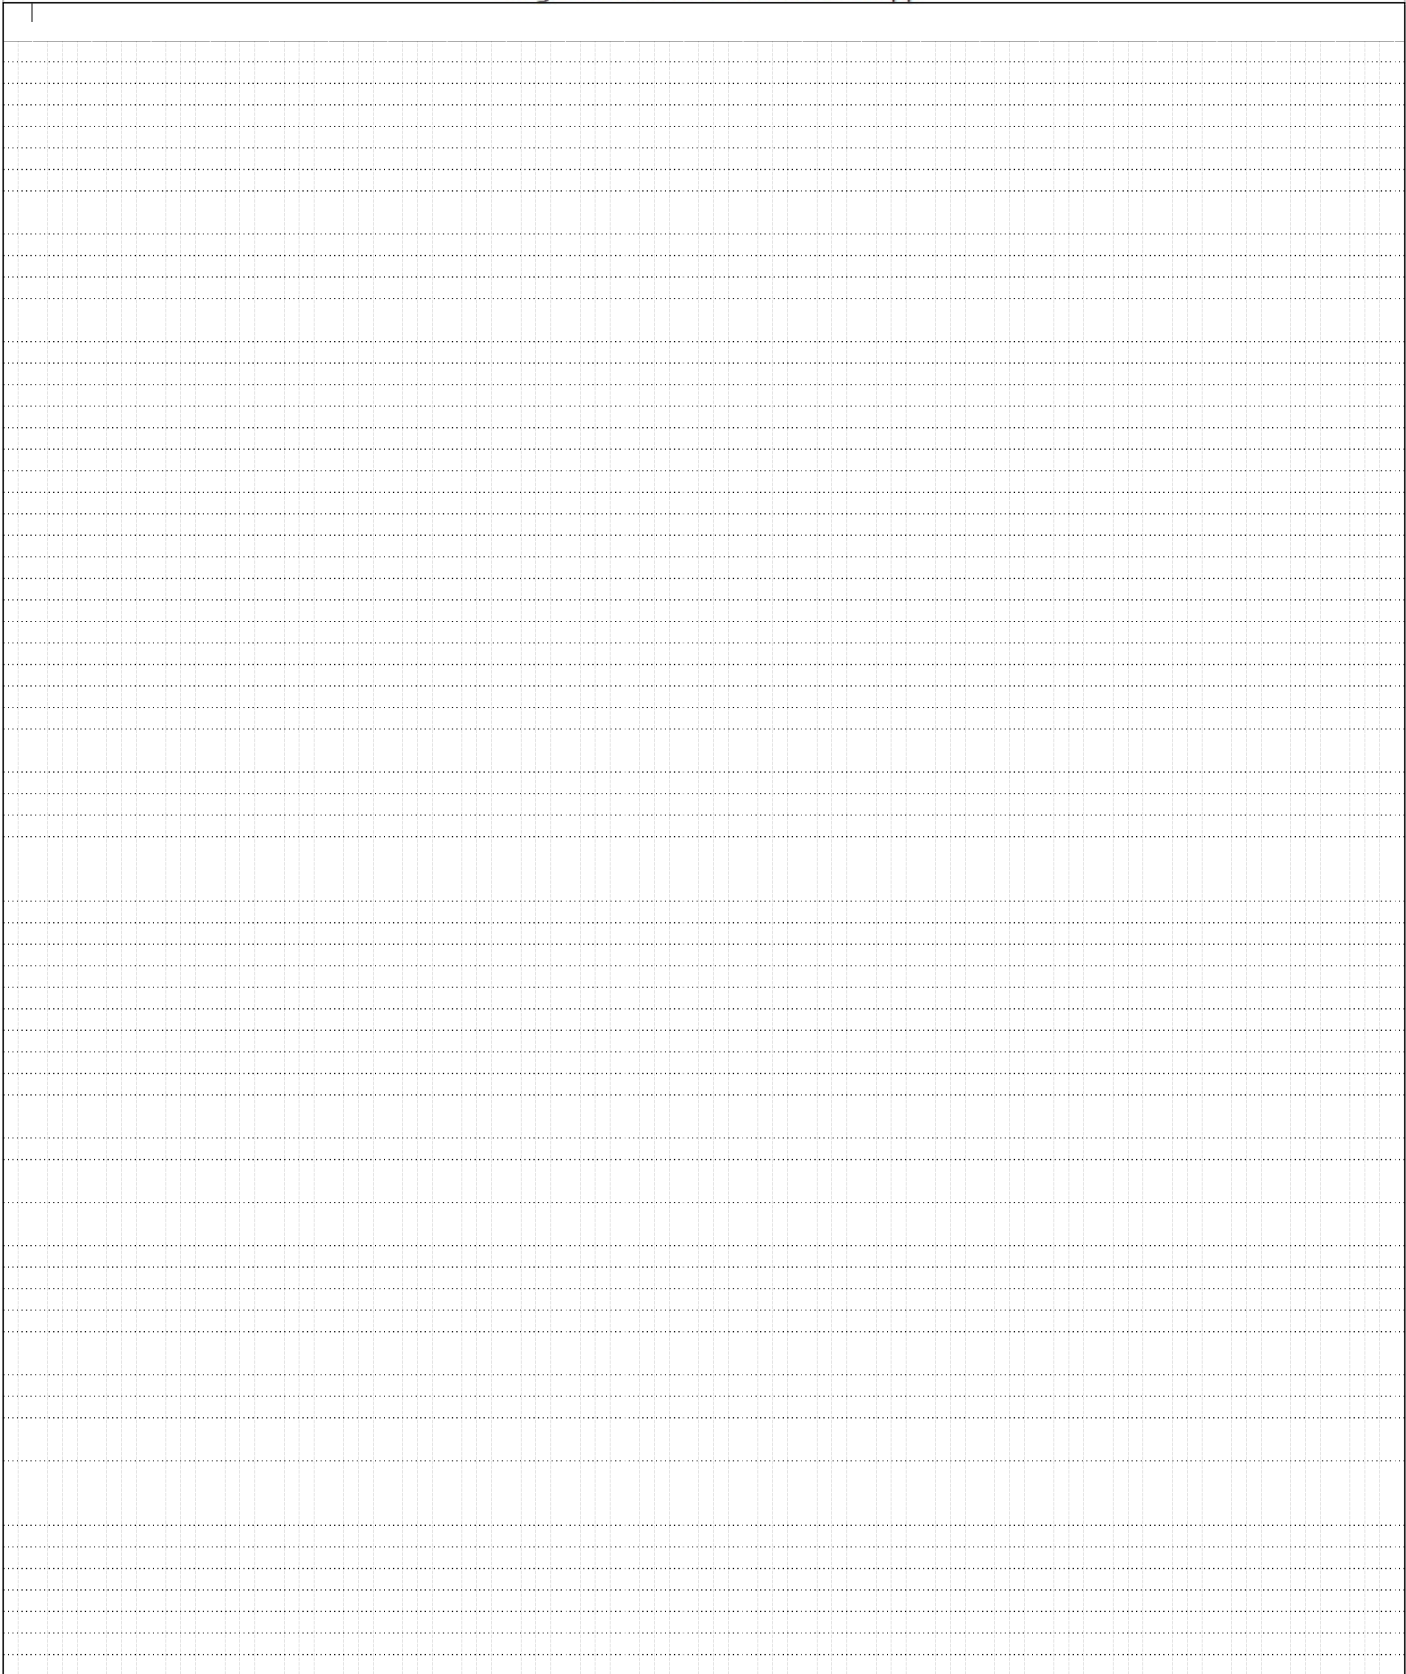


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

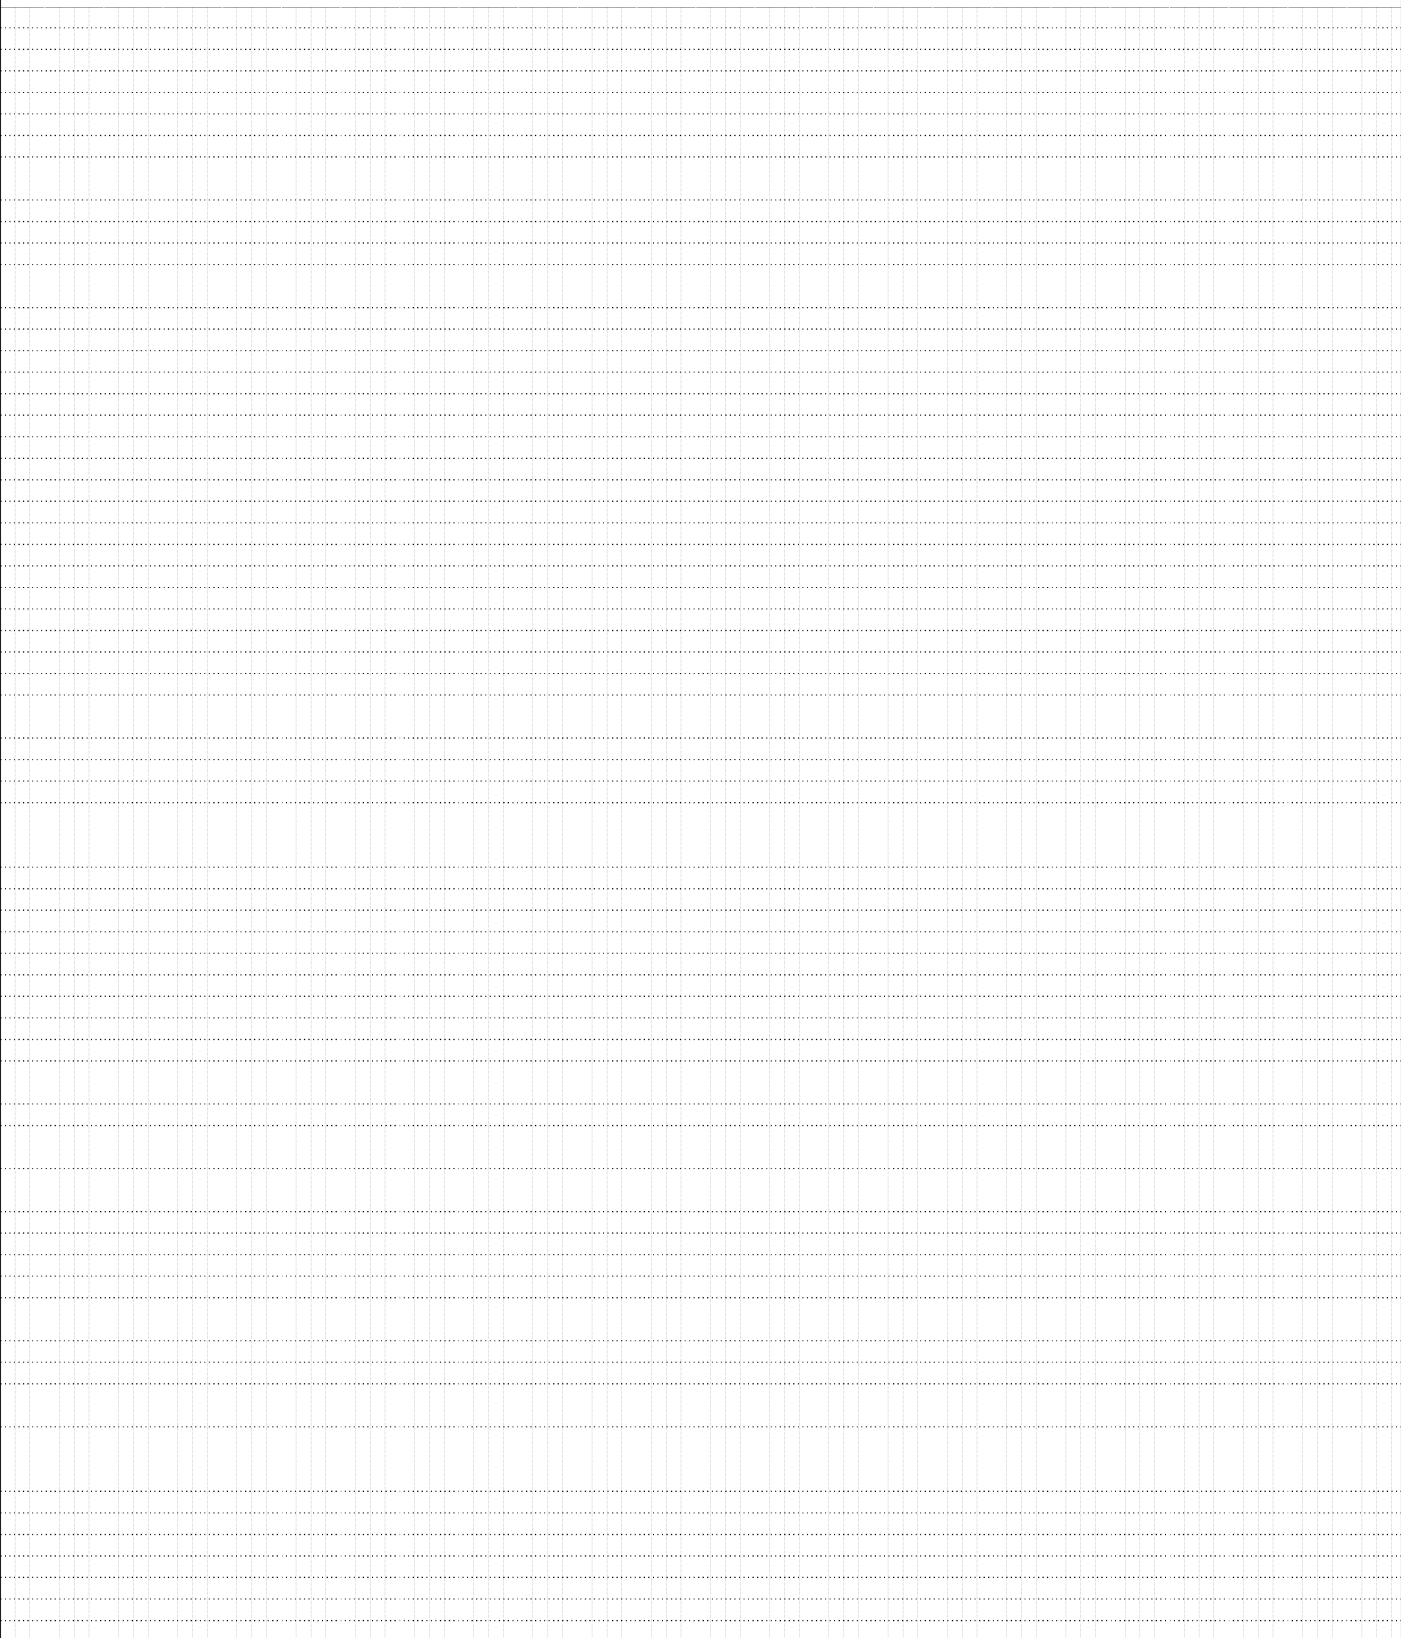


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

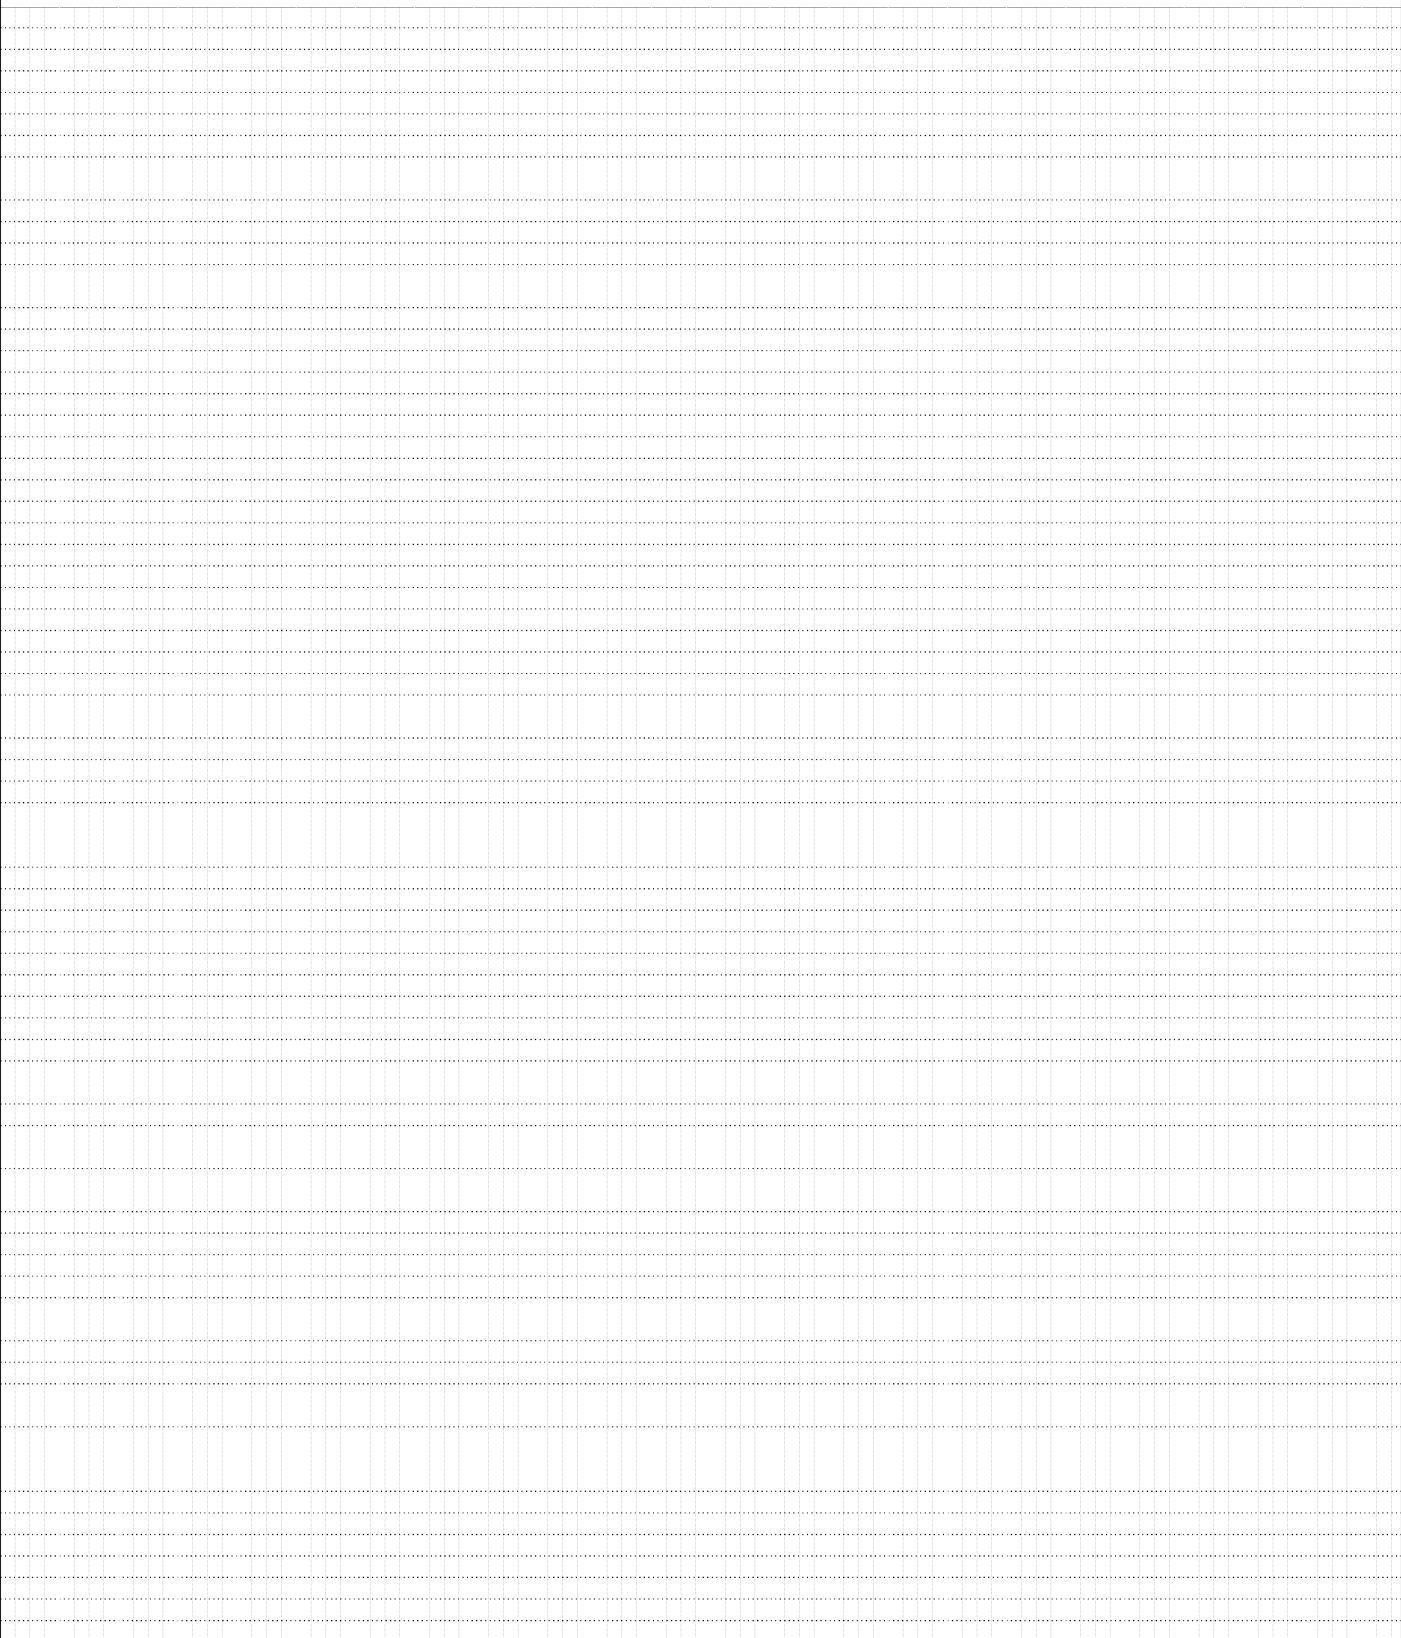

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

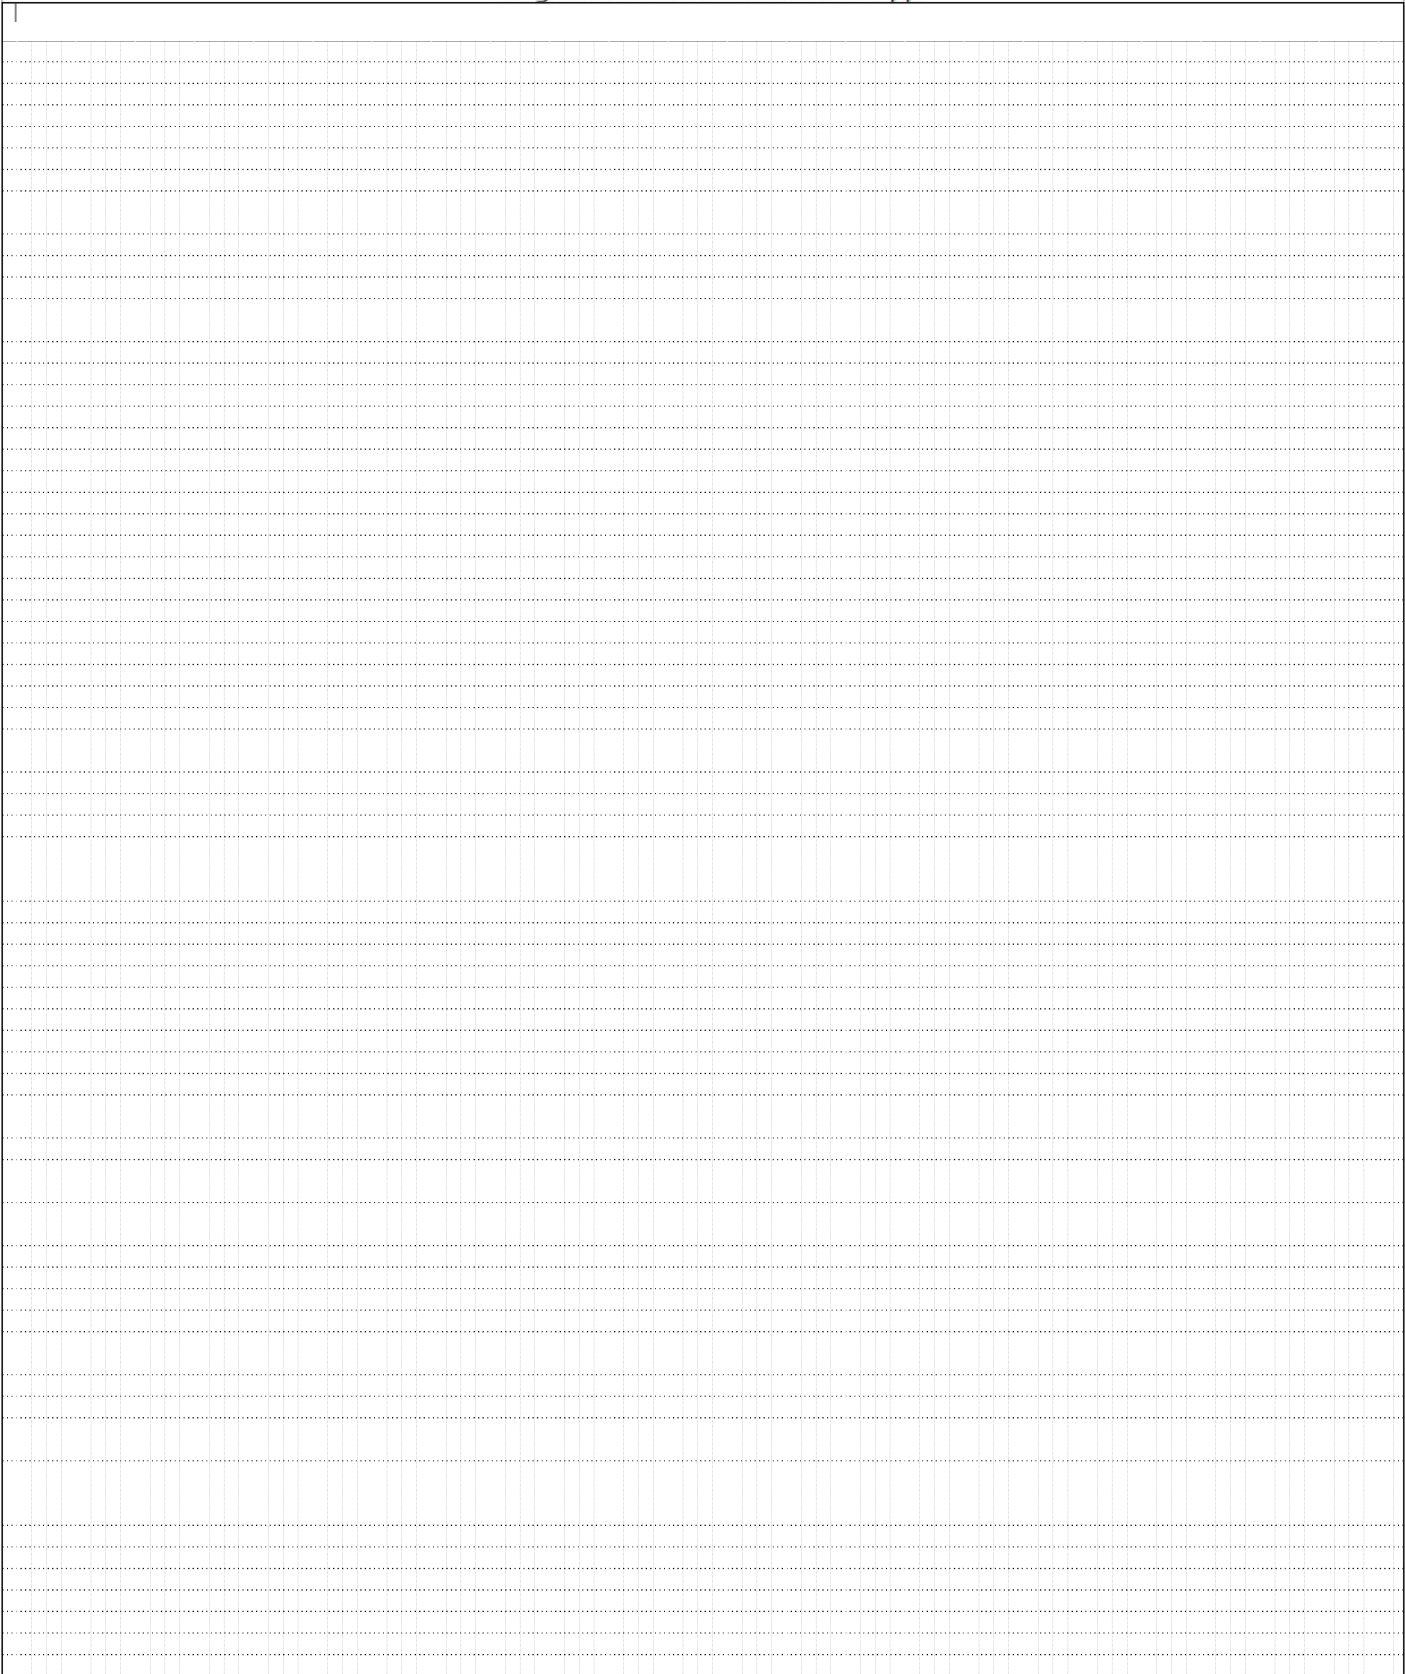


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			


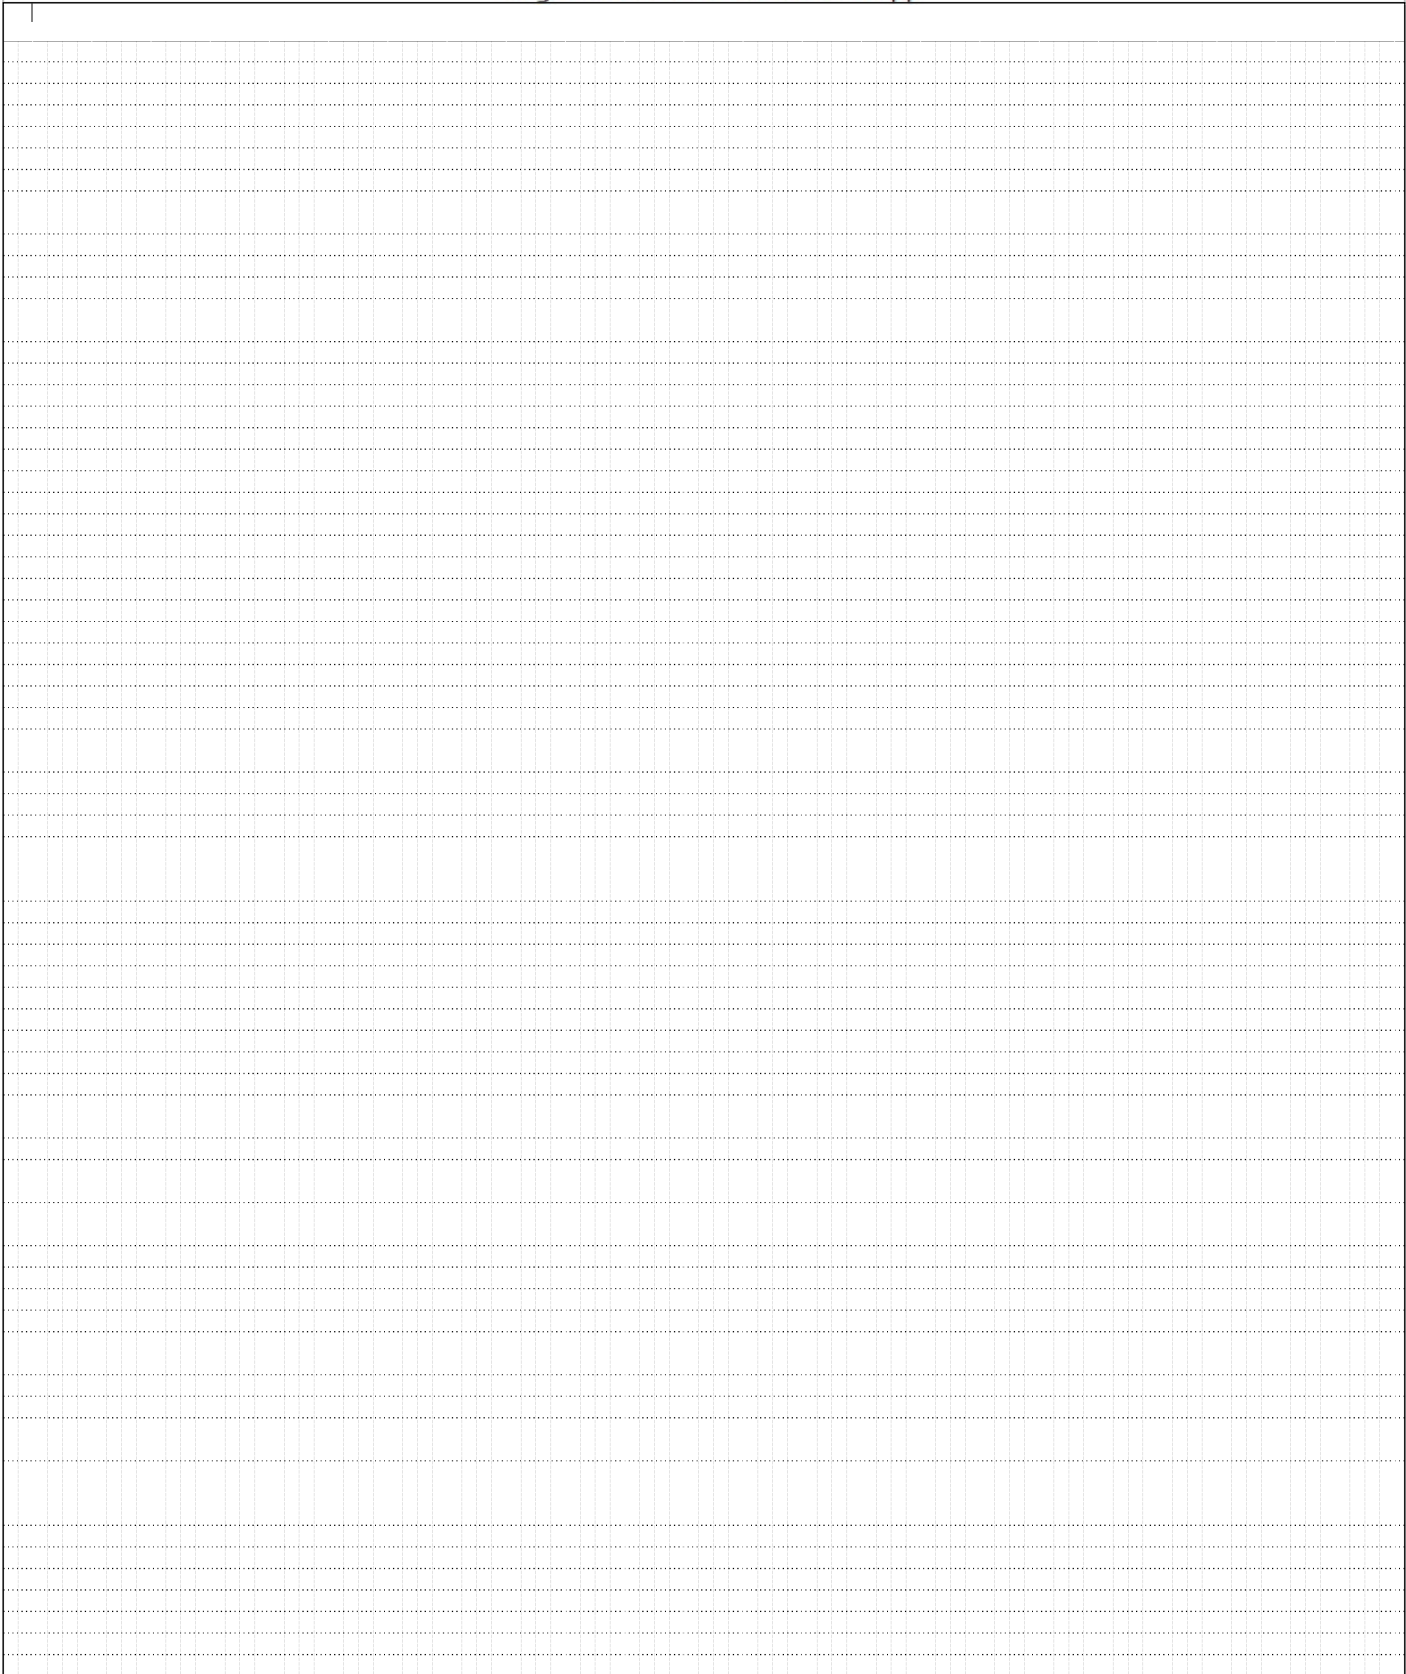



Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

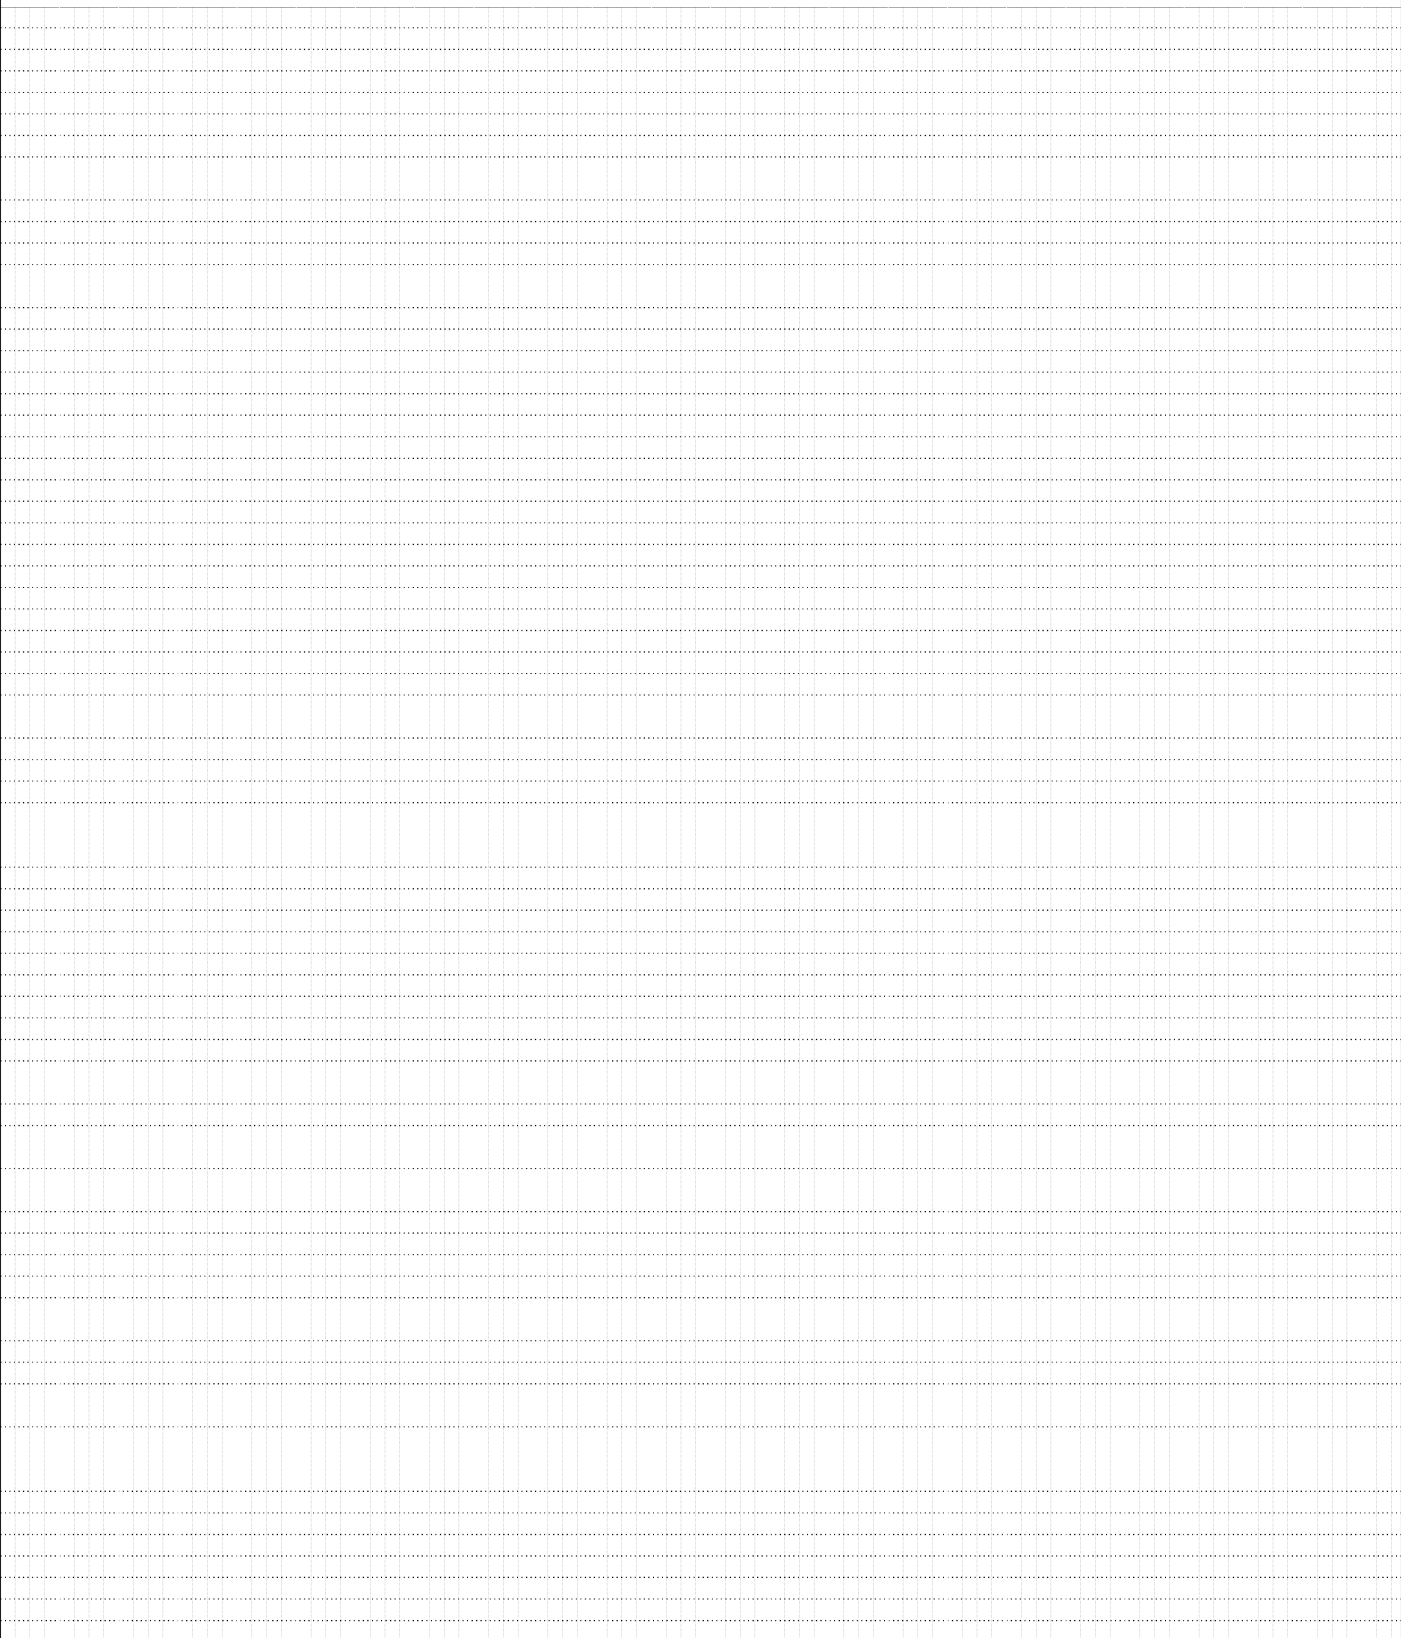

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

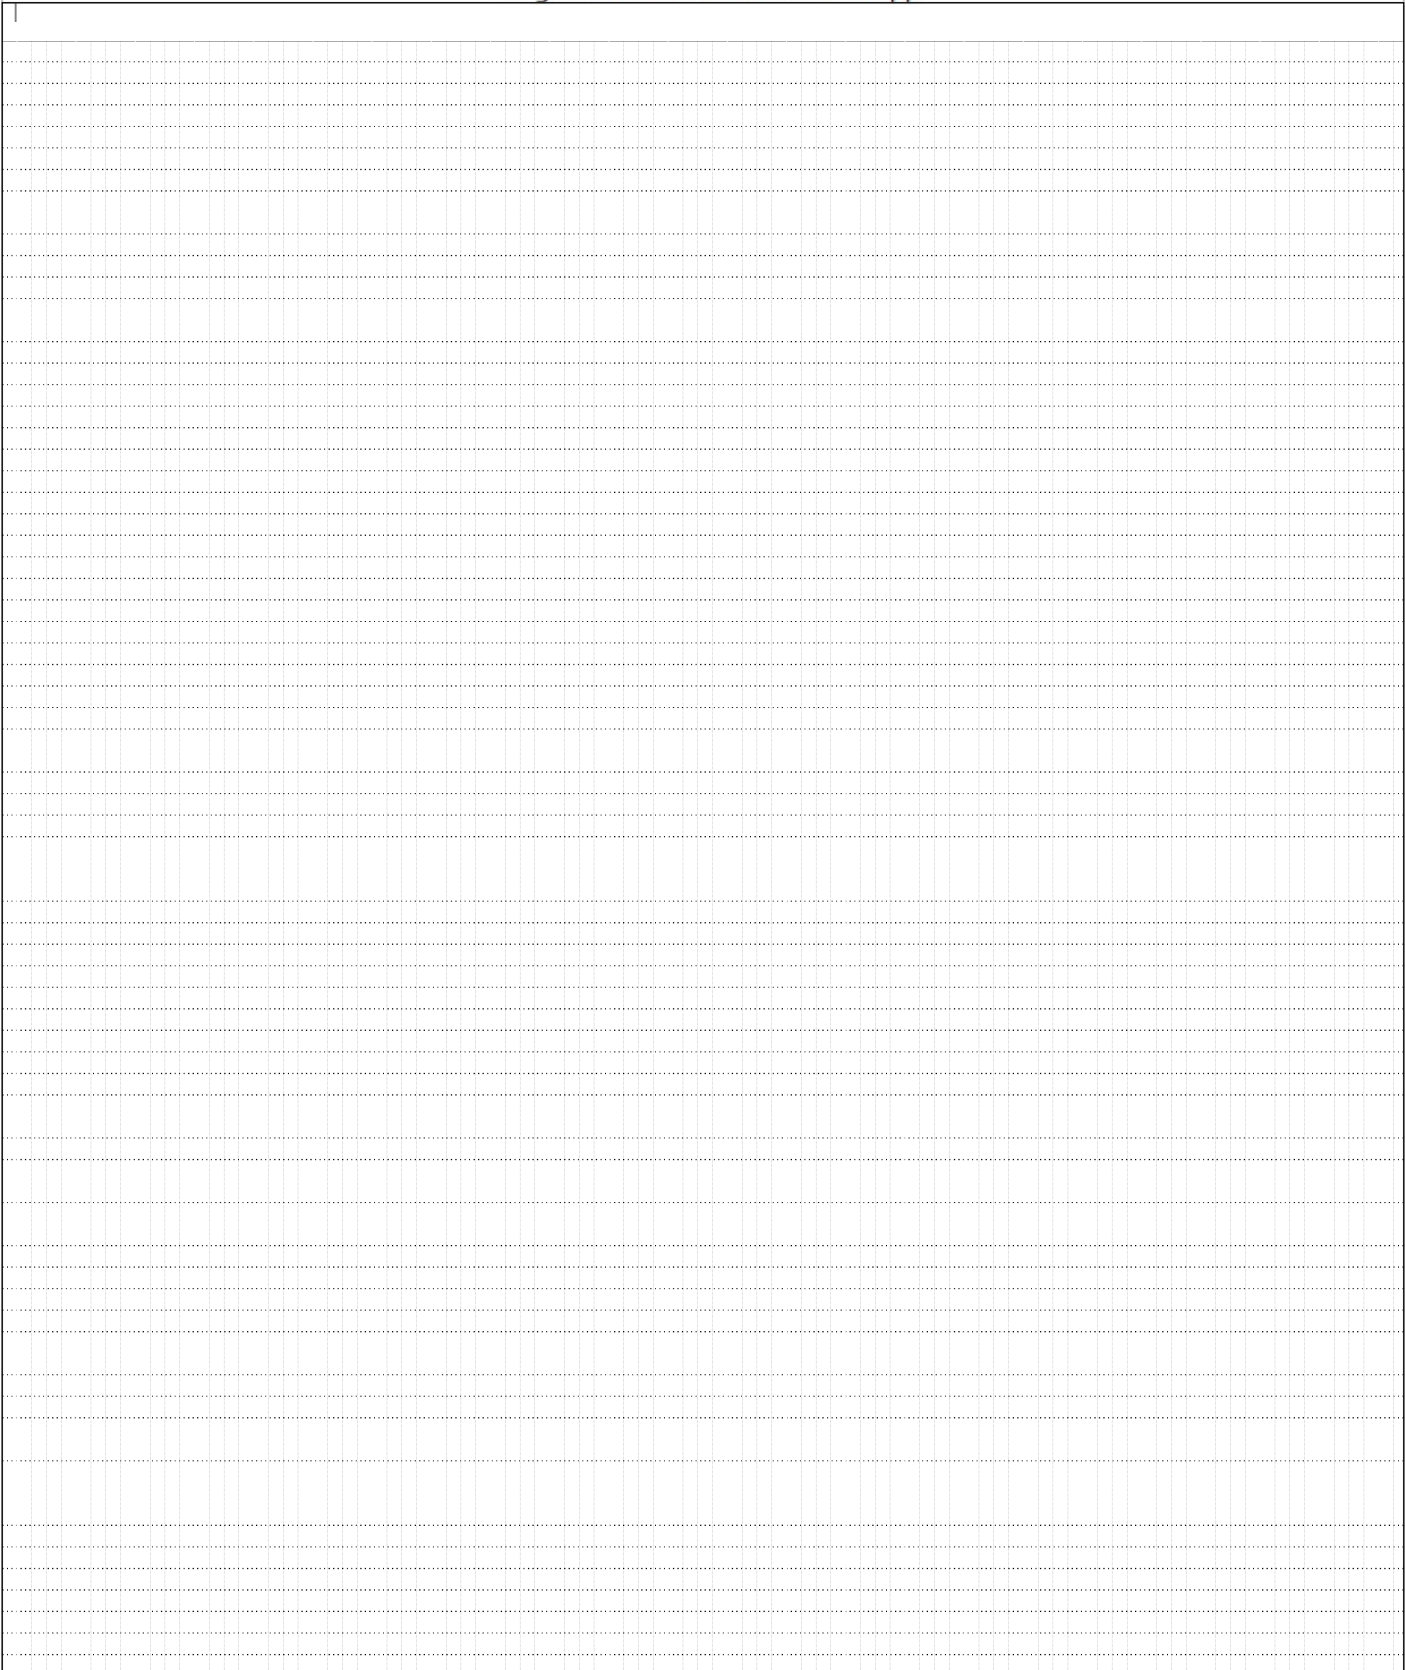


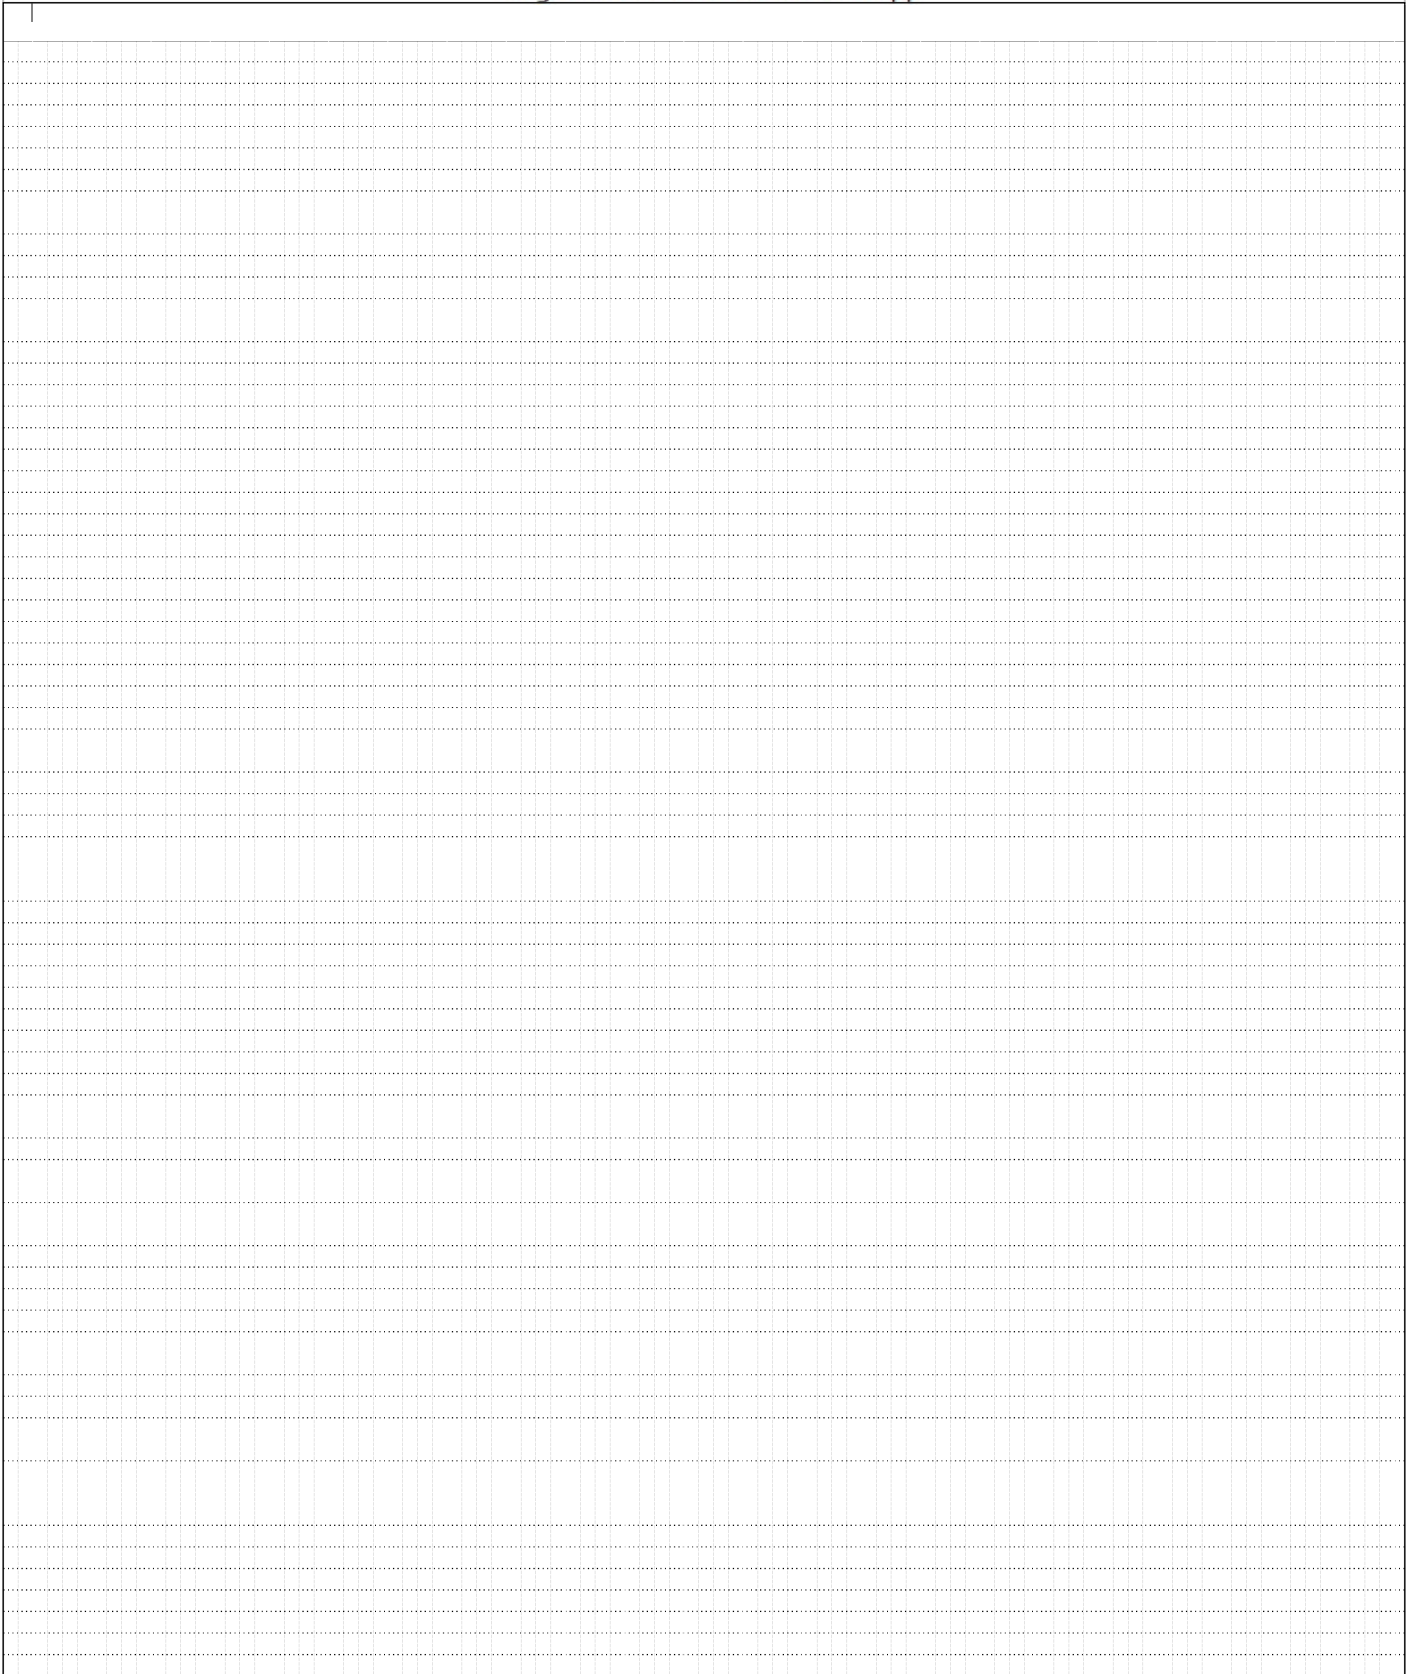



Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			




Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

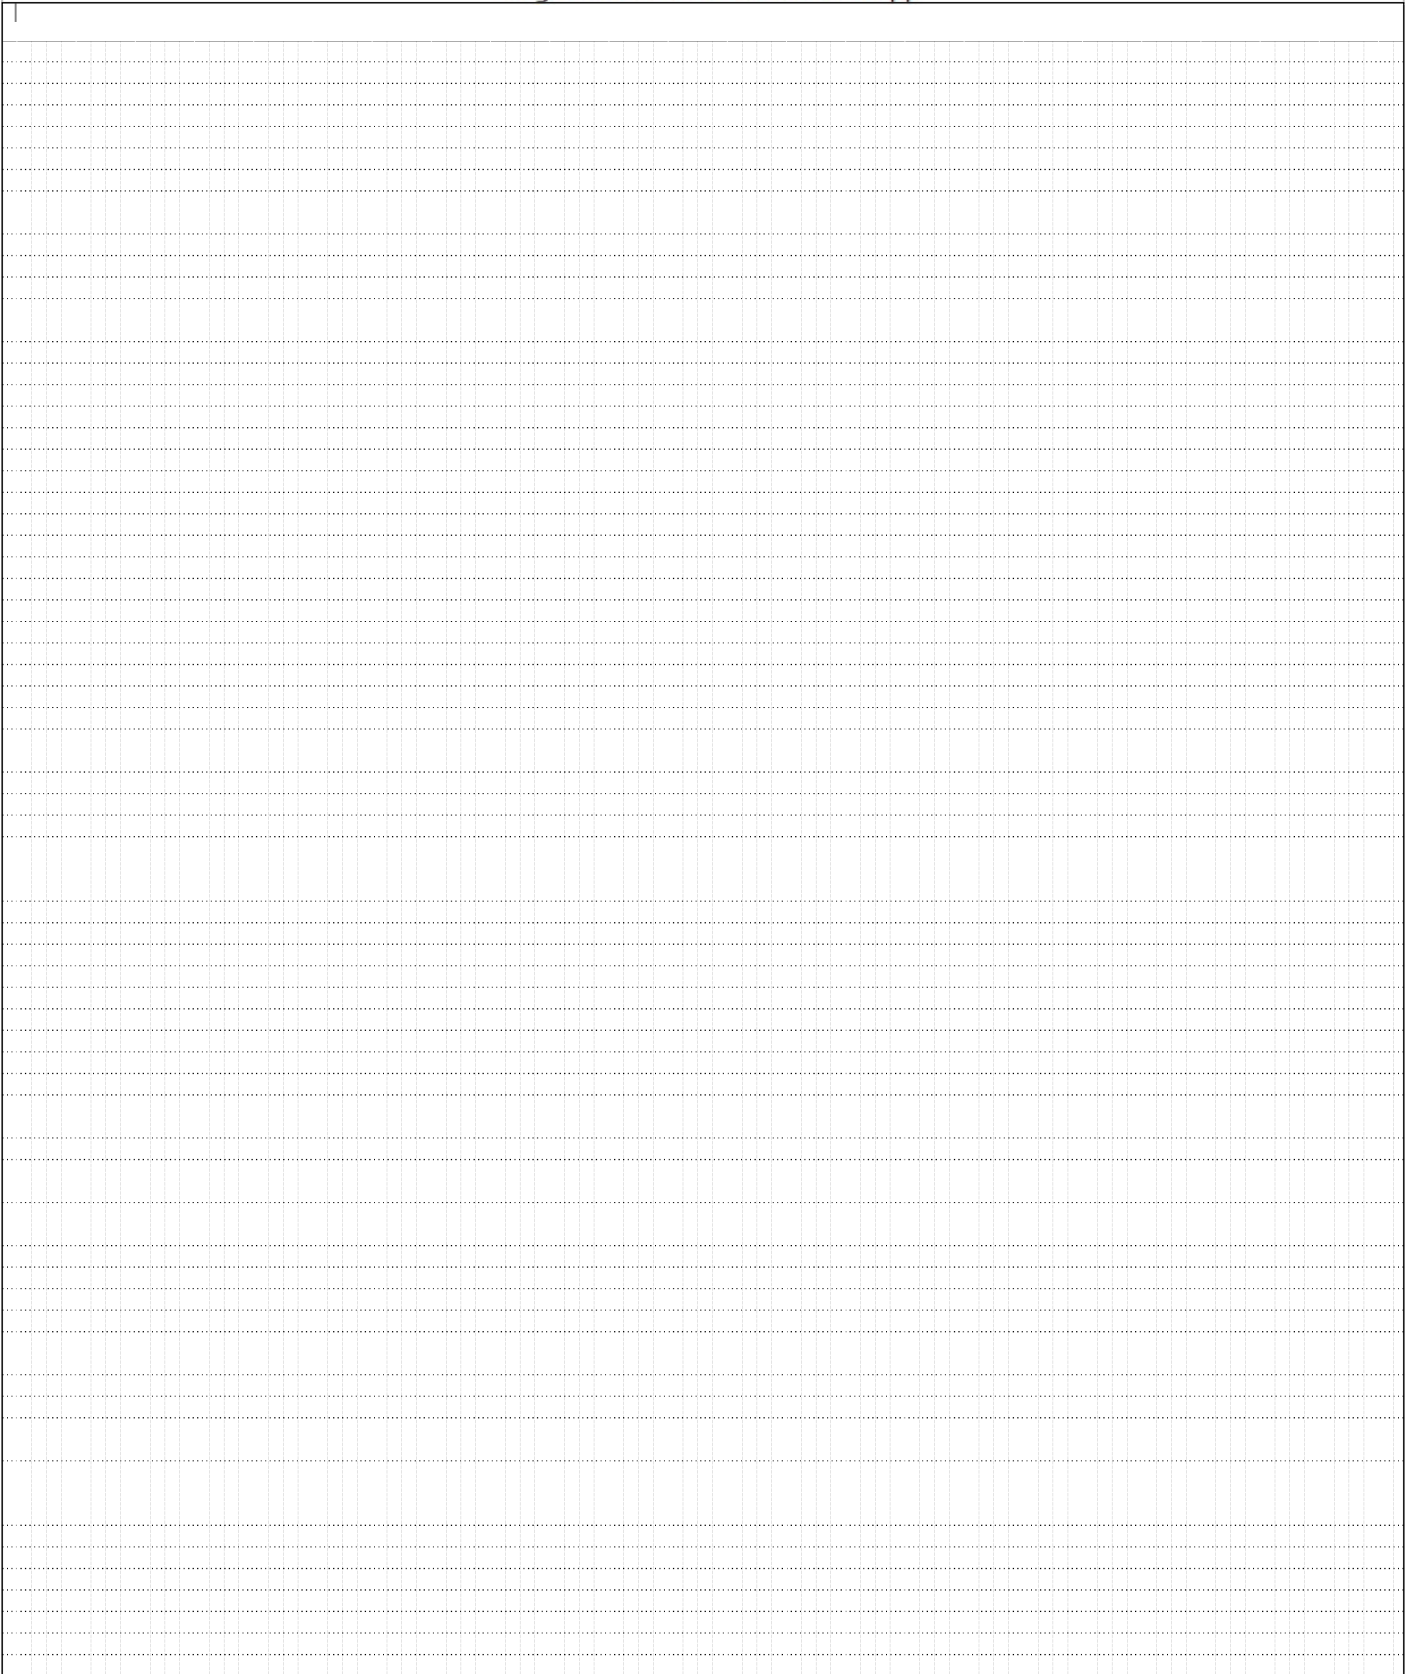


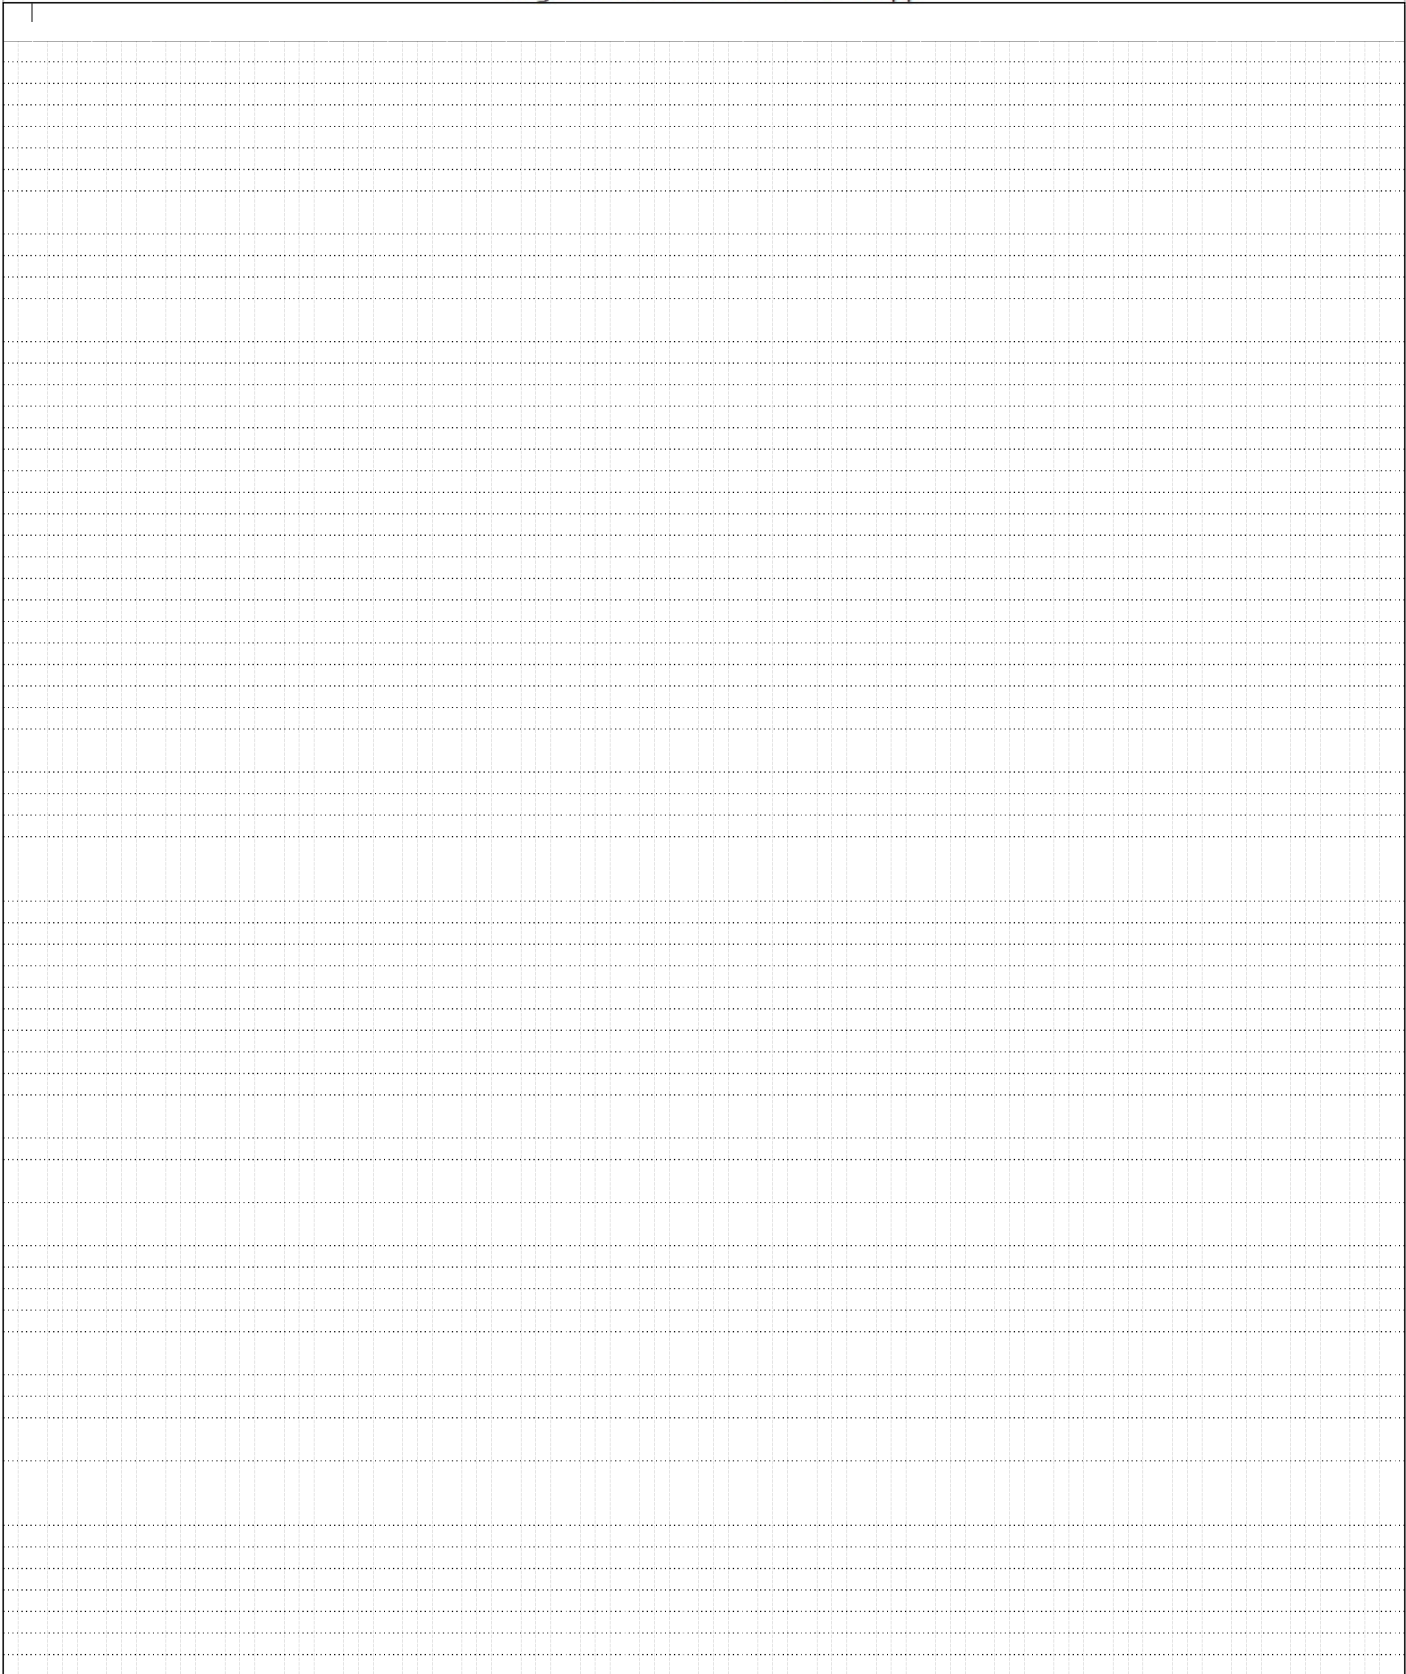



Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

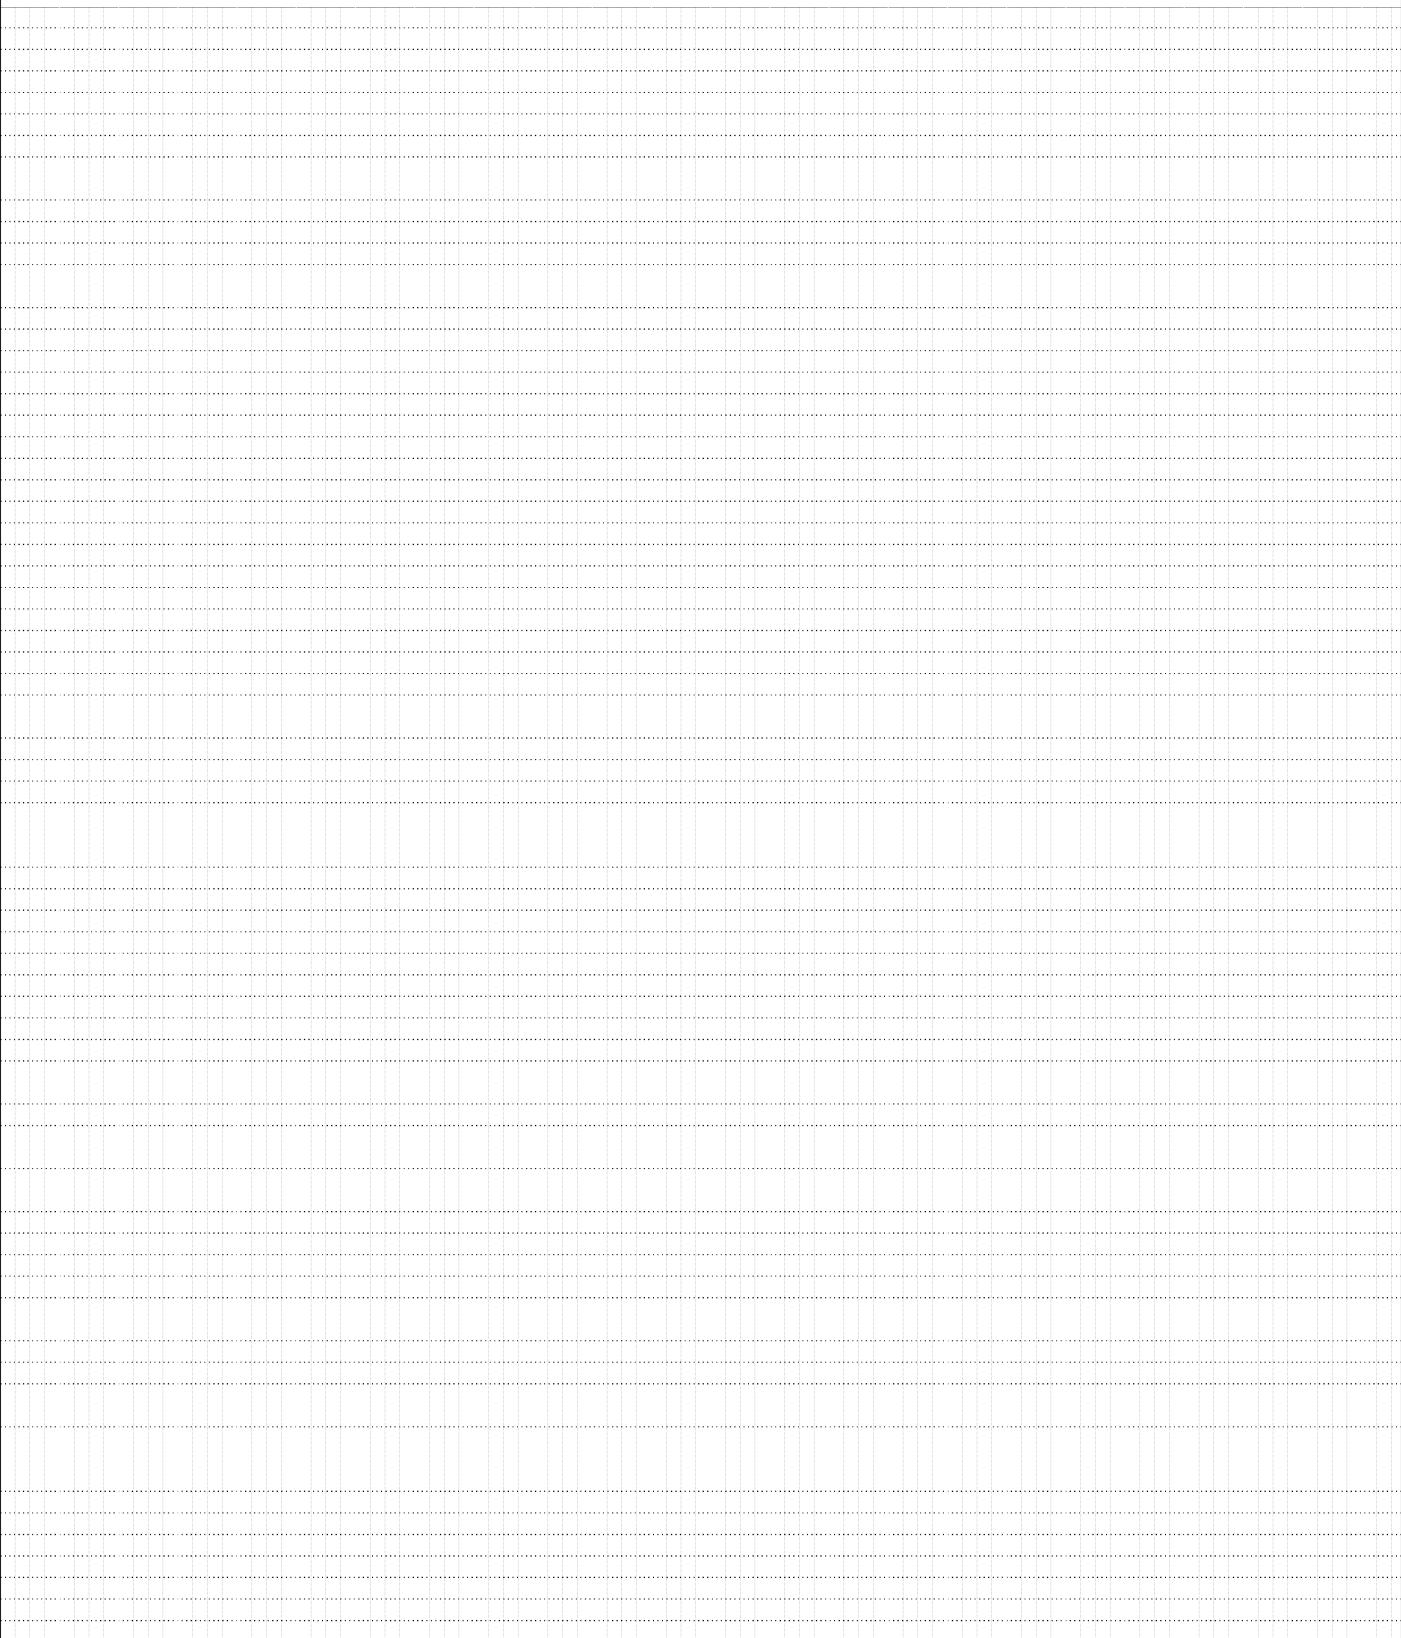

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			


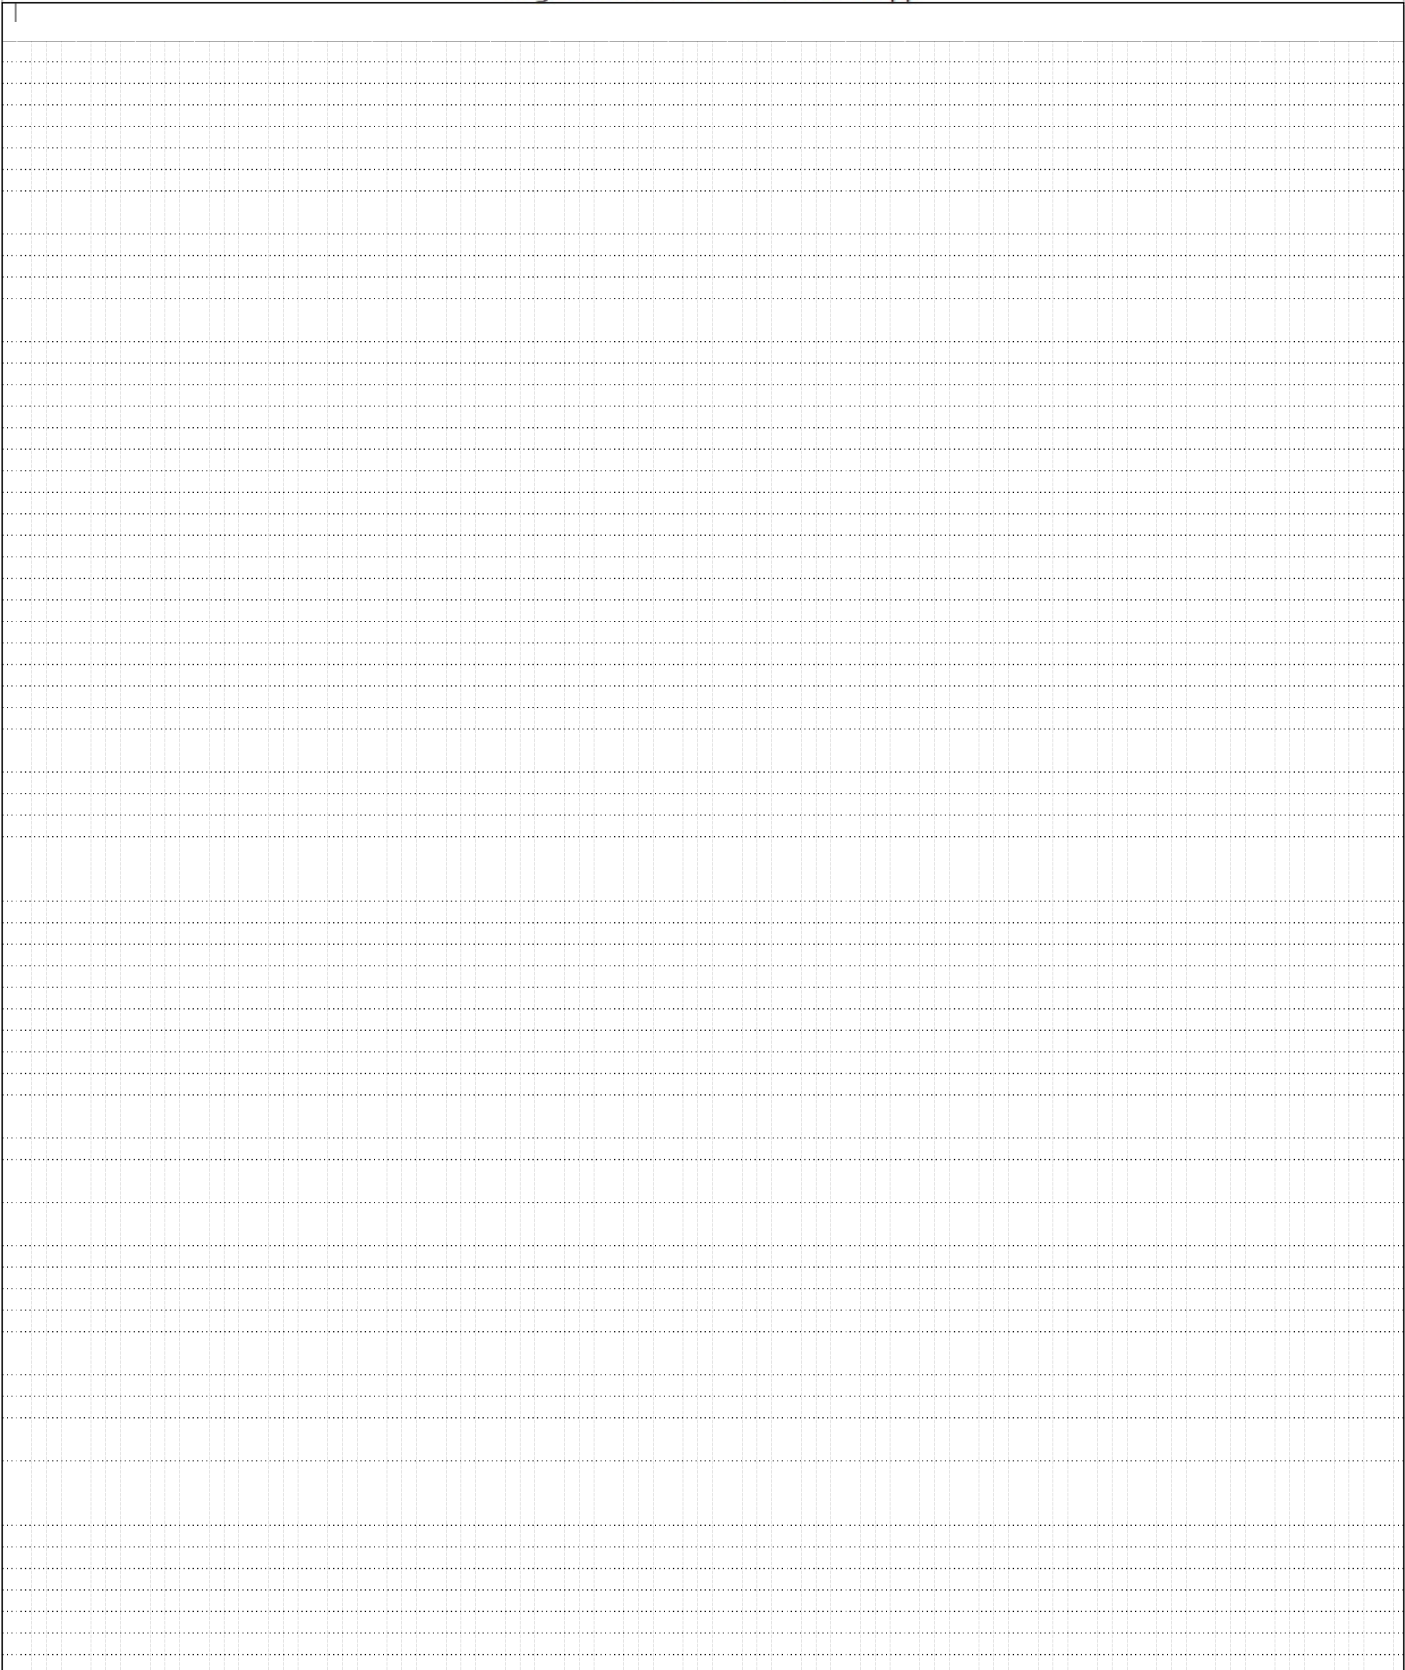


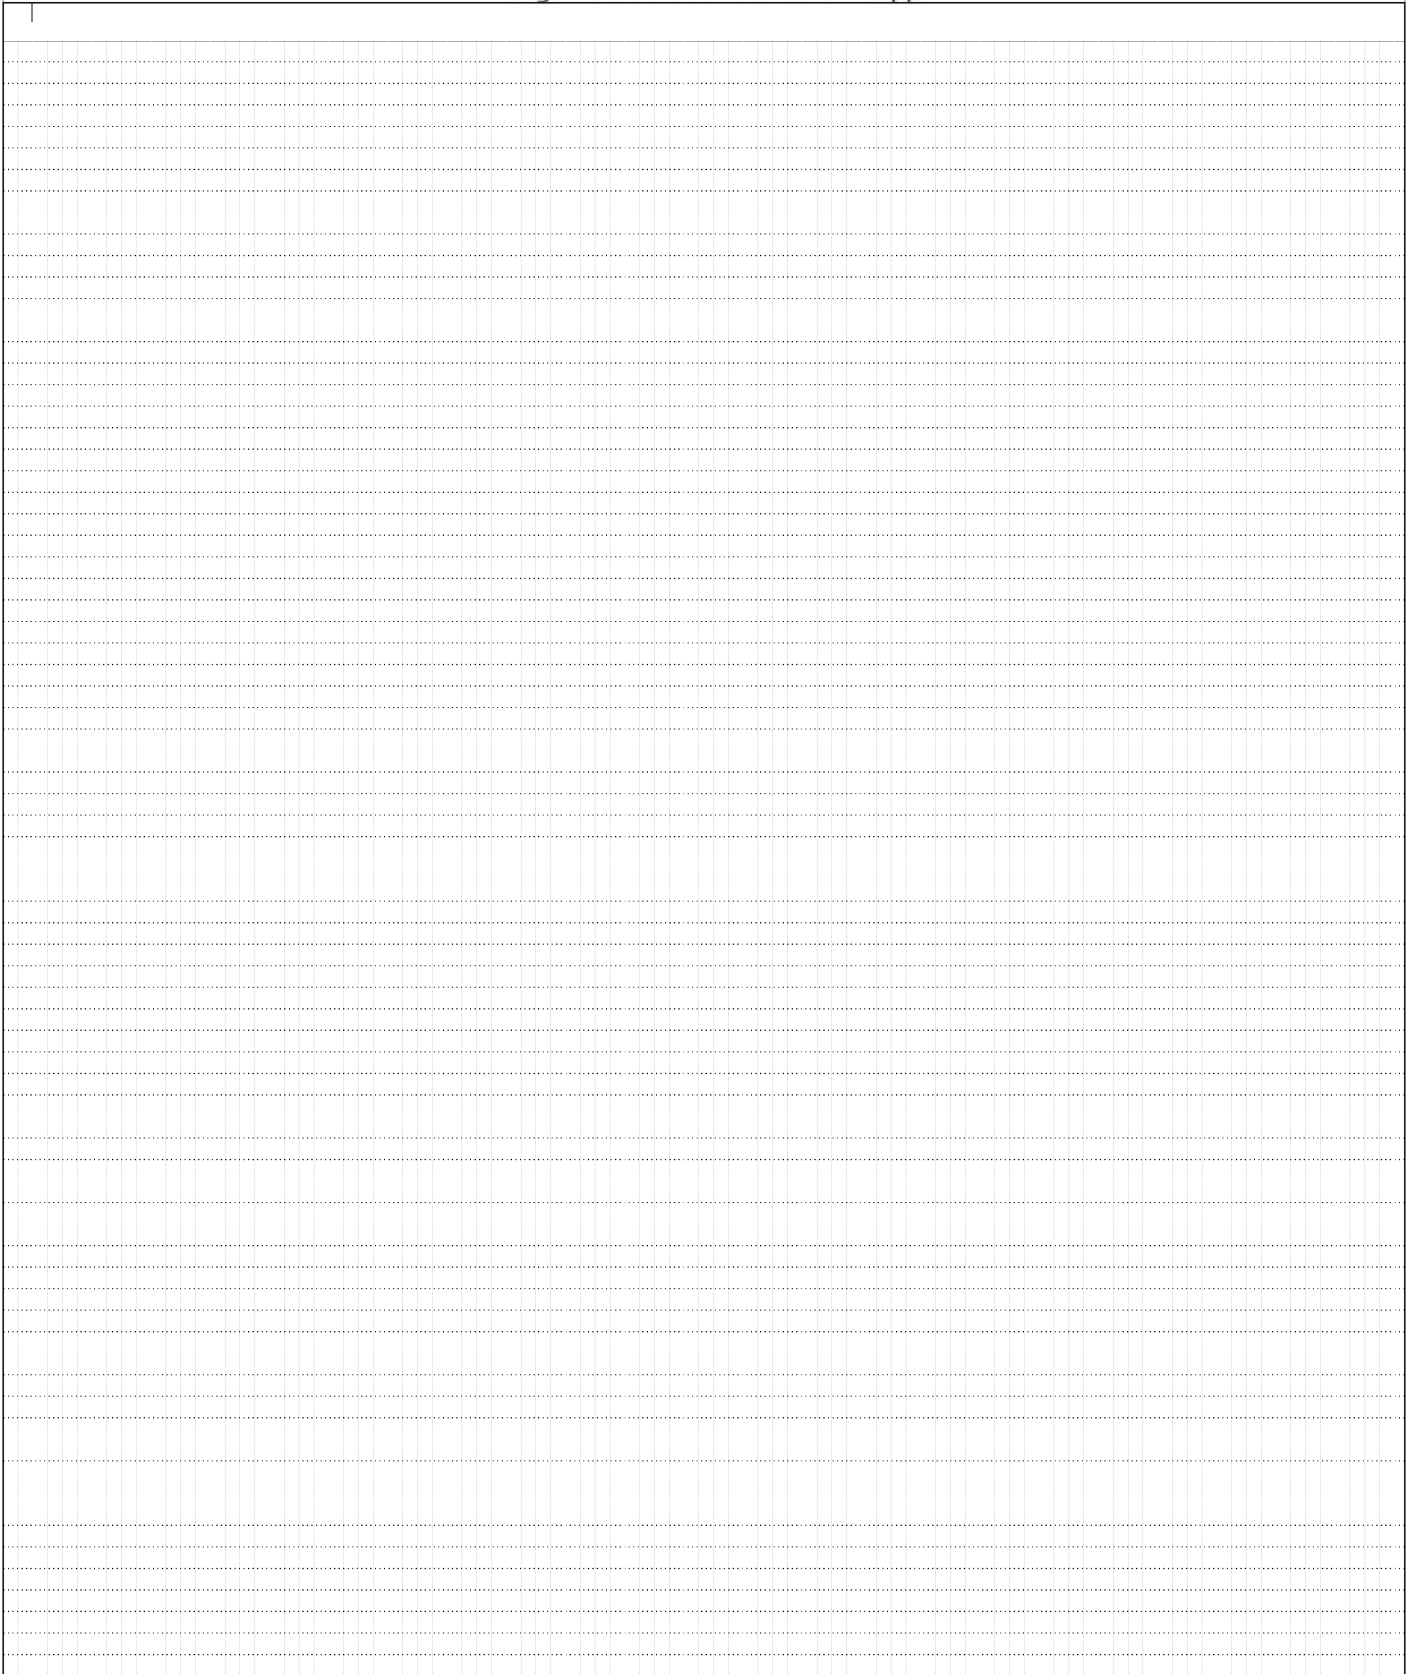


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

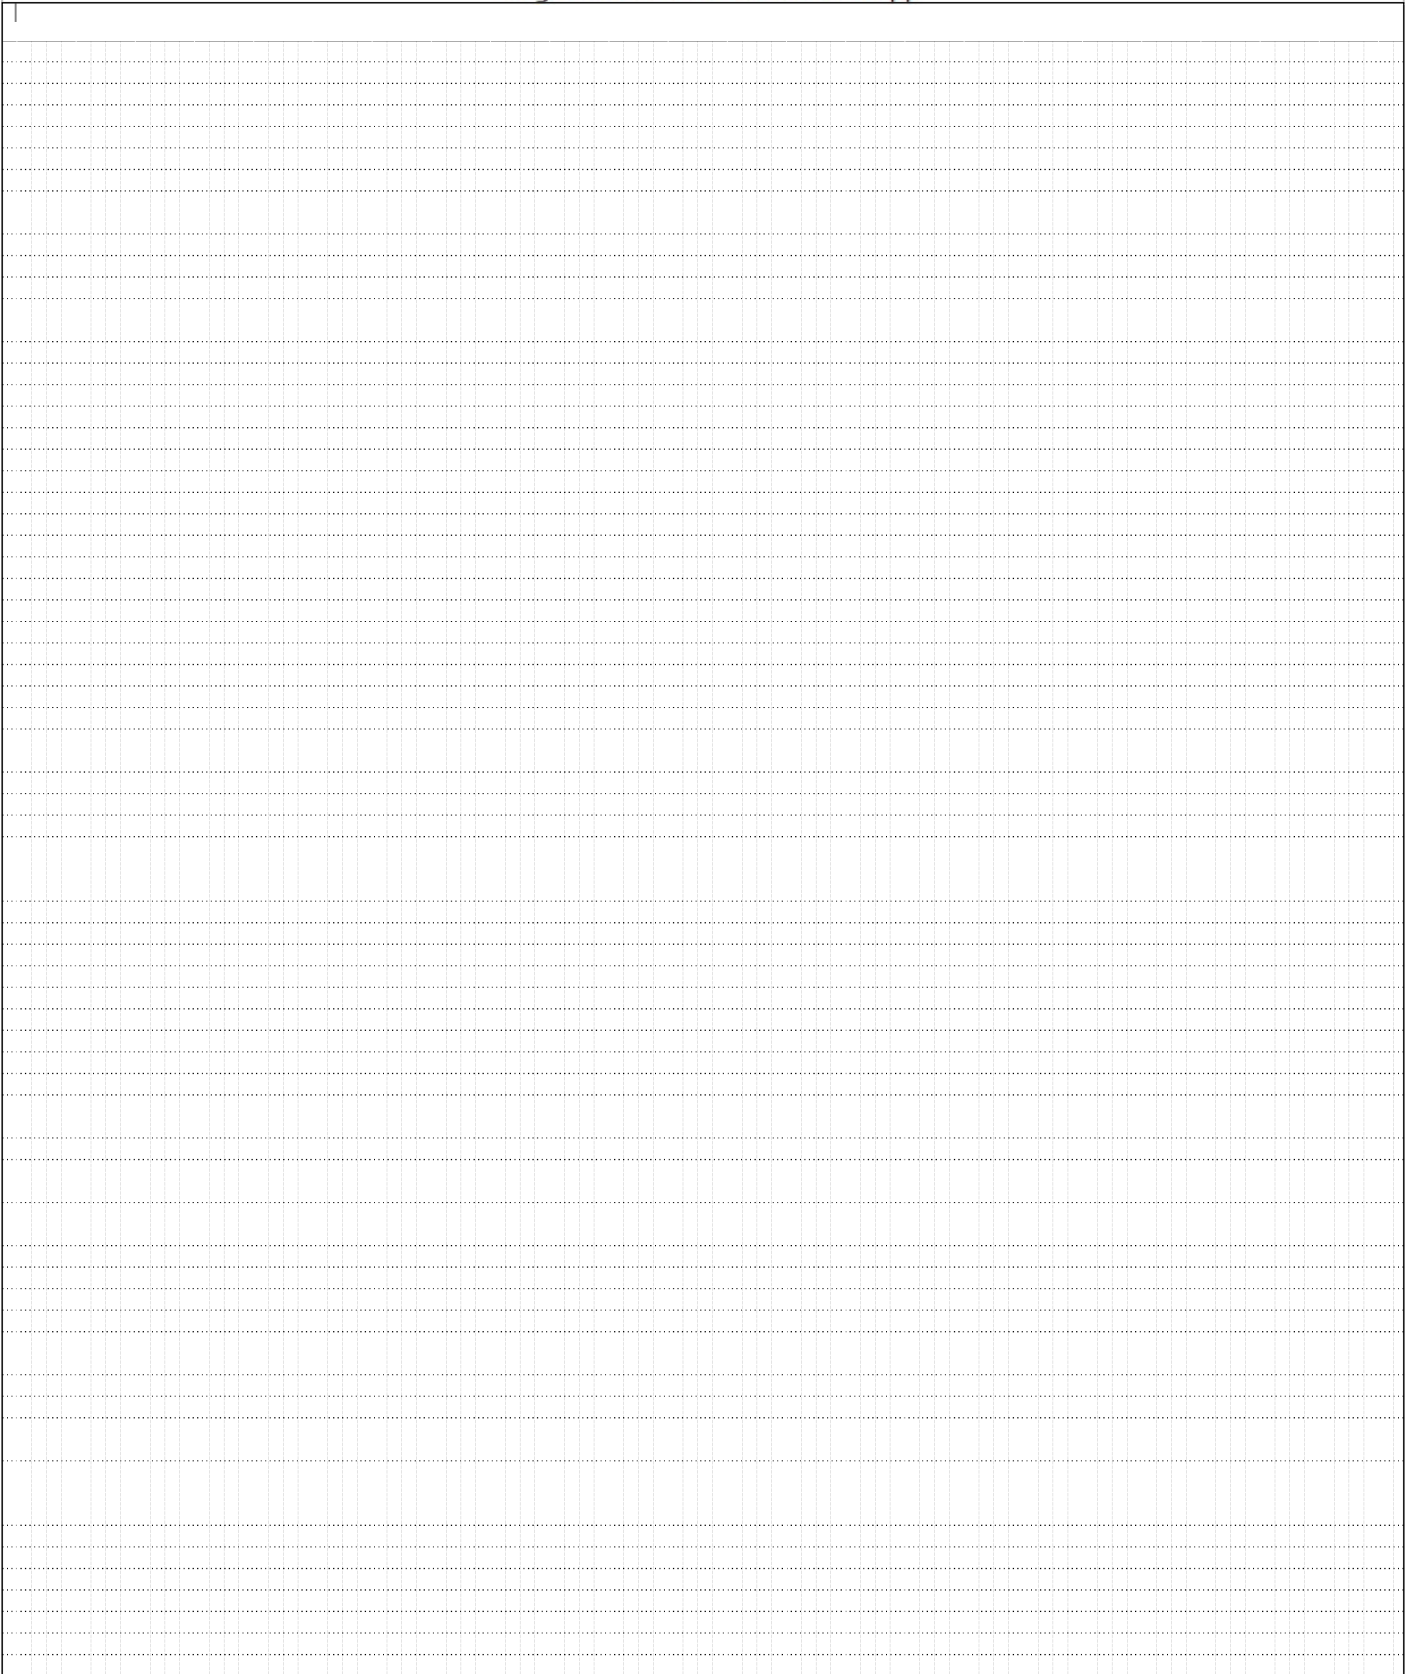


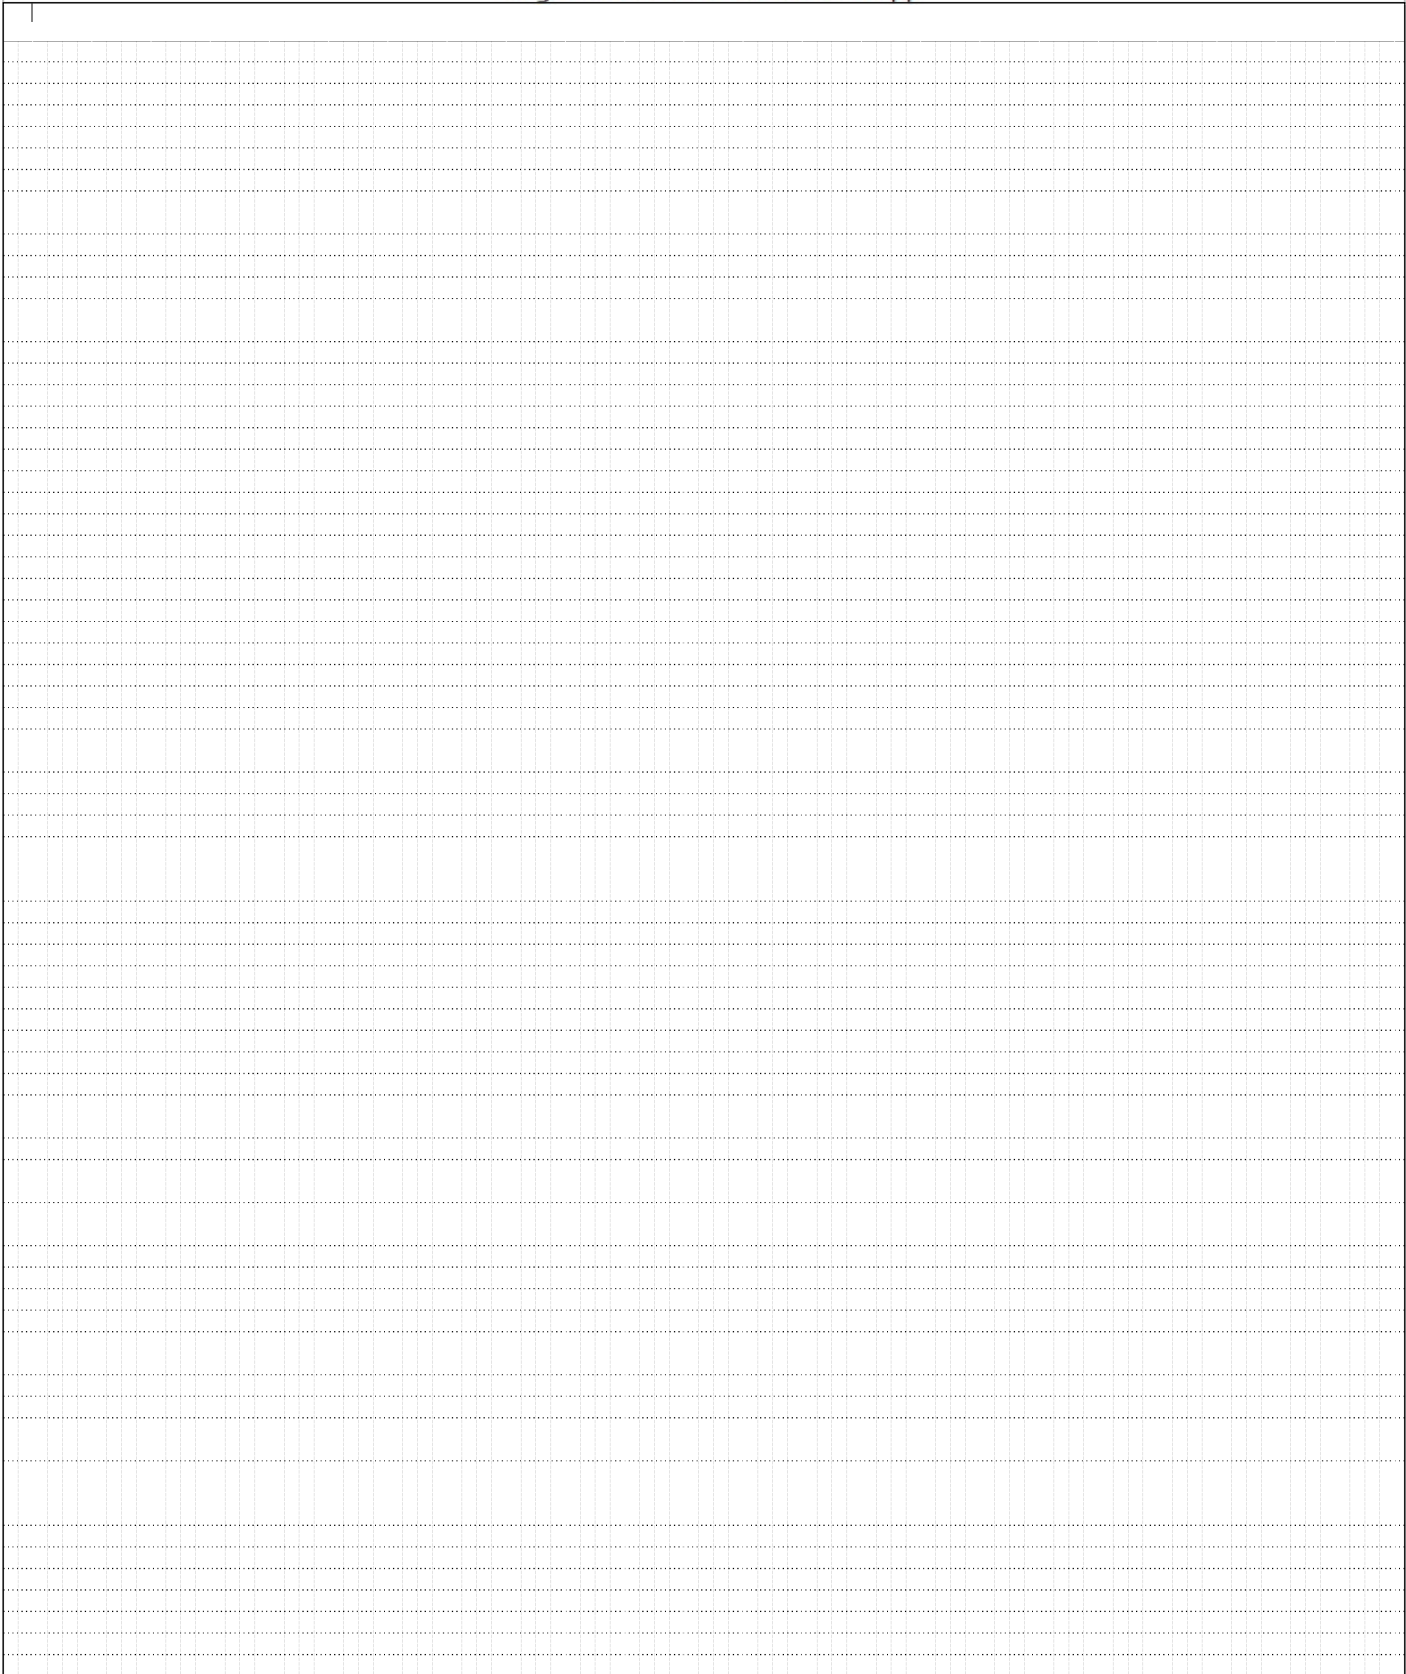



Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

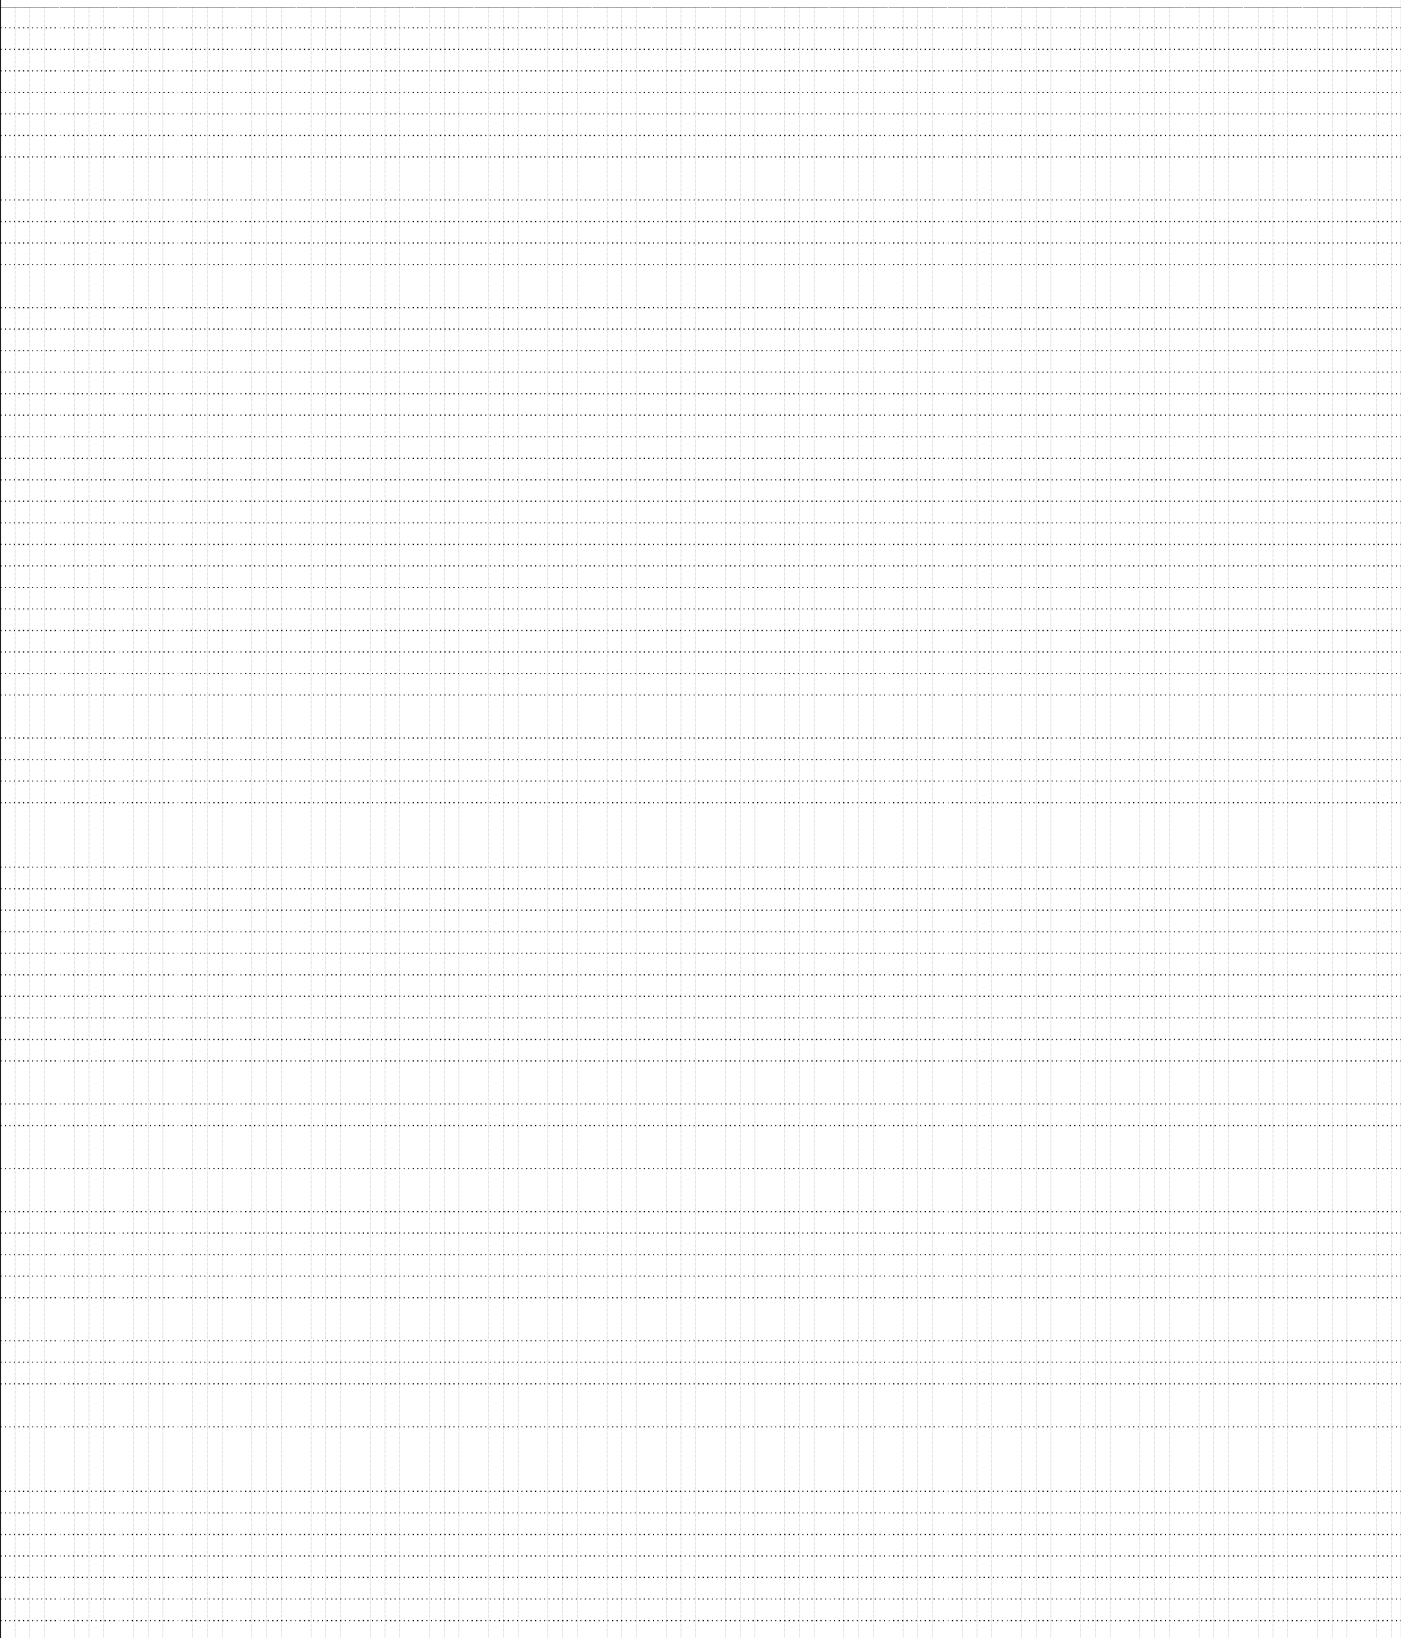


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

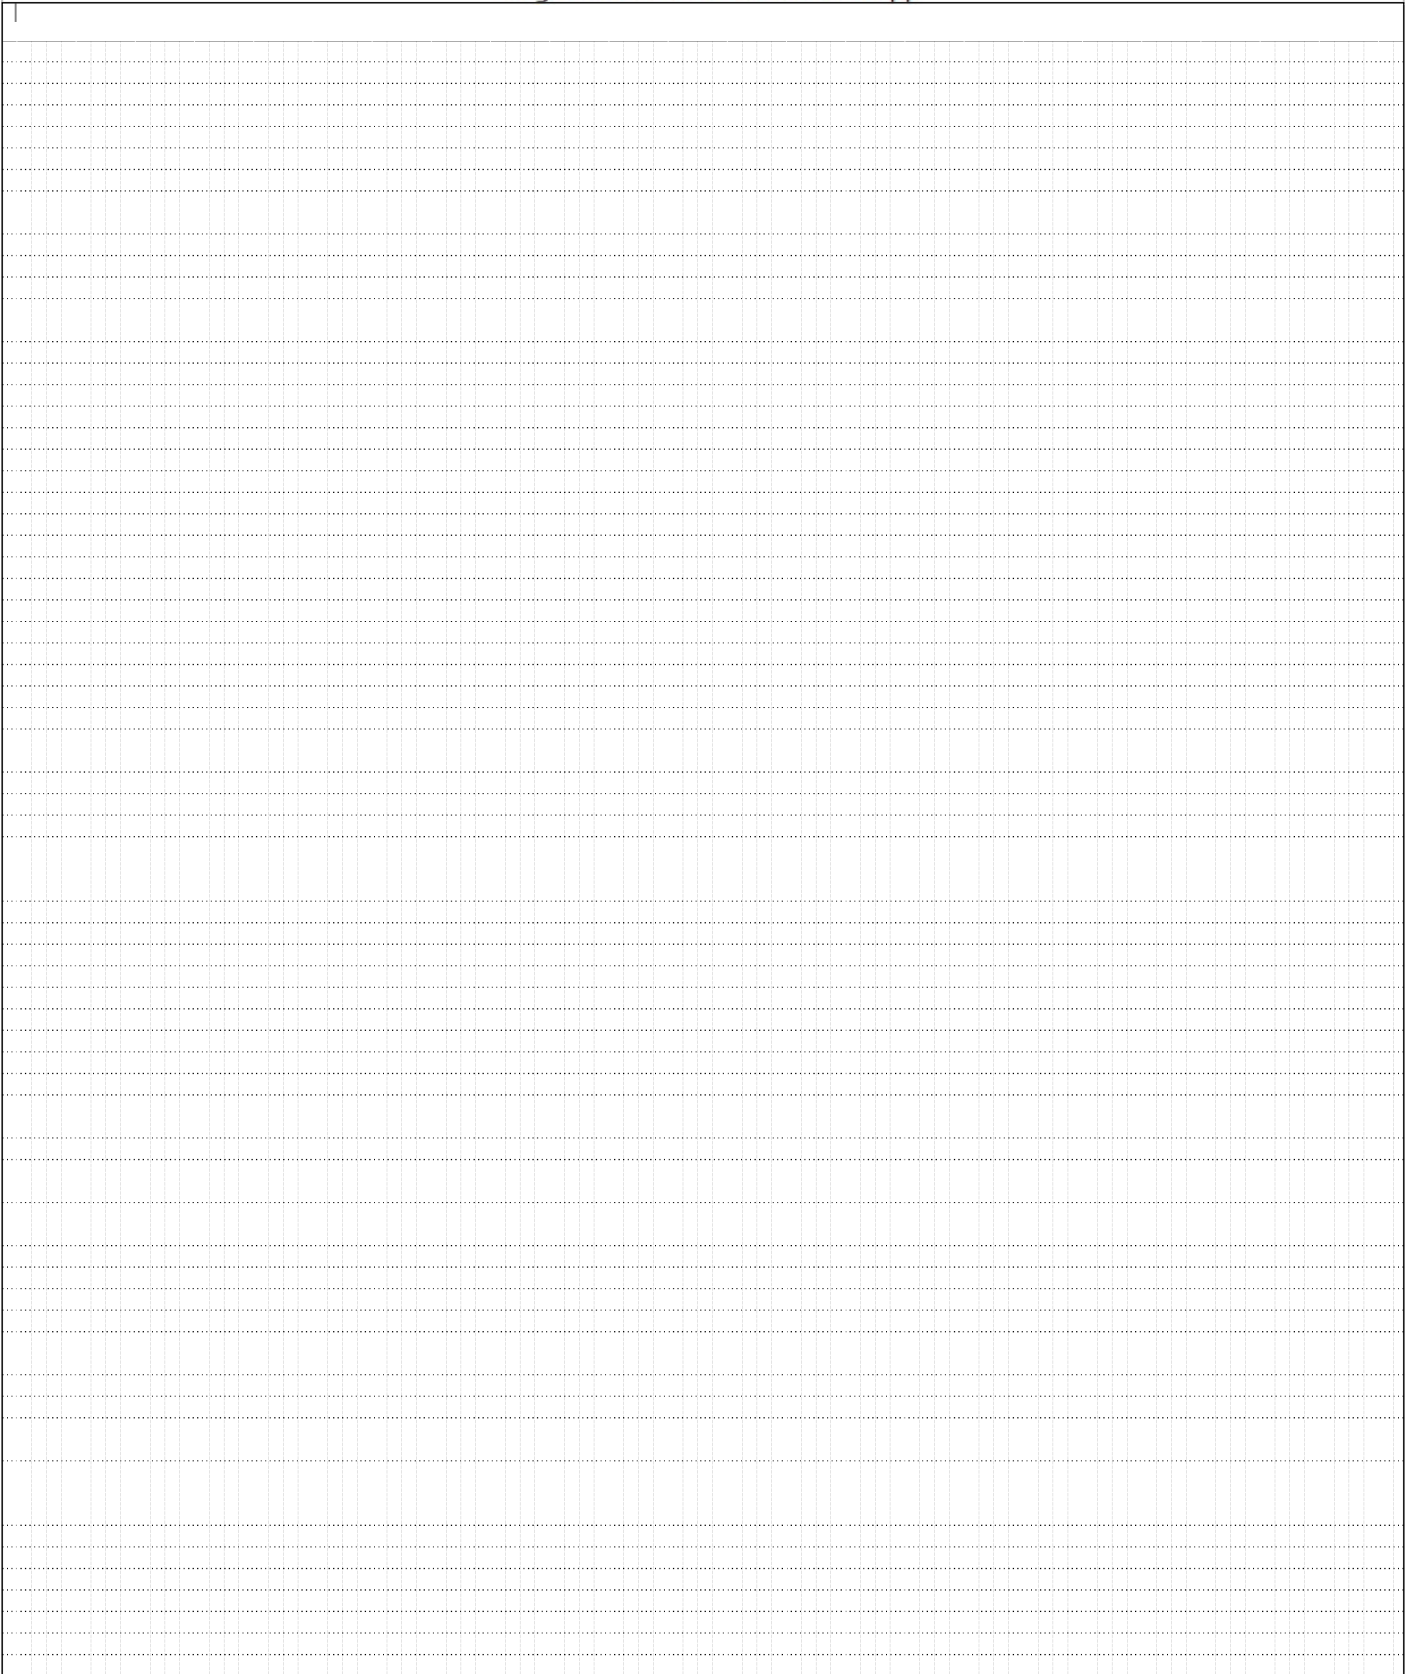


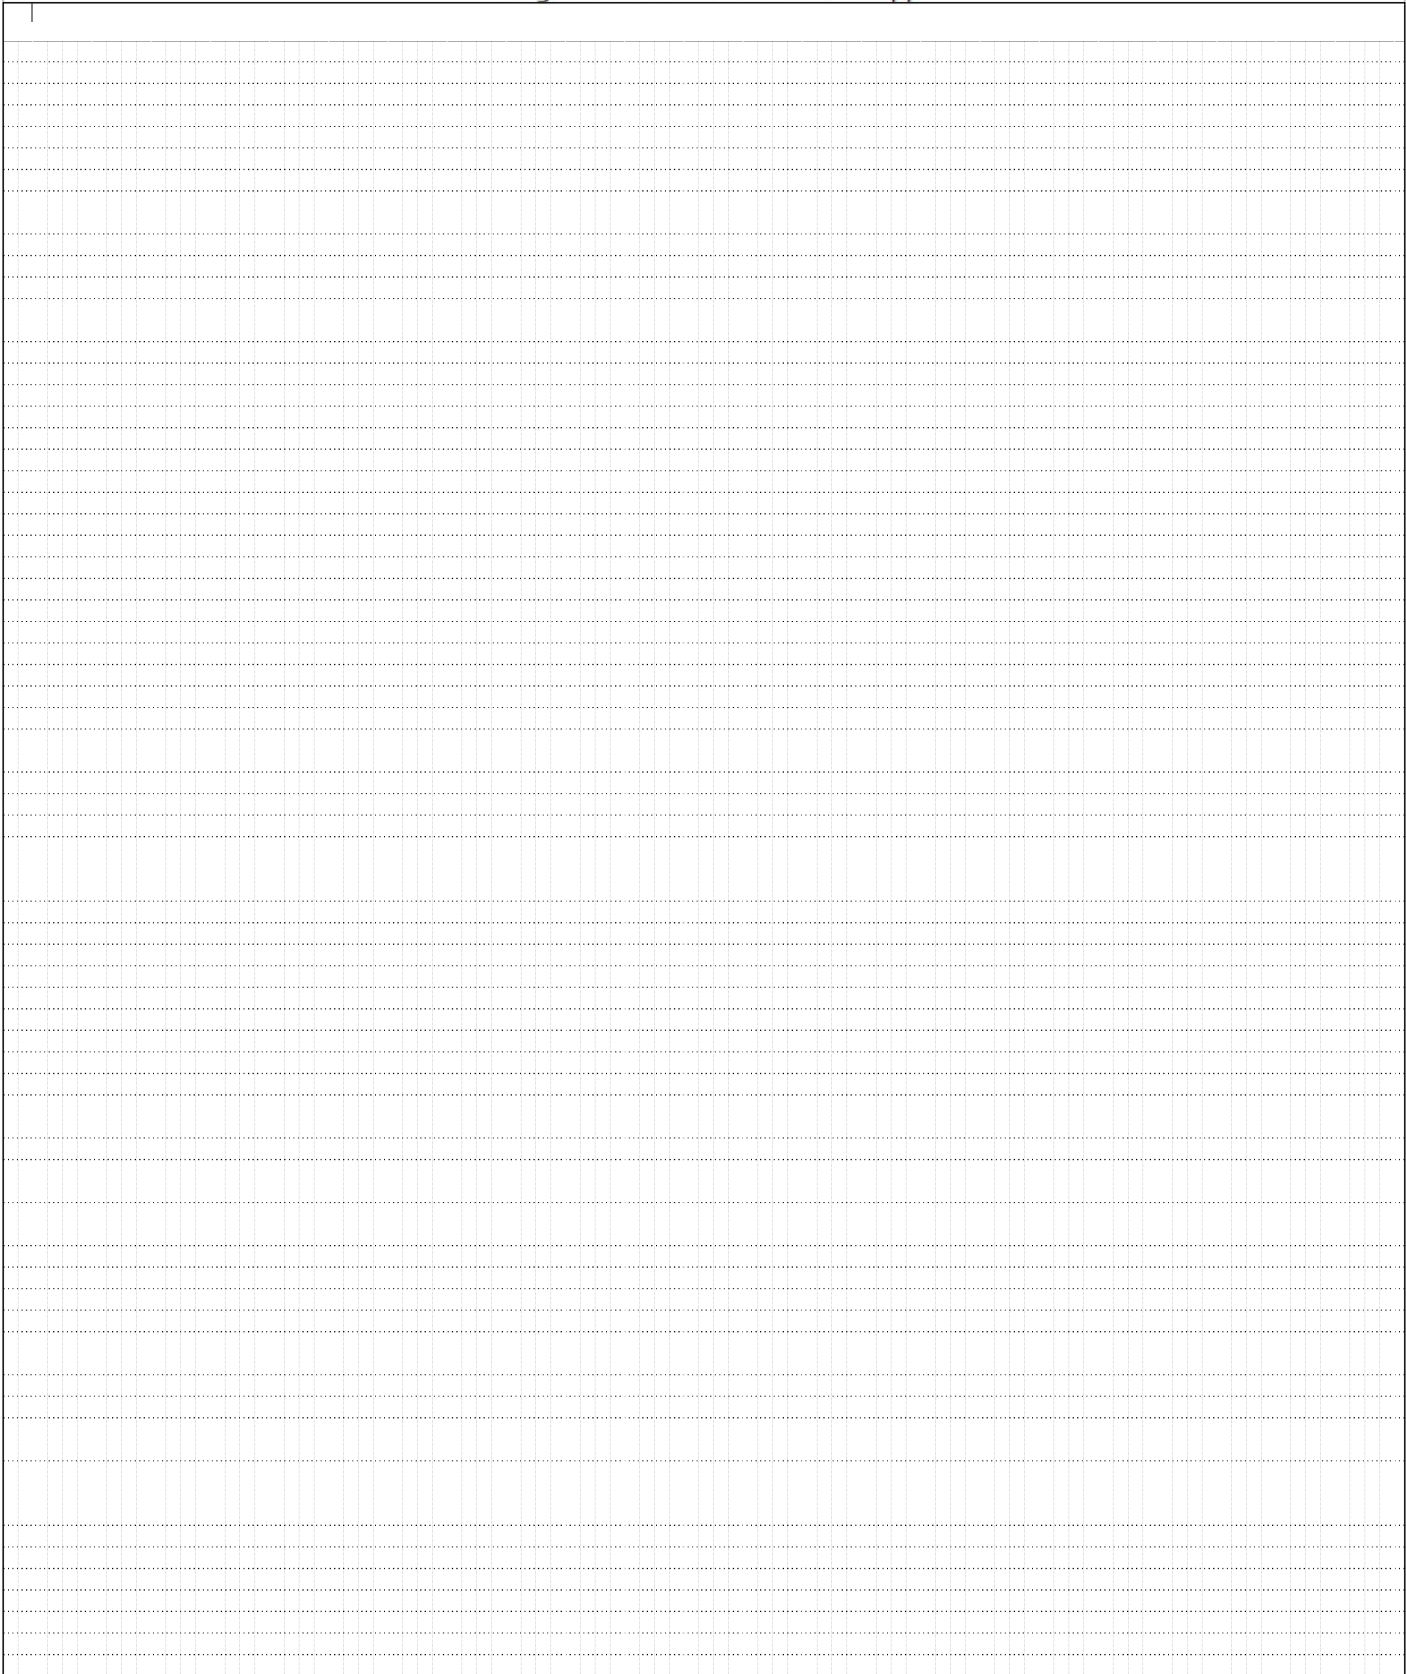



Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

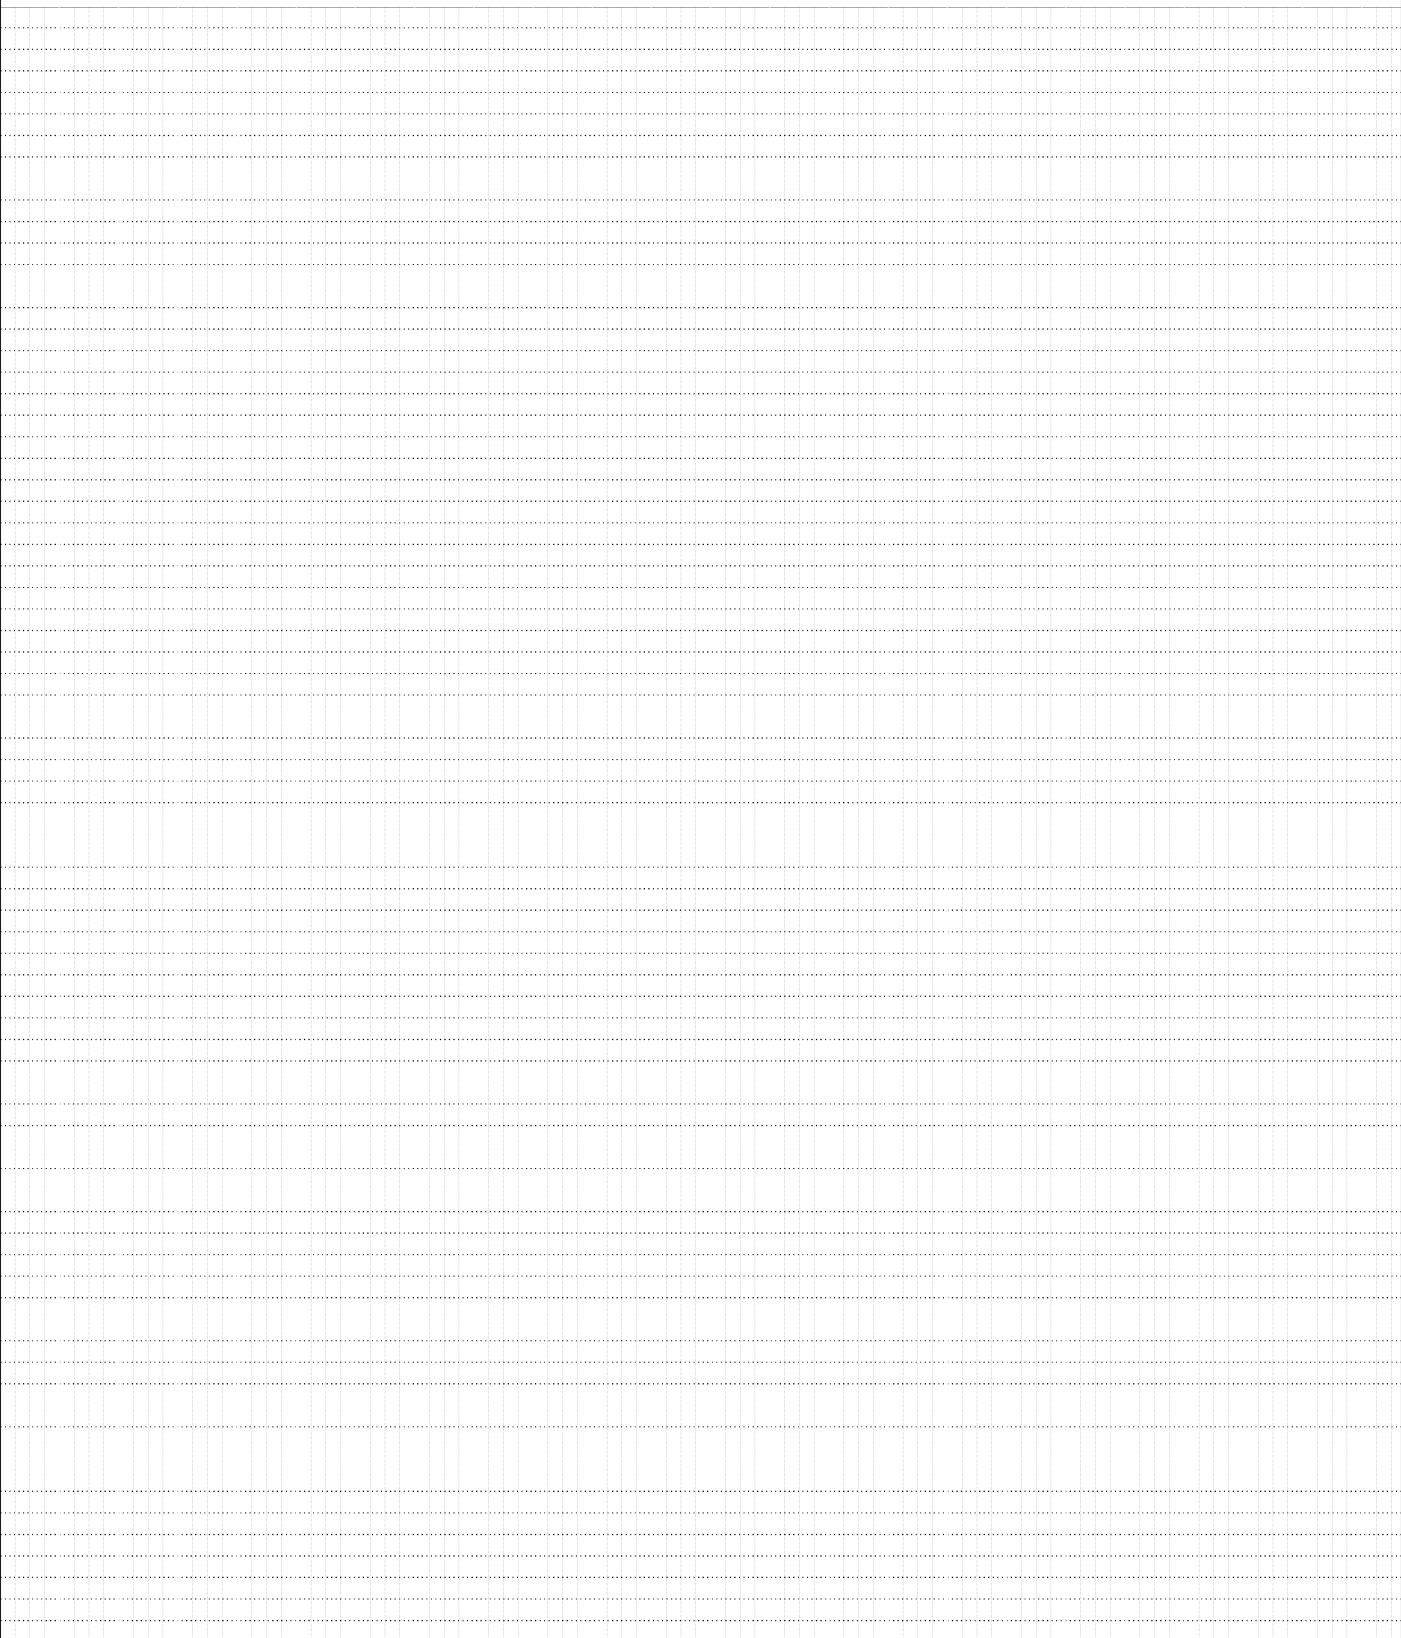


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

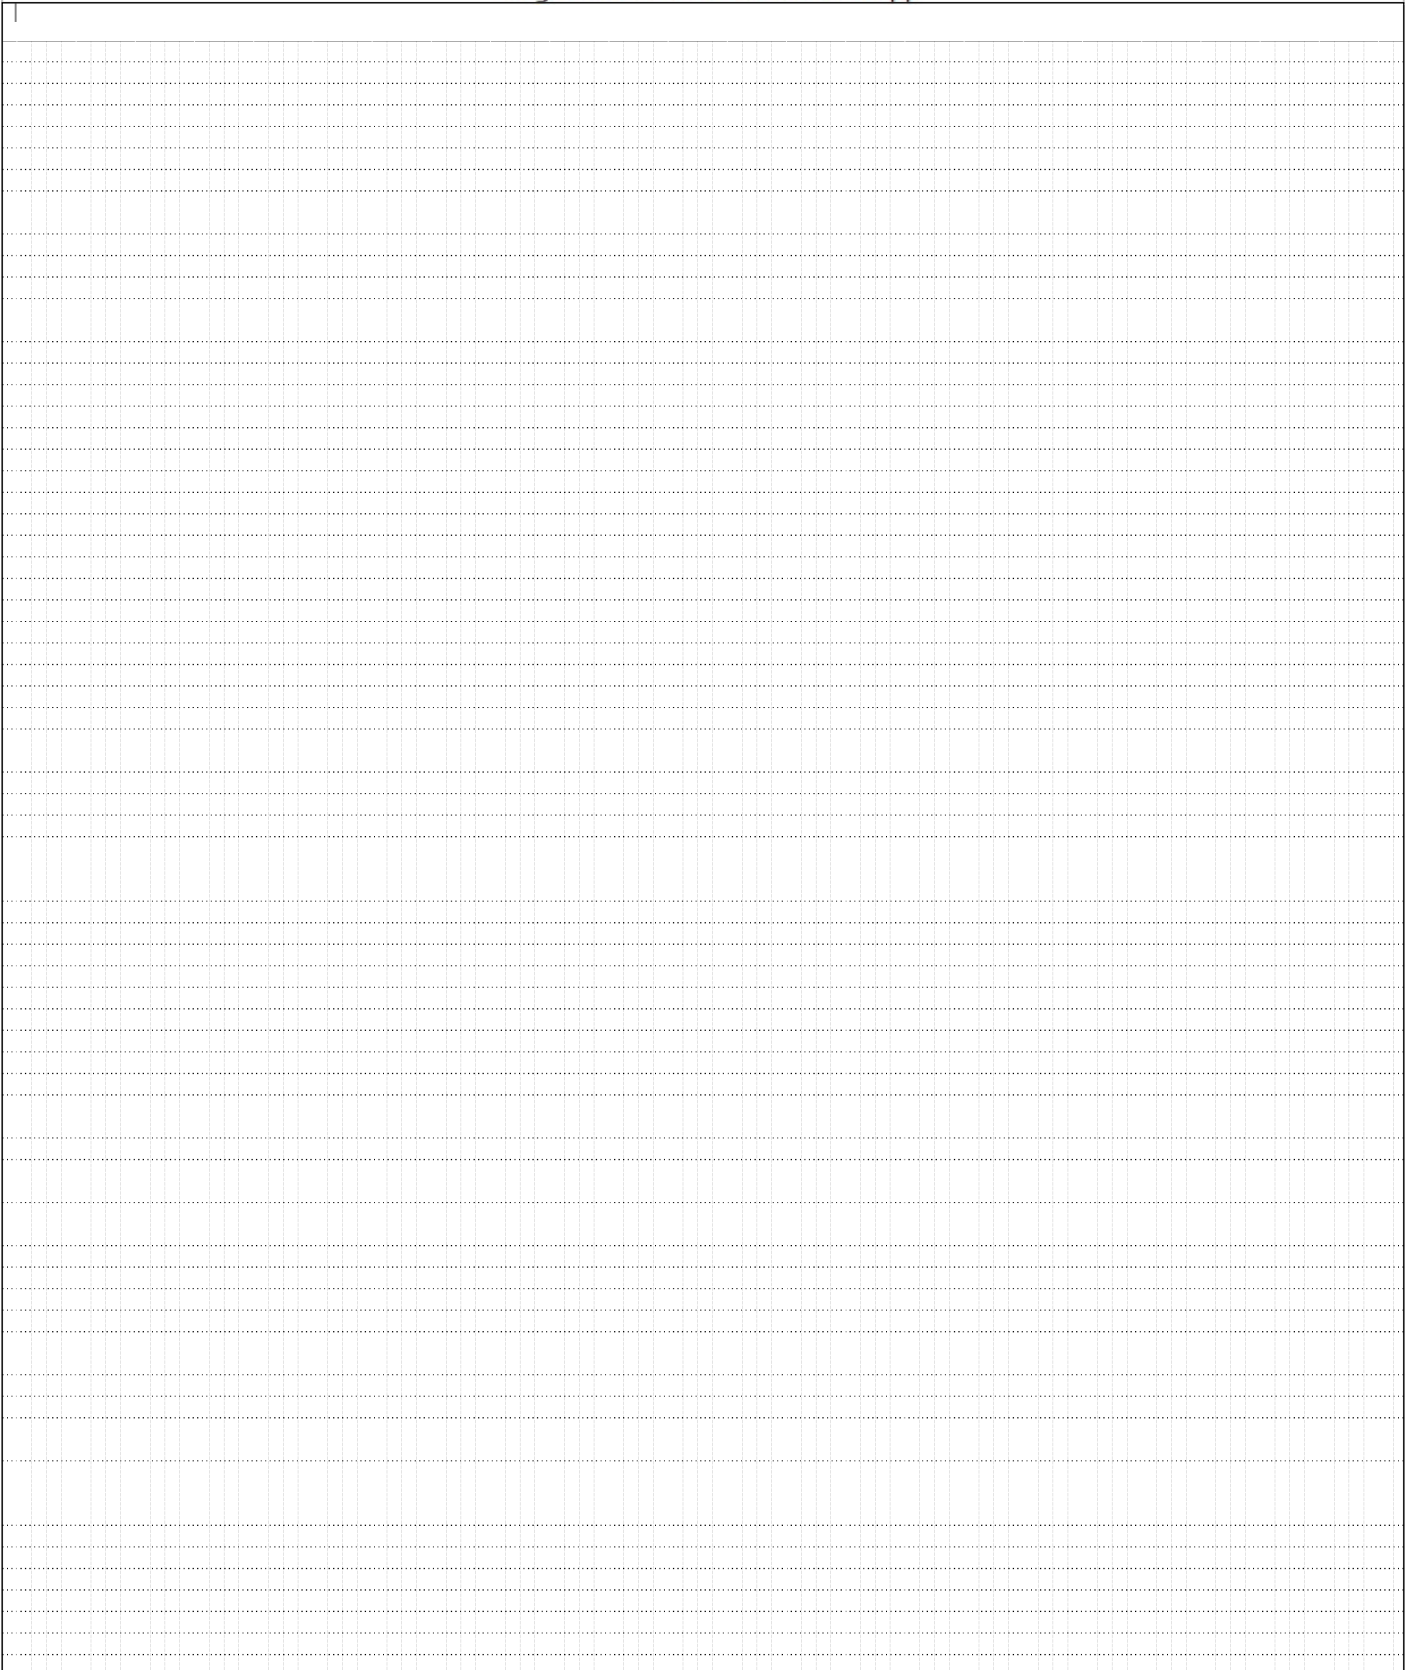

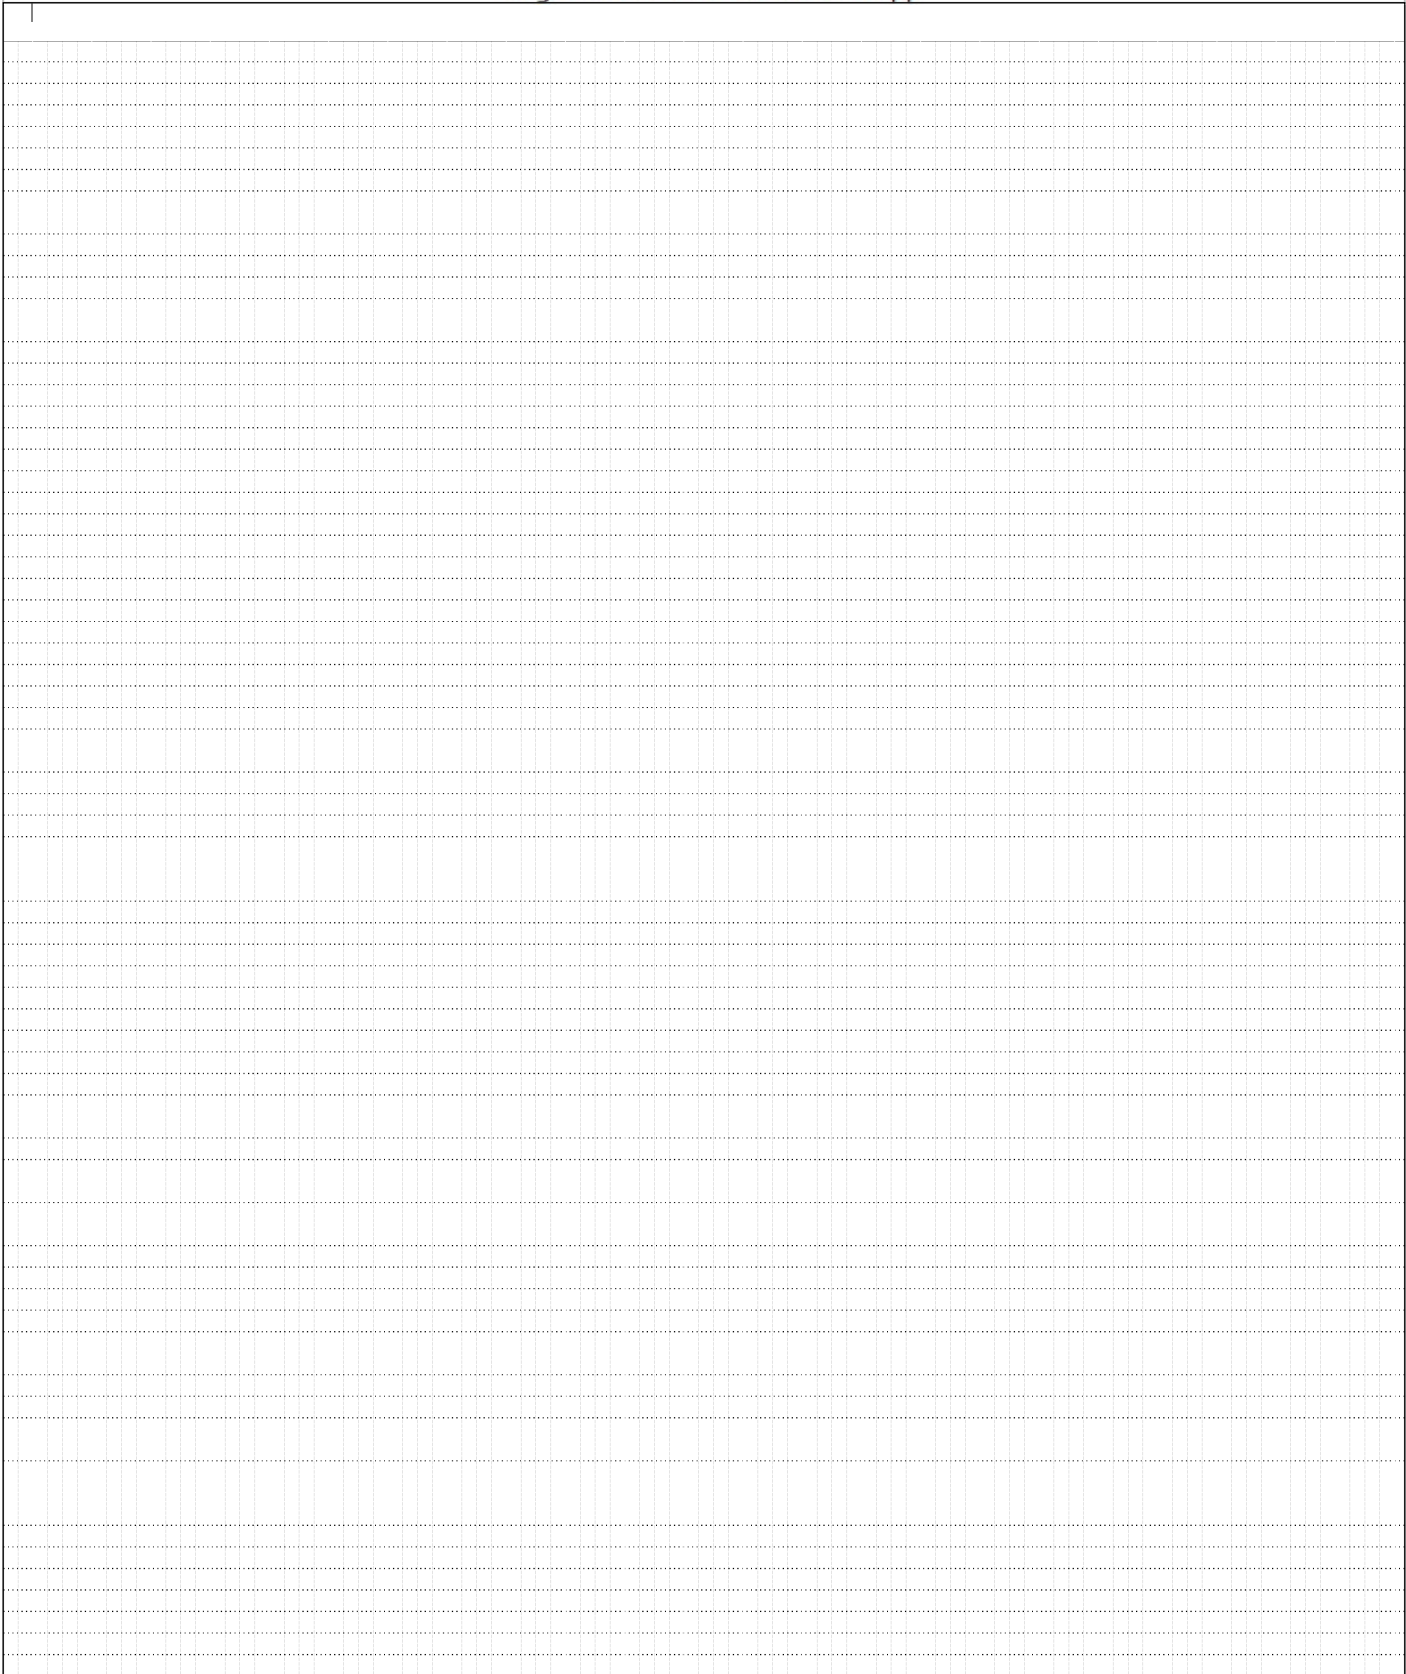

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

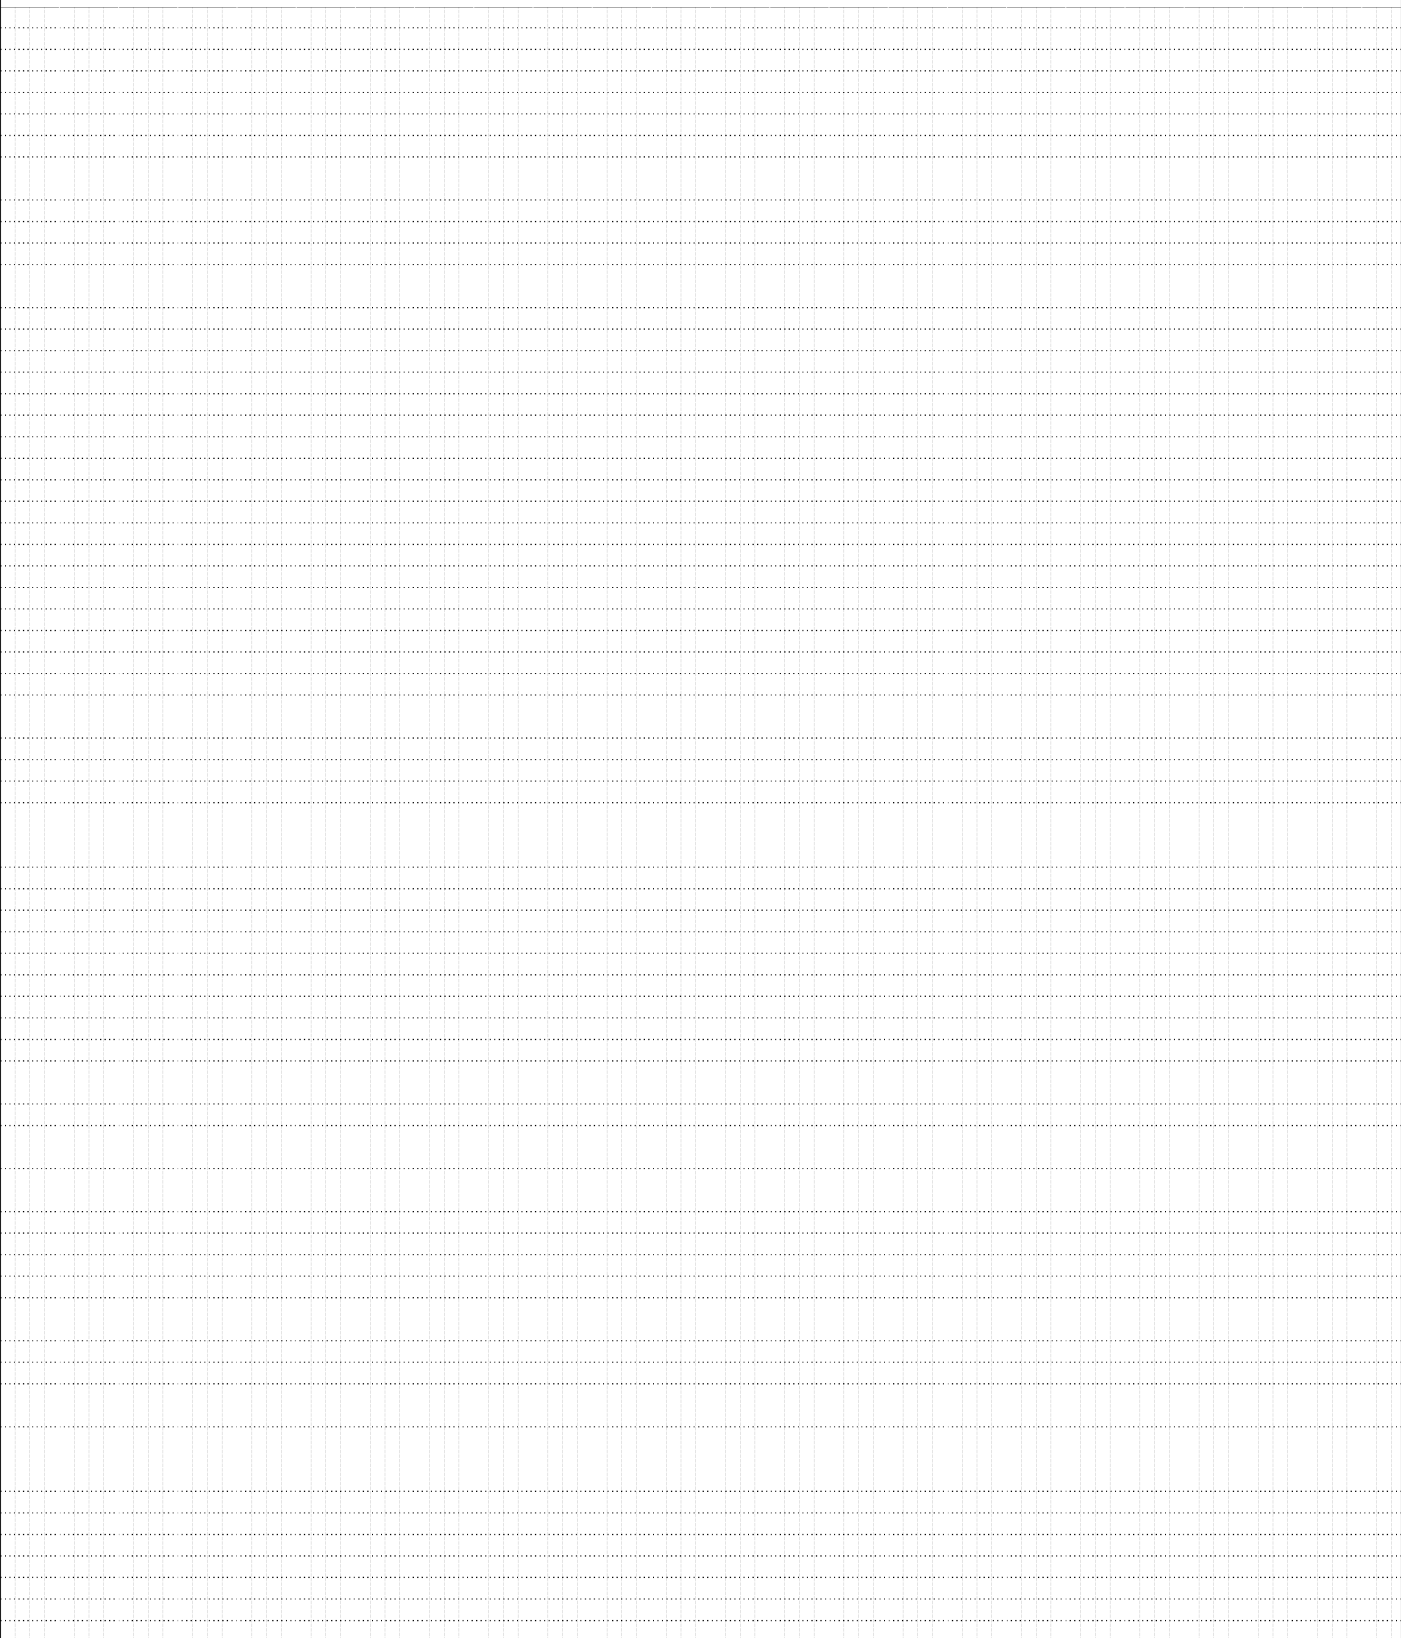


Tareas críticas		División		Hito de línea base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Resumen línea base	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Progreso del resumen			
Tarea		División de la línea base		Resumen			

[illegible]

	Tareas críticas División crítica Progreso de tarea crítica Tarea	División Progreso de tarea Línea base División de la línea base	Hito de línea base Hito Progreso del resumen Resumen	Resumen del proyecto Resumen línea base
--	---	--	---	--

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

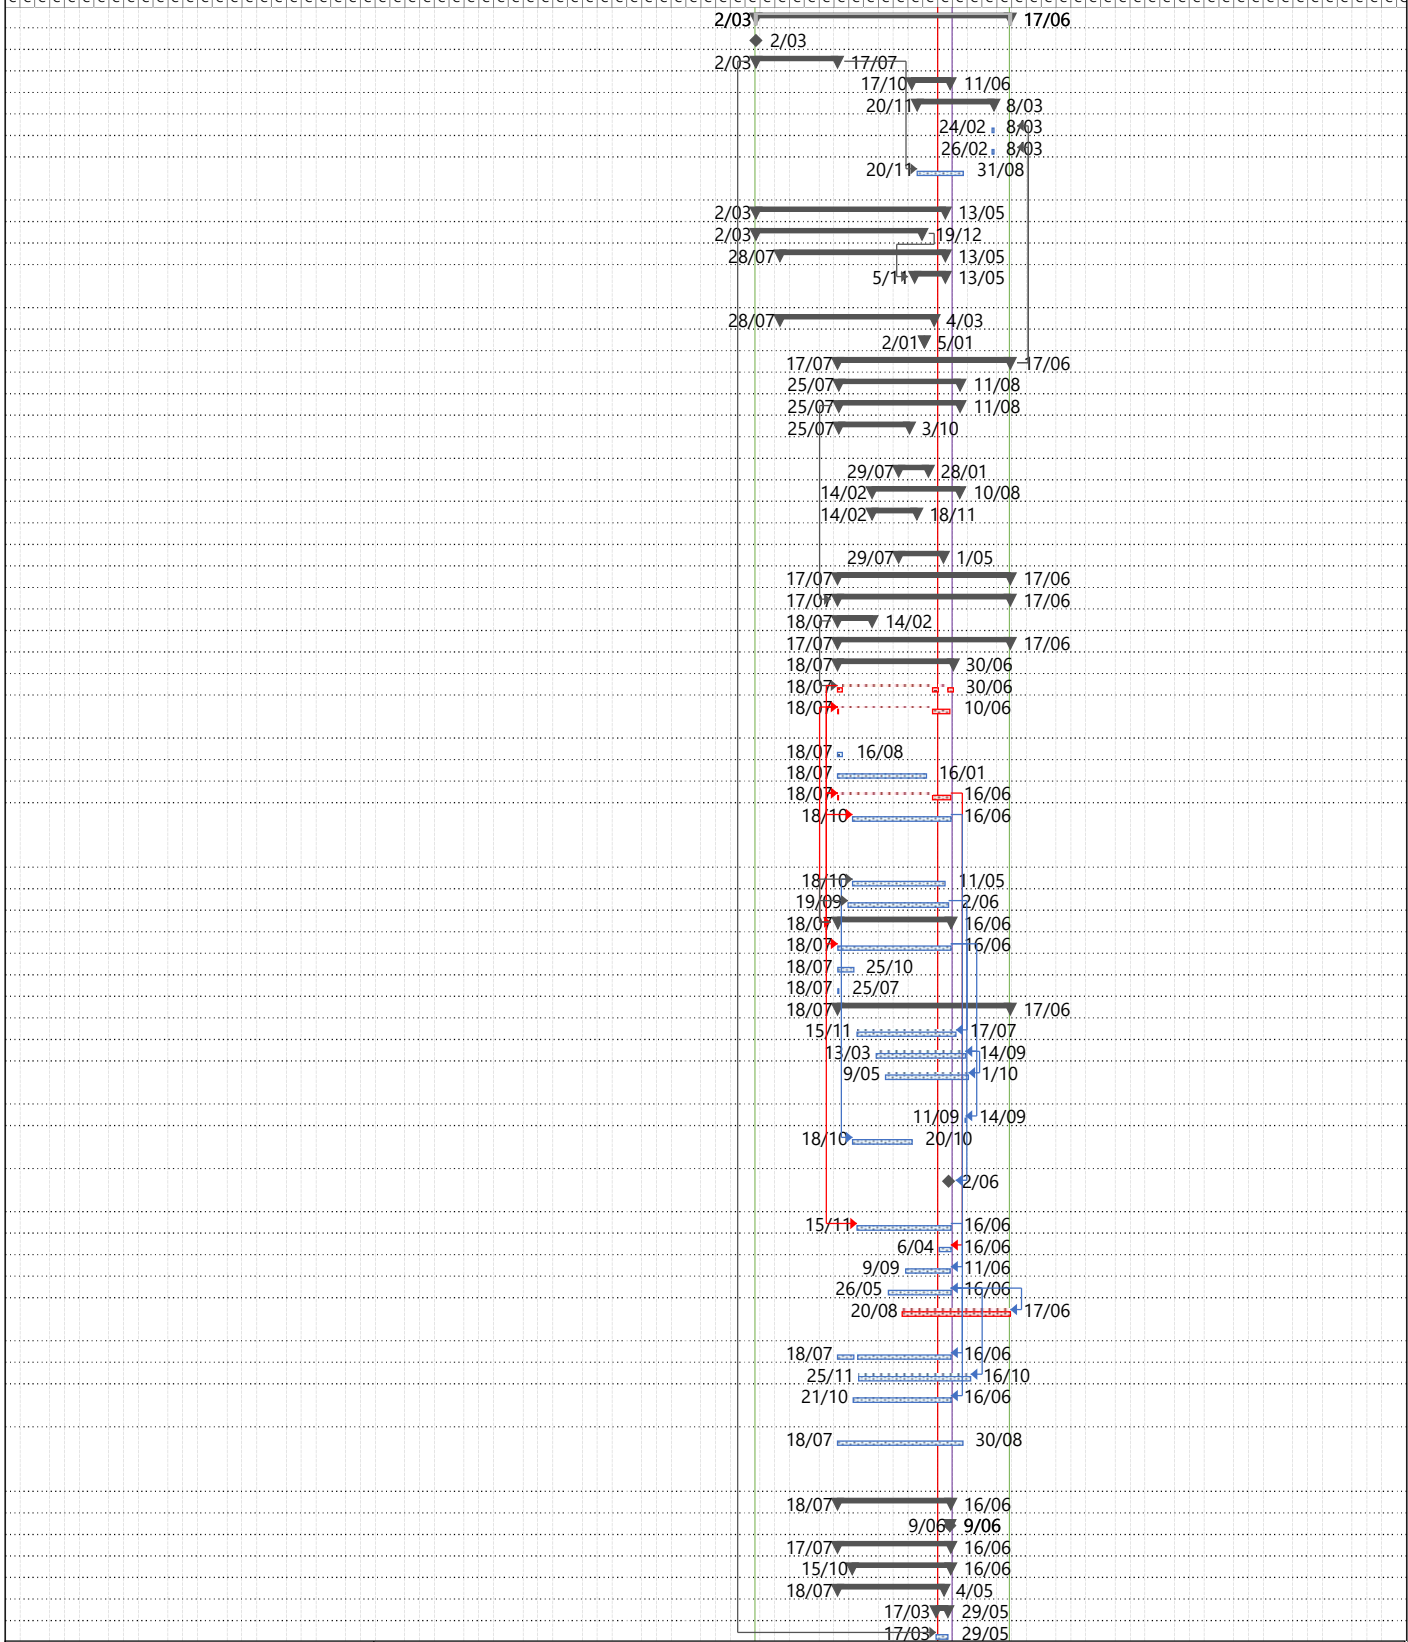

Resumen del proyecto

Resumen línea base

Página 45
