

INFORME DE INTERVENTORIA N°07

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2000.13.12.006-2025

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA N° 2000.13.04.005-2025 GRUPO 3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026

INTERVENTOR: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025

FECHA: 05 DE JULIO DE 2026

NOMBRE: CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ
CARGO : REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Representante de la Interventoria

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
FECHA: 05 DE ABRIL DE 2026		PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026			
INFORME N° 04		"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"			
CONTRATO: 2000.13.12.004-2024					
CONTENIDO					
ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S	Aspectos del contrato en curso	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S	Cumplimiento de obligaciones	
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S	Polizas vigentes	
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S	S		
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S		
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	N			
5	SEGURIDAD SOCIAL	S	S	Se adjuntan las planillas del personal de consultoría e interventoría tanto técnico como administrativo	
5.1	ANEXOS SST	N			
6	ANEXOS	N			
6.1	ASPECTOS TECNICOS	N			
6.2	CONTROL DE CALIDAD	N			
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	N			
6.4	ASPECTOS SOCIALES	N			
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	N			
6.6	RECURSO HUMANO	N			
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	N			
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	N			
6.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N			
6.10	ESTUDIOS Y DISEÑOS	N			
6.11	FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	N			
6.12	FICHA DE SEGUIMIENTO SGSST	N			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4	
				Versión: 4	
		INFORME DE INTERVENTORIA		Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME N°04			PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026		
PROYECTOS INCLUIDOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	X	OBRA		OTRO	ESPECIFIQUE:
1. INFORMACION GENERAL					
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA			1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA		
CONTRATO N° 22000.13.12.006-2025			CONTRATO N° 2000.13.04.005-2025		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE LOS CONTRATOS CUYO OBJETO SON: 1. "FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES SECTORES: 1) CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 2) CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 3) VEREDA LA MARÍA DEL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA; Y 4) SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA. 2. FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS: 1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS MUNICIPIO DE RESTREPO, 2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE; EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"			OBJETO DEL CONTRATO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"		
CONTRATISTA: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S			CONTRATISTA: CONSORCIO EYD REDES RURALES VC 2025		
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ			REPRESENTANTE LEGAL: ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI		
PLAZO INICIAL: 13 meses a partir de la firma del acta de inicio			PLAZO INICIAL: 12 meses a partir de la firma del acta de inicio		
ACTA DE INICIO: 27 de noviembre de 2025			ACTA DE INICIO: 04 de diciembre de 2025		
VALOR INICIAL: Mil sesenta y seis millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/CTE (\$1.066.618.466).			VALOR INICIAL: Mil setecientos cincuenta y un millones trescientos veinticuatro mil novecientos veinti ocho pesos (\$1.751.324.928,00) M/CTE		
CDR INICIAL No. 18201, 18213, 18211 del 07 de abril 2025 y 18511 del 8 de mayo de 2025.			CDR N° 18195 del 3 de abril de 2025, 18396 del 22 de abril de 2025, 18397 del 22 de abril del 2025, 18202 del 07 de abril 2025 18206 del 07 de abril de 2025.		
FECHA DE TERMINACION: 27 de diciembre de 2026.			FECHA DE TERMINACION: 04 de diciembre de 2026		
DATOS DE LA SUPERVISIÓN					
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando			Ing. Diego Calderón		
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato			Ing. James Pulgarín		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 4
				Fecha de Vigencia:
INFORME N°04		PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026		
"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	X	OBRA		OTRO ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)	
APORTES AL SISTEMA DE SALUD - EPS	SI	Contratista hace entrega de la correspondiente planilla que acredita el cumplimiento de esta obligación		
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES - AFP	SI	Contratista hace entrega de la correspondiente planilla que acredita el cumplimiento de esta obligación		
APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ARL	SI	Contratista hace entrega de la correspondiente planilla que acredita el cumplimiento de esta obligación		
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)	
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	NO			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)	
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Específicas del Contrato y/o Convenio	NO			

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

												SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI				Código: FO-PDA.2.1-4			
INFORME DE INTERVENTORIA																Versión: 4			
																Fecha de Vigencia: 01/02/2019			
PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026																			
2. CONTROL DE GARANTÍAS																			
2.2. CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA																			
2.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA																			
Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Desde	Hasta	Vigencia					
				Desde	Hasta					Desde	Hasta			Desde	Hasta				
Cumplimiento	\$ 213.323.693,00	45-44-101171320	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2025	31/07/2027	Cumplimiento	\$ 350.264.985,60	430-47-994000073861	ASEGURADORA SOLIDARIA	4/12/2025	4/06/2027								
Buen manejo del anticipo						Buen manejo del anticipo	\$ 525.397.479,00	430-47-994000073861	ASEGURADORA SOLIDARIA	4/12/2025	4/06/2027								
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 53.330.923,00	45-44-101171320	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2025	31/01/2030	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 87.566.246,40	430-47-994000073861	ASEGURADORA SOLIDARIA	24/11/2025	24/11/2029								
Calidad del Servicio	\$ 319.985.539,00	45-44-101171320	SEGUROS DEL ESTADO	31/01/2027	31/01/2032	Calidad del Servicio	\$ 525.397.479,00	430-47-994000073861	ASEGURADORA SOLIDARIA	24/11/2026	24/12/2031								
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 284.700.000,00	45-40-101104543	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2025	31/01/2027	Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 700.362.000,00	430-74-994000028090	ASEGURADORA SOLIDARIA	1/01/2026	4/12/2026								

2.1 SANCIONES				valor de la sanción impuesta	
Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso			
Multa					
Cláusula Penal					
Caducidad					
Ninguna		X			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA								Código: FO-PDA.2.1-4	
										Versión: 4	
										Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME N°04						PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026					
3. CONTROL FINANCIERO											
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA					
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Pago Anticipado (0%)	5/12/2025	\$210.846.357	19,77%	N/A	\$210.846.357						

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No. 04

PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026

4. CONTROL DE EJECUCION

GRUPO 2	Valor por diseño	Productos	Porcentaje por producto	Valor por producto	Porcentaje por contrato	Antes de Iva	Iva	Ejecutado
Diseño 1 - El Cerrito	\$ 290.723.252	Producto 0	30%	\$ 87.216.975,00	4,98%	\$ 73.291.575,63	\$ 13.925.399,37	\$ 87.216.975,00
		Producto 1	20%	\$ 58.144.650,00	3,32%	\$ 48.861.050,42	\$ 9.283.599,58	
		Producto 2	10%	\$ 29.072.325,00	1,66%	\$ 24.430.525,21	\$ 4.641.799,79	
		Producto 3	30%	\$ 87.216.975,00	4,98%	\$ 73.291.575,63	\$ 13.925.399,37	
		Producto 4 y 5	10%	\$ 29.072.327,00	1,66%	\$ 24.430.526,89	\$ 4.641.800,11	
Diseño 2 - El Águila	\$ 528.780.129	Producto 0	30%	\$ 158.634.038,00	9,06%	\$ 133.305.914,29	\$ 25.328.123,71	\$ 158.634.038,00
		Producto 1	20%	\$ 105.756.025,00	6,04%	\$ 88.870.609,24	\$ 16.885.415,76	\$ 105.756.025,00
		Producto 2	10%	\$ 52.878.012,00	3,02%	\$ 44.435.304,20	\$ 8.442.707,80	
		Producto 3	30%	\$ 158.634.038,00	9,06%	\$ 133.305.914,29	\$ 25.328.123,71	
		Producto 4 y 5	10%	\$ 52.878.016,00	3,02%	\$ 44.435.307,56	\$ 8.442.708,44	
Diseño 3 - Florida	\$ 483.120.400	Producto 0	30%	\$ 144.936.120,00	8,28%	\$ 121.795.058,82	\$ 23.141.061,18	\$ 144.936.120,00
		Producto 1	20%	\$ 96.624.080,00	5,52%	\$ 81.196.705,88	\$ 15.427.374,12	\$ 96.624.080,00
		Producto 2	10%	\$ 48.312.040,00	2,76%	\$ 40.598.352,94	\$ 7.713.687,06	
		Producto 3	30%	\$ 144.936.120,00	8,28%	\$ 121.795.058,82	\$ 23.141.061,18	
		Producto 4 y 5	10%	\$ 48.312.040,00	2,76%	\$ 40.598.352,94	\$ 7.713.687,06	
Diseño 3 - Pradera	\$ 448.701.147	Producto 0	30%	\$ 134.610.344,00	7,69%	\$ 113.117.936,13	\$ 21.492.407,87	
		Producto 1	20%	\$ 89.740.229,00	5,12%	\$ 75.411.957,14	\$ 14.328.271,86	\$ 134.610.344,00
		Producto 2	10%	\$ 44.870.114,00	2,56%	\$ 37.705.978,15	\$ 7.164.135,85	\$ 89.740.229,00
		Producto 3	30%	\$ 134.610.344,00	7,69%	\$ 113.117.936,13	\$ 21.492.407,87	
		Producto 4 y 5	10%	\$ 44.870.116,00	2,56%	\$ 37.705.979,83	\$ 7.164.136,17	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME N° 4	PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026	
5. SEGURIDAD SOCIAL		
EL CONTRATISTA HA ENTREGADO LOS SOPORTES DE LA SEGURIDAD Y LOS PARAFISCALES.		

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión presencial representantes de la comunidad,
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Corregimiento El Pedregal



Reunión presencial representantes de la comunidad,
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Corregimiento El Pedregal



REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN PRESENCIAL EN
VALLECAUCANA DE AGUAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN PRESENCIAL EN
VALLECAUCANA DE AGUAS

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4
		INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 4
			Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS			
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
En el marco de este proceso, se desarrollan actividades orientadas al levantamiento de información primaria y secundaria, diagnóstico de los sistemas existentes, análisis de las condiciones hidráulicas, sanitarias y ambientales del territorio, así como la formulación de alternativas técnicas que permitan optimizar o implementar infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico.			
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	
1	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA CONSULTORÍA:	Se permitió socializar de manera clara el estado de avance del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"	
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAMPO Y CATASTRO DE LO EXISTENTE. MUNICIPIO DEL AGUILA	En el marco del desarrollo del proyecto, se consolida la información técnica recopilada y analizada durante la etapa inicial de estudios. La documentación que será presentada: Informe de Diagnóstico, Estudio de Topografía, Caracterización Social, y Planos de Soporte.	
	ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO A LA INTERVENTORÍA	Como parte del cumplimiento de las actividades contractuales, se realizó la entrega a la interventoría del Producto No. 1 correspondiente al Diagnóstico del Proyecto Pedregal Municipio de Florida, el cual consolida la información técnica recopilada y analizada durante la etapa inicial de estudios. La documentación presentada incluye los siguientes componentes: Informe de Diagnóstico. Anexo A. Estudio de Topografía. Anexo B. Caracterización Social. Anexo C. Planos de Soporte.	
	ANALISIS DEL DIAGNOSTICO	Proyecto: Diagnóstico inicial para los ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL- MUNICIPIO DE FLORIDA (V) , ejecutado por la U.T. GE Valle 2025 para Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Población Objeto: 390 viviendas censadas, con 1.012 habitantes residentes (2.59 por vivienda) y 390 habitantes flotantes estimados para temporadas especiales. Problemática Central: la calidad del agua suministrada, no cumple con la calidad exigida por la Resolución No. 2115 de 2007 (por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano), la causa de este inconveniente es la ausencia de una planta de tratamiento de potabilización- PTAP en funcionamiento Servicios Actuales: Cobertura de energía, gas, aseo y sistema de acueducto operado por la Asociación de Usuarios de Acueducto del corregimiento El Pedregal del municipio de Florida (V). Gestión Ambiental: Permiso ambiental de la concesión de aguas superficial ante la CVC. Conclusión: El documento establece la línea base oficial que servirá como insumo para el diseño de las alternativas de ingeniería.	
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES			
No.	DESCRIPCION	CONTENIDO	
12	Acta No 18 - junio 26	Reunión del comité sobre avances de consultoría en los municipios (El Águila, Florida, Pradera y Cerrito), con acuerdos de seguimiento y tareas asignadas	
13			
14			
15			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS			
III. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA ENVIADA)			
No.	DESCRIPCION	CONTENIDO	
IV. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA RECIBIDA)			
No.	DESCRIPCION	CONTENIDO	
1	Oficio GE-VALLE-2025 -mayo 07 de 2026	Teniendo en cuenta que la Unión Temporal GE Valle 2025 emitió respuesta mediante oficio del 07 de mayo de 2026, con copia a la Interventoría, en el cual de forma resumida solicitó lo siguiente: El contratista solicita a Vallecaucana de Aguas y a la Interventoría que aclaren si los estudios especializados y adicionales solicitados para el proyecto de El Placer hacen parte del alcance contractual vigente o si, por el contrario, deben ser definidos e incorporados mediante el procedimiento contractual correspondiente, dado que su ejecución podría afectar el desarrollo, los tiempos y los criterios técnicos del proyecto	
2	Oficio GE-VALLE-2025 - 06 de junio y 16 de junio de 2026	La Unión Temporal GE Valle solicitó, a la dirección del área técnica, respuesta del oficio antes mencionado para tener claridad frente a las acciones a tomar y dar inicio al desarrollo del proyecto "Estructuración y Formulación de Estudios y Diseños para obras de Protección del Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado El Placer, Municipio de El Cerrito".	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA										Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
ANEXO 10 - SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026											
Item	Actividades	FECHAS DE EJECUCION INICIAL	DIAS	VALOR CONTRATO %	PORCENTAJE DE AVANCE		OBSERVACIONES				
					VR. ACUM. PERIODO ANTERIOR	NUOVO ACUMULADO					
0	PRODUCTO INICIAL Plan de trabajo, cronograma, hojas de vida de personal consultoria FASE I			100%	34.86%	34.86%					
				30.00%	30.00%	30.00%					
				30.00%	30.00%	30.00%					
				10.00%	4.86%	4.86%					
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACION, CATASTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO			5.00%	4.10%	4.10%					
1.1	Actividades preliminares y de contextualización			0.50%	0.50%	0.50%					
1.2	Reunión con Administración municipal para revisión y/o concertación del alcance de proyecto, incluir registro fotográfico y lista de asistencia.			0.50%	0.50%	0.50%					
1.3	Reunión Informativa del inicio de los estudios y diseños con la comunidad beneficiada, incluir registro fotográfico y lista de asistencia.			0.50%	0.50%	0.50%					
1.4	Reconocimiento físico de campo			0.50%	0.50%	0.50%					
1.5	Recolección de información existente: Memorias, planos, esquemas, archivos			0.50%	0.50%	0.50%					
1.6	Levantamiento de campo			0.50%	0.50%	0.50%					
1.7	Levantamiento del Catastro del sistema de acueducto y/o alcantarillado			0.50%	0.50%	0.50%					
1.8	Elaboración de fichas técnicas			0.50%	0.40%	0.40%					
1.9	Estudio Topográficos general			0.50%	0.20%	0.20%					
1.10	Informe de las actividades realizadas con registro fotográfico, planos esquemas, actas de reuniones y demás soportes.			0.50%	0.20%	0.20%					
2	DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO			5.00%	0.76%	0.76%					
2.1	Análisis y evaluación de diagnósticos, estudios y proyectos existentes			0.38%	0.38%	0.38%					
2.2	Proyección de Población			0.38%	0.38%	0.38%					
2.3	Análisis del consumo de agua, pérdidas y dotación bruta			0.38%	0.00%	0.00%					
2.4	Proyección de la Demanda			0.38%	0.00%	0.00%					
2.5	Análisis de la capacidad limitante del sistema			0.38%	0.00%	0.00%					
2.6	Medición de caudales y Análisis de Calidad del agua			0.38%	0.00%	0.00%					
2.7	Aforos y caracterización de aguas residuales			0.38%	0.00%	0.00%					
2.8	Estudio de tratabilidad y/o toxicidad			0.38%	0.00%	0.00%					
2.9	Estudio Hidrológico			0.38%	0.00%	0.00%					
2.10	Diagnostico Físico, técnico y operativo del Sistema			0.38%	0.00%	0.00%					
2.11	Diligenciamiento del formato: Anexo V Diagnostico Prestadores de servicios públicos, de la Resolución 0379 de 2012 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio			0.38%	0.00%	0.00%					
2.12	Informe de Diagnostico Técnico Operativo y Físico			0.38%	0.00%	0.00%					
2.13	Socialización del Informe de Diagnostico a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Administración municipal, Operador del servicio y Comunidad beneficiada. Se debe llenar lista de asistencia y			0.38%	0.00%	0.00%					
3	PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS			10.00%	0.00%	0.00%					
3.1	Formulación de Alternativas			5.00%	0.00%	0.00%					
3.2	Diseño preliminar de las alternativas			0.83%	0.00%	0.00%					
3.3	Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada			0.83%	0.00%	0.00%					
3.4	Cuantificación de Costos de las alternativas			0.83%	0.00%	0.00%					
3.5	Evaluación de las alternativas (económica, técnica, administrativa operativa etc.)			0.83%	0.00%	0.00%					
3.6	Informe de Formulación y Evaluación de las Alternativas			0.83%	0.00%	0.00%					
4	GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE I)			5.00%	0.00%	0.00%					
4.1	Informe de identificación y requisitos para adelantar los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto: Permiso o renovación de Concesión de Agua, Exploración de Pozo, Licencia Ambiental, Vertimiento, (Ver Anexo Técnico)			1.67%	0.00%	0.00%					
4.2	Informe de identificación y requisitos para adelantar Permiso para Uso de Zona de Carreteras o Permisos de cruce sobre la vía			1.67%	0.00%	0.00%					
4.3	Informe de identificación y requisitos para tramite de predios necesarios para la ejecución de estructuras puntuales y servidumbre necesarias para la ejecución de obras lineales. Incluir plano general y formato suministrado por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. (Ver Anexo Técnico)			1.67%	0.00%	0.00%					

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA		Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019							
ANEXO 10 - SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS									
INFORME N° 04									
Ítem	Actividades	FECHAS DE EJECUCIÓN		DÍAS	VALOR CONTRATO %	PORCENTAJE DE AVANCE		OBSERVACIONES	
		INICIAL	FINAL			VR. ACUM. PERIODO ANTERIOR	NUEVO ACUMULADO		
PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026									
5	DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA				30,00%	0,00%	0,00%		
5.1	Topografía de las Zonas de Interés Para el Diseño				20,00%	0,00%	0,00%		
5.2	Sistema de información geográfico (SIG)				2,50%	0,00%	0,00%		
5.3	Diseños Detallados Hidráulicos de los Componentes				2,50%	0,00%	0,00%		
5.4	Estudios de Suelos, Geológicos y Geotécnicos				2,50%	0,00%	0,00%		
5.5	Diseños Detallados Estructurales de los Componentes				2,50%	0,00%	0,00%		
5.6	Diseños Detallados Eléctricos de los Componentes				2,50%	0,00%	0,00%		
5.7	Estudios Ambientales de las Obras Proyectadas en el Sistema				2,50%	0,00%	0,00%		
5.8	Informe de Diseños Definitivos				2,50%	0,00%	0,00%		
6	PRESUPUESTOS - APU - ESPECIFICACIONES				10,00%	0,00%	0,00%		
6.1	Cuantificación de Cantidades de las Obras Proyectadas				1,11%	0,00%	0,00%		
6.2	Cálculo y Definición de los APU de los Ítems del Proyecto				1,11%	0,00%	0,00%		
6.3	Cálculo del Presupuesto Total de las Obras del Proyecto y POI				1,11%	0,00%	0,00%		
6.4	Cotizaciones de los materiales, mano de obra especializada, equipos no incluidos en la				1,11%	0,00%	0,00%		
6.5	Cuantificación de recursos				1,11%	0,00%	0,00%		
6.6	Plan financiero				1,11%	0,00%	0,00%		
6.7	Especificaciones Técnicas del Proyecto por cada ítem del presupuesto				1,11%	0,00%	0,00%		
6.8	Cronograma de obra				1,11%	0,00%	0,00%		
6.9	Flujo de fondos de inversión				1,11%	0,00%	0,00%		
7	GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II)				10,00%	0,00%	0,00%		
7.1	Informe de Gestión con los documentos que evidencie la aprobación de los permisos ambientales según corresponda permiso de concesión de agua, permiso de exploración pozo				3,33%	0,00%	0,00%		
7.2	Informe de Gestión con los documentos debidamente diligenciados y firmado que acredite la propiedad, o posesión y/o permiso de servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto.				3,33%	0,00%	0,00%		
7.3	Informe de Gestión con los documentos que evidencien la aprobación de permisos de intervenciones en vías, en caso de encontrarse en trámite anexar carta de radicación ante la				3,33%	0,00%	0,00%		
FASE V									
8	DOCUMENTOS, PRESENTACION Y VIABILIZACION DEL PROYECTO ANTE MVCT según Resoluciones No.0379 de 2012 y No.0504 de 2013				10,00%	0,00%	0,00%		
8.1	Elaboración Ficha Resumen del proyecto				0,77%	0,00%	0,00%		
8.2	Estructuración de la Metodología General Ajustada (MGA) / Elaboración Ficha EBI				0,77%	0,00%	0,00%		
8.3	Certificación del ente territorial en la cual se asegura el cumplimiento a lo previsto en la Ley 142				0,77%	0,00%	0,00%		
8.4	Certificación que el proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo, en el Plan de Ordenamiento				0,77%	0,00%	0,00%		
8.5	Certificación que el proyecto está incluido en el Banco de proyectos de inversión del municipio				0,77%	0,00%	0,00%		
8.6	Certificación del municipio en la cual acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de				0,77%	0,00%	0,00%		
8.7	Para proyectos en los que el municipio aporta recursos, certificar la disponibilidad de los mismos				0,77%	0,00%	0,00%		
8.8	Carta de presentación del proyecto				0,77%	0,00%	0,00%		
8.9	Radicación del Proyecto ante MVCT				0,77%	0,00%	0,00%		
8.10	Sustentación Técnica del Proyecto ante MVCT				0,77%	0,00%	0,00%		
8.11	Corrección y ajustes del Proyecto según MVCT				0,77%	0,00%	0,00%		
8.12	Entrega original y en CD del proyecto completo con su respectiva carta de viabilidad a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.				0,77%	0,00%	0,00%		
8.13	Sustentación y socialización del proyecto a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Administración municipal, Operador del servicio y Comunidad beneficiada. Se debe llenar lista de asistencia y				0,77%	0,00%	0,00%		
ACUMULADO TOTAL				0,00	100,00%	34,86%	34,86%		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
		INFORME DE INTERVENTORIA	
INFORME N°04		PERIODO: ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2026	
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES			
ITEM	ACTIVIDAD Y/O ELEMENTO	DESCRIPCION	
1	Avance ejecución del contrato	Durante el mes de junio de 2026, la Unión Temporal GE Valle 2025 avanzó en la gestión de la consultoría regional, destacando la entrega del Informe de Diagnóstico del corregimiento La Tupia (Pradera) —actualmente en revisión por la Interventoría— junto con trámites institucionales ante el Ingenio Mayagüez y Vallecaucana de Aguas para viabilizar su socialización y continuar con el planteamiento y selección de alternativas . Se realizó la entrega del diagnóstico de Florida para la primera semana de junio, en El Águila se proyecta realizar la entrega del Informe de Diagnóstico y en El Cerrito (El Placer) el inicio de actividades permanece suspendido a la espera de lineamientos oficiales por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.	

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2000.13.04.005-2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

**“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O
ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL AGUILA,
FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA”.**

Informe No. 6 “SEIS”

d. 1 Emitido para comentarios

Roldanillo Valle, junio de 2.026

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	- 4 -
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	- 5 -
3.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	- 6 -
3.1	CONTRATO DE CONSULTORÍA	- 6 -
3.2	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PÓLIZAS.....	- 6 -
3.3	REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO	- 7 -
4.	ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA	- 8 -
5.	AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	- 10 -
5.1.1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO	- 10 -
5.1.1.1	SOLICITUD RESPUESTA AL OFICIO EMITIDO EL 07 DE MAYO DE 2026 POR PARTE DE LA CONSULTORÍA:	- 10 -
5.1.2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA.....	- 10 -
5.1.2.1	CULMINACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAMPO Y DE DIBUJO.....	- 11 -
5.1.2.2	REALIZACIÓN DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON EL PORYECTO	- 11 -
5.1.3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADERA -	12 -
5.1.3.1	ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO A LA INTERVENTORÍA.....	- 12 -
5.1.4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIDA. -	13 -
5.1.4.1	ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO A LA INTERVENTORÍA.....	- 13 -
5.1.4.2	GESTIÓN DOCUMENTAL	- 15 -
5.1.4.3	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO CON LA VEEDURÍA CIUDADANA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA.	- 15 -
5.1.5	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAL.....	- 15 -
5.2	PORCENTAJE (%) DE AVANCE	- 16 -
6.	CONCLUSIONES.....	- 19 -
	ANEXOS	- 20 -

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información Contractual Consultoría.....	- 6 -
Tabla 2. Seguimiento a Póliza Cumplimiento entidades Públicas	- 6 -
Tabla 3. Seguimiento a Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	- 7 -
Tabla 4. Representantes partes del Contrato	- 7 -
Tabla 5. Porcentaje de Avances.....	- 18 -

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es elaborado por la consultoría **UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025**, identificada con NIT 902.009.437-8, representada legalmente por **ROSALBA NATALY BUCHELI**, y contiene el **INFORME No. 6 correspondiente al mes de junio de 2026**, en el marco del desarrollo de la consultoría de los siguientes proyectos:

1. Estructuración y formulación de estudios y diseños para obras de protección del acueducto y alcantarillado del centro poblado El Placer, municipio de El Cerrito.
2. Estructuración y formulación de los estudios y diseños del sistema de abastecimiento, tratamiento y suministro de agua potable para el acueducto interveredal La Cedalia – El Cedral – La Albania Alta – La Albania Baja – El Pital y Buenos Aires, municipio de El Águila.
3. Formulación y estructuración para la optimización del sistema de acueducto del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida.
4. Formulación y estructuración del proyecto del sistema de alcantarillado y PTAR del corregimiento La Tupia, municipio de Pradera.

El presente informe se entrega a la interventoría **MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con NIT 900.596.808-6, representada legalmente por **CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ**.

El documento corresponde al suministro de la información en relación con las actividades desarrolladas durante el periodo señalado, en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la consultoría, y presenta el estado de avance de las gestiones técnicas, administrativas, sociales y de coordinación institucional adelantadas para cada uno de los proyectos mencionados.

En este informe se describen las acciones preliminares realizadas, tales como revisión de información secundaria disponible, coordinación con las administraciones municipales o con el prestador del servicio, programación de actividades técnicas, entre otras.

Así mismo, el presente documento tiene como finalidad informar a la interventoría sobre el avance del contrato, dejando constancia de las actividades desarrolladas y las acciones programadas para el siguiente periodo, conforme al cronograma establecido.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la realización de los estudios y diseños de sistemas de acueducto o alcantarillado en los municipios de El Águila, Florida y Pradera, así como de las obras de protección para los sistemas de acueducto y alcantarillado del Centro Poblado El Placer, municipio de El Cerrito, departamento del Valle del Cauca. Lo anterior, con el propósito de formular soluciones técnicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua potable, el manejo adecuado de las aguas residuales y la protección de la infraestructura existente, garantizando la sostenibilidad y funcionalidad de los sistemas en beneficio de las comunidades atendidas.

En el marco de este proceso, se desarrollan actividades orientadas al levantamiento de información primaria y secundaria, diagnóstico de los sistemas existentes, análisis de las condiciones hidráulicas, sanitarias y ambientales del territorio, así como la formulación de alternativas técnicas que permitan optimizar o implementar infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico.

Los estudios y diseños que se desarrollen en el marco del proyecto buscan establecer las bases técnicas, sociales, ambientales y económicas necesarias para la estructuración de proyectos viables que permitan, en una etapa posterior, la gestión de recursos y la ejecución de obras orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

De esta manera, el proyecto se enmarca dentro de las estrategias orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al desarrollo sostenible de los municipios intervenidos y al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente del sector.

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATO DE CONSULTORÍA

Entidad Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.SP.
Contratista	UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025
Contrato de	CONSULTORIA
Contrato número:	2000.13.04.005-2025.
Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDRS):	CDR N° 18195 del 3 de abril de 2025, 18396 del 22 de abril de 2025, 18397 del 22 de abril del 2025, 18202 del 07 de abril 2025 18206 del 07 de abril de 2025.
Valor:	Mil setecientos cincuenta y un millones trescientos veinticuatro mil novecientos veintiocho pesos (\$1.751.324.928,00) M/CTE
Objeto:	OBJETO DEL CONTRATO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"
Plazo contractual:	12 meses a partir de la firma del acta de inicio
Fecha de Inicio:	04 de diciembre de 2025
Fecha Terminación:	04 de diciembre de 2026

Tabla 1. Información Contractual Consultoría

Fuente: Elaboración propia.

3.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PÓLIZAS

Las Tablas 2 y 3 se presenta el valor y vigencia de las pólizas presentadas por el contratista que garantizan el desarrollo del contrato.

COMPAÑÍA	No. GARANTÍA	TOMADOR	FECHA
ASEGURADORA SOLIDARIA	430-47-994000073861	UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025	01/12/2025
AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		INICIA	TERMINA
Cumplimiento del Contrato	\$350.264.985,6	04/12/2025	04/06/2027
Buen manejo del anticipo	\$525.397.479,00	04/12/2025	04/06/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones laborales	\$87.566.246,4	24/11/2025	24/11/2029
Calidad del servicio	\$525.397.479,00	24/12/2026	24/12/2031

Tabla 2. Seguimiento a Póliza Cumplimiento entidades Públicas

Fuente: Elaboración propia

COMPañÍA	No. GARANTÍA	TOMADOR	FECHA
ASEGURADORA SOLIDARIA	430-74- 994000028090	UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025	01/12/2025
AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		INICIA	TERMINA
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$700.362.000,00	01/01/2026	04/12/2026

Tabla 3. Seguimiento a Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Fuente: Elaboración propia

Generadas con la firma del contrato de consultoría No. 2000.13.04.005-2025. del 24 de noviembre de 2025.

3.3 REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

Los representantes de las entidades involucradas en el proyecto se presentan a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE O PROMOTORA	
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	MOISES CEPEDA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIEGO CALDERÓN
CONTRATISTA DE CONSULTORIA	
Contratista de Consultoría	UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025
Representante Legal	ROSALBA NATALY BUCHELI
CONSORCIADOS CONTRATISTA DE CONSULTORIA	
GRUPO M2 S.A.S	72.42%
EESALAMANCA S.A.S	26.58%
CH ASOCIADOS CONT.S	1%
INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
Interventoría	MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
Representante Legal	CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ
Director de Interventoría	PAULA ANDREA ALUMA

Tabla 4. Representantes partes del Contrato

4. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

FASE I – Actividades preliminares, catastro y diagnóstico
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)
Reconocimiento físico de campo
Recolección de información existente
Levantamiento de campo
Levantamiento de catastro del sistema
Elaboración de fichas técnicas
Estudio topográfico general
Informe de actividades con soportes
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL
Análisis de estudios existentes
Proyección de población
Análisis de consumo, pérdidas y dotación
Proyección de demanda
Análisis de capacidad del sistema
Medición de caudales y calidad del agua
Aforos y caracterización de aguas residuales
Estudios de tratabilidad y toxicidad
Estudio hidrológico
Diagnóstico físico, técnico y operativo
Diligenciamiento Anexo V (Res. 0379/2012)
Informe de diagnóstico técnico-operativo
Socialización del diagnóstico
REPORTES OBLIGATORIOS
Notificación de inviabilidad o problemas en campo (si aplica)
FASE II – Planteamiento, selección de alternativas y gestión de trámites (Parte I)
Formulación de alternativas
Diseños preliminares
Matriz de valoración ponderada
Cuantificación de costos
Evaluación técnica, económica y operativa
Informe de alternativas
GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (Parte I)
Requisitos para permisos ambientales
Requisitos para uso de zona de carreteras o cruces de vía
Requisitos para adquisición de predios y servidumbres
Socialización de resultados
FASE III – Diseño definitivo de la alternativa seleccionada

Topografía de zonas de interés
Sistema de Información Geográfica (SIG)
Diseños hidráulicos detallados
Estudios de suelos y geotecnia
Diseños estructurales
Diseños eléctricos
Estudios ambientales
Informe de diseños definitivos
PRESUPUESTOS – APU – ESPECIFICACIONES
Cantidades de obra
APU del proyecto
Presupuesto total y POI
Cotizaciones
Cuantificación de recursos
Presupuesto de puesta en marcha
Plan financiero
Especificaciones técnicas
Cronograma de obra
Flujo de fondos
Socialización de diseños
FASE IV – Gestión de trámites y permisos (Parte II)
Acreditación de propiedad, posesión o servidumbre
Aprobación de permisos de intervención en vías (o radicación)
FASE V – Documentos, presentación y viabilización del proyecto
MGA o Ficha EBI
Certificaciones de Ley 142/1994
Inclusión en Plan de Desarrollo, POT/EOT y Banco de Proyectos
Certificación de paz y salvo por subsidios
CDP o disponibilidad de recursos
Carta de presentación del proyecto
Radicación ante entidad correspondiente
Sustentación técnica
Correcciones solicitadas por la entidad
Entrega del proyecto a Vallecaucana de Aguas
Socialización final

5. AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

5.1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO

Para el proyecto que tiene como objeto "Estructuración y Formulación de Estudios y Diseños para obras de Protección del Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado El Placer, Municipio de El Cerrito" se desarrollaron las siguientes actividades:

5.1.1.1 SOLICITUD RESPUESTA AL OFICIO EMITIDO EL 07 DE MAYO DE 2026 POR PARTE DE LA CONSULTORÍA:

Teniendo en cuenta que la Unión Temporal GE Valle 2025 emitió respuesta mediante oficio del 07 de mayo de 2026, con copia a la interventoría, en el cual de forma resumida solicitó lo siguiente: El contratista solicita a Vallecaucana de Aguas y a la Interventoría que aclaren si los estudios especializados y adicionales solicitados para el proyecto de El Placer hacen parte del alcance contractual vigente o si, por el contrario, deben ser definidos e incorporados mediante el procedimiento contractual correspondiente, dado que su ejecución podría afectar el desarrollo, los tiempos y los criterios técnicos del proyecto. Ver anexo A.

Asimismo, mediante dos (2) oficios emitidos Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. al correo tecnica@eva.gov.co, los días 06 de junio y 16 de junio de 2026, la Unión Temporal GE Valle solicitó, a la dirección del área técnica, respuesta del oficio antes mencionado para tener claridad frente a las acciones a tomar y dar inicio al desarrollo del proyecto "Estructuración y Formulación de Estudios y Diseños para obras de Protección del Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado El Placer, Municipio de El Cerrito". Ver anexo B.

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE CONTEXTUALIZACION	PORCENTAJE POR CONTRATO – PRODUCTO I (3.32%)
Reuniones con administración municipal y comunidad AUSERPUP (registro fotográfico y asistencia)	0.37%
Reconocimiento físico de campo	0.37%
Recolección de información existente	0.37%
TOTAL	1.1%

5.1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA.

Para el proyecto que tiene como objeto "Estructuración y Formulación de los Estudios y Diseños del Sistema de Abastecimiento, Tratamiento y Suministro de Agua Potable, para el Acueducto Interveredal La Cedalia – El Cedral – La Albania Alta - La Albania Baja – El Pital y Buenos Aires municipio El Aguila" se desarrollaron las siguientes actividades.

5.1.2.1 CULMINACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAMPO Y DE DIBUJO

En el marco del desarrollo del proyecto, el día 17 de mayo de 2026, se dio inicio a la actividad de levantamiento topográfico de campo, en las veredas La Albania, con su zonificación La Albania Baja y el Bosque; y El Pital con su zonificación Buenos Aires; y para el día 15 de junio de 2026 fue culminada la topografía de dibujo y entregada al contratista de consultoría.

5.1.2.2 REALIZACIÓN DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON EL PROYECTO

En el marco del desarrollo del proyecto cuyo objeto es "Estructuración y Formulación de los Estudios y Diseños del Sistema de Abastecimiento, Tratamiento y Suministro de Agua Potable, para el Acueducto Interveredal La Cedalia – El Cedral – La Albania Alta - La Albania Baja – El Pital y Buenos Aires municipio El Aguila" se llevó a cabo una jornada de socialización del proyecto en mención, el día 26 de junio de 2026, a las 03:40 pm, en la vereda la Cedalia, zonificación El Río, dirigida a la comunidad de las veredas de La Cedalia, La Albania y El Pital, con el propósito de presentar de manera clara y participativa los alcances del proyecto, las actividades a desarrollar y la importancia de la participación comunitaria durante el proceso de formulación.

Durante el encuentro se explicó a los asistentes el objetivo general del proyecto, el cual busca adelantar los estudios y diseños necesarios para el sistema de acueducto interveredal, municipio de El Águila, orientados a mejorar las condiciones de potabilización y suministro de agua para la comunidad.

De igual manera, se expusieron las fases del proceso de formulación, la metodología de trabajo y las actividades de diagnóstico que se desarrollarán en el territorio.

Asimismo, se generó un espacio de diálogo con la comunidad, en el cual los participantes pudieron expresar sus inquietudes, observaciones y aportes frente a la problemática actual relacionada con el manejo de las aguas residuales en el corregimiento. Esta interacción permitió fortalecer el proceso de recolección de información y promover el acompañamiento de la comunidad en el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se resaltó la importancia del trabajo articulado entre la comunidad, las autoridades locales y el equipo técnico del proyecto, con el fin de avanzar en la estructuración de una solución técnica que responda a las necesidades del territorio y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las veredas antes mencionada.

Para el proceso de la convocatoria a la socialización se realizó entrega de oficio y volante informativo casa a casa. Así mismo, como medio se utilizó la creación de un grupo de WhatSapp donde se envió el volante y el oficio de invitación. Se cuenta con registro de firmas de los volantes entregados y con el registro de firmas de asistencia presencial a la socialización. Ver anexo C.

ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACION, CATASTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO	PORCENTAJE POR CONTRATO – PRODUCTO I (6.04%)
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)	0.67%
Reconocimiento físico de campo	0.67%
Recolección de información existente	0.67%
Culminación del levantamiento topográfico de campo y de dibujo	0.67%
Caracterización Social realizada	0.67%
Caracterización de la fuente hídrica las violetas	0.67%
Actualización del estudio Hidrológico	0.67%
Socialización del proyecto a la comunidad	0.67%
TOTAL	5.37%

5.1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADERA

Para el proyecto que tiene como objeto “Formulación y Estructuración del Proyecto del Sistema de Alcantarillado y PTAR del Corregimiento La Tupia, municipio de Pradera” se desarrollaron las siguientes actividades.

5.1.3.1 ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO A LA INTERVENTORÍA

Como parte del cumplimiento de las actividades contractuales, se realizó la entrega a la interventoría del Producto No. 1 correspondiente al Diagnóstico del Proyecto, el cual consolida la información técnica recopilada y analizada durante la etapa inicial de estudios. La documentación presentada incluye los siguientes componentes:

Informe de Diagnóstico.

Anexo A. Estudio de Topografía.

Anexo B. Caracterización Social.

Anexo C. Planos de Soporte.

Se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Ver anexo D.

ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACION, CATASTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO	PORCENTAJE POR CONTRATO – PRODUCTO I (5.12%)
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)	0.73%
Reconocimiento físico de campo	0.73%
Recolección de información existente	0.73%
Levantamiento topográfico de campo y de dibujo	0.73%
Caracterización Social realizada	0.73%

Socialización del proyecto a la comunidad	0.73%
Informe de diagnóstico técnico – operativo, con entregables, enviado a interventoría	0.73%
TOTAL	5.12%

5.1.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIDA.

Para el proyecto que tiene como objeto "Formulación y Estructuración para la Optimización del Sistema de Acueducto del Corregimiento El Pedregal, municipio de Florida" se desarrollaron las siguientes actividades:

5.1.4.1 ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO A LA INTERVENTORÍA

Como parte del cumplimiento de las actividades contractuales, se realizó la entrega a la interventoría del Producto No. 1 correspondiente al Diagnóstico del Proyecto, el cual consolida la información técnica recopilada y analizada durante la etapa inicial de estudios. La documentación presentada incluye los siguientes componentes:

Informe de Diagnóstico.

Anexo A. Caracterización Socioeconómica.

Anexo B. Levantamiento topográfico.

Anexo C. Estudio Hidrológico.

Anexo D. Caracterización de la fuente hídrica el Fraile.

La información entregada constituye la base técnica para el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto, permitiendo la evaluación de las condiciones existentes y la formulación de las alternativas de diseño correspondientes. A la fecha, la documentación remitida se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, para la emisión de las observaciones, conceptos y aprobación correspondientes.

5.1.4.1.1. Resumen del Informe de Diagnóstico

Durante el período reportado se elaboró el Informe de Diagnóstico del proyecto "Estudios y Diseños del Sistema de Acueducto del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida – Valle del Cauca", en el cual se consolidó y analizó la información técnica, ambiental, social y predial requerida para la formulación del proyecto. Se recopiló información primaria y secundaria del área de estudio, incluyendo la caracterización general del municipio y del corregimiento, así como la identificación de las condiciones actuales del sistema de abastecimiento de agua potable.

Como parte del proceso, se adelantaron visitas de campo para verificar el estado de la infraestructura existente y reconocer las condiciones del territorio, evidenciándose que la comunidad actualmente consume agua proveniente del río Frayle sin tratamiento de potabilización y que, durante las temporadas de lluvia, se presentan interrupciones en la prestación del servicio de acueducto. Adicionalmente, se gestionó la solicitud de información

ante las entidades competentes y se efectuó el análisis de la información recopilada para la elaboración del diagnóstico técnico.

En el componente social se desarrollaron actividades de articulación con la Administración Municipal, la Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora del Acueducto y líderes comunitarios, mediante reuniones de acercamiento, recorridos de reconocimiento y una jornada de socialización del proyecto con la comunidad. Como resultado de este proceso participativo, se acordó proyectar un nuevo sistema de acueducto para el corregimiento, conservando la infraestructura existente para usos complementarios, como riego y abastecimiento de animales.

Asimismo, se ejecutó la caracterización socioeconómica de la población beneficiaria, el levantamiento topográfico del trazado propuesto, el estudio hidrológico de la fuente de abastecimiento (río Frayle) y la caracterización de la calidad del agua, cuyos resultados evidenciaron que la fuente presenta un nivel de riesgo sanitario inviable para consumo humano sin tratamiento, confirmando la necesidad de implementar un sistema de potabilización. Finalmente, se establecieron los criterios técnicos de diseño y las proyecciones de población que servirán como base para el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto. Ver anexo E.

ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACIÓN, CATASTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO Y ESTUDIO TOPOGRÁFICO	PORCENTAJE POR CONTRATO – PRODUCTO I (5.52%)
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)	0.613%
Reconocimiento físico de campo	0.613%
Recolección de información existente	0.613%
Levantamiento topográfico de campo y de dibujo	0.613%
Caracterización Social realizada	0.613%
Caracterización de la fuente hídrica "El Fraile"	0.613%
Estudio Hidrológico de la fuente hídrica "El Fraile"	0.613%
Socialización del proyecto a la comunidad	0.613%
Informe de diagnóstico técnico – operativo, con entregables, enviado a interventoría	0.613%
TOTAL	5.52%

5.1.4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

No obstante, la consultoría Unión Temporal GE Valle 2025 ha venido adelantando las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto, mediante la elaboración y remisión de oficios a las diferentes entidades competentes, con el fin de solicitar información, obtener conceptos técnicos y dar cumplimiento a los requerimientos establecidos dentro del proceso de formulación y diseño. Entre las comunicaciones remitidas se destacan las siguientes: Ver anexos F,G,H,I y J.

5.1.4.3 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO CON LA VEEDURÍA CIUDADANA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA.

Descripción

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y mantener informados a los actores sociales del corregimiento El Pedregal primera Etapa sobre el desarrollo del proyecto "Estudios y Diseños del Sistema de Acueducto del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida – Valle del Cauca", se realizó una reunión de seguimiento convocada de manera conjunta por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., la Interventoría Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S. y la Unión Temporal GE-VALLE 2025, bajo la coordinación de la Consultoría.

Durante la jornada se socializó el estado de avance del proyecto, las actividades ejecutadas a la fecha y las etapas previstas para su desarrollo. De igual manera, se atendieron las inquietudes y observaciones presentadas por los integrantes de la Veeduría Ciudadana, la Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora del Acueducto y demás asistentes, generando un espacio de diálogo que permitió fortalecer la comunicación entre la comunidad y las entidades participantes, así como promover la transparencia y el seguimiento ciudadano al proceso de formulación del proyecto. Ver anexo K.

5.1.5 ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAL

- Entrega del informe de diagnóstico con sus respectivos entregables del municipio del Águila, veredas La Cedalia, La Albania y El Pital.
- Contratación de los estudios pertinentes para el Centro Poblado el Placer, municipio el Cerrito, posterior a respuesta emitida por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S. P.
- Entrega de los diagnósticos de los municipios de Pradera y Florida, por parte de la interventoría MYM, para sus respectivos ajustes.
- Entrega de los diagnósticos de los municipios de Pradera y Florida, por parte de la Unión Temporal GE Valle 2025, con los respectivos ajustes a la interventoría MYM.
- Proceder por parte de la Unión Temporal GE Valle 2025, con el planteamiento de las alternativas de los municipios de Pradera y Florida, para ser socializadas a sus respectivas comunidades beneficiadas.
-

5.2 PORCENTAJE (%) DE AVANCE

A la fecha del presente informe, el avance total del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIOS DE EL CERRITO, EL AGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE", corresponde a un **47.11%**; desglosada cada actividad por municipio en la tabla a continuación:

PRODUCTO CERO		30%
PROYECTO No 1. GRUPO 3. PRODUCTO CERO (0)	"ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO"	
	Plan de Trabajo	4.98%
	Cronograma	
	Hojas de vida de personal	
TOTAL – PRODUCTO CERO - MUNICIPIO DE CERRITO		4.98%
PROYECTO No 2. GRUPO 3. PRODUCTO CERO (0).	"ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDA LA CEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL AGUILA".	
	Plan de Trabajo	9.06%
	Cronograma	
	Hojas de vida de personal	
TOTAL – PRODUCTO CERO - MUNICIPIO DE EL ÁGUILA		9.06%
PROYECTO No 3. GRUPO 3. PRODUCTO CERO (0).	"FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA"	
	Plan de Trabajo	7.69%
	Cronograma	
	Hojas de vida de personal	
TOTAL – PRODUCTO CERO - MUNICIPIO DE PRADERA		7.69%
PROYECTO No 4. GRUPO 3. PRODUCTO CERO (0).	"FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA".	
	Plan de Trabajo	8.28%
	Cronograma	
	Hojas de vida de personal	
TOTAL – PRODUCTO CERO - MUNICIPIO DE FLORIDA		8.28%
TOTAL-PRODUCTO CERO		30%

PROYECTO No 4. GRUPO 3. FASE I	“FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA”.	
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)		0.613%
Reconocimiento físico de campo		0.613%
Recolección de información existente		0.613%
Levantamiento topográfico de campo y de dibujo		0.613%
Caracterización Social realizada		0.613%
Caracterización de la fuente hídrica “El Fraile”		0.613%
Estudio Hidrológico de la fuente hídrica “El Fraile”		0.613%
Socialización del proyecto a la comunidad		0.613%
Informe de diagnóstico técnico – operativo, con entregables, enviado a interventoría		0.613%
TOTAL		5.52%
TOTAL – INICIO DE FASE 1. MUNICIPIO DE FLORIDA		5.52%
TOTAL – INICIO DE FASE 1. DE LOS PROYECTOS – GRUPO 3.		17.11 %

Tabla 5. Porcentaje de Avances

PRODUCTO INICAL (I)		20%
PROYECTO No 1. GRUPO 3. FASE I	"ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL CERRITO"	
Reuniones con administración municipal y comunidad AUSERPUP (registro fotográfico y asistencia)		0.37%
Reconocimiento físico de campo		0.37%
Recolección de información existente		0.37%
TOTAL		1.1%
TOTAL – INICIO DE FASE 1. MUNICIPIO DE CERRITO		1.1%
PROYECTO No 2. GRUPO 3. FASE I	"ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDA LA CEDALIA – EL CEDRAL – LA ALBANIA ALTA - LA ALBANIA BAJA – EL PITAL Y BUENOS AIRES MUNICIPIO EL ÁGUILA".	
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)		0.67%
Reconocimiento físico de campo		0.67%
Recolección de información existente		0.67%
Culminación del levantamiento topográfico de campo y de dibujo		0.67%
Caracterización Social realizada		0.67%
Caracterización de la fuente hídrica las violetas		0.67%
Actualización del estudio Hidrológico		0.67%
Socialización del proyecto a la comunidad		0.67%
TOTAL		5.37%
TOTAL – INICIO DE FASE 1. MUNICIPIO DE EL ÁGUILA		5.37%
PROYECTO No 3. GRUPO 3. FASE I	"FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CORREGIMIENTO LA TUPIA, MUNICIPIO DE PRADERA"	
Reuniones con administración municipal y comunidad (registro fotográfico y asistencia)		0.73%
Reconocimiento físico de campo		0.73%
Recolección de información existente		0.73%
Levantamiento topográfico de campo y de dibujo		0.73%
Caracterización Social realizada		0.73%
Socialización del proyecto a la comunidad		0.73%
Informe de diagnóstico técnico – operativo, con entregables, enviado a interventoría		0.73%
TOTAL		5.12%
TOTAL – INICIO DE FASE 1. MUNICIPIO DE PRADERA		5.12%

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de junio de 2026, la Unión Temporal GE Valle 2025 realizó la entrega del Informe de Diagnóstico correspondiente al proyecto del corregimiento de Pedregal Primera Etapa del municipio de Florida. Dicho documento, junto con sus respectivos anexos técnicos, fue remitido a la Interventoría para su revisión, evaluación y emisión de observaciones, encontrándose actualmente en proceso de revisión.


En relación con el corregimiento de Pedregal primera etapa del municipio de Florida, La Unión Temporal GE Valle 2025, en cumplimiento de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, ha venido realizando la gestión y remisión de diferentes comunicaciones oficiales ante las entidades correspondientes, con el propósito de recopilar información técnica, gestionar conceptos y permisos, y avanzar en el desarrollo de los estudios y diseños del proyecto.

Para el caso del municipio del águila, se tiene previsto realizar durante la primera semana del mes de julio la entrega a la Interventoría del Informe de Diagnóstico junto con sus respectivos anexos técnicos, con el fin de que se adelante el proceso de revisión, evaluación y emisión de observaciones correspondientes.

En relación con el Centro Poblado El Placer, municipio de El Cerrito, la Unión Temporal GE Valle 2025 se encuentra a la espera de las directrices y/o respuesta por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes al desarrollo del proyecto.

En relación con el proyecto del corregimiento La Tupia, municipio de Pradera, se encuentra pendiente la entrega, por parte de la Interventoría Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S. (M&M), de los ajustes y observaciones al Informe de Diagnóstico. Una vez sean recibidos, la Unión Temporal GE-VALLE 2025 procederá a realizar las correcciones correspondientes y, posterior a su aprobación, continuará con el análisis y planteamiento de las alternativas técnicas del proyecto.

La reunión de seguimiento permitió socializar de manera clara y transparente el estado de avance del proyecto "Estudios y Diseños del Sistema de Acueducto del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida – Valle del Cauca", generando un espacio de diálogo entre Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., la Interventoría Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., la Unión Temporal GE-VALLE 2025, la Veeduría Ciudadana, la Junta Administradora del Acueducto, la Junta de Acción Comunal y la comunidad en general.



ROSALBA NATALY BUCHELI

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025

NIT: 902009437-8

ANEXOS

Anexo A. Oficio emitido por la Unión Temporal GE Valle 2025 a Vallecana de Aguas S.A. E.S.P. al correo tecnica@eva.gov.co, con fecha del del 07 de mayo de 2026.

Anexo B. Oficios emitidos por la Unión Temporal GE Valle 2025 a Vallecana de Aguas S.A. E.S.P. al correo tecnica@eva.gov.co, con fecha del 06 de junio y 16 de junio de 2026.

Anexo C. Acta de la reunión de socialización veredas La Albania, El Pital y Buenos Aires municipio de "El Águila", con el registro fotográfico de la jornada, la evidencia del oficio y del volante de convocatoria remitidos a la comunidad beneficiada, el registro de firmas de recibido del oficio de convocatoria, la presentación utilizada durante la socialización y el registro de asistencia debidamente firmado por los participantes.

Ver anexo D. Informe de Diagnóstico técnico-operativo corregimiento "La Tupia". Estudio de Topografía. Caracterización Social. Planos de Soporte. (Entregada toda la información en medio magnético).

Anexo E. Informe de Diagnóstico técnico-operativo corregimiento "El Pedregal – primera Etapa". Caracterización Socioeconómica. Levantamiento topográfico. Estudio Hidrológico. Caracterización de la fuente hídrica el Fraile. (Entregada toda la información en medio magnético).

Anexo F. Oficio Solicitud Mapa de Riesgo a la Administración Municipal.

Anexo G. Oficio Solicitud Mapa de Riesgo la Junta de Acueducto.

Anexo H. Oficio mediante el cual se solicita a la Junta Administradora del Acueducto explicar las razones por las cuales, a la fecha, la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Compacta no ha sido instalada.

Anexo I. Oficio Acuavalle para Planos del Tanque de almacenamiento y de bombeo.5. Oficio de la Administración Municipal para Acuavalle.

Anexo J. Oficio de la Administración Municipal para Acuavalle.

Anexo K. Acta de la reunión realizada, registro fotográfico de la actividad y registro de firmas, en el municipio de Florida Valle.

Anexo A. Oficio emitido por la Unión Temporal GE Valle 2025 a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. al correo tecnica@eva.gov.co, con fecha del del 07 de mayo de 2026.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**

Contrato Consultoría No 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Mayo 07 de 2026,

Ingeniero

DIEGO J. CALDERÓN

Director Técnico Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

L. C.

Ingeniera

PAULA ALUMA

Directora de Interventoría, M&M Arquitectura e Ingeniería SAS.

L. C.

Referencia: Respuesta al Oficio Rad. Padre VA.3000.07.01.00337-2026 – TRD: VA.3000.07.01.00337-2026.

Asunto: Aclaración alcance contractual – Concepto técnico Proyecto El Placer – El Cerrito:
"ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCION
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PLACER, MUNICIPIO DE EL
CERRITO"

Cordial saludo,

En atención al documento denominado "Concepto información proyecto corregimiento El Placer – El Cerrito", mediante el cual se realizan observaciones técnicas relacionadas con la necesidad de complementar estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y de socavación para el adecuado sustento de las obras de protección planteadas dentro del proyecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Una vez revisado el concepto emitido por la Dirección Técnica de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025 reconoce que técnicamente las observaciones expuestas pueden contribuir al fortalecimiento integral del proyecto y a la definición futura de soluciones hidráulicas y estructurales más detalladas.

No obstante, lo anterior, es importante precisar que los estudios específicos de hidráulica fluvial avanzada, modelación complementaria de socavación general y local, así como estudios especializados orientados a definir obras de protección hidráulica integral sobre el río Amaime, no hacen parte expresa del alcance contractual establecido en el Anexo Técnico que rige el contrato suscrito con la UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025.

Carrera 9 No 8-04 - Municipio de Roldanillo- Valle Del Cauca
grupom2sas@gmail.com - 3164983757

Unión Temporal GE-VALLE 2025

Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Lo anterior se evidencia en el Anexo Técnico contractual, el cual define taxativamente las actividades, productos y alcances a desarrollar por el consultor, incluyendo estudios topográficos, geotécnicos, y estructurales asociados al componente contratado, sin que dentro de dicho alcance se establezca la obligación específica de desarrollar estudios detallados de socavación, modelación hidráulica complementaria de protección fluvial integral o estudios adicionales especializados para evaluación morfodinámica del cauce.

En este sentido, las observaciones efectuadas dentro del concepto técnico corresponden a requerimientos complementarios o adicionales que no se encuentran expresamente incluidos dentro del alcance contractual definido por la Entidad en los documentos base del proceso contractual.

Así mismo, debe tenerse presente que el objeto contractual desarrollado por la UNION TEMPORAL GE VALLE 2025 se fundamenta en el alcance, actividades y productos expresamente definidos por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. en el Anexo Técnico y documentos precontractuales, los cuales constituyen la base obligacional y técnica para la ejecución de la consultoría.

Por consiguiente, cualquier actividad adicional asociada a estudios especializados de socavación, modelaciones hidráulicas complementarias, análisis morfodinámicos del río o profundización de estudios no contemplados inicialmente, deberá ser evaluada por la Entidad respecto de su incorporación mediante los mecanismos contractuales correspondientes, en caso de considerarse necesaria su ejecución.

Adicionalmente, solicitamos respetuosamente a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. y a la Interventoría se sirvan aclarar si la UNION TEMPORAL GE VALLE 2025 debe continuar con el desarrollo de las actividades, estudios y productos que sí se encuentran expresamente contemplados dentro del alcance contractual y del Anexo Técnico para el proyecto El Placer – El Cerrito, o si por el contrario dichas actividades deben suspenderse temporalmente hasta tanto la Entidad defina la necesidad, alcance y forma de ejecución de los estudios adicionales mencionados en el concepto técnico, tales como los estudios hidráulicos complementarios, modelaciones de socavación y demás análisis no contemplados inicialmente dentro del contrato.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la definición de dichos estudios adicionales podría generar incidencia directa sobre criterios técnicos de diseño, localización, dimensionamiento y concepción de las obras proyectadas, situación que eventualmente podría afectar el normal desarrollo de las actividades actualmente contratadas.

Carrera 9 No 8-04 - Municipio de Roldanillo- Valle Del Cauca
grupom2sas@gmail.com - 3164983757

Unión Temporal GE-VALLE 2025

Contrato Consultoría No 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Finalmente, reiteramos nuestra disposición técnica y contractual para atender las observaciones que se encuentren dentro del alcance pactado y continuar articuladamente con la Entidad e interventoría en el desarrollo del proyecto. Lo anterior, sin que ello implique aceptación tácita por parte de la UNION TEMPORAL GE VALLE 2025 de actividades, estudios o alcances adicionales no contemplados dentro de las obligaciones contractuales inicialmente pactadas.

Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, prevenir posibles inconsistencias en el alcance técnico y asegurar la coherencia entre los lineamientos establecidos y los productos a desarrollar.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI

Representante Legal UNIÓN TEMPORAL GE - VALLE 2025

Copia. supervisor de vallecaucanas de aguas

Anexo B. Oficios emitidos por la Unión Temporal GE Valle 2025 a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. al correo tecnica@eva.gov.co, con fecha del 06 de junio y 16 de junio de 2026.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**

Contrato Consultoría No 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Roldanillo, Valle 06 junio de 2026

Ingeniero

DIEGO CALDERÓN

Director Técnico

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Santiago de Cali (Valle)

Asunto: Solicitud de información sobre respuesta a consulta técnica relacionada con el Proyecto El Placer – Municipio de El Cerrito.

Cordial saludo,


De manera respetuosa, me permito solicitar información relacionada con el oficio remitido el día 07 de mayo de 2026 al correo electrónico - tecnica@eva.gov.co, con copia a la Interventoría del contrato; mediante el cual se presentó la respuesta al Oficio Rad. VA.3000.07.01.00337-2026, referente a la aclaración del alcance contractual y concepto técnico del proyecto "Estructuración y Formulación de Estudios y Diseños para Obras de Protección del Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado El Placer, Municipio de El Cerrito".

Teniendo en cuenta que los aspectos consultados guardan relación directa con la definición de actividades, alcance técnico y toma de decisiones necesarias para la adecuada ejecución del proyecto, agradecemos nos sea informada la fecha estimada de emisión de la respuesta correspondiente, o en su defecto el estado actual del trámite.

Lo anterior, con el fin de contar con los lineamientos requeridos para la continuidad de las actividades contractuales y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

Agradecemos de antemano la atención prestada y la colaboración brindada, quedando atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE – VALLE 2025

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com

Coordinadora: Andrea Lonoño Vásquez.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com.

Tel: 317-3307112.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**

Contrato Consultoría No 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Roldanillo, Valle 16 junio de 2026

Ingeniero

DIEGO CALDERÓN

Director Técnico

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Santiago de Cali (Valle)

Asunto: Solicitud de información sobre estado de trámite – Reiteración de solicitud.

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito realizar seguimiento al oficio remitido el día 06 de junio de 2026 al correo electrónico tecnica@eva.gov.co, mediante el cual se solicitó información relacionada con la respuesta a la consulta técnica presentada respecto al proyecto denominado: "Estructuración y Formulación de Estudios y Diseños para Obras de Protección del Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado El Placer, Municipio de El Cerrito".

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del área técnica de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y considerando que los aspectos objeto de la consulta son fundamentales para la definición del alcance técnico, la programación de actividades y la toma de decisiones requeridas para la adecuada ejecución del proyecto, agradecemos nos sea informado el estado actual de la solicitud presentada, así como la fecha estimada para la emisión del respectivo concepto o pronunciamiento técnico.

Lo anterior, con el propósito de contar oportunamente con los lineamientos técnicos necesarios para la continuidad de las actividades contractuales y garantizar el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos dentro del contrato.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la atención del trámite.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE – VALLE 2025

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com

Coordinadora: Andrea Lonoño Vásquez.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com. Tel: 317-3307112.

Anexo C. Acta de la reunión de socialización veredas La Albania, El Pital y Buenos Aires municipio de "El Águila", con el registro fotográfico de la jornada, la evidencia del oficio y del volante de convocatoria remitidos a la comunidad beneficiada, el registro de firmas de recibido del oficio de convocatoria, la presentación utilizada durante la socialización y el registro de asistencia debidamente firmado por los participantes.

Ver anexo D. Informe de Diagnóstico técnico-operativo corregimiento "La Tupia". Estudio de Topografía. Caracterización Social. Planos de Soporte. (Se entrega en medio magnético).

Anexo E. Informe de Diagnóstico técnico-operativo corregimiento "El Pedregal – primera Etapa". Caracterización Socioeconómica. Levantamiento topográfico. Estudio Hidrológico. Caracterización de la fuente hídrica el Fraile. (Se entrega en medio magnético).

Anexo F. Oficio Solicitud Mapa de Riesgo a la Administración Municipal.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**
Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Roldanillo, 09 febrero de 2026.

Doctor

DIMAS ANTONIO MARTÍNEZ TORO

Alcalde Municipal

Municipio de Florida

Departamento del Valle del Cauca.

Asunto: Solicitud de gestión ante la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) del Mapa de Riesgo de la fuente hídrica corresponde al río Fraile, en el marco del proyecto de "Formulación y Estructuración del acueducto de la vereda El Pedregal Primera Etapa, municipio de Florida".

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del proyecto cuyo objeto es la "Formulación y Estructuración para la optimización del sistema de acueducto del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida", la Unión Temporal GE Valle 2025, en calidad de contratista, se permite solicitar respetuosamente el apoyo de la Administración Municipal, en cabeza de su despacho como representante legal del municipio, para que se sirva gestionar ante la Unidad Ejecutora de Saneamiento – UES la elaboración, avance y suministro del Mapa de Riesgo de la fuente hídrica proyectada para la captación del sistema de abastecimiento en mención, con el fin de continuar con el proceso de solicitud de la concesión de aguas para el acueducto comunitario del El Pedregal Primera Etapa.

La fuente de abastecimiento corresponde al río Fraile, en el cual se encuentra localizada la bocatoma que actualmente abastece el sistema de acueducto antes mencionado, como componente fundamental del proyecto de optimización objeto de la presente solicitud.

La elaboración del mapa de riesgo constituye un insumo técnico esencial para una de fase de formulación y estructuración del proyecto, en tanto permite identificar, localizar y evaluar las amenazas naturales, antrópicas y operativas que puedan afectar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, así como la seguridad y sostenibilidad del sistema de abastecimiento proyectado.

De igual manera, el mapa de riesgo resulta clave para:

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**


Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

- Realizar un análisis integral de las condiciones actuales de la fuente de agua y su área de influencia.
- Definir medidas de prevención, mitigación y manejo orientadas a la protección del recurso hídrico.
- Sustentar la toma de decisiones técnicas relacionadas con el diseño y localización de la infraestructura de captación.
- Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y ambientales exigidos por las autoridades competentes, fortaleciendo los procesos de planificación territorial y gestión del riesgo.

Contar con esta información permitirá formular el proyecto de manera responsable, técnica y ambientalmente viable, garantizando la sostenibilidad del sistema de acueducto y el bienestar de la comunidad beneficiaria del corregimiento "El Pedregal".

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para avanzar de manera articulada con la Administración Municipal.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI.

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025.

Número Telefónico: 3164983757.

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com.

Número Telefónico - Coordinadora UTGE VALLE 2025: 3173307112.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com.

Anexo G. Oficio Solicitud Mapa de Riesgo la Junta de Acueducto.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**
Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Roldanillo, 09 febrero de 2026.

Señor:

ERIBERTO COLLAZOS MESA

Presidente y Representante Legal

Acueducto Comunitario de la vereda El Pedregal – Primera Etapa

Municipio de Florida

Departamento del Valle del Cauca.

Asunto: Solicitud de gestión ante la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) del Mapa de Riesgo de la fuente hídrica corresponde al río Fraile, en el marco del proyecto de "Formulación y Estructuración del acueducto de la vereda El Pedregal Primera Etapa, municipio de Florida".

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del proyecto cuyo objeto es la "Formulación y Estructuración para la optimización del sistema de acueducto del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida", la Unión Temporal GE Valle 2025, en calidad de contratista, se permite solicitar respetuosamente el apoyo del Acueducto Comunitario de la vereda El Pedregal – Primera Etapa, municipio de Florida, para que se sirva gestionar ante la Unidad Ejecutora de Saneamiento – UES la elaboración, avance y suministro del Mapa de Riesgo de la fuente hídrica proyectada para la captación del sistema de abastecimiento en mención, con el fin de continuar con el proceso de solicitud de la concesión de aguas para el acueducto comunitario del El Pedregal Primera Etapa.

La fuente de abastecimiento corresponde al río Fraile, en el cual se encuentra localizada la bocatoma que actualmente abastece el sistema de acueducto antes mencionado, como componente fundamental del proyecto de optimización objeto de la presente solicitud.

La elaboración del mapa de riesgo constituye un insumo técnico esencial para una de fase de formulación y estructuración del proyecto, en tanto permite identificar, localizar y evaluar las amenazas naturales, antrópicas y operativas que puedan afectar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, así como la seguridad y sostenibilidad del sistema de abastecimiento proyectado.

De igual manera, el mapa de riesgo resulta clave para:

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**


Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

- Realizar un análisis integral de las condiciones actuales de la fuente de agua y su área de influencia.
- Definir medidas de prevención, mitigación y manejo orientadas a la protección del recurso hídrico.
- Sustentar la toma de decisiones técnicas relacionadas con el diseño y localización de la infraestructura de captación.
- Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y ambientales exigidos por las autoridades competentes, fortaleciendo los procesos de planificación territorial y gestión del riesgo.

Contar con esta información permitirá formular el proyecto de manera responsable, técnica y ambientalmente viable, garantizando la sostenibilidad del sistema de acueducto y el bienestar de la comunidad beneficiaria del corregimiento "El Pedregal".

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para avanzar de manera articulada con la Administración Municipal.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI.

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025.

Número Telefónico: 3164983757.

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com.

Número Telefónico - Coordinadora UTGE VALLE 2025: 3173307112.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com.

Anexo H. Oficio mediante el cual se solicita a la Junta Administradora del Acueducto explicar

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**

Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Roldanillo, Valle del Cauca, 10 febrero de 2026.

Señor

HERIBERTO COLLAZOS MESA

Presidente de la Junta de Acueducto Rural

Corregimiento de la Tupia.

Municipio de Florida

Departamento del Valle del Cauca.

Asunto: Solicitud de explicación técnica y verificable sobre la no puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) compacta del corregimiento La Tupia.

Reciba un cordial saludo:

Yo, **ROSALBA NATALY BUCHELI VITELY**, en calidad de Representante Legal del contratista UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025, me permito dirigir la presente comunicación con el fin de solicitar una explicación clara, técnica y verificable en relación con la situación actual de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP compacta, instalada en el corregimiento La Tupia, municipio de Florida, Valle del Cauca.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como es de su conocimiento, la comunidad del área de influencia fue favorecida dentro del proceso de priorización por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., como gestora del Plan Departamental de Aguas el Valle del Cauca, para el proyecto denominado "FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA", el cual constituye un insumo fundamental para el diagnóstico técnico que, en calidad de contratista, se debe entregar en el marco de la Fase I del proyecto.

En este contexto, resulta necesario contar con información clara y verificable respecto al estado real de la PTAP compacta, dado que su existencia, condiciones operativas y situación administrativa hacen parte relevante del análisis del sistema de abastecimiento de agua potable de la zona. No obstante, pese a que la comunidad cuenta físicamente con dicha infraestructura, concebida como una solución fundamental para mejorar la calidad del agua destinada al consumo humano, a la fecha la planta no ha sido puesta en marcha ni se encuentra en operación.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**
Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas


En razón de lo expuesto, respetuosamente se solicita se informe:

- ✓ Las razones técnicas, administrativas o contractuales por las cuales la PTAP no ha sido puesta en funcionamiento a la fecha.
- ✓ El estado actual del proceso de entrega, legalización y puesta en marcha de la planta.
- ✓ Las responsabilidades institucionales relacionadas con la operación, administración y mantenimiento del sistema.
- ✓ Los plazos estimados y acciones previstas para la entrada en operación efectiva de la PTAP.

La presente solicitud tiene como finalidad disponer de información objetiva, documentada y verificable que permita adelantar de manera adecuada el diagnóstico técnico exigido para la Fase I del proyecto, así como contribuir a la claridad institucional frente a una infraestructura de alto impacto para la comunidad beneficiaria.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a una pronta respuesta.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI.
C.C

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025.

Número Telefónico: 3164983757.

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com

Anexo I. Oficio Acuavalle para Planos del Tanque de almacenamiento y de bombeo.

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**
Contrato Consultoría No. 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Roldanillo, 25 de abril de 2026

Señores

CARLOS HINCAPIÉ

Subgerente operativo (E)

L.C

REFEFENCIA: Proyecto - FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA.

Asunto: Solicitud de información técnica de tanque de almacenamiento bajo y del sistema de bombeo, existentes en la PTAP de Florida.

La empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., en su calidad de gestora del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Diálogos Vallecaucanos, así como de las metas trazadas en materia de agua potable y saneamiento básico, priorizó el proyecto denominado "FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA".

En este sentido, mediante el Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.005-2025, suscrito con la Unión Temporal GE Valle 2025, actualmente se adelantan los estudios y diseños orientados al mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de agua potable para el corregimiento El Pedregal – Primera Etapa, en jurisdicción del municipio de Florida.

No obstante, el desarrollo del proyecto contempla diferentes fases, correspondiendo la Fase II, al planteamiento, análisis y selección de alternativas técnicas, entre otros aspectos asociados a la estructuración del sistema.

En el marco de dicha fase, una de las alternativas evaluadas contempla la posibilidad de que Acuavalle S.A. E.S.P. asuma la prestación del servicio público de acueducto para la comunidad del corregimiento El Pedregal – Primera Etapa, en jurisdicción del municipio de Florida.


Con base en lo anterior, y de acuerdo con la visita técnica realizada el día 23 de abril de 2026, a las instalaciones de la PTAP del municipio de Florida, operada por la empresa Acuavalle S.A. E.S.P., se evidenció la existencia de un tanque de almacenamiento bajo y un sistema de bombeo, infraestructura que potencialmente podría ser utilizada dentro del esquema de prestación anteriormente mencionado.

Unión Temporal GE-VALLE 2025

Contrato Consultoría No 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

Por lo anterior, la Unión Temporal GE Valle 2025, solicita muy comedidamente a la empresa Acuavalle S.A. E.S.P., se nos facilite la información técnica existente, memorias y/o planos correspondientes a la infraestructura mencionada, con el fin de que estos puedan ser evaluados por el especialista hidráulico del proyecto y así verificar su estado y condiciones estructurales por parte del especialista estructural, para una posible incorporación dentro de las alternativas planteadas.

Agradecemos de antemano la atención prestada y el apoyo brindado al presente requerimiento, quedando atentos a la información que desde su competencia consideren pertinente remitir.



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE – VALLE 2025

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com

Coordinadora: **ANDREA LONDOÑO VÁSQUEZ.**

Te: (+57) 317 – 3307112.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com



ACUAVALLE S.A. E.S.P.
VENTANILLA ÚNICA

2025-09-25 15:48:54

Remitente: MUNICIPIO DE FLORIDA

Fotos: 0

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO BAJO Y DEL SISTEMA DE

Destinatario: CARLOS ANDRES HINCAPIE TECNICA

Redatado: "62012026"

Atención: "2167813"

Anexo J Oficio de la Administración Municipal para Acuavalle.

		CÓDIGO: GPD-FO-005
		VERSIÓN: 1
		EMISIÓN: 24-11-2025

DAM -042- 2026

Florida, 25 de mayo de 2026

Señores
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
L.C


ACUAVALLE S.A. E.S.P.
VENTANILLA UNICA
 2026-05-27 19:11:23
 Remite: MUNICIPIO DE FLORIDA Folios: 0
 Asunto: MANIFESTACION DE CONFORMIDAD FRENTE A
 POSIBLE PRESTACION DEL SERVICIO DE
 Distribuido: JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
 Recibido: "E4C62026" Atendido: "2171267"

REFERENCIA: Proyecto - FORMULA
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL
PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA.

Asunto: Manifestación de conformidad frente a posible prestación del servicio de
acueducto en el corregimiento El Pedregal Primera Etapa.

Por medio de la presente, yo, **MARIBEL SARRIA LATORRE**, en calidad de
Alcaldesa Municipal encargada de Florida, me permito manifestar que, en el marco
de los espacios de diálogo adelantados con la empresa Vallecaucana de Aguas S.A.
E.S.P., entidad gestora del Plan Departamental de Aguas del departamento del
Valle del Cauca, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Diálogos
Vallecaucanos, así como de las metas establecidas en materia de agua potable y
saneamiento básico, actualmente se encuentra priorizado por la gobernación del
Valle y el municipio de Florida, el proyecto denominado: "FORMULACIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA".

En desarrollo de las mesas técnicas y espacios de articulación realizados entre la
entidad anteriormente mencionada, la consultoría Unión Temporal GE Valle 2025,
representantes de la comunidad del corregimiento El Pedregal – Primera Etapa y la
Administración Municipal, se contempló, dentro de las posibles alternativas a
socializar con la comunidad, la posibilidad de que Acuavalle S.A. E.S.P. pueda
asumir la prestación directa del servicio público de acueducto en dicho sector.

En ese sentido, como representante legal del municipio de Florida, manifiesto mi
interés y disposición institucional frente a dicha alternativa, siempre y cuando la
misma sea concertada, socializada y aprobada por la comunidad beneficiaria, y se
desarrolle conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y normativos
aplicables.

Lo anterior, con el propósito de continuar fortaleciendo las acciones encaminadas
al mejoramiento y fortalecimiento de la prestación del servicio de agua potable, así
como garantizar a la comunidad una prestación eficiente, continua y de calidad,

MUNICIPIO DE FLORIDA
 NIT 300100519-1
 Calle 10 con carrera 20 esquina código postal: 763560
 Teléfono: 603 2244444 Email: alcalde@florida.vallenorte.gov.co

 ALCALDÍA DE FLORIDA VALLE	 FORMATO OFICIO	CÓDIGO: GPD-FO-005
		VERSIÓN: 1
		EMISIÓN: 24-11-2025

contribuyendo al bienestar de los habitantes del corregimiento El Pedregal, municipio de Florida.

De igual manera, esta alternativa permitirá contar con mayores elementos de análisis dentro del proceso de formulación de alternativas del proyecto y facilitar la toma de decisiones concertadas entre la comunidad y las entidades involucradas.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a la información y consideraciones que desde su competencia estimen pertinentes.

Cordialmente,


 (E)
 MARIBEL DEL SOCORRO SARRIA LA TORRE
 Alcalde Municipal (E)

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Humberto Gutiérrez	Contratista	
Revisó	Wladimir Ceron Rodriguez	Asesor Jurídico (E)	
Aprobó	Maribel del Socorro Sarria	Alcalde Municipal (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Anexo K. Acta de la reunión realizada, registro fotográfico de la actividad y registro de firmas, en el municipio de Florida Valle.

ACTA No 4.	DIMENSIÓN: PROYECTOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	
ACTIVIDAD: JORNADA DE SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, REALIZADA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS, LÍDERES COMUNITARIOS, REPRESENTANTES DE VALLECAUCANA DE AGUAS, REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORÍA Y REPRESENTANTES DE LA CONSULTORÍA, EN LA CUAL SE PRESENTÓ INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO, SU ALCANCE, LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS ESPERADOS PARA LA COMUNIDAD EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA.	
FECHA: 26 DE JUNIO DE 2026	LUGAR o MEDIO: JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
HORA DE INICIO: 3:40 pm	HORA FINAL: 05:40 pm
OBJETIVO: SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS DE LA CEDALIA, LA ALBANIA Y EL PITAL, MUNICIPIO DEL ÁGUILA, EL ALCANCE, LOS OBJETIVOS Y LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO DENOMINADO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, CON EL FIN DE INFORMAR A LOS HABITANTES SOBRE EL PROCESO QUE SE ADELANTE, PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y RECOGER APORTES DE LA COMUNIDAD QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ADECUADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO EN MENCIÓN.	
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: EN EL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SIENDO HORAS DE LA TARDE, SE DA INICIO A LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES LA “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES CONVOCADOS. PARA DAR INICIO A LA REUNIÓN, TOMA LA PALABRA LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO COORDINADORA DEL GRUPO UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025, QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE: BUENA TARDES A TODAS Y TODOS LOS PRESNETES, ANTES DE INICIAR, QUISIERA SOLICITAR SU AUTORIZACIÓN PARA GRABAR ESTA REUNIÓN. LA GRABACIÓN SERÁ UTILIZADA ÚNICAMENTE COMO APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, CON EL FIN DE QUE LA INFORMACIÓN, LAS INTERVENCIONES, LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS QUEDEN REGISTRADAS DE MANERA PRECISA.	

POSTERIORMENTE, LES COMPARTIRÉ POR WHATSAPP TANTO EL ACTA COMO LA PRESENTACIÓN DE ESTA REUNIÓN. ¿ESTÁN TODOS DE ACUERDO CON QUE REALICE ESTA GRABACIÓN?, PARA LO CUAL LOS ASISTENTES DIERON SU AUTORIZACIÓN. MUCHAS GRACIAS. ENTONCES, SI NO HAY INCONVENIENTE, DAMOS INICIO A LA REUNIÓN.

COMO PARTE DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN, TOMA LA PALABRA EL ARQUITECTO JUAN DAVID GONZALEZ HERNANDEZ, QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE: BUENAS TARDES, GRACIAS POR ASISTIR A ESTA REUNIÓN, ES MUY IMPORTANTE LA ASISTENCIA DE TODOS USTEDES POR MI PARTE NOS COMPAÑA JUAN DAVID GONZÁLEZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, NUESTRO COMPAÑERO ADOLFO GÓMEZ SECRETARIO DE GOBIERNO, EL DÍA DE HOY ESTE ES EL GRUPO QUE VIENE A SOCIALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE ESTÁN HACIENDO EN ESTE SECTOR CON RELACIÓN AL ACUEDUCTO QUE SE PRETENDE CONSTRUIR Y DESARROLLAR AQUÍ, DE AHÍ LES VAN A DAR LA INTRODUCCIÓN, ELLOS NOS VANA EXPLICAR MUCHAS GRACIAS, PERMISO.

TERMINADA LA PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO INTERVIENE EL DOCTOR ADOLFO GOMEZ: GRACIAS A USTEDES, NO LES QUITO MUCHO TIEMPO, LA MAYORÍA ME CONOCE ADOLFO GÓMEZ SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO, ESTAMOS ACÁ PUES ACOMPAÑÁNDOLOS JUAN DAVID CON EL EQUIPO DE VALLECAUCANA DE AGUAS QUE ESTÁ REALIZANDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA CEDALIA COMO USTEDES BIEN LO SABEN, VIENEN A REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES QUE SE HAN TENIDO AL RESPECTO, Y, BUENO, YA LES CONSULTAREMOS TAMBIÉN A ELLOS QUE LA IDEA ES, PUES, COMO USTEDES MEJOR LO SABEN QUE YO, QUE PODAMOS PASAR DE ESTA PARTE PREVIA, QUE ES MUY IMPORTANTE Y HAY QUE DECIRLO, PERO QUE FINALMENTE NO NOS VA A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE SEGUIMOS TENIENDO, ¿CIERTO? PUES YA LO QUE NOS QUEDA ACÁ ES EMPEZAR A PENSAR Y PARA ESO LES ROGAMOS EL FAVOR DE SACARNOS, PUES, DE ESE DESCONOCIMIENTO, CUÁL ES LA PROYECCIÓN QUE SE TIENE AL RESPECTO A LA POTENCIAL CONSTRUCCIÓN LLEVADA DE ESOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE ACUEDUCTO, QUE ESTA COMUNIDAD LLEVA ESPERÁNDOLO BASTANTES AÑOS. SIMPLEMENTE ESO. PERMISO. GRACIAS.

LA COORDINADORA ANDREA LONDOÑO TOMA LA PALABRA: YO SOY ANDREA LONDOÑO, SOY LA COORDINADORA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. MI EQUIPO DE TRABAJO ES EL INGENIERO ENRIQUE PEÑA Y EL TRABAJADOR OFICIAL VIVIAN VALERIA CORTEZ.

CONTINUA LA SEÑORA FRANCY VÉLEZ: MI NOMBRE ES FRANCI VÉLEZ, YO HAGO PARTE DE LA INTERVENTORÍA. NOSOTROS COMO INTERVENTORÍA LO QUE HACEMOS ES VIGILANCIA ACERCA DEL PROYECTO, QUE EL CONDUCTOR HAGA ADECUADAMENTE SU LABOR.

POSTERIORMENTE TOMA LA PALABRA LA ARQUITECTA CONSTANZA MORENO: MUY BUENAS TARDES MI NOMBRE ES CONSTANZA MORENO. SOY LA DIRECTORA DE INTERVENTORÍA, LE VAMOS A HACER LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

CONTINUA EL DOCTOR CRISTOBAL MORENO: MI NOMBRE ES CRISTOBAL MORENO ABOGADO, HAGO PARTE DEL COMPONENTE SOCIAL VALLECAUCANA DE AGUAS. GRACIAS POR ASISTIR.

CONTINUA EL SEÑOR EDISON PINTO: MUY BUENAS TARDES YO SOY EL ENCARGADO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUALES DE VALLECAUCANA DE AGUAS Y DE PARTE DE LA GOBERNACIÓN.

POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA SOCIALIZACIÓN, TOMA LA PALABRA LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO: COMO COMUNIDAD, VAMOS A EMPEZAR A DESGLOSAR EL PROYECTO PARA QUE TODOS TENGAMOS CLARIDAD SOBRE SU ORIGEN, ALCANCE Y ESTADO ACTUAL.

APROXIMADAMENTE EN EL AÑO 2016, EL ÁREA TÉCNICA DE VALLECAUCANA DE AGUAS, PERO DESDE EL ÁREA TÉCNICA COMO TAL, INICIÓ LOS ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA CEDALIA. EN ESA PRIMERA ETAPA SE ALCANZÓ A REALIZAR PARTE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y UN ESTUDIO RELACIONADO CON LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DENOMINADA LAS VIOLETAS. SIN EMBARGO, EL PROYECTO SE ENCONTRABA ENFOCADO ÚNICAMENTE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y LOS ESTUDIOS NO LOGRARON CULMINARSE EN SU TOTALIDAD.

POSTERIORMENTE, EL PROCESO SE INTERRUMPIÓ Y, LUEGO EN EL AÑO 2019 SE RETOMA NUEVAMENTE Y, FINALMENTE, EL ESTUDIO HIDROLÓGICO FUE ENTREGADO APROXIMADAMENTE EN EL AÑO 2020.

AL ANALIZAR EL AVANCE DEL PROYECTO Y LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO, SE DETERMINÓ AMPLIAR SU COBERTURA, INCLUYENDO LAS VEREDAS LA CEDALIA, LA ALBANIA Y PITAL, CON EL PROPÓSITO DE BENEFICIAR A UN MAYOR NÚMERO DE HABITANTES.

EN EL CASO DE LA CEDALIA, SE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UN ACUEDUCTO COMUNITARIO LEGALMENTE CONSTITUIDO, CON CAPACIDAD APROXIMADA PARA ATENDER A 55 USUARIOS. ACTUALMENTE CUENTA CON ALREDEDOR DE 35 SUSCRIPTORES CONECTADOS. NO OBSTANTE, DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE LA VEREDA Y A LAS DISTANCIAS ENTRE LAS VIVIENDAS, RESULTA COMPLEJO GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A TODA LA COMUNIDAD MEDIANTE ESTE SISTEMA.

POR SU PARTE, LA COMUNIDAD DE LA ALBANIA ALTA SE ABASTECE DE UNA CONEXIÓN PROVENIENTE DE LA FUENTE LAS AMÉRICAS. SIN EMBARGO, EL SUMINISTRO PRESENTA DEFICIENCIAS Y, DURANTE LAS TEMPORADAS DE VERANO, EL CAUDAL DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE, LO QUE IMPIDE ATENDER DE MANERA ADECUADA LA DEMANDA DE LOS APROXIMADAMENTE 29 SUSCRIPTORES QUE SE BENEFICIAN DE LA CONEXIÓN, QUEDANDO DESATENDIDOS EL RESTO DE LOS SECTORES DE LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA Y EL BOSQUE.

NO OBSTANTE, FRENTE A ESTA SITUACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DISPONE DEL PREDIO DONDE ESTÁ PREVISTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, UBICADO EN EL SECTOR DE LA CEDALIA, CERCANO AL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA EL NACIMIENTO DE AGUA QUE ABASTECERÁ EL PROYECTO. ¿CIERTO? ... PREGUNTA ELLA, DIRIGIÉNDOSE AL ARQUITECTO JUNA DAVID, EL CUAL RESPONDE DE FORMA AFIRMATIVA.

LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO CONTINUA: ENTONCES, ¿EL PROYECTO EN QUÉ CONSISTE? EL PROYECTO VA A CONSISTIR (AHORA EL INGENIERO ENRIQUE LES VA A EXPLICAR), PERO LA IDEA ES CONSTRUIR LA BOCATOMA, ESTAMOS IDEANDO LA FORMA DE QUÉ SISTEMA DE PLANTA DE POTABILIZACIÓN VAMOS A MANEJAR, ¿SÍ? Y TIRAR UNAS LÍNEAS QUE VAYAN HASTA LA ALBANIA Y DE ALLÍ TAMBIÉN TIRAR LAS QUE BAJARÍAN, QUE TOMARÍAN LA PARTE ALTA DE LA CEDALIA, BAJARÍA Y TOMARÍA LA PARTE DE EL PITAL Y TOMAR TAMBIÉN EL RESTO DE LA ALBANIA. LA IDEA

ES SUSPENDER LA ENTRADA DE LAS AMÉRICAS PARA QUE TODA EL AGUA QUE ENTRE A LA ZONA ENTRE AGUA POTABLE. ¿SÍ? ENTONCES, POR ESO EL PROYECTO SE LLAMA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL. LA CEDALIA, DONDE SE ESTÁ TENIENDO EN CUENTA EL CEDRAL, LA ALBANIA, LA ALBANIA BAJA, EL PITAL Y BUENOS AIRES. COMO NO SE TENÍA COMO MUY CLARO TODA LA PARTE QUE, POR EJEMPLO, DECIR EL CEDRAL O DECIR EL RÍO, NO ES QUE ESTÉ POR FUERA DE LA CEDALIA, ENTONCES ALLÍ POR ESO NO QUEDÓ EL RÍO, PERO LA IDEA ES QUE TAMBIÉN LA LÍNEA PASARÍA POR ESTA ZONA.

¿SÍ? BUENO... BIEN, CON ESTO ES UN PROYECTO QUE TRANSFORMAMOS VIDAS PORQUE DE LOS 147 SUSCRIPTORES QUE TENEMOS EN LAS TRES VEREDAS, APROXIMADAMENTE SÓLO 29 SUSCRIPTORES QUE CORRESPONDEN A LA ALBANIA ALTA ES LO QUE TENEMOS EN PROCESO CON AGUA, NO MÁS. O SEA, TODO LO QUE ESTUVIMOS INVESTIGANDO A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS Y TODO LO QUE SE HA REALIZADO CON USTEDES ES QUE NO TIENEN AGUA COMO LAS OTRAS ZONIFICACIONES Y LAS OTRAS VEREDAS.

ENTONCES, TENEMOS AQUÍ EL MUNICIPIO DE BENEFICIADO EL ÁGUILA, EL PROYECTO PUES TIENE UNA DURACIÓN DE 12 MESES, EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL 04 DE DICIEMBRE, TUVIMOS UNOS PROBLEMITAS PARA PODER INICIAR, YA USTEDES SABEN QUE TUVIMOS ALGUNAS DIFICULTADES, YA GRACIAS A DIOS PUES SABEN QUE TAMBIÉN LA TOPOGRAFÍA SE REALIZÓ. LA FUENTE DE FINANCIACIÓN ES VALLE CAUCANA DE AGUAS, POBLACIÓN BENEFICIADA TENEMOS APROXIMADAMENTE 735 HABITANTES APROXIMADAMENTE Y LOS METROS LINEALES A INTERVENIR SON 10.742, ES LO QUE SE TIRARÍA DESDE LA BOCATOMA HASTA DONDE TERMINE EL TRAZADO.

LOS DATOS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, EL CONTRATO ES 2013-04-005-2025, CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL G. VALLE, 2025, NOSOTROS ESTAMOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RORTANILLO, NIT. 902.009.437-8, SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA DOCTORA ROSALBA NATALY BUCHELY BUCHELY.

LOS DATOS DE LA INTERVENTORÍA, CONTRATO NÚMERO 2013-04-005-2025, EL CONTRATISTA MARTÍNEZ Y MANRIQUE, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, NIT. 900.596.808-6 Y SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL INGENIERO CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ.

EL ALCANCE DEL PROYECTO: VUELVO Y LES DIGO QUE USTEDES EMPEZARON APROXIMADAMENTE ENTRE 2016-2019-2020 APENAS UNOS ESTUDIOS Y UNA TOPOGRAFÍA QUE SE LEVANTÓ SOLAMENTE EN UNA DE LAS VEREDAS. ENTONCES, ESTE PROYECTO SOLAMENTE CORRESPONDE A LO QUE SON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, NO ES EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

SIN EMBARGO, YO CREO QUE ES MUY IMPORTANTE DECIR QUE ESTE PROYECTO ES PRIVILEGIADO Y ES UNO DE LOS MÁS SOLICITADOS POR LA MISMA GOBERNADORA. USTEDES HICIERON ESE PROCESO EN LOS CONVERSATORIOS VALLECAUCANOS, DONDE USTEDES SALIERON GANADORES DE ESE EJERCICIO Y COMO PRIORIDAD NOSOTROS TENEMOS ESE PROYECTO DE USTEDES EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO.

NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO EL ESTUDIO Y DISEÑO, ELLA HA ESTADO ENCIMA DEL PROYECTO, TAMBIÉN DICIÉNDONOS PARA CUÁNDO, PARA CUÁNDO LO TENDREMOS LISTO, PORQUE EL RECURSO DE ESTE PROYECTO YA ESTÁ PRÁCTICAMENTE QUE ASIGNADO. PERO LO

QUE QUIERO QUE LES QUEDE MUY CLARO ES QUE EN ESTE MOMENTO ESTAMOS EN LOS ESTUDIOS Y EL DISEÑO, NO ESTAMOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SÍ ES UNA DE LAS METAS TRAZADAS, TANTO POR LA GOBERNACIÓN COMO POR VALLECAUCANA DE AGUA, PERO EN ESTE MOMENTO ESTAMOS EN TODO EL PROCESO DE LO QUE SON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

POSTERIORMENTE TOMA LA PALABRA EL INGENIRO ENRIQUE: BIEN, LES VOY A HABLAR DE LA PARTE TÉCNICA, DE QUÉ PENSAMOS CONSTRUIR EN RELACIÓN A LAS TRES VEREDAS LA ALBANIA, LA CEDALIA Y EL PITAL. LA PROBLEMÁTICA ESTÁ EN EL ALBANIA EN ÉPOCA DE VERANO, PERO EN ÉPOCAS DE INVIERNO NO HAY NINGÚN PROBLEMA, PUEDE ABASTECER LAS 29 CASAS DONDE ESTÁ LLEGANDO. PERO EN EL MOMENTO EN QUE LLEGA EL MOMENTO DE SEQUÍA NO ALCANZA A CUBRIR LAS VIVIENDAS.

NECESITAMOS SOLUCIONAR ESO. HAY QUE SOLUCIONAR EL RESTO DE VEREDAS CON EL PITAL Y LA CEDALIA, LA PARTE DE AGUA POTABLE, AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO. AGUA TENEMOS BASTANTE, PERO TIENE UNAS ESPECIFICACIONES ESPECIALES PARA QUE SEA CONSUMO HUMANO.

¿CUÁL ES LA IDEA? LA IDEA ES BUSCAR EL DISEÑO DE UN ACUERDO QUE CUBRA LAS TRES VEREDAS Y QUE RECIBAN MÁS AGUA QUE SEA APTA PARA EL CONSUMO. ¿QUÉ SE PIENSA HACER? AL MIRAR LA QUEBRADA LAS AMÉRICAS NO ALCANZA LA CANTIDAD DE AGUA, NO ALCANZA A CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. ENTONCES SE BUSCA CONSTRUIR UNA NUEVA BOCATOMA EN LA QUEBRADA LAS VIOLETAS, CERCA DE ELLA SE VA A HACER UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA POTABILIZAR EL AGUA. A ESA QUEBRADA SE LE HACEN UNOS ESTUDIOS QUE YA SE REALIZARON, SE HACE UNA CARACTERIZACIÓN Y SE DETERMINAN QUÉ CUALIDADES QUE TIENE ESA AGUA. Y DEPENDIENDO DE ESO, NOSOTROS DISEÑAMOS UNA PLANTA PARA PURIFICAR EL AGUA, PORQUE ELLAS SIN TRATAMIENTO NO SON APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO Y QUE, CON LA PLANTA, ESA AGUA YA LA PODAMOS CONSUMIR.

LA IDEA ES QUE DESDE ESA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE VA A QUEDAR AQUÍ EN EL RÍO, COMO USTEDES SABEN DESDE UNA PARTE ALTA, SE VA A HACER UN ACUEDUCTO EN EL RÍO CERCA A ELLA, EN UN ÁREA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, SE VA A HACER LA PLANTA DE TRATAMIENTO. NECESITAMOS LLEVAR ESA AGUA HASTA LA ALBANIA. SE REALIZÓ UNA TOPOGRAFÍA EN LA PARTE DE LA CUESTA DE LA MONTAÑA Y SE EMPIEZA A LLEVAR DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA TUBERÍA HASTA EL TANQUE DE LA ALBANIA.

NECESITAMOS MIRAR SI ESE TANQUE, LA CAPACIDAD QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA DETERMINADA AGUA Y SI ES SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS TRES VEREDAS. DE NO SER ASÍ, TENDRÍAMOS QUE REALIZAR UN NUEVO TANQUE. YA TENIENDO UN AGUA CONSTANTE, PORQUE LA VIOLETA ES MUCHO MÁS REPRESENTATIVA DE ACÁ, SE HIZO UNA CARACTERIZACIÓN CON UN MUY BUEN CAUDAL, SE SUPONE QUE ESA PODRÍA SER SUFICIENTE PARA SUPLIR AGUA A LAS TRES VEREDAS.

PARA TAL FIN, SE VAN A REALIZAR UNAS ACTIVIDADES. LA PRIMERA DE ELLAS ES EN LA QUE ESTAMOS. EN MI CASO ES GENERAR UN DOCUMENTO QUE LLAMAMOS EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, DONDE VAMOS A DETERMINAR LO QUE YO LES ESTOY DICIENDO EN ESTE MOMENTO, YA PASARON POR SUS CASAS UNA PERSONA TRABAJADORA SOCIAL QUE HIZO UN

ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO, DONDE DETERMINÓ CIERTAS COSAS IMPORTANTES QUE VAN A INFLUIR SOBRE EL DISEÑO. AL IGUAL LA TOPOGRAFÍA YA SE REALIZÓ, ESTAMOS PENDIENTES DE UNA PARTE, YA HAY UNA PARTE, ESTAMOS PENDIENTES DE OTRA PARTE DE LA INFORMACIÓN Y TAMBIÉN SE REALIZÓ LA CARACTERIZACIÓN DE LA PARTE DE LAS VIOLETAS, DONDE NOS VAN A DECIR EL ANCHO, LA PROFUNDIDAD, EL CAUDAL QUE TIENE ESA QUEBRADA, PARA VER SI SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE AGUA QUE TENEMOS NOSOTROS PARA LAS TRES VEREDAS. ESTE ES EL PUNTO INICIAL DE LO QUE ES EL PRODUCTO 1, QUE ES EL DIAGNÓSTICO. EL ESTUDIO HIDROLÓGICO TAMBIÉN PERTENECE A ESTA ETAPA 1, COMO LES DIJE, EL ESTUDIO DONDE SE VA A MIRAR LA QUEBRADA Y SE VAN A TOMAR CIERTOS PARÁMETROS DE ESA QUEBRADA PARA DETERMINAR SI ES SUFICIENTE PARA QUE NOSOTROS TENGAMOS EL SERVICIO CONSTANTE 24 HORAS, NO A RATOS, SINO CONSTANTE, Y TANTO EL CAUDAL DE INVIERNO COMO CUANDO HAYA VERANO, QUE SEA CONSTANTE. ES IMPORTANTE INDEPENDIENTE DE SEQUÍA O CALOR, QUE SIEMPRE SEA CONSTANTE.

LA TOPOGRAFÍA ES LA QUE NOS INDICA LAS POSIBILIDADES DE POR DÓNDE PODEMOS LLEVAR ESA TUBERÍA HASTA EL PUNTO QUE NOSOTROS TENEMOS DESIGNADO.

PARA TAL FIN SE PUEDEN PRESENTAR DOS POSIBILIDADES, QUE SE VAN A PRESENTAR PARA LOGRAR ESO. EN ESE PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS, YO TENGO QUE MIRAR LAS POSIBILIDADES QUE HAY DENTRO DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO PARA LLEVAR ESA AGUA HASTA SUS CASAS.

LUEGO, TOMA LA PALABRA LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO: AQUÍ YO LES HAGO UN PARÉNTESIS. EL INGENIERO VA A DETERMINAR EL MEJOR TRAZADO PARA PODER ENTREGAR EL AGUA. TIENEN QUE TENER EN CUENTA DE QUE LA ORIENTACIÓN, LA ZONA DONDE QUEDARÍA LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES BIEN RETIRADO, ADEMÁS DE QUE PUES ESTAMOS MIRANDO HASTA LAS POSIBILIDADES Y TODAS LAS OPCIONES DE QUÉ PLANTA COLOCAR ALLÁ.

HEMOS HASTA PENSADO EN LA POSIBILIDAD DE UNA PLANTA COMPACTA Y HACERLA LLEGAR CON HELICÓPTERO, O SEA ¡ASÍ DE LOCO! PERO LO ESTAMOS MIRANDO TODAS LAS POSIBILIDADES. EL COSTO DE UNA CONSTRUCCIÓN DE ESA PLANTA, NADA MÁS DE LA PLANTA, TIENE UN COSTO BASTANTE ELEVADO.

TIRAR LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN TIENE OTRO COSTO. ENTRE VEREDAS Y VEREDA PUES ES MUCHO, Y ESTAMOS HABLANDO 10.742 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. ENTONCES, EL INGENIERO VA A BUSCAR LA FORMA QUE EL TIENE DE PLANTEARLE A VALLECAUCANA DE AGUAS OTRAS ALTERNATIVAS.

CUANDO YA SE ENTREGUE EL DIAGNÓSTICO QUE SEA EVALUADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y QUE YA TODO ESTE BIEN, LAS ALTERNATIVAS SE SOCIALIZAN CON LA COMUNIDAD, Y POR VOTACIÓN, SE TIENE QUE HACER LA CONVOCATORIA LO MÁS MASIVA PARA QUE ESA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA PODAMOS TENER MAYOR ASISTENCIA. PORQUE YA LA ALTERNATIVA QUE POR VOTACIÓN SE ESCOJA, ESA ES LA QUE VA A QUEDAR; ENTONCES, CON ESA ES CON LA QUE NOSOTROS YA SEGUIRÍAMOS EL SIGUIENTE DISEÑO Y CON LA CUAL SE VA ATRABAJAR.

ENTONCES, YA EN EL PASO NÚMERO 3, YA NOSOTROS ENTREGARÍAMOS, COMO LES EXPLIQUÉ, LO QUE ES EL DISEÑO YA DEFINITIVO CON TODAS SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LA IDEA DE ESTE PROYECTO ES ENTREGARLO OFICIALMENTE, ESTE AÑO PARA QUE EL RECURSO SE PUEDA ADICIONAR Y QUE EL PRÓXIMO AÑO SE PUEDA EMPEZAR CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.

ENTONCES, POR ESO NECESITAMOS PUES EL APOYO DE USTEDES; EN EL MOMENTO YA USTEDES ESTÁN VIENDO QUE ESTO ES ALGO REAL. NO SÉ CUÁNTOS DE USTEDES ENCONTRARON CON EL TOPOGRÁFO Y CON SU GRUPO DE TRABAJO. ¿ALGUNO DE USTEDES ENCONTRÓ CON ÉL? SÍ. ENTONCES, ESTÁN VIENDO QUE ESTO ES UNA REALIDAD. EL TOPÓGRAFO ENTREGA DOS TOPOGRAFÍAS, UNA DE CAMPO Y OTRA DE DIBUJO. YA CON LA TOPOGRAFÍA Y EL INFORME DE DIAGNÓSTICO PASARÍAMOS A LA FASE II; YA PASARÍAMOS, YA EMPEZARÍA EL PROCESO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS, Y AQUÍ SÍ NECESITAMOS QUE LA MAYORÍA DE LA COMUNIDAD ESTE PRESENTE, PARA QUE LUEGO NO NOS VENGAN A DECIR, A MÍ NO ME DIJERON, YO NO ESCOGÍ LA ALTERNATIVA, YO NO ME ENTERÉ DE ESO. POR ESO ES IMPORTANTE SU PRESENCIA EN ESTA SOCIALIZACIÓN.

BUENO, YA AQUÍ, YA SI USTEDES TIENEN PREGUNTAS, INQUIETUDES, YA EN ESE MOMENTO YA LAS RESOLVEMOS.

POSTERIORMENTE TOMA LA PALABRA EL DOCTOR ADOLFO GOMEZ: ESTE ES EL MOMENTO. TODAS LAS DUDAS, PREGUNTAS, INQUIETUDES, TODO LO QUE TENGA ENTRE EL PECHO Y DE ESPALDA. BIEN PUEDA SEÑORAS Y SEÑORES. ES AQUÍ, NO ES EN OTRO ESPACIO. NO DESPUÉS POR ALLÁ ECHANDO CHISME QUE LO HUBIÉRAMOS HECHO ASÍ Y NO ASÁ, NO ACÁ., COMO SE NOS HA DICHO EL INGENIERO Y TODO EL EQUIPO QUE ESTÁ ACÁ. QUE ES UN EQUIPO BASTANTE NUTRIDO. GOBERNACIÓN, VALLECAUCANA, INTERVENTORÍA Y EL EJECUTOR. EN ESTE CASO ES UNIÓN TEMPORAL, PUES SON ELLOS LOS RESPONSABLES DE QUE ESTO LLEGUE A SER EXITOSO, Y SON USTEDES COMO COMUNIDAD LOS BENEFICIARIOS. ENTONCES, BIEN PUEDAN.

EL CIUDADANO FRANCISCO BERMUDEZ HACE UNA PREGUNTA: EN ESTE MOMENTO TIENEN YA IDENTIFICADAS PUES DIGAMOS LO DE LO QUE SON LAS ZONAS, LA CEDALIA ALTA, CEDRAL, SECTOR EL RÍO, ALBANIA, ALBANIA BAJA, EL BOSQUE, LLANO GRANDE, LA PARTE BAJA PUES DE LA ALBANIA Y LO QUE ES PITAL Y BUENOS AIRES.

IDENTIFICADAS LAS VIVIENDAS A LAS CUALES HAY QUE LLEGARLES PUES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. O SEA, USTEDES YA LO TIENEN CLARO ESA INFORMACIÓN.

EL INGENIERO ENRIQUE PEÑA TOMA LA PALABRA: ESO NOSOTROS LO RECIBIMOS EN EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO NOS HABLA, PUES LÓGICAMENTE LO HE CONTRATADO POR LAS TRES VEREDAS, Y NOS HABLA DE 147 VIVIENDAS. NOS HABLA IGUAL DE QUE HAY 107 A LAS QUE SE LES PUDO HACER LA VISITA, O SEA QUE SE LES HIZO LA ENCUESTA, DEL RESTO DE LAS 147 O ESTÁN DESOCUPADAS, O EN EL MOMENTO NO SE ENCONTRABAN LAS PERSONAS, O ESTÁN ABANDONADAS, ESTÁN SOLAS.

SIN EMBARGO, ESAS CASAS SE VAN A TENER DE CUENTA DENTRO DEL DISEÑO. ¿POR QUÉ? PORQUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN LLEGAR A SER OCUPADAS, QUE OJALÁ EN NUESTRO PAÍS SE PRESENTE LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS QUE VAYAN A VIVIR AL CAMPO. YO YA HE ESTADO AQUÍ EN EL ÁGUILA, ENTONCES SÉ QUE LA MIGRACIÓN DEL CAMPO HACIA OTROS SECTORES ES GRANDE REPRESENTATIVO, QUE INCLUSIVE A VECES FALTABAN ALUMNOS A LAS

ESCUELAS.

ENTONCES, PENSANDO EN QUE SEA, AL CONTRARIO, QUE COMENCEMOS A CULTIVAR NUESTRAS TIERRAS, ENTONCES SE TIENEN EN CUENTA LAS 147 VIVIENDAS.

LA INGENIERA ANDRE LONDOÑO, TOMA NUEVAMENTE LA PALABRA: A VER, AQUÍ VAMOS A HACER UNA ACLARACIÓN. LA LÍNEA, EL CAUDAL SE VA A TENER EN CUENTA LAS 147 VIVIENDAS, PERO LA LÍNEA COMO TAL DE DISTRIBUCIÓN, LA LÍNEA PRINCIPAL SE VA A TIRAR ES SOBRE LA VÍA.

ENTONCES, LAS VIVIENDAS QUE ESTÉN MÁS CERCANAS A LA VÍA SE VAN A PODER CONECTAR CON MAYOR FACILIDAD. LAS PERSONAS QUE ESTÉN MUY RETIRADAS, LUEGO ELLAS TENDRÁN QUE HACER LA GESTIÓN PARA QUE ELLAS PUEDAN TIRAR SU LÍNEA Y SE PUEDAN CONECTAR A LA LÍNEA PRINCIPAL. ¿POR QUÉ? PORQUE ES QUE CUANDO SE VA A SELECCIONAR UN PROYECTO ... COMUNIDAD VS EL COSTO DE LO QUE REPRESENTA, POR EJEMPLO, VOY A DECIR UN EJEMPLO QUE SERÍA REALMENTE PUES COMO TONTO, PERO PARA QUE COMPRENDAMOS.

SI YO VOY A HACER UN PROYECTO PARA UNA COMUNIDAD DE 588 PERSONAS, EN DONDE EL PROYECTO ME VALGA 15 MIL MILLONES DE PESOS, PUES YO MÁS BIEN MIRO CÓMO REUBICO TODA ESA GENTE Y LA ACOMODO Y ME VA A VALER MENOS. ¿SÍ ME VA A ENTENDER? ENTONCES, ¿QUÉ ES LO QUE SE ESTÁ PLANTEANDO? LA BOCA TOMA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO, LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN POR TODA LA ZONA DONDE MÁS SE PUEDA HACER LA CONEXIÓN. POR ESO ES IMPORTANTÍSIMO EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.

POR DONDE SE VAYA A TIRAR LA LÍNEA PRINCIPAL Y CUÁNTAS PERSONAS QUEDARÍAN CONECTADAS DIRECTAMENTE ALLÍ Y CUÁNTOS LUEGO SE TENDRÍAN QUE CONECTAR. OBIAMENTE, PUES YA LAS VIVIENDAS QUE ESTÉN DESOCUPADAS O COMO SEA, PUES YA ELLAS NO VAN A ESTAR, PUES, ¿CIERTO? NO VAN A SER UNA PRIORIDAD. ¿POR QUÉ? PORQUE EL COSTO DE ESTE PROYECTO, NADA MÁS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA, ES BASTANTE, BASTANTE ELEVADO.

NADA MÁS POR LA UBICACIÓN DE LA PLANTA. ENTONCES, SIN EMBARGO, EL CAUDAL SE VA A MANEJAR, TANTO PARA LA POBLACIÓN QUE HAY, INCLUIDAS LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS, COMO PARA LA POBLACIÓN FLOTANTE. ¿QUÉ ES LA POBLACIÓN FLOTANTE? CUANDO, POR EJEMPLO, A MI CASA ME LLEGA VISITA, ¿CIERTO? ESA ES LA POBLACIÓN FLOTANTE. O LLEGAN TRABAJADORES TEMPORALES, PUES PORQUE TODO ESTO ES UNA ZONA CAFETERA Y ES DONDE PUEDO RECIBIR TRABAJADORES, VISITAS. ESA ES LA POBLACIÓN FLOTANTE.

ENTONCES, EL CAUDAL SE VA A TENER EN CUENTA Y SE CALCULÓ PARA TODA LA POBLACIÓN. PERO NO TODAS VAN A QUEDAR, CUANDO SE HAGA AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COMO TAL, NO TODAS SE VAN A CONECTAR POR LAS DISTANCIAS, PORQUE SI NO, EL PROYECTO ECONÓMICAMENTE NO SERÍA VIABLE Y, PUES, NO PODRÍA PASAR.

EL CIUDADANO JHON FREDY PEREZ, ALZA LA MANO Y DICE: PORDÓN UNA PREGUNTA, ¿LA TOPOGRAFÍA DE ARRIBA SE PIERDE?

PARA LO CUAL LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO RESPONDE: NO, DON JOHN, LA TOPOGRAFÍA DE ARRIBA SE TUVO EN CUENTA. ¿POR QUÉ? ... PORQUE VIENE LA BOCATOMA, LA PLANTA Y SE

CONECTARÍA TODA LA GENTE DE LA PARTE DE ARRIBA.
NUEVAMENTE EL CIUDADANO DON JHON INTERVIENE: NO, NO, NO.

PARA LO CUAL LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO PREGUNTA: ¿O QUÉ ES?

DON JHON FREDY PEREZ CONTINUA: LA TOPOGRAFÍA SE EMPEZÓ DESDE LAS VIOLETAS A LA ALBANIA, POR LA PARTE ALTA.

LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO INTERVIENE: POR ESO, ESA SE TOMA PORQUE ES PARA LLENAR DEL TANQUE DE LA ALBANIA. ES PARA COGER EL TANQUE DE LA ALBANIA. NO, POR ESO SE VAN A SACAR DOS, SE VA A SACAR EL TRAZADO QUE IRÍA POR DONDE USTED ESTÁ DICIENDO, POR ENCIMA, PARA COGER LA ALBANIA Y QUE BAJE EL AGUA HACIA LA PARTE MÁS BAJA Y SE COGERÍA LA DE LA CEDALIA SACAR SOBRE DE LA VÍA, HASTA COGER LO QUE SE PUEDA.

LUEGO INTERVIENE EL INGENIERO ENRIQUE PEÑA: A VER, LO QUE SUCEDE ES QUE ESO ESTÁ DEPENDIENDO DE LAS ALTERNATIVAS QUE SE PRESENTEN. LA INGENIERA HABLA DE LA POSIBILIDAD QUE, PARA MÍ TAMBIÉN, MÁS CLARA POSIBLEMENTE ES LA VÍA. POSIBLEMENTE, ¿SÍ? PORQUE YO TENGO UNA DE MIS RESPONSABILIDADES, ES BUSCAR QUE LA LÍNEA PRINCIPAL ACOJA A LA MAYOR PARTE DE USUARIOS POSIBLES, ¿SÍ? LLEVARLA POR DONDE PASE MÁS CERCA A TU CASA, LLAMÉMOSLO DE ESA FORMA, ¿SÍ? CON LIMITANTES, PORQUE SI HAY ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE NO LO PERMITE, PUES TENGO QUE DESVIARME.

EL MOMENTO, COMO LES DECÍA, AHORA EL IMPORTANTE VA A SER CUANDO VAYAMOS A ELEGIR CUÁL ES LA ALTERNATIVA MÁS FÁCIL PARA TODOS, ¿SÍ? Y NO SÓLO FÁCIL, SINO QUE SEA TÉCNICAMENTE MÁS VIABLE Y QUE TENGA UNA COBERTURA MAYOR, ¿SÍ? PERO, EN ALGUNAS REUNIONES TÉCNICAS QUE HEMOS TENIDO, HEMOS VISTO QUE, TANTO POR COSTOS Y POR OTRAS SITUACIONES, POSIBLEMENTE LA MÁS VIABLE SEA LA DE LA VÍA. POSIBLEMENTE. PERO, ¿QUIÉN QUITA QUE YO ENCUENTRE ALGO DIFERENTE Y LA MANDEMOS POR OTRO SITIO? PERO, POR AHORA ES ASA.

LUEGO INTERVIENE EL ARQUITECTO JUAN DAVID: BUENO, PUES YO LES AGRADEZCO POR ESTAR ACÁ, POR EL PROYECTO, POR TODO LO QUE SE HA REALIZADO. PERO DIGAMOS QUE HAY UNA INQUIETUD MUY GENERAL, QUE ES DE TODA LA COMUNIDAD, DE LOS QUE ESTAMOS ACÁ.

DESPUÉS DE QUE TENGAMOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, QUE DEBEN DE CULMINAR MÁS O MENOS EN DICIEMBRE, ¿CUÁNDO APROXIMADAMENTE SE PODRÍA DAR VIABILIDAD PARA QUE ESE PROYECTO SE PUEDA CONSTRUIR? PORQUE SABEMOS QUE ES UN RECURSO IMPORTANTE QUE SE DÉ INVERTIDA ALLÍ. Y QUE, DIGAMOS QUE ESTA COMUNIDAD HA ESTADO ESPERANDO POR UN PERIODO PRUDENTE, ¿CIERTO? QUE SE PUEDA INVERTIR ESE RECURSO PRECISAMENTE ACÁ. Y NO QUE EN UNOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SIMPLEMENTE SE CUMPLE CON LA NORMATIVA TÉCNICA, ¿CIERTO? QUE ES LO QUE DEBEMOS CUMPLIR.

PERO QUE NO DEMOS VIABILIDAD COMO TAL AL SENTIDO DE LO QUE TIENE QUE VER, PUES, ES DESARROLLAR O PODER FACILITAR ESA SOLUCIÓN QUE TENEMOS EN ESA COMUNIDAD. ENTONCES, COMO LA PRINCIPAL.

POSTERIORMENTE INTERVIENE EL DOCTOR CRISTOBAL MORENO: NUESTRO TRABAJO SOLO VA HASTA DISEÑOS. NOSOTROS DEJAMOS DICHO QUE ES LO QUE TOCA HACER,

AHÍ SÍ PASA DE ELLOS QUE HACEN LA GESTIÓN ANTE GOBERNACIÓN PARA QUE SE PUEDA HACER ELLOS CUENTAN COMO ES. POR ESO ES VITAL PRIMERO AGRADECERLES LA PRESENCIA Y LA ASISTENCIA. PARA SER LA PRIMERA REUNIÓN ES BUENA, ES UN ÉXITO, ¿POR QUÉ? PORQUE HOY EN DÍA LA GENTE DUDA MUCHO DEL GOBIERNO, QUE GENERALMENTE LAS OBRAS SE DEMORAN MUCHO O NO LAS LLEVAN A CABO.

ENTONCES POR ESA RAZÓN LA GENTE CASI NO ASISTE. EL HECHO DE QUE ESTÉN USTEDES AQUÍ ME PARECE QUE ES FUNDAMENTAL, MOTIVA Y ESTÁN DEMOSTRANDO QUE TIENEN INTERÉS POR ESTA OBRA QUE SE VA A LLEVAR A CABO. EN CUANTO A LA PREGUNTA EN CONCRETO, POR ESO ES FUNDAMENTAL REALIZAR LO MÁS PRONTO POSIBLE LOS ESTUDIOS, LOS DISEÑOS QUE ESTAMOS HACIENDO AHORA Y QUE TENGAN LAS ALTERNATIVAS CLARAS, PARA QUE, EN UN MOMENTO DETERMINADO, CUANDO ESTÉN CLARAS, SE DEFINAN POR CUÁL DE ELLAS.

ENTONCES EL PROPÓSITO ES QUE, DE AQUÍ A DICIEMBRE, DESPUÉS SE HAYA TERMINADO EL ESTUDIO Y DISEÑO, PARA ENERO, FEBRERO, MARZO, MÁS O MENOS, SE EMPIECE LA OBRA EN CONCRETO.

LUEGO INTERVIENE LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO: NO QUEREMOS SER IMPRUDENTES EN LAS FECHAS, PERO ESA ES LA META, ENTRE FEBRERO Y MARZO EMPEZAR.

INTERVIENE EL DOCTOR CRISTOBAL MORENO: ENTONCES LO MÁS PRONTO POSIBLE LO QUE ESTAMOS HACIENDO, QUE HAYA CLARIDAD EN EL TEMA PARA QUE LO AVANCEMOS.

LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO PREGUNTA: ¿ALGUNA OTRA INQUIETUD? ...

INTERVIENE EL CIUDADANO RODRIGO PEREZ: ¿EL COSTO DE LA CONEXIÓN DESDE LA PRINCIPAL ES GRATIS HASTA LAS CASAS O HAY QUE PAGAR ALGUNA ADICIONAL? Y ¿LLEVA MEDIDOR?

INTERVIENE LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO: POR EJEMPLO, DIGAMOS, PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE QUE HAY QUE PRESENTAR UNAS ALTERNATIVAS, Y ESTARÍA HABLANDO YO DE FORMA IMPRUDENTE. DIGAMOS QUE VA A IR SOBRE LA VÍA. ENTONCES, LAS PERSONAS QUE QUEDEN CONECTADAS DIRECTAMENTE, QUE ESTÉN MÁS CERCANAS A LA VÍA, O SEA, ESO SE VA A TENER EN CUENTA EL METRAJE POR EL COSTO, ENTONCES DIGAMOS, QUE SE VA A TENER EN CUENTA HASTA 300 METROS, POR EJEMPLO.

DIGAMOS, ENTONCES, A ESAS VIVIENDAS, DESDE LA TUBERÍA MADRE HASTA EL METRAJE QUE SE ESCOJA, SEGÚN EL PRESUPUESTO, VA A SER GRATIS. PUES USTEDES TIENEN QUE TENER SU JUNTA DE ACUEDUCTO, ESA ES OTRA COSA QUE TAMBIÉN SE TIENE QUE ORGANIZAR. HAY QUE MIRAR QUIÉNES VAN A SER LOS OPERADORES DEL SISTEMA. ENTONCES, HASTA ESE PUNTO, ES POR EJEMPLO GRATIS. LAS CASAS, YA LAS CASAS QUE NO QUEDEN CONECTADAS, SE VA A CORRER LO QUE ES LA CONEXIÓN POR CUENTA DEL SUSCRIPTOR.

DEBE DE IR CON MEDIDOR, PORQUE USTEDES DEBEN DE FORMAR SU JUNTA, ESO DEBE QUEDAR LEGALMENTE CONSTITUIDO. Y YA SABEN QUE AL TENER UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, UNA PLANTA QUE INVOLUCRA UN FONTANERO, VAN A TENER QUE REALIZAR UNOS COBROS, ENTONCES TIENEN QUE TENER UN CONTADOR, VAN A TENER UNOS QUÍMICOS, ENTONCES VAN A TENER QUE HACERLE UNOS TRATAMIENTOS AL AGUA, ENTONCES POR ESO LA JUNTA DEBE

QUEDAR LEGALMENTE CONSTITUIDA, CON PERSONAL QUE SEA DE EMPUJE PARA IR A HACER SUS RESPECTIVOS PROCESOS EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EJERCICIO COMO TAL. Y YA VAN A SABER QUE USTEDES VAN A TENER UN COBRO, QUE ES EL COBRO DEL MANTENIMIENTO DEL MISMO SISTEMA QUE FINALMENTE ES DE USTEDES. ¿BIEN?

INTERVIENE EL DOCTOR ADOLFO GOMEZ: BUENO, Y DE PRONTO LE COMPLEMENTO UN POQUITO MÁS, PARA QUE LA GENTE NO SE ME ASUSTE. USTED SABE QUE CUANDO A NOSOTROS LOS CAMPESINOS NOS HABLAN DE UN CONTADOR, NO NOS EMPIEZAN A CUADRAR LA COSA, SI O NO, PORQUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A NO PAGAR O A PAGAR MUY POQUITO, ESA ES LA REALIDAD, ¿CIERTO? MIREN, ESTOS MEDIDORES NO TIENEN DE PRONTO EL PROPÓSITO PRECISAMENTE DE QUE USTEDES PAGUEN UNAS CIFRAS ESCANDALOSAS POR EL SUMINISTRO DEL AGUA, DE NINGUNA MANERA. PROYECTOS COMO ESTE YA LO HEMOS TENIDO EN EL ÁGUILA, POR EJEMPLO, LA EXPERIENCIA DE LA VEREDA SANTA ELENA, QUE ES ALGO MUY PARECIDO A ESTO.

SANTA ELENA TIENE SUS MEDIDORES, Y ESA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA QUÉ HA DECIDIDO QUE MÁS ALLÁ DEL CONSUMO, TIENE IGUAL UN SOLO CARGO FIJO. ESO HAN DECIDIDO, ¿CUÁL ES EL OBJETO DE LOS MEDIDORES? LO DECÍA HOY LA INGENIERA. MIRAR QUE HAGAMOS UN USO RESPONSABLE ... ¿DE QUIÉN? DEL AGUA TRATADA, PORQUE NO PUEDE SER POSIBLE Y USTEDES ME VAN A DISCULPAR. YO SOY COMPAÑERO CON USTEDES, YO TAMBIÉN SOY DE FINCA, Y TENGO FINCA DE HECHO TODAVÍA, PERO USTEDES NO VAN A PODER USAR EL AGUA TRATADA PARA IR A DESPULPAR EL CAFÉ. PARA IR DESPULPAR EL CAFÉ, USTEDES TIENEN QUE SEGUIR USANDO, ¿CUÁL? LA DE NACIMIENTO. PORQUE IMAGÍNENSE DÓNDE SERÍA EL MANTENIMIENTO DE LA CLORACIÓN.

POR EJEMPLO, QUE FUERA EL ESCASO DE CLORAR, MIREN ¿QUÉ SENTIDO TIENE CLORAR UN AGUA PARA IR A ECHÁRSELA AL BENEFICIO DEL CAFÉ, O PARA LAVAR LOS CERROS? ENTONCES, ES ESO, ESOS MEDIDORES TIENEN LA FINALIDAD DE QUE COMO COMUNIDAD LE DEMOS UN USO RACIONAL AL AGUA QUE ES TRATADA; Y HACE PARTE DE ESA CULTURA QUE SEPAMOS DISTINGUIR, QUE EL AGUA TRATADA, LA DEL ACUEDUCTO QUE ES LA QUE NECESITAMOS PARA EL CONSUMO HUMANO, PARA LOS ALIMENTOS, PARA LAS BEBIDAS, PARA LA DUCHA TAMBIÉN, NO HAY LÍO, OBIVIAMENTE. PERO YA TODO LO QUE ES EL USO AGRÍCOLA O AGROPECUARIO, SEGUIMOS CON NUESTROS NACIMIENTOS TRADICIONALES Y LISTO, NO SE ESTRESEN POR ESO, LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA NO TIENE TAMPOCO MAYOR MISTERIO. YA LO DECÍA EL DOCTOR, DESDE VALLECAUCANA DE AGUAS NOS AYUDAN CON TODO EL TEMA DEL PAPELEO, LA ASESORÍA, LA ORIENTACIÓN. Y, EN RESUMIDAS CUENTAS, VA A SEGUIR FUNCIONANDO COMO CUALQUIER OTRO ACUEDUCTO VEREDAL.

USTEDES PONEN LA CUOTA, ESO VA A DEPENDER DE LA CANTIDAD DE USUARIOS, VA A DEPENDER DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO QUE USTEDES NECESITEN. EL FONTANERO NO TIENE QUE ESTAR EL TIEMPO COMPLETO. SI USTEDES CONSIDERAN QUE ES SUFICIENTE UN DÍA A LA SEMANA, ESTÁ BIEN. DOS DÍAS AL MES, ESTÁ BIEN. PRECISAMENTE TODOS USTEDES MISMOS VAN A SER LA JUNTA ADMINISTRADORA. Y DE USTEDES VA A DEPENDER QUE FUNCIONE BIEN O MAL. ESO ES TODO.

PREGUNTA LA TRABAJADORA SOCIAL FRANCI VÉLEZ: DISCULPE, ¿OTRA PREGUNTITA CON RESPECTO AL ÁREA TÉCNICA? ¿OTRA DUDA? ¿NO? NO. BUENO, LISTO. GRACIAS.

INTERVIENE EL DOCTOR CRISTOBAL MORENO: BUENO, ENTONCES SEGUIMOS CON NUESTRA ETAPA, HACE FUNDAMENTAL COMO LES DECÍA EN ESTA REUNIÓN PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE QUÉ SE ESTÁ LLEVANDO A CABO, QUÉ SE VA A HACER, EL PRECIO. EL COSTO, GENERALMENTE EL COSTO ES MUY BARATO, LO IMPORTANTE ES EL BUEN USO QUE SE DÉ A ESA AGUA Y DEL APROVECHAMIENTO.

DECÍA LA INGENIERA TAMBIÉN Y EL INGENIERO ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN ESTAS VEREDAS, UN PROYECTO CON EN EL SENTIDO DE TRAER LO QUE ES EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL ACUEDUCTO, POR QUÉ ¿CUÁNTAS PERSONAS, O CUÁNTOS CORREGIMIENTOS, ¿O CUÁNTAS VEREDAS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE TENER AGUA POTABLE? ... MUY POQUITAS, ENTONCES PARA USTEDES ES UN PRIVILEGIO QUE TODOS ESTEMOS ACÁ CON EL PROPÓSITO, NO DE GENERAR EXPECTATIVAS, ES UNA REALIDAD PARA QUE TENGAN SU AGUA TRATADA SU ACUEDUCTO, SU ALCANTARILLADO ETC; EL COMPAÑERO PINTO Y YO SOMOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS, ¿SABEN QUÉ ES VALLECAUCANA DE AGUAS? ... PARECE QUE NO, VALLECAUCANA DE AGUAS ES UNA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ORDEN DEPARTAMENTAL, CUANDO EL COMPAÑERO PINTO SE PRESENTÓ TUVO SUERTE EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE, ESTA ENTIDAD COMPRENDE AL DEPARTAMENTO DEL VALLE, SE ENCARGA DE IMPLEMENTAR, DE ESTRUCTURAR Y DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CUANDO ALGUIEN DIJO, QUE DE PARTE DE LA GOBERNACIÓN, NO HABLABA DE POLÍTICA, ES LA REALIDAD QUE LA GOBERNADORA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN QUE HACE LA ALCALDÍA DE LOS MUNICIPIOS PARA SUS VEREDAS, SE DEPOSITE LA PLATA, ¿A TRAVÉS DE QUIÉN? DE VALLECAUCANA DE AGUAS. VALLECAUCANA DE AGUAS EJECUTA LA PLATA, ES DECIR, EMPIEZA A TOCAR PUERTAS DÓNDE, EN EL DEPARTAMENTO, EN LA NACIÓN ESE RECURSO Y PODER TRAERLO PARA QUE USTED TENGA SU ACCESO AL AGUA; Y TAMBIÉN, VALLECAUCANA CONSIGUE LOS SUBCONTRATISTAS PARA EJECUTAR EL CONTRATO Y ESA PLATA SEA EL UTILIZADA; POR EJEMPLO QUE VALGA MIL MILLONES DE PESOS, ENTONCES QUÉ NECESITA VALLECAUCANA, QUE ESA OBRA SE EJECUTE, QUE ESA OBRA NO SE QUEDE SOBRE EL PAPEL, QUE SEA UNA REALIDAD, QUE SE LLEVE A CABO BIEN COMO POCAS VECES EL CONTRATISTA PONE LA OBRA Y AL FINAL NO HACEN NADA O QUEDA EN EL CAMINO. ESTO ES MUY SERIO.

¿ENTONCES QUÉ PASA? VALLECAUCANA DE AGUAS EN ESE SENTIDO ES MUY CELOSA. CONSEGUIMOS EL AGUA, VAMOS A EJECUTAR EL CONTRATO, PERO VAMOS A ESTAR PENDIENTES QUE EL CONTRATO SE LLEVE A CABO. Y PARA ESE PROPÓSITO QUÉ ES LO QUE REQUERIMOS: PRIMERO, VALLECAUCANA DE AGUAS VA ATENER SUS CONSULTORES, ¿VA A TENER SU PROPIO EQUIPO, PERO HAY OTRO ELEMENTO FUNDAMENTAL QUE SON QUIÉNES?, USTEDES.

NOSOTROS, COMO VALLECAUCANA DE AGUAS, EMPEZAMOS A HACER EL CONTRATO. EMPEZAMOS PRIMERO CON EL CONTRATISTA A MIRAR EL CONTRATO Y NOSOTROS, COMO VALLECAUCANA DE AGUAS, VAMOS A HACER EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR EL CONTRATO CON LA INTEFVENTORÍA. PERO RESULTA QUE TODOS LOS DÍAS NO VAMOS A ESTAR ACÁ, PORQUE ES IMPOSIBLE, PORQUE TENEMOS OTROS COMPROMISOS EN OTROS LUGARES, EN OTROS CORREGIMIENTOS.

ENTONCES, OBLIGATORIAMENTE, CUANDO NO ESTEMOS ACÁ, NOS CONFIAREMOS DE LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD, ENTONCES LES DECÍA QUE NECESITAMOS OBLIGATORIAMENTE COMPROMISOS Y RESPONSABILIDAD DE LA MISMA COMUNIDAD PARA QUE ESTÉN PENDIENTES DE LA OBRA.

LA LEY 850 TRAE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA TODOS NOSOTROS, PARA QUE ESTEMOS PENDIENTES DE LA OBRA. SE LLAMA LA VEEDURÍA CIUDADANA. ESAS VEEDURIAS CIUDADANAS SON LAS HERRAMIENTAS QUE DA EL GOBIERNO PARA QUE ESTEMOS PENDIENTES DE LAS OBRAS CON UN TRABAJO CON LA COMUNIDAD.

NO ES QUE EL CONTRATISTA SEA MALO, NO, A VECES SE VAN A LLEGA EL MOMENTO DONDE NO SE VA A ESTAR PENDIENTES DE LO QUE SE ESTÁ HACIENDO TODO COMETEMOS ERRORES ... ¿PARA QUÉ? PARA QUE LA OBRA CUMPLA, PERO PARA ESO REQUERIMOS OBLIGATORIAMENTE UNOS AMIGOS QUE HAGAN PARTE DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DE ESTE SECTOR PARA QUE SI SE PUEDE Y SI NO 4, 5, 6, O PERSONAS QUE HAGAN PARTE DE ESA VEEDURÍA PARA QUE ESTEMOS PENDIENTES DE LA OBRA Y NO ES NECESARIO QUE ESTÉN TODOS LOS DÍAS, ENTONCES POR ESA RAZÓN ES FUNDAMENTAL QUEDE EN MANOS DE LA VEEDURÍA, NOSOTROS HACEMOS UN ACTA Y ACORDAMOS 4, 5, 6 PERSONAS PARA LA VEEDURÍA Y DE AHÍ PUEDE ESTAR EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, PORQUE, PORQUE ESA ACTA HAY QUE LLEVARLA A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL ÁGUILA, VAMOS ALLÁ Y LA PERSONERÍA LE DA VIABILIDAD Y LE DA LEGALIDAD, PARA QUE ESO NO SEA UNA COSA DE PAPEL PORQUE ES ALGO LEGAL Y SALE LA RESOLUCIÓN; SIMPLEMENTE NECESITAMOS QUE UNOS VOLUNTARIOS HAGAN PARTE DE LA VEEDURÍA Y YA NOS PONEMOS DE ACUERDO PARA IR A LA UNA PERSONERÍA PARA QUE SEA LEGAL. PERO, DE VERDAD QUE NECESITAMOS EL APOYO DE LA COMUNIDAD.

INTERVIENE LA TRABAJADORA SOCIAL FRANCY VÉLEZ: YO SÍ QUERÍA HACERLES, LAS PERSONAS QUE VAN A SER PARTE DE LA VEEDURÍA, POR FAVOR NOS PRESTAN LA CÉDULA. ESA VEEDURÍA, PARA CONFORMAR LA VEEDURÍA, COMO LO DICE ACÁ EL INGENIERO ES DE 5 A 6 PERSONAS, LA IDEA TAMBIÉN ES QUE ESA VEEDURÍA DEBE TENER UN REPRESENTANTE LEGAL, ALGUIEN QUE VA A SER COMO LA CABEZA, Y UNA SECRETARIA. ¿PARA QUÉ SE DEBEN ESAS DOS PERSONAS? PUES EN CASO DE REUNIONES, QUE SE HAGA UNA REUNIÓN, SE PUEDA LEVANTAR UN ACTA, Y ESA SECRETARIA O ESE SECRETARIO PUEDA HACER UNA. ENTONCES, ESO ES IMPORTANTE. ENTONCES, QUISIÉRAMOS SABER QUIÉNES ESTÁN INTERESADOS, Y ACÁ TENEMOS EL ACTA, Y EL ACTA PARA LA CONFORMACIÓN. PARA ESA CONFORMACIÓN DE ESA VEEDURÍA QUEDE INSCRITA ANTE PERSONERÍA MUNICIPAL QUE LA SECRETARIA O EL SECRETARIO UNA VEZ NOSOTROS VERIFIQUEMOS ESTOS DOS DOCUMENTOS, EL SECRETARIO O EL REPRESENTANTE VA Y PRESENTA ESE DOCUMENTO EN SU CONSUVIVIR, PARA QUE QUEDE LEGALMENTE CONSTITUIDO.

PREGUNTA EL DOCTOR CRISTOBAL MORENO: ¿CÓMO LES PARECIÓ LA FIGURA, ¿QUÉ TAL LES PARECE EL TEMA DE LA VEEDURÍA? ENTONCES, EXCELENTE, HUBO CLARIDAD, NECESITAMOS APOYO ¿QUIÉNES DE USTEDES QUIEREN HACER PARTE DE LA VEEDURÍA?

INTERVEINE EL CIUDADANO FRANCISCO BERMUDEZ: YO PROPONGO ALGO, EN ESTE MOMENTO HAY REPRESENTACIÓN DE LAS VEREDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, YO CREO QUE SI ESTAMOS AQUÍ ES PORQUE NOS INTERESA EL TEMA, ENTONCES YO PENSARÍA QUE PUEDAN PARTICIPAR DOS PERSONAS POR VEREDA EN LA VEEDURÍA.

INTERVIENE EL DOCTOR CRISTOBAL MORENO: COMPAÑEROS QUE TAL LES PARECE LA PROPUESTA. ¿ESTÁN DE ACUERDO CON LA PROPUESTA?

RESPUESTA DE LOS AISTENTES: SÍ.

LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA SON LAS SIGUIENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	VEREDA
EVELIO SIERRA BERNAL	2.338.760	EL PITAL
LUIS CARLOS GUERRERO	94.263.327	EL PITAL
JOSÉ RODRIGO PEREA	9.815.207	LA CEDALIA
JHON GUERRERO	16.232.529	LA ALBANIA
ROBETH ZAPATA	14.567.093	LA ALBANIA

ES PERTINENTE RESALTAR QUE DURANTE EL PROCESO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN SE BRINDÓ REFRIGERIO A LOS ASISTENTES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES:

CONCLUSIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO:










ANEXOS

- A. Evidencia de la creación del grupo de WhatsApp para la convocatoria.
- B. Oficio de convocatoria a la socialización.
- C. Registro de firmas de recepción de la invitación.
- D. Volante de convocatoria a la socialización.
- E. Presentación empleada en la reunión de socialización.
- F. Registro de firmas de los asistentes a la jornada de socialización.


NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS DE LA CEDALIA, L ALBANIA Y EL PITAL DEL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA VALLE		
3187784862	3152212864	3155148371
3209123201	3108434599	3174768854
3127876934	3233703378	3127883276
3205385830	3163600718	3122497977
3174146550	3105158843	3212153934
3158856981	3126293986	3174768854
3168389424	3143287071	3148089761
3225252501	3165041815	3178829659
3206278572	3226548860	3137400737
3146227244	3133956133	3235285645
3122735208	3137904592	
3115339991	3127876939	
3112858051	3146254160	
3177106684	3205290152	
3126716038	3122506148	
3153476442	3146461740	
3155603243	3205029898	
3169473342	3116095930	
3182677273	3208873914	
318354841	350265215	
3178657326	3117034500	
3042584335	3165601841	
3218507495	3122520210	
3137915330	3212153434	
3104030411	3217739139	
3227876084	3145505832	
3102395905	3122541826	
3205601486	3150322826	
3193421924	3113439901	
3204616212	3126449253	
3233942002	3188143358	
3134182315	3117012646	
3234073905	3113295867 -	
3195302439	3104418307	
3226918892	3233984991	
3126858698	3232606843	
3177106684	3208322417	
3155224646	3200074952	
3146321890	3132740152	
3202414567	3234477535	
3155734456	3102463136	
3172387359	3102487124	

Creación grupo convocatoria socialización acueducto interveredal – La Cedalia, La Albania y El Pital.

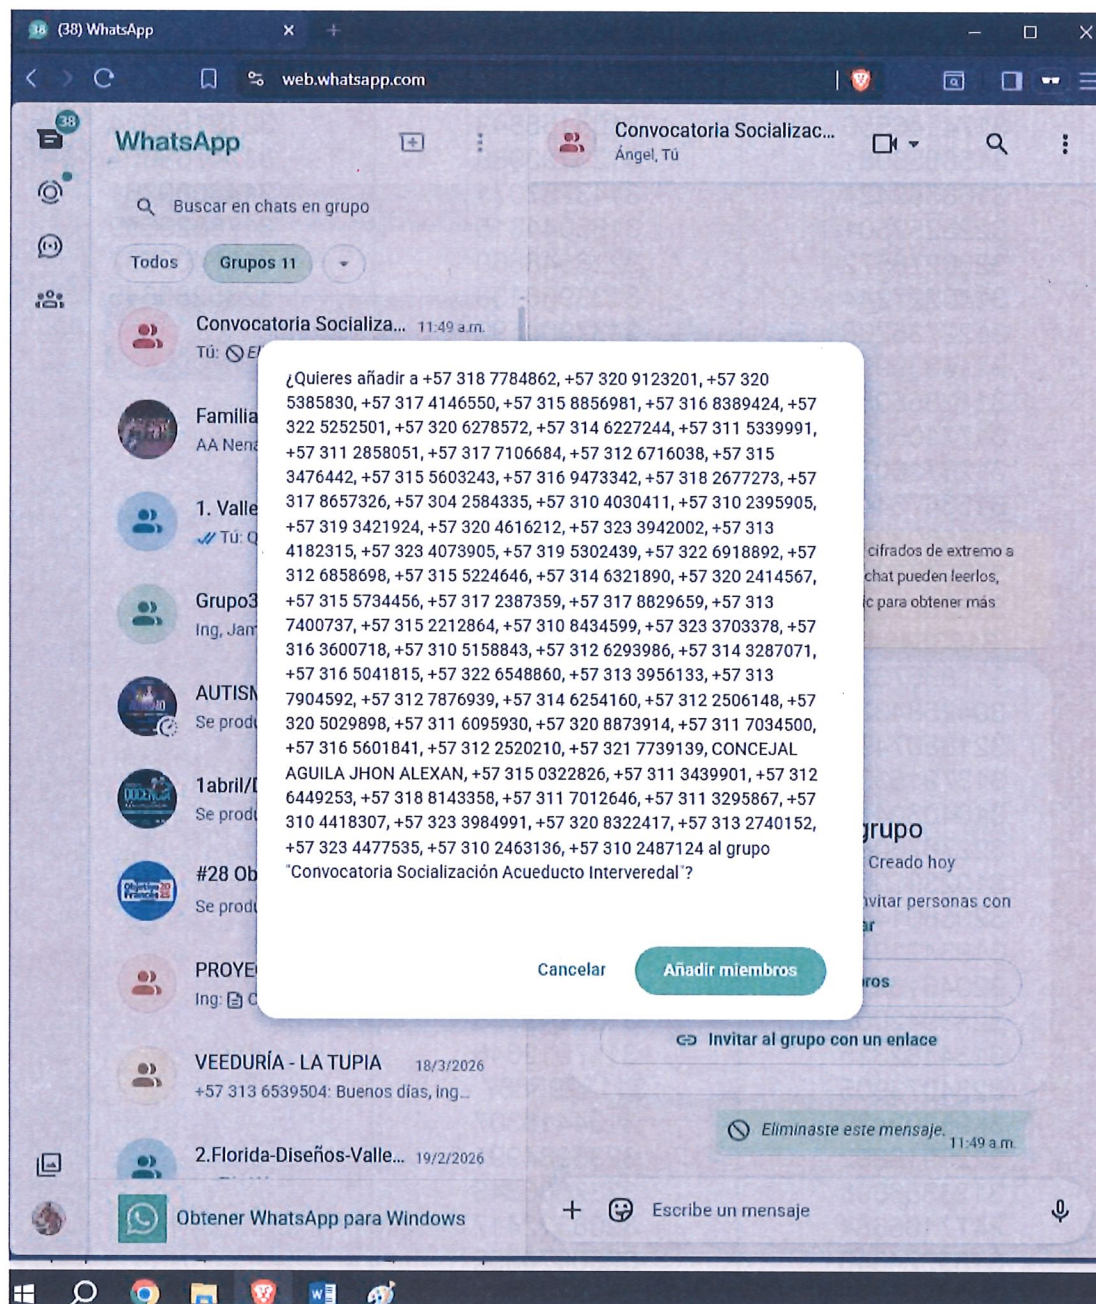

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**

Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

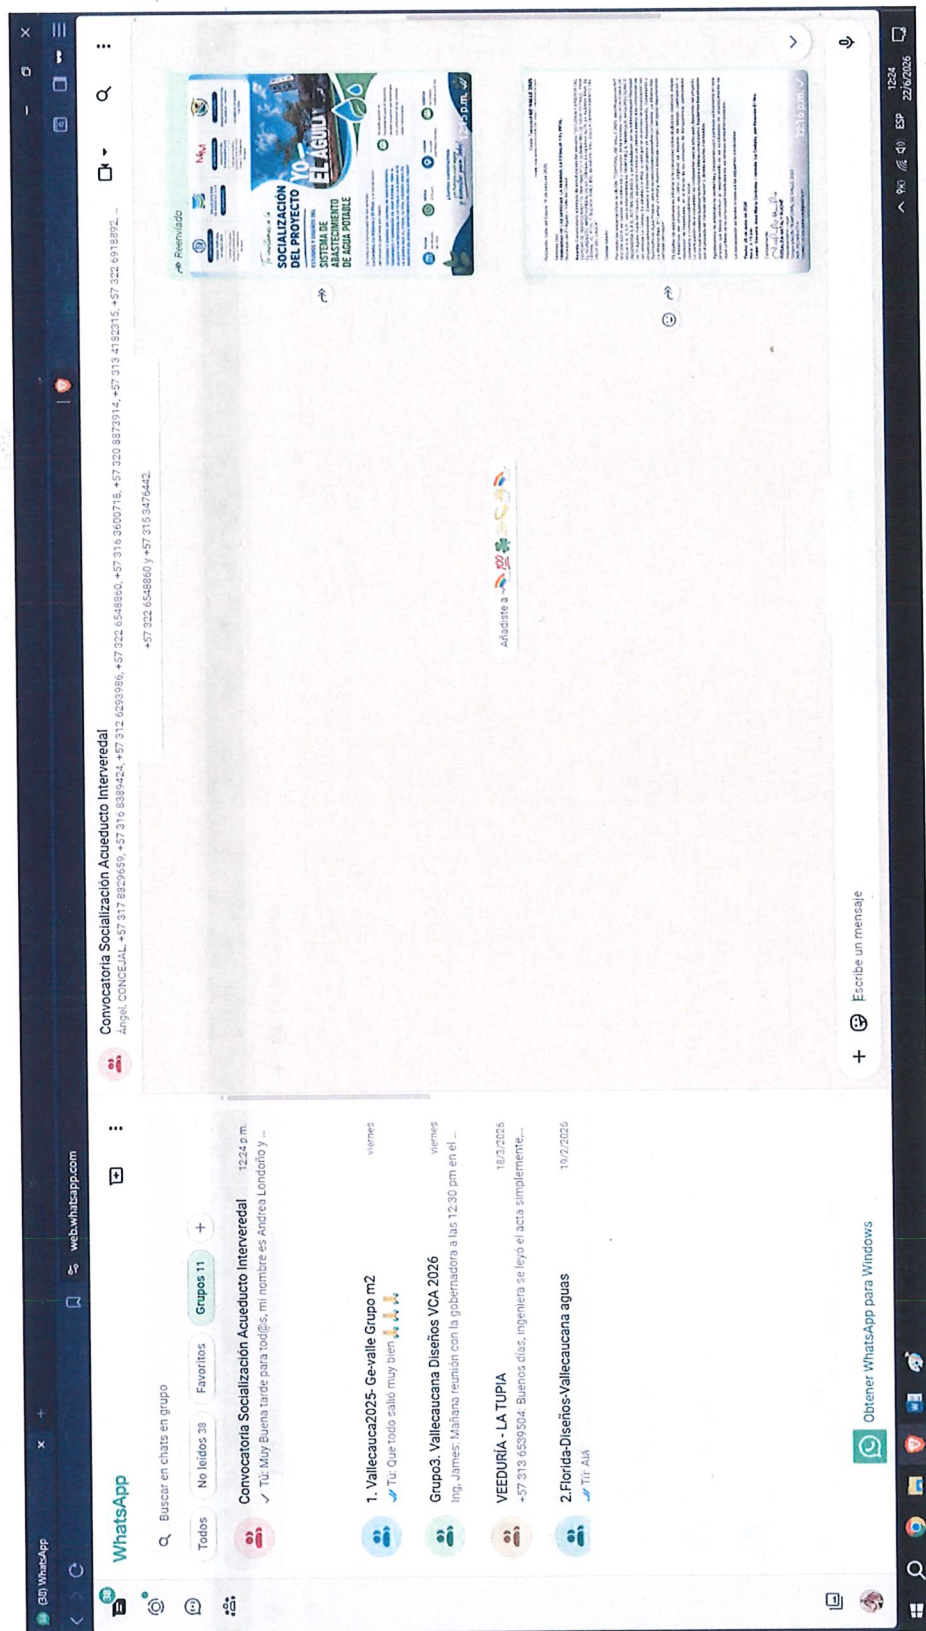

Unión Temporal **GE-VALLE 2025**
Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

WhatsApp

Buscar un chat o iniciar uno nuevo

Todos

No leídos 38

Favoritos

Grupos 11

web.whatsapp.com

Convocatoria Socialización Acueducto Interveredal

Atendidos a +57 321 2153934, +57 317 4768854, +57 315 5148371, ...

ENRIQUE ING.

Vivian valeria Cortez loaliza

Ing. Jorge Rico Rico

Interventoria Constanza Moreno

Ing. SALMANCA

12:06 p.m.

12:11 p.m.

11:51 a.m.

11:45 a.m.

11:41 a.m.

11:19 a.m.

12:24 p.m.

12:24 p.m.

Muy Buena tarde para todos, mi nombre es Andriana Londoño y soy la coordinadora del Grupo Unión Temporal GE Valle 2025, contratista de consultoría de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P del proyecto " ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA CEDALIA, EL CEDRAL LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL PITAY Y BUENOS AIRES, MUNICIPIO EL AGUILA" la razón de la creación de este grupo, es para cordialmente invitar a la comunidad de las veredas antes mencionadas a la socialización del proyecto, esperamos contar con su presencia... muchas gracias 🙏🙏🙏



SOCIALIZACION DEL PROYECTO
YO VOY CON EL AGUILA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

+ Escribe un mensaje

Obtener WhatsApp para Windows

WhatsApp (36) WhatsApp x Recibidos (70) - andrealondon x Solicitud de grabación reunión x + web.whatsapp.com

WhatsApp

Q con

Todos No leídos 36 Favoritos

Chats

Interventoria Constanza More... miércoles
✓ Mil y mil gracias 🙏🙏🙏

Convocatoria Socialización Acue... jueves
+57 311 6095930 salió del grupo.

CONCEJAL AGUILA JHON AL... 26/6/2026
Hola

Juan concejal 28/5/2026
Por favor me regalan un comentario positiv...

Consepcion Guerrero Valleca... 26/5/2026

Acceder a un historial de chats más amplio en la aplicación
Obtener WhatsApp para Windows

Convocatoria Socialización Acueducto Intervredal
Angel CONCEJAL +57 312 6293986 +57 322 6548860 +57 316 3600718 +57 320 8873914 +57 313...

25/6/2026

+57 312 7883276

5:36 a.m.

+57 312 2497977
Hola 5:35 p.m.

+57 310 4418307
Hola 5:38 p.m.

+57 310 4030411 salió del grupo.
26/6/2026

+ Escribe un mensaje

12:56 p.m. 5/07/2026

Buscar



CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL
GE-VALLE 2025

Contrato Consultoría:
No.2000.13.04.005-2025
Grupo 3 - Vallecaucana
de Aguas



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATANTE



INTERVENTORÍA
ARQUITECTURA
E INGENIERÍA S.A.S.

Contrato Consultoría:
No.2000.13.04.005-2025
Grupo 3 - Vallecaucana
de Aguas



ALCALDÍA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEL ÁGUILA - VEREDAS

LA CEDALIA, LA ALBANIA
Y EL PITAL

Te invitamos a la
SOCIALIZACIÓN
DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE



Se invita a la comunidad de las veredas:
La Cedralia, La Albania y El Pital, a la socialización
del proyecto que tiene por objeto:

"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO,
TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL
ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA,
LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL
MUNICIPIO DEL ÁGUILA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".



Su participación es
fundamental para el desarrollo
de este proyecto que beneficiará
a la comunidad de las veredas
antes mencionadas.



FECHA
26 de junio
de 2026



HORA
3:15 p.m.



LUGAR
Escuela
José María Córdoba.



VEREDA
La Cedralia,
zonificación El Río.

¡Juntos construimos
un futuro con agua
y bienestar para todos!

¡Tu voz y tu presencia hacen la diferencia!

Roldanillo, Valle del Cauca, 10 de junio de 2026

Señores (as):

COMUNIDAD DE LAS VEREDAS: LA ALBANIA, LA CEDALIA Y EL PITAL.
Municipio del El Águila – Valle del Cauca

Asunto: Convocatoria a jornada de socialización del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, la UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025, identificada con NIT 902.009.437-8, en calidad de contratista y consultor de la empresa VALLECAUCANA DE AGUA S.A. E.S.P., con la interventoría de MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., NIT 900.596.808-6, y en articulación con la Administración Municipal de El Águila (Valle del Cauca), se permite convocar de manera atenta a la comunidad de las veredas La Cedralia, La Albania y El Pital a participar en la jornada de socialización del proyecto denominado: *"Estudios y Diseños del Sistema de Abastecimiento, Tratamiento y Suministro de Agua Potable, para el Acueducto interveredal de La Cedralia, La Albania Alta, La Albania Baja, El Cedral, El Pital y Buenos Aires del municipio del águila departamento del valle del cauca"*

El objetivo de esta jornada es informar a la comunidad sobre el alcance, objetivos, etapas y beneficios del proyecto, así como propiciar un espacio de diálogo, participación y resolución de inquietudes, en el marco de los principios de transparencia, participación ciudadana y corresponsabilidad social.

La participación de la comunidad es fundamental para el adecuado desarrollo del proyecto, por lo cual se extiende la presente invitación a líderes comunitarios, habitantes beneficiados con el proyecto en mención del sector y demás actores interesados.

Agradecemos de antemano su asistencia y disposición para participar activamente en este proceso que busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua potable de la comunidad beneficiada de las veredas antes mencionadas.


La socialización se llevará a cabo en las siguientes condiciones:

Fecha: 26 de junio de 2026

Hora: 3:15 pm.

Lugar: Escuela José María Córdoba – vereda: La Cedralia, zonificación El Río.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHE

Representante Legal

Grupo UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025 –

NIT: 902.009.437-8.

Correo: ch.asociados.sas@gmail.com

Unión Temporal GE-VALLE		PROYECTOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. - GRUPO 3		Fecha: 04 / 01 / 2026
Contrato Consultoría No 2000.13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas NIT: 902.009.437-8.		FORMATO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN		Versión 1.0
NOMBRE DEL PROYECTO:		ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
RESPONSABLE: ANDREA LONDOÑO VÁSQUEZ				
CARGO: COORDINADORA UNIÓN TEMPORAL GE-VALLE 2025				
FECHA: 11 / 06 / 2026				
HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:		
NOMBRE	# IDENTIFICACIÓN	VEREDA	# TELEFÓNICO	FIRMA
Jorge Enrique Resiga	16214527	El Río	3113295869	<i>Jorge Enrique Resiga</i>
Franzisco A. Brandy	94262983	La Cedralia	3136920419	<i>Franzisco A. Brandy</i>
Fredy Giraldo	161232880	La Albania	3192325035	<i>Fredy E. Giraldo</i>
Los Carlos Guerrero	94263327	El Pital	3155148371	<i>Guillermo Pinz</i>
Fernando Valencia	18531126	La Cedralia	3132248094	<i>Fernando Valencia</i>
Thon Alexander Guerrero	14570262	La Cedralia	3122541826	<i>Thon Alexander Guerrero</i>
Adriana M. Caldas	1112.765.673	El Río	3104590869	<i>Adriana Castano</i>
Sandra M. Garcia	11007349967	El Río	3215628126	<i>Sandra Caldas</i>
María G. Gomez	31.475.280	El Río	3143321657	<i>María G. Gomez</i>
Amparo Aguero	291452727	El Pital	3158956981	<i>Amparo Aguero</i>
Pais Guerrero	161232529	La Albania	3176896034	<i>Pais Guerrero</i>
Rodrigo Perez	9815207	La Cedralia	3187784862	<i>Rodrigo Perez</i>
Jorge Ailey Sosa	94263064	El Pital	3232988831	<i>Jorge Ailey Sosa</i>

Observaciones: _____

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL

La Cedalia - El Cedral - La Albania Alta - La Albania Baja - El Pital y Buenos Aires

Municipio de El Águila, Valle del Cauca



Gobernación del
VALLE DEL CAUCA



**VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.**



**ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA**



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



Trabajamos por un futuro con agua potable
para nuestras comunidades.



Avenida 8 # 24 A Norte - 147,
en Cali, Valle del Cauca.



Teléfono: 26653810



Sitio web:
vallecaucanadeaguas.gov.co



Carrera 9 No 8-04 - Municipio de Roldanillo - Valle Del Cauca

grupom2sas@gmail.com

TEL: 3164983757



*Agua que
transforma
comunidades*



Gobernación del
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.




Unión Temporal
GE-VALLE
2025



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



UN PROYECTO QUE TRANSFORMA VIDAS

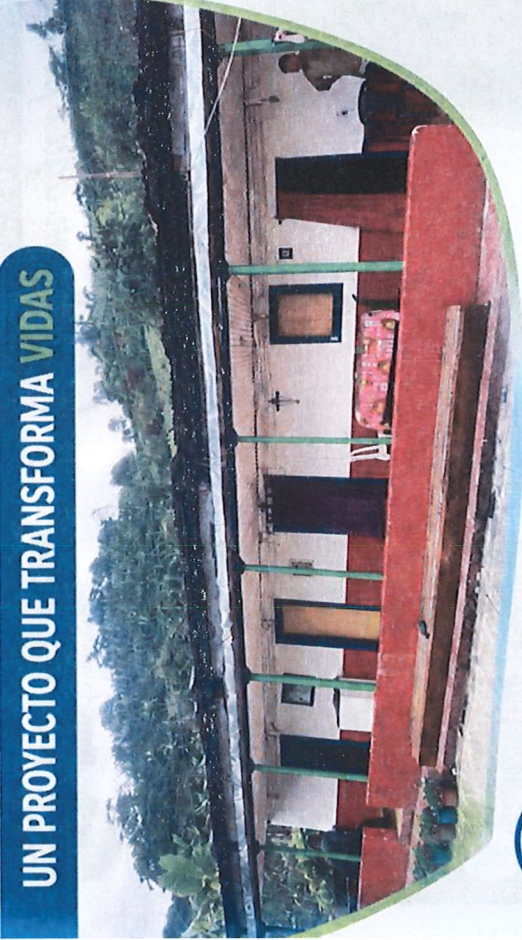

Agua que transforma comunidades



Trabajamos por un futuro con agua potable para nuestras comunidades.

- 

Municipio Beneficiado:
El Águila - Valle
- 

Plazo de ejecución de Estudios y Diseño:
Doce (12) MESES
- 

Fuente de financiación:
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
- 

Población beneficiada:
735 Habitantes aprox.
- 

Total Longitud a Intervenir:
10.742 Metros Lineales aprox.



DATOS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA


	No. DE CONTRATO:	2000.13.04.005-2025.
	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025.
	NIT:	902.009.437-8.
	REPRESENTANTE LEGAL:	ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI.



Plazo de ejecución:
DOCE (12) MESES



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
con agua potable
PARA NUESTRAS COMUNIDADES

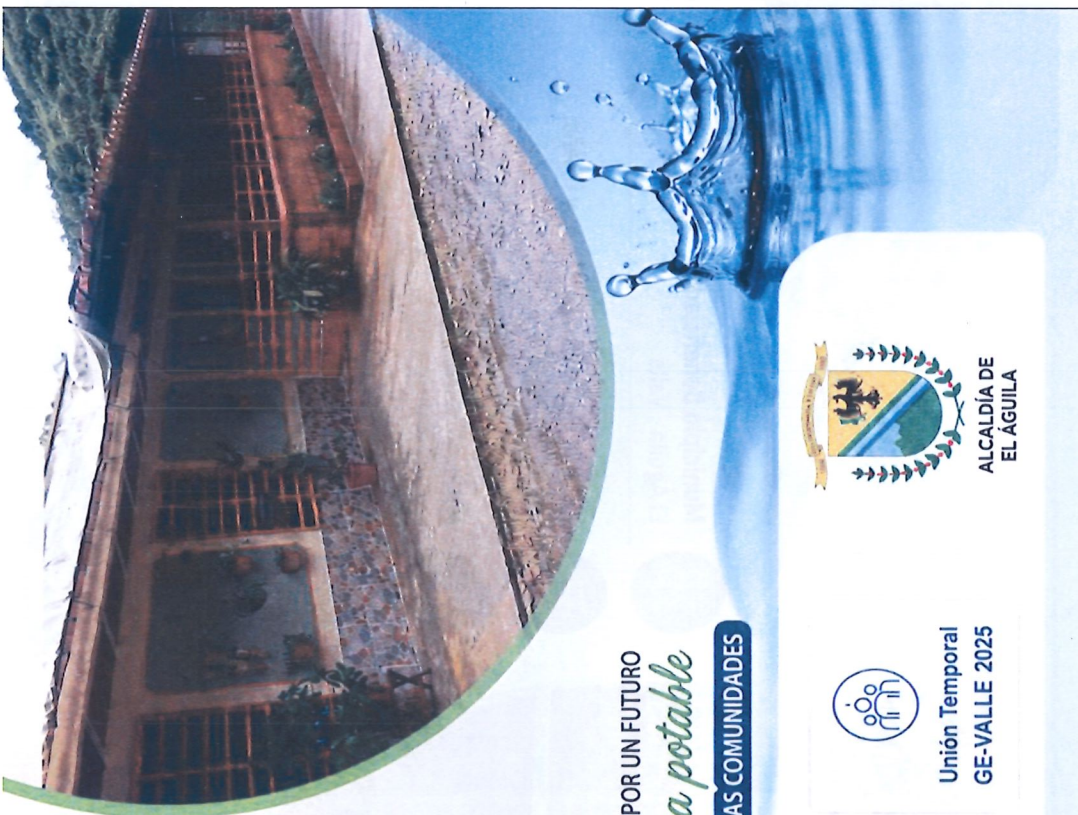




GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA

DATOS DE LA INTERVENTORÍA

	No. DE CONTRATO:	2000.13.04.005-2025.
	CONTRATISTA:	MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
	NIT:	900.596.808-6.
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS DAVID MARTINEZ VÉLEZ.

Plazo de ejecución:
DOCE (12) MESES



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
con agua potable
PARA NUESTRAS COMUNIDADES



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA




VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA



ALCANCE DEL PROYECTO:



El proyecto que venimos a socializar **NO** contempla la construcción inmediata de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ni de las redes de distribución.



Su alcance corresponde **exclusivamente** a la elaboración de los **ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS** requeridos para el desarrollo del sistema de acueducto interveredal que beneficiará a las veredas La Cedralia, La Albania y El Pital, en el municipio de El Águila.



Estos estudios y diseños permitirán definir las condiciones técnicas, operativas y financieras necesarias para que, en una etapa posterior, se puedan **gestionar los recursos** requeridos para la construcción de la infraestructura que garantice la prestación adecuada del servicio de agua potable a los habitantes de las veredas beneficiarias.



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •

VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA

**En proyecto se divide en 5 fases
 con entrega de 5 productos:**

PRODUCTO 1.

- 1- Actividades preliminares.
- 2- Catastro del sistema de acueducto existente.
- 3- Estudio topográfico.
- 4- Diagnóstico del sistema actual del acueducto.



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •

VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA

EN ESTA ETAPA SE VA A:

- 01  Revisar el **estado actual** de la infraestructura existente.
- 02  Realizar **levantamientos técnicos** y estudios del terreno.
- 03  Diseño de la **planta de tratamiento - PTAP**.
- 04  Diseñar la **red del acueducto**.
- 05  Caracterización **socio-económica**.
- 06  Caracterización de la **fuerza "Las Violetas"**.
- 07  Actualización del **Estudio Hidrológico** de la fuerza "Las Violetas".

TRABAJAMOS POR UN FUTURO
CON **AGUA POTABLE** PARA NUESTRAS COMUNIDADES



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA




Unión Temporal
GE-VALLE 2025

VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA

Producto 2.:

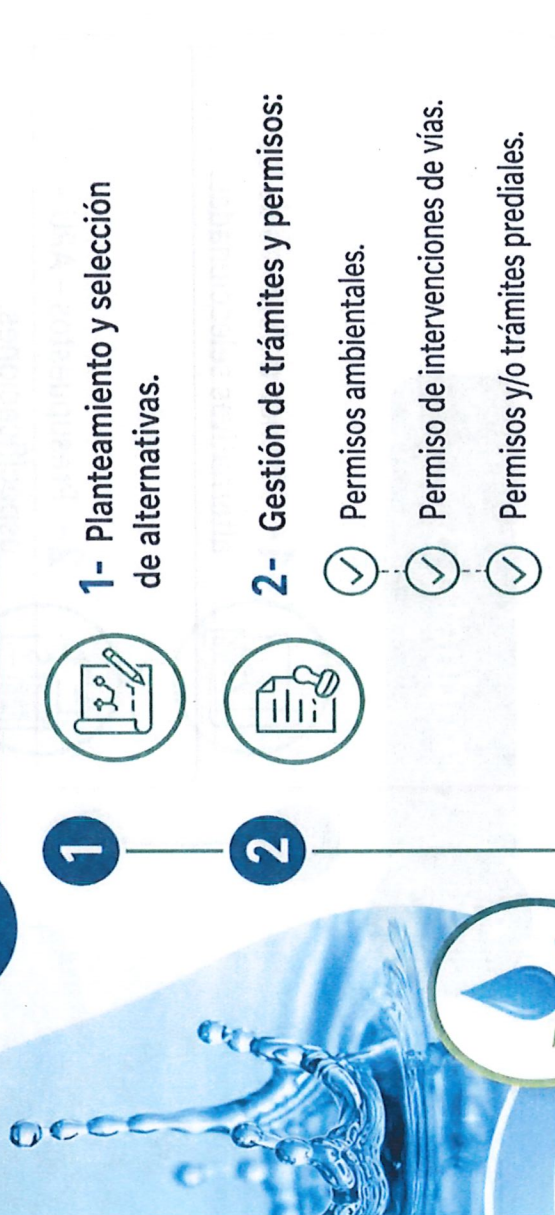

TRABAJAMOS POR UN FUTURO
 CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •

VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA




Producto 3.:

1



1- Diseños definitivos de las alternativas seleccionadas.

2



2- Presupuestos – APU – especificaciones.



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •

VEREDAS LA CEDALIA - LA ALBANIA Y EL PITAL — MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA —

Producto 4.:



Realización y entrega
del informe de las
actividades de la fase IV:
Gestión de trámites
y permisos.



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



Unión Temporal
GE-VALLE 2025

VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA

Producto 5.:

Documentos,
presentación,
concepto técnico
favorable o
viabilización del
proyecto.



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
EL ÁGUILA



Unión Temporal
GE-VALLE 2025



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •

VEREDAS LA CEDALIA – LA ALBANIA Y EL PITAL

MUNICIPIO EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA



Para que este proyecto quede bien diseñado, necesitamos del apoyo de todos ustedes, especialmente facilitando la información que los profesionales requieran.



Su colaboración es fundamental para lograr un diseño eficiente y acorde a las necesidades reales de las veredas.



Con estos estudios se busca que el municipio y el acueducto, puedan gestionar los recursos necesarios para su futura construcción.



TRABAJAMOS POR UN FUTURO
 CON AGUA POTABLE PARA NUESTRAS COMUNIDADES •



GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA



VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.



ALCALDÍA DE
PRADERA



Unión Temporal
GE-VALLE 2025

MUCHAS GRACIAS



**VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.**



Avenida 8 # 24 A Norte - 147,
en Cali, Valle del Cauca.
Teléfono: 26653810
Sitio web:
vallecaucanadeaguas.gov.co



Unión Temporal GE-VALLE 2025



Contrato Consultoría
No.2000.13.04.005-2025 -
Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas.



DIRECCIÓN:
Carrera 9 No 8-04 - Municipio de
Roldanillo- Valle Del Cauca.



TELÉFONO:
3164983757.



CORREO ELECTRÓNICO:
grupom2sas@gmail.com



AGUA POTABLE



COMPROMISO



CONFIANZA



BIENESTAR

Unión Temporal GE-VALLE Contrato Consultoría No.2020-13.04.005-2025 - Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas NIT: 902.009.437-8.		PROYECTOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. - GRUPO 3		Fecha: 04 / 01 / 2026	
		FORMATO DE ASISTENCIA		Versión 1.0	
NOMBRE DEL PROYECTO:		"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"			
TEMA:		Socialización a la comunidad de las veredas de La Cedral, La Albania y El Pital, para brindar información del objeto del proyecto en mención, las fases previstas para su desarrollo, el alcance técnico y social por parte de Vallecaucana de aguas S.A.E.S.P., el contratista Unión Temporal GE Valle 2025 y la interventoría Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., en articulación con la administración municipal.			
RESPONSABLE: ANDREA LONDOÑO VÁSQUEZ					
CARGO: COORDINADORA UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025					
FECHA: 26 / 06 / 2026					
HORA DE INICIO: 03:40 pm		HORA DE FINALIZACIÓN: 01:40 pm			
NOMBRE	# IDENTIFICACIÓN	VEREDA	# TELEFÓNICO	FIRMA	
Fernando Valencia	13531126	La Cedral	3132243094	Fernando Valencia	
Darwin Cossio	1112759400	La Cedral	3225404332	Darwin Cossio	
Daniela Montej	18392842	El Pital	3211123503	Daniela Montej	
Jose Rodolfo Bet	9845209	La Cedral	3189784862	Jose Rodolfo Bet	
Adriana Castano	1112365673	El Rio	3104590869	Adriana Castano	
Sandra Y Garcia	1007347267	El Rio	3275626726	Sandra Garcia	
Amparo Aguirre	29452784	El Pital	3158856981	Amparo Aguirre	
Evelio Sierra	238760	El Pital	3168339424	Evelio Sierra	
Lot Nelly River	30892391	El Pital	3206258592	Lot Nelly River	

FIRMA DEL PROFESIONAL: 

Observaciones: _____

Unión Temporal GE-VALLE

Contrato Consultoría No.2000.13.04.005-2025 -
Grupo 3 - Vallecaucana de Aguas

NT: 902.009.437-8.

PROYECTOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. - GRUPO 3

Fecha: 04 / 01 / 2026

FORMATO DE ASISTENCIA

Versión 1.0

NOMBRE DEL PROYECTO:

"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CEDALIA, LA ALBANIA ALTA, LA ALBANIA BAJA, EL CEDRAL, EL PITAL Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DEL ÁGUILA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

TEMA:

Socialización a la comunidad de las veredas de La Cedralia, La Albania y El Pital, para brindar información del objeto del proyecto en mención, las fases previstas para su desarrollo, el alcance técnico y social por parte de Vallecaucana de aguas S.A.E.S.P., el contratista Unión Temporal GE Valle 2025 y la interventoría Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., en articulación con la administración municipal.

RESPONSABLE: ANDREA LONDOÑO VÁSQUEZ

CARGO: COORDINADORA UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025

FECHA: 26 / 06 / 2026

NOMBRE	HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:		FIRMA
	# IDENTIFICACIÓN	VEREDA	# TELEFÓNICO		
Jorge Enrique Freijola	16214873	El Rio	3113295869		Jorge Enrique Freijola
Constanza Moreno V.	66654225	Alcalá de los Rios	3136247967		Constanza Moreno V.
Tranzy Velez O	66219157	Isabel Buenavista	3188612151		Tranzy Velez O
Goldardo Priechuldu	16550560	El Rio	3213799527		Goldardo Priechuldu
Edisson Pinto	80168005	Vallecaucana	3007840307		Edisson Pinto
Fredy Giraldo	16232880	El Rio (Albania)	3192325035		Fredy Giraldo
Jonathan Guerrero	16232529	Albania	3196896034		Jonathan Guerrero
Marcu Gilma Gomez	31425280	El Rio	3163321657		Marcu Gilma Gomez
Dora Alexander Gorno	14590262	La Cedralia	3122254182		Dora Alexander Gorno
Luis Carlos Guerrero	94263827	El Pital	3155148371		Luis Carlos Guerrero

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Observaciones:

ACTA No 4.	DIMENSIÓN: PROYECTOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE DEL PROYECTO: “FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA”	
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA”, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA UNIÓN TEMPORAL GE-VALLE 2025, LA INTERVENTORÍA MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. S., REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.	
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026	LUGAR o MEDIO: SALÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA
HORA DE INICIO: 10:20 am	HORA FINAL: 12:15 pm
OBJETIVO: REALIZAR UNA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA”, CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR EL ESTADO DE AVANCE DE LA CONSULTORÍA, SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ATENDER LAS INQUIETUDES Y OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA COMUNIDAD Y LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES, Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN ENTRE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., LA CONSULTORÍA UNIÓN TEMPORAL GE-VALLE 2025, LA INTERVENTORÍA MARTÍNEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.	
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SIENDO LAS HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026, SE REALIZA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON ALGUNOS INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA”, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL GE-VALLE 2025, LA INTERVENTORÍA MYM, REPRESENTANTES DEL ACUEDUCTO, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA CIUDADANA Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. LA REUNIÓN CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DEL INGENIERO EDWARD SALAMANCA, CONTRATISTA DEL GRUPO UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025; CRISTÓBAL MORENO ABOGADO Y CONTRATISTA DEL ÁREA SOCIAL DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.; LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO, COORDINADORA DEL GRUPO UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025; FRANCY VÉLEZ, CONTRATISTA PROFESIONAL SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA MYM; LA SEÑORA NANCY LOZANO TESORERA LA JUNTA DEL ACUEDUCTO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SEÑOR RUBEN ROSERO Y EL TESORERO EL SEÑOR JORGE COLLAZOS TESORERO DE LA JUNTA DE	

ACCIÓN COMUNAL, EL SEÑOR DNIEL CUCALON PRESIDENTE DE LA VEEDURÍA, LA SEÑORA LISED ROSAS BERMUDEZ SECRETARIA DE LA VEEDURÍA, EL SEÑOR ALEX CORREA INTEGRANTE DE LA VEEDURÍA, LA SEÑORA MAIDY ANDREA ZUÑIGA, DANILO BECERRA Y ISLENA PORTILLA REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD, Y VALERIA CORTEZ, PROFESIONAL SOCIAL CONYTRATISTA DE LA UNIÓN TEMPORAL GE-VALLE 2025.

EL PROFESIONAL SOCIAL DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., CRISTÓBAL MORENO, DA APERTURA A LA JORNADA, BRINDANDO UN SALUDO DE BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y AGRADECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, A LOS ASISTENTES POR PARTE DE LA VEEDURÍA CIUDADANA Y LOS DEMÁS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO:

"HACEMOS ESTA REUNIÓN O LOS CONVOCAMOS CON EL PROPÓSITO DE ACTUALIZARLOS, EN PRIMER LUGAR, CÓMO VA EL PROYECTO, AHORA EL INGENIERO VA A EXPLICARLE EL AVANCE DEL PROYECTO. EN SEGUNDO LUGAR, EXPLICARLES A USTEDES LAS TRES ALTERNATIVAS QUE SE PLANTEARON JUSTAMENTE EN ESTA REUNIÓN EL 23 DE ABRIL. ¿POR QUÉ? PORQUE HAY CONFUSIÓN, NO HAY CLARIDAD EN LAS ALTERNATIVAS, PORQUE A PESAR QUE SE COMENTARON, OBIAMENTE FUE EN EL AIRE, PERO ES BUENO QUE USTEDES COMO VEEDORES TENGAN CLARA CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS PARA CUANDO HAGAMOS LA CONVOCATORIA GENERAL, CUANDO SE HAGA LA ASAMBLEA, USTEDES DEBEN TENER CLARIDAD, REPITO, DE ESTA ALTERNATIVA. ¿PARA QUÉ? PARA QUE SE LA INFUNDAN A LA COMUNIDAD. ENTONCES, POR ESA RAZÓN CONSIDERAMOS FUNDAMENTAL DE HACER ESTA REUNIÓN PARA QUE USTEDES TENGAN ACTUALIZADOS, REPITO, CÓMO VA EL AVANCE DE LA OBRA Y SEGUNDO, TODOS TENGAMOS YA DEFINIDO Y CLARO CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS, SE LAS COMENTO POR ENCIMA PARA QUE EL INGENIERO AHONDE EN ELLAS. UNA DE ESAS ALTERNATIVAS MENCIONAMOS QUE ES QUE HAY UN TANQUE, LA PTAP ES UNA, SE PLANTEÓ QUE SI ESTÁN DE ACUERDO SE DEJA, ES LO QUE YA ESTÁ ALLÍ, AUNQUE HACE MUCHO TIEMPO QUE ESTÁ CONSTRUIDA Y SE HACE UNA MODIFICACIÓN, SE ADAPTA PARA QUE FUNCIONE, PERO CON EL TEMOR QUE ES UNA PLANTA QUE HACE MUCHO TIEMPO SE EMPEZÓ A CONSTRUIR. LA OTRA ALTERNATIVA ES LA QUE LA COMUNIDAD SE PEGUE DE ACUAVALLE Y SE HACE EL PROCESO, AHÍ EL INGENIERO LE VA A EXPLICAR CUÁL ES ESE MECANISMO PARA QUE FUNCIONE. Y LA TERCERA ALTERNATIVA ES LA DE TENER, COMPRAR EL AGUA EN UNOS BLOQUELONES Y LUEGO ORGANIZAN UNA ASOCIACIÓN, AUNQUE AQUÍ ACABO DE ESCUCHAR QUE YA ESTÁN LAS ASOCIACIONES, HAY UNA ASOCIACIÓN Y EN EL EVENTO QUE NO ESTÁ CLARA, YA AL FINAL DE LA REUNIÓN LE EXPLICAMOS CÓMO SE FORMALIZA, CÓMO SE CREA LA ASOCIACIÓN. ¿PARA QUÉ? PARA QUE LA COMUNIDAD TENGA AUTONOMÍA DEL MANEJO DE ESA AGUA. ENTONCES, ES EL PROPÓSITO PARA QUE USTEDES TENGAN CLARO REALMENTE CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS Y SEPAN QUE VALLECAUCANA DE AGUAS EN NINGÚN MOMENTO HA ABANDONADO LA RESPONSABILIDAD. EMPEZAMOS, PERO ALLÍ ESTABA VALLECAUCANA DE AGUAS CON SU GERENTE Y TODOS LOS AMIGOS QUE HACEMOS PARTE DE ESA GRAN EMPRESA Y ESTAMOS COMPROMETIDOS A VER CÓMO REALIZAMOS ESA OBRA. POR ESA RAZÓN, AQUÍ HAY ALGUIEN DE MUCHA CONFIANZA DEL MUNICIPIO, DEL CORREGIMIENTO, EL CUAL SE LE AGRADECE ESPECIALMENTE A LA DOCTORA CONCEPCIÓN GUERRERO, LA CUAL ESTÁ CON NOSOTROS AQUÍ Y QUIÉN MÁS QUE ELLA ESTÁ GESTIONANDO,

ESTÁ AYUDANDO, ESTÁ PRESIONANDO PARA QUE SE LLEVE A CABO ESTA GRAN OBRA. ENTONCES QUERÍA HACERLE ESA INTRODUCCIÓN PARA QUE YA EL INGENIERO EMPIECE A EXPLICARLES CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS Y LE HAGA UN COMENTARIO GENERAL CÓMO VA EL PROCEDIMIENTO. NO SÉ SI ALGUIEN TIENE ALGUNA INQUIETUD ANTES QUE INTERVENGA EL INGENIERO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

- “MI NOMBRE ES CRISTÓBAL MORENO, SOY ABOGADO, ESTOY VINCULADO CON VALLECAUCANA DE AGUAS Y HAGO PARTE DEL COMPONENTE SOCIAL DE ESA GRAN EMPRESA”
- “MI NOMBRE ES VALERIA CORTEZ, SOY TRABAJADORA SOCIAL Y ESTOY APOYANDO EL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO PARA LA UNIÓN TEMPORAL”
- “BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES ALEX CORREA PONTÓN, SOY ADMINISTRADOR PÚBLICO Y HAGO PARTE DE LA CONTRATO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL ACUEDUCTO DEL PEDREGAL”
- “MUY BUENOS DÍAS PARA TODOS, MI NOMBRE ES EDWARD SALAMANCA, SOY INGENIERO CIVIL E INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, HAGO PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL, SOY SOCIO DE LA UNIÓN TEMPORAL Y SOY EL ENCARGADO DE LA PARTE DE DISEÑO HIDRÁULICO DEL PROYECTO EL PEDREGAL”
- “MUY BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES LIZETH ROSAS, SOY SECRETARIA DE LA VEEDURÍA Y HAGO TAMBIÉN PARTE DE LA ASOCIACIÓN Y DE LA JUNTA COMUNAL DEL PEDREGAL Y TAMBIÉN ESTOY MIRANDO LO DEL PROYECTO DE PEDREGAL”
- “MUY BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES DANIEL CUCALON CIFUENTES, SOY ABOGADO DE PROFESIÓN, ACTUALMENTE SOY EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA VEEDURÍA DEL AGUA COMO TAL ESTOY AQUÍ, PRESIDENTE, MUCHAS VECES EL TIEMPO MÍO SE LIMITA, PERO PUES EN LO QUE YO PUEDA AYUDAR, COLABORAR, AQUÍ VOY A ESTAR EN PIE DE CAÑÓN. TAMBIÉN PUES QUIERO DAR CON LA SALVEDAD QUE YO AHORITA PUES VOY A ESTAR HASTA LAS 11 POR CUESTIONES DE QUE TENGO UN COMPROMISO EN CALI, PERO IGUALMENTE LA IDEA ES PROSEGUIR, YO SÉ QUE AQUÍ HAY UN GRAN EQUIPO, UN EQUIPO QUE IMPULSA Y TENEMOS LOS MISMOS PENSAMIENTOS DE LLEVAR A CONSECUENCIA ESTE PROYECTO, ENTONCES AQUÍ ESTAMOS.”
- “BUENOS DÍAS PARA TODOS, MI NOMBRE ES RUBÉN ROSERO, SOY INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, INVITADO POR LIZETH ROSAS PARA ESTE PROCESO.”
- “BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES DANILO BECERRA, INGENIERO INDUSTRIAL, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, INVITADO POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SALIENTE, LA ENTRANTE QUE GANÓ HACE POCO EN LAS ELECCIONES DE LA HAT A NIVEL NACIONAL, INTERESADO PUES EN EL TEMA EL AGUA PUES ES UN RECURSO COMO SABEMOS EN UNOS AÑOS VA A EMPEZAR A PASAR FACTURA POR EL DESPILFARRO QUE LE ESTAMOS DANDO ACTUALMENTE, ENTONCES QUÉ MEJOR QUE MIRAR CÓMO

ATENDEMOS ESA URGENCIA FUTURO QUE VAMOS A TENER”

- “BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES NANCY LOZANO Y SOY LA TESORERA DE LA ASOCIACIÓN”
- “BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES JORGE COLLAZOS, SOY HABITANTE DEL PEDREGAL, LLEVO MUCHO TIEMPO TRABAJANDO POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, ESTA JUNTA DEL ACUEDUCTO TAMBIÉN ERA EL TESORERO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL QUE ACABA DE TERMINAR, ME RENOVARON EL CARGO, SIGO COMO TESORERO EN LA NUEVA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y CON LA MEJOR DISPOSICIÓN PARA MIRAR A VER CÓMO SE PUEDE SACAR ADELANTE ESTE PROYECTO Y QUE SEA BENEFICIADA LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL”
- “MUY BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES CONCEPCIÓN GUERRERO, HAGO PARTE DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE VALLECAUCANA.
- “MUY BUEN DÍA, MI NOMBRE ES ELENA PORTILLA, SOY PORCICULTORA TÉCNICA AGROPECUARIA, HAGO PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EN LA NUEVA Y VIVO EN EL PEDREGAL.”
- “MUY BUENOS DÍAS, MI NOMBRE ES FRANCY VÉLEZ, SOY TRABAJADORA SOCIAL Y HAGO PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DE MYM”

ANTES DE DAR INICIO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN, SE INFORMÓ A LOS ASISTENTES QUE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA ELABORACIÓN DEL ACTA Y LA FIDELIDAD DE LOS REGISTROS DE LAS INTERVENCIONES, LA JORNADA SERÍA GRABADA EN AUDIO. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN EXPRESA A LOS PARTICIPANTES PARA REALIZAR DICHA GRABACIÓN, MANIFESTANDO LOS ASISTENTES SU CONFORMIDAD Y APROBACIÓN PARA EL REGISTRO DE LA REUNIÓN. TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA PARTICIPATIVA DEL ENCUENTRO Y CON EL PROPÓSITO DE CONSERVAR LA FIDELIDAD DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR LOS ASISTENTES, A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN MEDIANTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES DIÁLOGOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES Y RESPUESTAS EXPUESTAS DURANTE LA JORNADA. ESTE REGISTRO PERMITE EVIDENCIAR DE MANERA DETALLADA LOS APORTES DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD, LA VEEDURÍA CIUDADANA, LOS LÍDERES COMUNITARIOS Y EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS ACLARACIONES Y ACUERDOS GENERADOS EN EL MARCO DEL ESPACIO DE SEGUIMIENTO.

SE CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL INGENIERO EDWARD SALAMANCA:

“PRIMER PUNTO, NOSOTROS COMO DISEÑADORES NO VAMOS A TOMAR NADA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, OSEA, USTEDES TIENEN, HAY UN BRAZO QUE ES EL BRAZO DE DERIVACIÓN NÚMERO 2 DEL RÍO FRAILE, MARGEN DERECHA, AHÍ HAY UN CANAL, LLEGAMOS A UN DESARENADOR, DE ESE DESARENADOR SALIMOS CON UNA TUBERÍA DE 12 PULGADAS QUE ES LA QUE LLEGA AL LOTE DE LA PLANTA. USTEDES EN LA PLANTA, TENEMOS UNA PLANTA, UNA PLANTA QUE SE HABER CONSTRUIDO HACE UNOS VEINTE, TREINTA AÑOS, SE TIENE UNA PLANTA COMPACTA PARA DOS, CINCO, TRES LITROS POR SEGUNDO Y TENEMOS UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y TENEMOS UNAS REDES DE SEIS A UNA Y MEDIA PULGADA. EL

PROPÓSITO ES NO UTILIZAR NADA DE ESO EN NUESTRO PROYECTO. ENTONCES, SI NO VAMOS A UTILIZAR NADA DE ESO, ¿CUÁLES SERÍAN NUESTRAS OPCIONES? ¿ENTONCES UNA OPCIÓN ES QUE? ES QUE CREO QUE ESO APARECE ASIGNADO, NO SÉ SI ES A LA JUNTA DE ACCIÓN, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL O A LA JUNTA DE ACUEDUCTO, CUANDO SE HIZO EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RÍO FRAILE, APARECE UNA CONCESIÓN, UN CAUDAL ASIGNADO DE 15 LITROS PARA EL PEDREGAL, 15 LITROS AL ESTAR ASIGNADO NO SIGNIFICA DE CAUDAL, PERO NO LO HAN LEGALIZADO, O SEA, UNA COSA ES QUE ELLOS HICIERON LAS MEDICIONES, ENTONCES LISTO EL PEDREGAL 1, PORQUE HAY PEDREGAL 1 Y PEDREGAL 2, PEDREGAL 1 TIENE 15 LITROS, PERO HAY QUE LEGALIZARLOS, O SEA, USTEDES NO ESTÁN LEGALIZADOS ANTE LA CVC. ¿CUÁL ES QUÉ SERÍA LA OPCIÓN DE ESOS 15 LITROS? NOSOTROS PARA. ESTARÍAMOS HABLANDO, TENGO ENTENDIDO QUE SON COMO 300 USUARIOS, ESTARÍAMOS SUMANDO DOS, HAY UNA DE 70 Y OTRA DE 40, DOS URBANIZACIONES NUEVAS, EN TOTAL ESTARÍAMOS HABLANDO CASI DE 3.000 ALGO PERSONAS, NECESITARÍAMOS 6.2, 6.3 LITROS POR SEGUNDO. ENTONCES NOSOTROS EN EL LOTE LO DIVIDIMOS, AHÍ LES DEJAMOS LO DEMÁS QUE SIGA EL TANQUE, ALMACENAMIENTO Y A LAS REDES EXISTENTES DERIVAMOS ALLÍ LES HARÍAMOS UN TANQUE, UN SEDIMENTADOR DEL SEDIMENTARIO, AMPLIARÍAMOS LA PLACA DONDE ESTARÍA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EL MÓDULO ES DE 2.5 A 3, NECESITARÍAMOS AMPLIAR PRÁCTICAMENTE OTRO MÓDULO, TENDRÍAMOS HACER UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y LAS REDES NUEVAS SON COMO 4 KILÓMETROS DE RED NUEVO. HAY QUE. VAMOS A NECESITAR, ENTONCES USTEDES SER CONSCIENTES DE QUE, SI VAMOS A TENER LA PLANTA, ESO ES UNA PLANTA DE APLICACIÓN QUE HAY QUE ESTARLE APLICANDO QUÍMICOS, NO VAMOS A NECESITAR UN INGENIERO TODO EL DÍA, PERO SI VAMOS A NECESITAR AL MENOS QUE VAYA DOS VECES POR SEMANA, Y VAMOS A NECESITAR UN OPERADOR DE LA PLANTA, O SEA ELLOS. ENTIENDO QUE POR OCHO HORAS NECESITARÍAMOS TENER CUATRO PERSONAS PARA CUBRIR EL TURNO EL MES COMPLETO TENDRÍAMOS QUE TENER CUATRO PERSONAS Y UN INGENIERO. CUATRO PERSONAS TIEMPO COMPLETO Y UN INGENIERO AL MENOS DOS MEDIOS DÍAS A LA SEMANA. A LA SEMANA, CORRECTO. NECESITARÍAMOS LO DEL FONTANERO Y NECESITARÍAMOS ALGUIEN QUE SE ENCARGARA DE LAS LECTURAS, PORQUE AHORITA SÍ O SÍ TENEMOS QUE IR CON MICROMEDICIÓN, ALGUIEN QUE SE ENCARGUE DE LEER, DESPUÉS ALGUIEN QUE EN SECRETARÍA, UNA SECRETARIA QUE SE ENCARGUE DE ELABORAR LOS RECIBOS Y UNA PERSONA, EL MISMO FONTANERO, ALGUIEN QUE LOS ENTREGUE Y DESPUÉS HACER LA RECOLECCIÓN DEL DINERO. TENEMOS QUE SER CONSCIENTES SI NOS VAMOS, SI QUEREMOS QUE NOS VAN A MONTAR UN PROYECTO Y QUE ESTO FUNCIONE, PORQUE LO VAMOS A ABANDONAR Y HASTA QUE DURE LA TUBERÍA, ESO NO VAMOS A IR, NO VAMOS A LLEGAR DE QUE ESO FUNCIONE Y QUE EL AGUA ESTÉ BIEN Y TODA ESA PARTE. TENEMOS UNOS LIMITANTES QUE ALLÁ HAY CRECIENTES Y SABEMOS QUE EL BRAZO SE NOS TAPA. DESPUÉS AHÍ TENEMOS QUE ESPERAR, NO SÉ, A VECES NOS DEMORAMOS UN DÍA, DE PRONTO A VECES NOS VA UNA SEMANA, DOS SEMANAS EN QUE PODAMOS LIMPIAR EL CANAL Y VOLVER OTRA VEZ A TENER. ESA ES UNA ALTERNATIVA. LA OTRA ALTERNATIVA ES UTILIZAR AGUA DE LA PLANTA DE VALLECAUCANA. DE ACUAVALLE, PERDÓN. DE ESA ACUAVALLE SE DERIVARÍAN DOS OPCIONES. QUE TENDRÍAMOS QUE HACER ALLÁ. ALLÁ TENEMOS QUE HACER UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, PORQUE ELLOS TIENEN UN TANQUE DE 500 METROS CÚBICOS, PERO ESTÁ ABANDONADO. Y ENTONCES, PUES AHORITA SI PONEMOS

A HACER ESTUDIOS DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES DEL TANQUE Y TODA ESA PARTE, PUES AHÍ NOS QUEDARÍAMOS VARIOS MESES. Y PARTE COMO LE DIGO, EL PROPÓSITO, LO QUE NOS DIJO LA GOBERNADORA HACE 8 DÍAS ES QUE ESTE ES UN PROYECTO QUE TIENE QUE QUEDAR ESTE AÑO MATRICULADO POR ELLA, EJECUTARLO EL PRÓXIMO AÑO. ENTONCES, PARA QUE ESO PUEDA OCURRIR, TIENE QUE ESTAR A MÁXIMO EN OCTUBRE EN VENTANILLA ÚNICA.

CRISTOBAL MORENO: "DISCULPA, INGENIERO, UN MOMENTICO. EL TANQUE QUE TÚ HABLAS, ¿CUÁL ES QUE DICES QUE ESTÁ COMO ABANDONADO?

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: ¡NO!, ES UN TANQUE QUE ESTÁ EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE ACÁ EN ACUAVALLE. EN ACUAVALLE, SÍ. ELLOS TIENEN UN TANQUE QUE NO LO USAN, ENTONCES ELLOS NOS ESTÁN DANDO ESE ESPACIO. ENTONCES NOSOTROS NECESITAMOS UN TANQUE DE 120 METROS CÚBICOS. ENTONCES LO HARÍAMOS AHÍ EN ESE ESPACIO, PERO NECESITARÍAMOS BOMBEO. ENTONCES PARA CUALQUIERA DE LAS DOS, PARA LA SEGUNDA O LA TERCERA, QUE ES VENDER EN BLOQUE O VENDER POR BOMBEO. ENTONCES LISTO. ESAS SON LAS TRES ALTERNATIVAS. CORRECTO. QUE NOS TOCARÍA METERLE. NOSOTROS SI VAMOS AQUÍ, TENEMOS QUE TENER POR LO MENOS UNA TARIFA. LA TARIFA NO ES AQUÍ, PUES DE QUE. ¿USTEDES QUÉ OPINAN? QUE CUANDO VAMOS A PAGAR. NO, SI LA VAMOS A. SI SEGUIMOS CON LO DE LA JUNTA Y O SEA, LA JUNTA VA A TENER DE TODOS MODOS SU ACUEDUCTO QUE TIENEN AHORITA, PERO SI TAMBIÉN QUIEREN MANEJAR EL ACUEDUCTO NUEVO, TENDRÍAMOS QUE HACER COMO UNA TARIFA DONDE SE INCLUYA EL PERSONAL QUE LES HEMOS DICHO. APARTE DE ESO, TENDREMOS QUE TENER UNOS QUÍMICOS QUE HAY QUE COMPRAR Y TODA ESA PARTE, PORQUE ESA PLANTA ES CON QUÍMICOS, UN CLORO, UN SULFATO DE ALUMINIO, ESA PARTE VERSUS EN EL OTRO LADO TENDRÍAMOS QUE TENER EN CUENTA LA TARIFA ACTUAL QUE MÁS O MENOS QUE TIENEN AHORITA LOS QUE VIVEN AQUÍ Y A ESE LE TENEMOS QUE AUMENTARLE EL COSTO DE LA ENERGÍA PORQUE ES QUE ALLÁ NOS TOCA BOMBLEAR COMO ESTAMOS PARA ARRIBA, ENTONCES ES ESO, NO ES EL MISMO, O SEA, YO NO VOY, TENGO QUE SERLES SINCERO, YO NO VOY A PAGAR LA MISMA TARIFA SI YO VIVO AQUÍ EN EL PARQUE QUE SI VIVO ALLÁ, PORQUE ALLÁ ACÁ VIENE POR GRAVEDAD, SERÍA MÁS CARO EL RECIBO DE ARRIBA, NO, ES QUE EN ESE SENTIDO, COMPARANDO LO QUE VIVEN AQUÍ EN EL CASCO URBANO QUE ESTÁN A GRAVEDAD CON NOSOTROS LO QUE TENEMOS QUE REVISAR EL TEMA ES EL COSTO CON ENERGÍA DE ACUAVALLE VERSUS A LOS COSTOS QUE TENEMOS DE NOSOTROS PARA TENERLA. ¿LA OPERATIVIDAD NO ESTÁ, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LISTO, NOSOTROS EN LA TARIFA TENEMOS QUE INCLUIR TAMBIÉN HAY QUE TENER, IR COMPRANDO TUBERÍAS, ACCESORIOS, PORQUE ESTO SE VA, ¿CIERTO? VERSUS, CREO QUE ESO LO TIENE YA ACUAVALLE, LO TIENE YA EN SU TARIFA DE REPOSICIONES Y TODA ESA PARTE, NECESITAMOS PESO, ESOS CASOS LOS TENDRÍAMOS QUE TENER NOSOTROS. ESAS SON LAS TRES ALTERNATIVAS. ¿CÓMO VAMOS NOSOTROS QUÉ VAMOS AHORITA? NOSOTROS YA HICIMOS ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO, YA ESO LO TENEMOS LISTO, HIZO TODA LA TOPOGRAFÍA, YA ESTÁ LISTA, SE HIZO EL TRABAJO, LO HIZO, YA HICIMOS EL TRABAJO SOCIAL TAMBIÉN SE HIZO UN ESTUDIO DE CARACTERIZACIONES, SE TOMARON LAS MUESTRAS DEL RÍO, DEL RÍO FRAILE, NO SON MUY BUENAS, PUES ESO, LA VERDAD ES QUE LA CALIDAD DEL RÍO NO ES MUY, MUY, MUY BUENA, O SEA, NOSOTROS

TENEMOS TODO LO DEL TRABAJO DE CAMPO, YA SE ENTREGÓ EL PRIMER INFORME QUE ES EL DIAGNÓSTICO, NOSOTROS EN ESTE MISMO MES ESTAMOS ENTREGANDO EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y EN EL MES QUE VIENE JULIO, Y EL PROPÓSITO ES QUE A FINAL DEL MES O A PRINCIPIOS DE AGOSTO HAGAMOS LA REUNIÓN CON USTEDES Y USTEDES NOS DIGAN, MIRA, NOSOTROS LES PRESENTAMOS LAS ALTERNATIVAS, USTEDES NOS DIGAN, VÁMONOS POR ESTA."

EL SEÑOR DANIEL CUCALON PREGUNTA: "USTEDES EL ESTUDIO NOS PUEDEN COMPARTIR?, O SEA, NOSOTROS EL ESTUDIO, ¿DIGAMOS DEL AGUA?"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: "ESO SÍ SE LE PUEDE COMPARTIR, DE TODOS MODOS, PUES, O SEA, ESO SE LE VA A PASAR, SÍ, SINO QUE NOSOTROS NO SOMOS NOSOTROS, O SEA, NOSOTROS TENEMOS UN PATRÓN QUE ES VALLECAUCANA, PERO YO CREERÍA, YO HAGO LA CONSULTA Y NO CREO QUE HAYA PROBLEMAS, PERO ENTIÉNDAME QUE, YO COMO CONSULTOR NO PUEDO ENTREGÁRSELOS, PERO ESO LO HACEMOS LA GESTIÓN CON VALLECAUCANA. VALE, NO HAY NINGÚN PROBLEMA."

DANIEL CUCALÓN: "¿UNA PREGUNTA ADICIONAL, ¿DIGAMOS LA COMPRA POR BLOQUES DE AGUA, NO ES LO MISMO? ¿HAY QUE TENER BOMBEO O NO SE PUEDE?"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: "¿NO, NO, NO, NO, NO, ES QUE ES LA MISMA COSA, O SEA, NOSOTROS, ¿NOSOTROS QUE TENDRÍAMOS QUE HACER? TENDRÍAMOS EL BOMBEO, O SEA, TENEMOS LA PLANTA, LA PLANTA LLEGA, TRATA SU AGUA, NOSOTROS HACEMOS EL TANQUE, NOS LA LLEVAN AL TANQUE Y TENEMOS EL BOMBERO. LO QUE HACEMOS ES, CUANDO YO HABLO POR BLOQUE ES QUE ELLOS LE COLOCAN ALLÁ EN LA PLANTA, COLOCAN UN MACRO MEDIDOR Y LE DICEN A USTED MENSUALMENTE USTED ME CONSUMIÓ "X", USTED LE PAGA POR ESOS "X". OTRO ES QUE ELLOS ENTREGUEN A CADA CASA Y LA CASA, ELLOS SE COMPROMETEN, CADA CASA QUE USÓ EL SERVICIO COBRA EL SERVICIO."

EL SEÑOR DANIEL CUCALON INTERVIENE: "PERO NO ENTENDIENDO, YO TENGO ENTENDIDO QUE EL BLOQUEADOR ES PARA QUE LLEGA A LAS INSTALACIONES DE NOSOTROS Y AHÍ SEAN SUMINISTRADAS"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: "SÍ, SÍ, BUENO, LO QUE PASA ES QUE AHÍ NOS TOCARÍA HACER OTRO TANQUE. NO, O SEA, POR BLOQUE ES QUE LA PLANTA DE ACUAVALLE TRATA EL AGUA Y TE LA MANDA. USTED VERÁ SI LA TRAEMOS, HAY UNA OPCIÓN DE TRAERLA ACÁ, PERO SERÍA DOBLE. HAY QUE HACER OTRO TANQUE PORQUE COMO LA IDEA ES QUE NO VAMOS A UTILIZAR SUS. NO PODEMOS COGER AQUÍ Y TRAERLO AL TANQUE DONDE USTEDES TIENEN SU AGUA QUE VIENE DIRECTA"

EL SEÑOR DANIEL CUCALON INTERVIENE: "PERO, AHÍ PERDERÍAMOS AUTONOMÍA PORQUE DIGAMOS AQUÍ NO VA A DARSE POR MI ZONA"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: "NO, NO, NO, POR ESO, O SEA, SI USTED LE COMPRA, O SEA, EN ESTE MOMENTO YO VIVO EN PALMIRA, LE COMPRA AGUA OCCIDENTE, EL AGUA EN BLOQUE, ENTONCES ELLOS SIMPLEMENTE LE PASAN A USTED, LE PASAN LA FACTURA, MIRE, USTED CONSUMIÓ (1.000) MIL METROS CÚBICOS, O SEA, LO QUE SALIÓ DE LA PLATA PARA USTEDES, USTEDES LO LLEVAN ALLÁ. LO PODEMOS, LO QUE PASA ES QUE HARÍAMOS UN BOMBEO Y DESPUÉS VOLVERLO A LLEVAR Y TENEMOS QUE HACER UN TANQUE NUEVO Y ESE TANQUE NUEVO VOLVER A DIVIDIR, PERO BOMBEO TAMBIÉN, ES QUE NO HAY OTRA FORMA DE LLEGAR DEL LOTE DE LA PLANTA. NO HAY OTRA FORMA DE LLEGAR.

DANIEL CUCALON PREGUNTA: "¿Y SI NOSOTROS DIGAMOS, OPTAMOS POR LA CREACIÓN DE UN NUEVO TANQUE?"

INGENIERO EDWARD SALAMANCAR RESPONDE: "NO, ESA ES LA PRIMERA OPCIÓN. NO, POR ESO, ESA ES LA PRIMERA OPCIÓN. LA PRIMERA OPCIÓN ES TOMAR NOSOTROS, OLVIDARNOS DE ACUAVALLE Y COGER NOSOTROS EL AGUA, TRATARLA, HACERLE AMPLIAR LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y HACER UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA RED. SÍ, ESO SE LE HACE. LO OTRO ES TRAER EL AGUA DE ALLÁ. ALLÁ TIENE SU PROBLEMA QUE SI USTED LA COMPRA POR BLOQUE, PERO RESULTA QUE CINCO PERSONAS NO LE PAGAN, USTED ASUME EL COBRO, USTED NO LE PUEDE. ES QUE ESTE MES NO ME PAGARON LOS 300, ME PAGARON SINO 295."

EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO INTERVIENE: "CLARO, TIENE QUE PAGAR EL COBRO, LO HACÍAMOS NOSOTROS ESO. INGENIERO, PARA HACERLE UNA CLARIDAD A ELLOS, EL TEMA DE LOS BOMBEO, DE LOS BLOQUELONES, QUE ESTÁ DICIENDO ALLÍ OBLIGATORIAMENTE LE TOCARÍA HACER UNA ASOCIACIÓN LO QUE ESTAMOS DICIENDO, AUNQUE ENTIENDO QUE YA NO. EXACTO. YA, PERDÓN UN SEGUNDITO. ENTONCES A TRAVÉS DE ESA ASOCIACIÓN USTEDES VAN A SER RESPONSABLES DE REUNIR LOS PRESUPUESTOS DEPENDIENDO LO QUE CADA UNO GASTE CON LA JUNTA Y PARA QUE TENGAN CÓMO PAGARLE A ACUAVALLE. ¿USTED CUANDO USTED HABLA DE AUTONOMÍA, USTED VA A SER AUTÓNOMO PORQUE TIENE SU ASOCIACIÓN?"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA INTERVIENE: "SÍ. DE LAS TRES OPCIONES USTEDES SIGUEN SIENDO AUTÓNOMOS, O SEA, UNA ES QUE BUENO, USTEDES VAN A IR CON SU AGUA DE RIEGO, USTEDES SIGUEN SIENDO DE LAS TRES, USTEDES SON AUTÓNOMOS. EL DOS, UNA QUE SE AMPLÍE LA PLANTA DE ACÁ Y SE TOME EL AGUA DEL RÍO, PUES VAMOS A TENER LOS LIMITANTES DE QUE LLOVIÓ Y SE TAPÓ EL RÍO, LISTO, PERO ESO LO TENEMOS, CON ESO HEMOS VIVIDO. LISTO, Y USTEDES COBRAN. LA OTRA BLOQUE, USTEDES TAMBIÉN VAN A COBRAR. YA, EL OTRO ES CON ACUAVALLE, QUE ENTONCES YA ACUAVALLE LE DICE SI LOS CINCO NO PAGAN, PUES LES QUITA EL AGUA A LOS CINCO ACUAVALLE.

LA ALTERNATIVA UNO, QUE ES LA DE TOMAR NOSOTROS EL AGUA Y SEGUIR NOSOTROS MANEJANDO. VAMOS A TENER UNA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN QUE VA A SER UNA CAJITA DONDE VAMOS A DECIR AQUÍ LLEGAN 15 LITROS, 6 SE VAN PARA ACÁ Y LOS OTROS 9 SE VA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE TIENEN AHORITA. Y ALLÍ VAMOS A UN DESARENADOR, VAMOS A AMPLIAR LA PLANTA AGUA POTABLE, HAY QUE METER UN BOMBEO PARA ALIMENTAR

LA PLANTA AGUA POTABLE. DESPUÉS VAMOS A HACER UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO Y UNAS REDES NUEVAS, 4 KILÓMETROS NUEVOS PORQUE ALLÁ TENEMOS QUE MANGUERAS, QUE TUBERÍAS, NO VAMOS A METER TUBERÍA DE PRESIÓN EN LOS DIÁMETROS. LISTO, ESA ES PARA ALTERNATIVA 1. LA ALTERNATIVA 2 Y 3. AH, Y VAN LOS MEDIDORES. Y VAN LOS MEDIDORES.

EL SEÑOR DANIEL CUCALON PREGUNTA: "DISCULPE INGENIERO, Y EN ESA ALTERNATIVA 1 ES DONDE NECESITAMOS LOS 4 OPERADORES, EL FONTANERO"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: "CLARO, TODO EL PERSONAL QUE TIENE UNA PTAP, UN PROYECTO COMPLETO, MEJOR DICHO, SERÍAN USTEDES SU PROPIA EMPRESA, SERÍAN LO QUE HACE ACUAVALLE, PERO LO HARÍAN EN MENOR ESCALA, AQUÍ ES DONDE USTEDES TIENEN QUE MIRAR QUÉ ALTERNATIVA LES CONVIENE MÁS. SI VAMOS A FUNCIONAR COMO UNA MINI EMPRESA, LITERAL, UNA PEQUEÑA EMPRESA.

LA SEÑORA FRANCY VELEZ INTERVIENE: "¡Y POR ESO ES BUENO ESTAS REUNIONES! ... PORQUE AQUÍ NOS VAMOS A DAR CUENTA. ENTONCES MIREMOS CUÁNTO NOS VALE, CUÁNTAS PERSONAS REALMENTE NECESITAMOS PARA FUNCIONAR. VAMOS A TENER QUE, TENER UNA SECRETARIA, VAMOS A TENER QUE, TENER UN SITIO OFICINA, UNA IMPRESORA PARA UN PUNTO DE PAGO. ENTONCES ES MIRAR ESA COMPARADO CON LAS OTRAS DOS OPCIONES. Y SI LA OPCIÓN 1 ME SIRVE PORQUE YO VOY A HACER EL MANEJO, PERO LA OPCIÓN 2 ME SIRVE MÁS PORQUE ES QUE YO LO ÚNICO QUE TENGO QUE TENER ESO, UN PUNTO DE PAGO Y UNA SECRETARIA."

LA SEÑORA LIZED ROSAS PREGUNTA: "¿POR QUÈ DICEN QUE SE NECESITA LA FUNCIÓN DE 4 OPERADORES?"

INGENIERO EDWARD SALAMANCA EXPLICA: "NO, NO, LO QUE PASA ES QUE USTED ¡VENGA, LE VOY A EXPLICAR! PORQUE USTED TIENE QUE TENER UNA PERSONA EN LA PLANTA, PORQUE USTED TIENE QUE ESTAR CLARO, 24 HORAS. USTED NO LA PUEDE PONER A TRABAJAR 24 HORAS, O SEA, POR LEY SON 8 HORAS. ENTONCES 24 SERÍAN 3 EN EL DÍA. PERO USTED NO SÉ POR QUÉ, PERO CUANDO USTED COMPLETA LA SEMANA, USTED NO PUEDE TENER TRES DÍAS, LOS MISMOS TRES TIENE QUE TENER SIEMPRE LE DA CUATRO PERSONAS MÁS PARA QUE ELLOS SE VAN TURNANDO. ENTONCES HAY UNO QUE DESCANSA UN DÍA. ES POR ESO, ES POR ESE TEMA. LISTO. LA SEGUNDA ALTERNATIVA YO LA COMPRO POR BLOQUE. ¿QUÉ HACEMOS DE INFRAESTRUCTURA? HAY UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UN EQUIPO DE BOMBEO Y LAS REDES DE ALCANTARILLADO. Y SE PUEDE CONSIDERAR LA IDEA DE PONER UN TANQUE ABAJO, ARRIBA Y OTRO TANQUE ARRIBA. PERO PUES ESO NOS LO DIRÁ DESPUÉS EL DISEÑO DEFINITIVO. SI SE NECESITA. NO SERÍA NECESARIO, PERO SE PUEDE PENSAR COLOCAR EL TANQUE. ¿ES ESA LA INFRAESTRUCTURA QUÉ HACEN USTEDES? ¡EN ESA ALTERNATIVA TAMBIÉN HABRÍA MEDIDORES! SI, NO TODOS. EN LAS TRES ALTERNATIVAS DEBE HABER MEDIDORES. EN LA ALTERNATIVA POR BLOQUE YO TAMBIÉN DIGO, O SEA, YO SIMPLEMENTE LE COMPRO EL AGUA A LAS MEDICIONES

DE LOS MEDIDORES, PERO ESTÁ EL RIESGO DE LO DEL PAGO, QUE NO TODOS PAGUEN Y LE TOQUE A LA JUNTA ASUMIR, YO LES PAGO A LOS DE ACUAVALLE Y LA OTRA ES QUE ACUAVALLE SE ENCARGA DE TODO. ACUAVALLE SE ENCARGARÍA DE TODO. Y EN LA TERCERA OPCIÓN ES ACUAVALLE QUIEN DETERMINA SI CORTA EL AGUA, SI NO PAGA TALES PREDIOS, PERO OBVIAMENTE TIENE UN ARANCEL QUE ES LA ENERGÍA POR BOMBEO. EN ESE ORDEN DE IDEAS TENEMOS CLARO QUE NO VAMOS A USAR NADA DE LO EXISTENTE.

ACUAVALLE NOS COLOCARÍA UNA TARIFA, COLOCARÍA UN MACROMEDIDOR A LA ENTRADA DEL TANQUE Y MENSUALMENTE PAGARÍAMOS ESO Y NOSOTROS HARÍAMOS LA REDISTRIBUCIÓN CON LOS MICROMEDIDORES Y REALIZAREMOS EL PROCESO DE COBRO. NOS TOCA EVALUAR LA SITUACIÓN DE AHÍ, QUÉ NOS HARÍA MÁS RENTABLE, SI TENER ALLÁ NUESTRA PLANTA, CON LA INVERSIÓN QUE SE REQUIERA Y TODO, O UTILIZAR EL SERVICIO DE ACUAVALLE QUE YA TIENE UNA INFRAESTRUCTURA MONTADA Y ESO ESTÁ LISTO. EN LA REUNIÓN QUE VAMOS A TENER NOSOTROS, APARTE DE PLANTEARLE LAS ALTERNATIVAS, LE VAMOS A DECIR: LOS COSTOS DE INVERSIÓN SON ESTOS; PARA LA ALTERNATIVA 1 SON ESTOS, Y LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 SON ESTOS Y ESTOS.”

EL SEÑOR DANIEL CUCALON INTERVIENE: “LO QUE PASA ES QUE MIRANDO LAS SOLUCIONES QUE USTED DA, O SEA, A MÍ, A MI CONCEPTO, LA ÚLTIMA ES LA QUE USTED DICE QUE ACUAVALLE SE ENCARGARÍA DE TODO. ÉL COLOCARÍA SU MEDIDOR, TE LLEGÓ TU RECIBO, ME TOCA PAGAR TANTO, VENGO A ACUAVALLE, PAGO MI AGUA Y SE ACABÓ. NO SE NECESITAN CUATRO EMPLEADOS, NO SE NECESITAN A ESO PORQUE ACUAVALLE TIENE UN PESO URGENTE. O SEA, SERÍAN COSAS QUE SE AHORRARÍAN PRÁCTICAMENTE.”

INGENIERO EDWARD SALAMANCA: “¿PERO LES TENGO QUE SER SINCERO QUE VA A SER DIFERENTE? EL PRECIO, LES HEMOS DICHO: LAS TARIFAS, NO, MIREN, ¿QUIÉNES VIVEN AQUÍ? BUENO, NINGUNO. ENTONCES, SI ALGUIEN SE VA A VIVIR AQUÍ, ¿QUÉ ES ESE COSTO? INCLUSO, PUES TENEMOS QUEJAS CONSTANTES, IGUAL, PORQUE LOS COSTOS SON ELEVADOS, ESTANDO NOSOTROS EN ZONA URBANA. UN RECIBO NORMALMENTE, DIGAMOS, PORQUE TAMBIÉN ES POR ESTRATO, ¿NO? EN ESTRATO UNO PUEDE LLEGAR A 40, 50, 60; ESTRATO TRES ESTÁN PAGANDO ENTRE 120 HASTA 180 MIL PESOS EN ADELANTE.”

LA SEÑORA ISLENA PORTILLA INTERVIENE: “EL CONSUMO SERÍA MÍNIMO PORQUE SERÍA SOLO PARA LA CASA, PARA ALIMENTOS Y DEMÁS, LOS ANIMALES Y SEMBRADOS SIGUE CON NUESTRO PROPIO ACUEDUCTO.”

INGENIERO EDWARD SALAMANCA EXPLICA: “UNA FAMILIA CON CUATRO O CINCO PERSONAS DEBEN CONSUMIR 26 METROS CÚBICOS AL MES, EL MÁXIMO, O SEA, ESTÁ ENTRE 20 A 26, ¿SÍ? O SEA, NOSOTROS DISEÑAMOS CON UN METRO CÚBICO, QUE SERÍA 30 METROS CÚBICOS, O SEA, EL CRITERIO DE DISEÑO ES UN METRO CÚBICO, O SEA, 30 METROS CÚBICOS AL MES, PERO ESO VA SOBRADO, LA IDEA ES QUE ESO ESTÉ ENTRE 20 A 26.”

EL SEÑOR DANIEL CUCALON INTERVIENE: "BUENO, YO PUES YA TENGO QUE SALIR PORQUE TENGO COMPROMISOS, PERO SÍ QUIERO DAR UNOS PUNTOS CLAROS DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, PUES SI SE MANIFIESTA QUE SÍ, OBTIENIENDO SE VA A HACER UNOS COBROS POR UN AGUA YA POTABILIZADA. LA IDEA FUNDAMENTAL ES QUE LOS RECURSOS SEAN INVERTIDOS AHORA MISMO EN EL CORREGIMIENTO, INVERSIONES DE QUE TENGAMOS NOSOTROS AUTONOMÍA PARA ARREGLAR LOS INCONVENIENTES DEL PRODUCTO, PARA ARREGLAR LOS INCONVENIENTES QUE TENGAMOS, PORQUE MUCHAS VECES NOSOTROS HEMOS SENTIDO ABANDONO ESTATAL Y ESO NO ES NUEVO. ESO ES ALGO QUE SIEMPRE NOSOTROS HEMOS TENIDO EL INCONVENIENTE DE QUE SI NO HACEMOS PAROS, QUE SI NO ALEGAMOS, QUE SI NO LLAMAMOS LA ATENCIÓN, A NOSOTROS NUNCA NOS PRESTAN ATENCIÓN Y NUNCA NOS DAN SOLUCIONES PLENAS. NO SÉ SI ACUAVALLE VAYA A QUERER FIRMAR UN ACUERDO O QUERER, DIGAMOS, EJEMPLO, SUPONIENDO LA HIPÓTESIS QUE SE UTILICE LA TERCERA ALTERNATIVA, CUÁL SERÍA EL AMARRE, PUES COMO ASÍ DECIRLO PARA LA INVERSIÓN A NUESTRA COMUNIDAD, A NUESTROS TERRITORIOS, PORQUE SÍ, OBTIENIENDO DEJAMOS QUE NO EXISTA LA AUTONOMÍA, NO VAMOS A CONTAR CON NUESTRAS DECISIONES DE NUESTROS PROPIOS RECURSOS QUE NOSOTROS INVERTIMOS EN EL AGUA. ENTONCES ESO HAY QUE DEJARLO MUY CLARO Y TAMBIÉN EXPLICARLO A LA POBLACIÓN, LAS ALTERNATIVAS Y CUÁL SERÍA LOS PRO Y LOS CONTRAS, PARA QUE DIGAMOS, SEPAMOS NOSOTROS CUÁL VAMOS A TOMAR. COMO LE DIGO, LA COMUNIDAD SIEMPRE HA QUERIDO GANAR SU AUTONOMÍA, HASTA EL MOMENTO, FUERA DE ESTO, LA IDEA ES QUE EL INFORME LLEGUE TAMBIÉN EN CUANTÍAS, EJEMPLO, QUE NOS DEN, OBTIENIENDO NOSOTROS COMO JUNTA VAMOS A INVESTIGAR CÓMO FUNCIONAN OTROS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS, OTROS ACUEDUCTOS CON AGUA POTABLE, COMO EL DE MIRANDA, QUE SON ACUEDUCTOS PROPIOS, Y VAMOS A TAMBIÉN INVESTIGAR EN OTRAS ZONAS QUE HAYAN ACUEDUCTOS PROPIOS, PARA PODER REVISAR Y DECIR CÓMO FUNCIONARÍA."

INGENIERO EDWARD SALAMANCA RESPONDE: "SÍ, UNA COSA ES QUE EL ACUEDUCTO SEA PEQUEÑO, OTRA COSA ES EL PROCESO DE TRATAMIENTO. AQUÍ ES UN PROCESO QUE USTED, AGUA QUE ENTRA, TIENE QUE APLICARLE UNOS QUÍMICOS, TIENE QUE ESTAR HACIENDO UNAS PRUEBAS, Y NO ES QUE ESO SE PROGRAMA Y USTED LE DICE: TODOS LOS DÍAS VAMOS A ECHAR 5 DE ESTO Y 3 DE ESTO. NO, ELLOS TIENEN QUE LLEGAR, TOMAN LAS MUESTRAS, HACEN UNOS ANÁLISIS Y DICEN: LISTO, HOY NO LE VAMOS A ECHAR LOS 5 PORQUE EL AGUA ESTÁ MUY TURBIA, VAMOS A SUBIR A 7, VAMOS A ESTO, SI ME ENTIENDE, ES ESO. ENTONCES, DIGAMOS, QUE USTEDES, CON ACUEDUCTOS QUE FUNCIONAN, PORQUE ACUEDUCTOS ABANDONADOS TENEMOS TODOS LOS QUE QUIERAN, SÍ. Y ENTONCES ELLOS LLEGAN Y TE DICEN, Y PRIMERO QUE TODO TENEMOS QUE SER CONSCIENTES Y NO VAMOS A PAGAR LOS 5 MIL PESOS. ¿CUÁNTO PAGAMOS? 7 MIL, 7 MIL NO VAMOS A PAGAR. NO, NOS TENEMOS QUE OLVIDAR DE ESO, ¿SÍ? YO VIVO EN UNA ZONA RURAL DE PALMIRA, YO PAGO 36 MIL PESOS. ENTONCES, BUENO, SÍ, SINO QUE NOS TENEMOS QUE OLVIDAR DE ESA PARTE. USTED SIGUE PAGANDO LOS 7 PARA USAR AGUA PARA RIEGO. LA QUE VA A QUEDAR

AHÍ.”

EL SEÑOR DANIEL CUCALON INTERVIENE: “DE TODAS MANERAS, HAY QUE MIRAR, Y ES IMPORTANTE QUE LOS INGENIEROS HAY QUE REVISAR POR QUÉ LOS OTROS ACUEDUCTOS QUE LOS HA MANEJADO LA COMUNIDAD HAN FRACASADO. ¿CÓMO FUNCIONA? ESO TIENE UNA BUENA INVESTIGACIÓN. PORQUE ARRANCAMOS CON MUCHAS GANAS Y DESPUÉS, CUANDO EMPIEZAN A HABER FALLAS, QUE LA GENTE NO PAGÓ, QUE ESTO, IGUALMENTE, YO QUEDO ATENTO AL ACTA DE LO QUE SE VAYA A IMPONER AQUÍ.”

EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO INTERVIENE: “AQUÍ NO VAMOS A DECIDIR NADA, ESTO ES INFORMATIVO. HOY LES ESTAMOS CONTANDO QUÉ VAMOS A HACER, Y YA ... ES UNA JUNTA, CUANDO HAGAMOS LA REUNIÓN GRANDE, QUE LA GENTE DIGA, ES QUE, A VER, YO LES COMENTO OTRA COSITA. LO QUE PASA DENTRO DE ESTOS PROCESOS, SE MANEJAN 3 SOCIALIZACIONES: UNA INICIAL, QUE FUE LA PRIMERA; UNA INTERMEDIA, QUE TENEMOS QUE HACER YA CUANDO ESTÉN LAS OPCIONES ESTRUCTURADAS Y LA FINAL, QUE ES CUANDO VAMOS A TOMAR LA DECISIÓN. ESA ES CON TODA LA COMUNIDAD, COMO HICIMOS LA PRIMERA.”

EL SEÑOR DANIEL CUCALON DICE: “IGUALMENTE, ME GUSTARÍA QUE PRONTO QUEDARA ESTIPULADO EL PROMEDIO DEL TIEMPO QUE VA A QUEDAR YA PARA ESA OTRA REUNIÓN.”

EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO CONTINUA: “¡NO, NO, ¡NO! ESO NO DEPENDE. NOSOTROS TENEMOS QUE HACER EL INFORME, PASARLO A INTERVENTORÍA, Y UNA VEZ INTERVENTORÍA LO APRUEBE, NOS VAMOS CON USTEDES Y SE LOS PRESENTAMOS. LA IDEA ES CON TIEMPO, ORGANIZAR TODAS LAS REUNIONES. NO HAY LIO, COMO A PRINCIPIOS DE AGOSTO.

LA SEÑORA MAIDY ANDREA ZUÑIGA INTERVIENE: “YO ENTIENDO DE LA AUTONOMÍA, DISCULPEN, PERO HAY QUE TAMBIÉN TENER LOS PIES EN TIERRA, PORQUE ES QUE, MÁS O MENOS, UN OPERARIO BÁSICO SON 2 MILLONES DE PESOS QUE LE CUESTA. ENTONCES HABLAMOS DE AUTONOMÍA, PERO SI SON 15 PERSONAS, ¿CUÁNTO LE CUESTA A TODA LA COMUNIDAD MANTENER TODA ESTA PERSONA? SI QUEREMOS NOSOTROS HACER, ES QUE ES MUY BUENO DECIR HAGÁMOSLO NOSOTROS Y YO ESO LO RESPETO. PERO, CON UN PEDREGAL QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA TIENE QUE TRABAJAR CON LAS UÑAS, SE DAÑAN, PERO SON LOS MISMOS 5 QUE SALEN, LOS DEMÁS NO SALIERON; CON GENTE QUE PELEA Y NI SIQUIERA PAGA. ENTONCES, HAY QUE SER TAMBIÉN CONSECUENTE EN TENER LOS PIES EN LA TIERRA. SI TENEMOS AGUA POTABLE NOS VA A COSTAR, Y YO SÉ QUE NO VAMOS A SER NOSOTROS MISMOS LOS QUE VAMOS A ORGANIZAR PORQUE YA SE NOTA, SE NOTA LA DESUNIÓN. NOMÁS CON EL ALCANTARILLADO, ¿QUIÉNES SABÍAN? LOS MISMOS... O SEA, QUE LA TARIFA DE 7 MIL PESOS TAMBIÉN LA HACEN. SE NECESITABA ALGO, NADIE TENÍA, NADIE PODÍA, NADIE SABÍA, NADIE NADA.

ENTONCES, PARA MÍ ERA MUY PARTICULAR Y ESO TIENEN QUE ANALIZARLO MUY BIEN. SÍ QUEREMOS AUTONOMÍA, PERO VENGA, ¿TENEMOS PARA SER AUTÓNOMOS? ¿SOMOS UNIDOS

PARA SER AUTÓNOMOS? SON LAS COSAS QUE HAY QUE ANALIZAR. ES QUE UNO PUEDE HABLAR DE AUTONOMÍA, PERO SI YO NO LA TENGO Y NO ESTOY ORGANIZADA, VA A SER DIFÍCIL. Y YO CREO QUE, EN ESTE MOMENTO, NO TENER AGUA POTABLE, EN ESTE MOMENTO... FATAL, FATAL. ENTONCES, YO SÍ CREO QUE TIENEN QUE TAMBIÉN... O SEA, NO ES QUE TAMBIÉN TENGAN PIES EN TIERRA Y QUE SEAN CONSECUENTES EN LO QUE QUEREMOS Y LO QUE QUIEREN. ES MUY BUENO SER AUTÓNOMOS, PERO SI NO TENEMOS LA CAPACIDAD NOS TOCA HACERNOS UN LADITO Y MIRAR QUÉ VAMOS A ORGANIZAR, PORQUE ESO ASÍ NO... NO, Y TIENE EL PROBLEMA QUE YO SOY DE LA JUNTA. ENTONCES, ¿CÓMO LO VA A QUITAR AL VECINO? EL VECINO NO LE VA A QUITAR EL AGUA. ENTONCES VIENE LA OTRA Y DICE: A MÍ, ¿POR QUÉ SI ME LO QUITÓ Y ESTE LLEVA 3 MESES? ESO ES DELICADO.”

CONTINUA EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO: “UNA PEQUEÑA ACOTACIÓN. LO QUE DICE LA SEÑORA, EL INGENIERO EXPRESÓ AHORA QUE ÉL VA A HACER UNA ESPECIE DE PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS PARA TRAERLA Y CON BASE EN ESO SE ANALIZA. MIRAR Y LUEGO INTERNAMENTE SE TOMA LA DECISIÓN. PARA CUANDO SEA LA ASAMBLEA GENERAL YA HAYA CLARIDAD INTERNAMENTE, QUE POR ESO ES LA IMPORTANCIA DE ESTA REUNIÓN.”

INTERVIENE EL SEÑOR RUBEN ROSERO: “PUES HOMBRE, AQUÍ HAY ALGO MUY INTERESANTE. LO QUE DICE AQUÍ NUESTRA VECINA ES AJUSTADO A LA REALIDAD Y AQUÍ NO NOS PODEMOS PONER MÁSCARAS. TENEMOS QUE DECIR LAS COSAS COMO SON Y ATERRIZADOS A LA REALIDAD. EL TEMA DEL ACUEDUCTO DEL PEDREGAL ES NECESARIO. NOSOTROS LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS TOMANDO AGUA DE ACUAVALLE, PERO PORQUE ES GRATIS. TODOS VAMOS A ACUAVALLE, ODIAMOS ACUAVALLE, EL LOGOTIPO, LO ODIAMOS, LO PUTEAMOS, PERO TOMAMOS AGUA DE ACUAVALLE POR UNA SOLA RAZÓN: PORQUE ES QUE EL AGUA QUE TOMAMOS DE LA LLAVE ES GRATUITA. ODIAMOS ACUAVALLE, PERO EL AGUA NO. EL AGUA ES DE ALTA CALIDAD. AHORA, EL TEMA DEL SERVICIO COMUNITARIO TENDRÍA QUE ESTAR LIGADO A LA LEY 149. SÍ, CORRECTO. SE DICE, POR LO QUE LE ESCUCHABA AHORA, QUE NOSOTROS COMO ACUEDUCTO COMUNITARIO NO SE LE ESTÁ PAGANDO A CVC EL AFORO DEL AGUA. O, ES QUE NO ESTAMOS LEGALIZADOS. NI SIQUIERA ESTAMOS LEGALIZADOS. ES POSIBLE QUE NOSOTROS VAMOS Y NOS DIGAN... ESTE TEMA ES SUPREMAMENTE INTERESANTE PORQUE, ASÍ COMO UNA VEZ QUE ESTUVIMOS AHÍ QUE NOS ACOMPAÑÓ USTED EN LA REUNIÓN DEJAMOS QUE HABLARA TODA LA GENTE PARA MIRAR EN QUÉ NIVEL ESTAMOS. SI NOSOTROS VAMOS A ESTABLECER EL ACUEDUCTO COMUNITARIO VAMOS A ESTAR REGIDOS POR LA LEY 149 DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEBEMOS DE TENER AFORO DE AGUA. ENTONCES EN ESA FACTURA HAY QUE TENER EN CUENTA QUE HAY QUE PAGARLE A LA CVC PRIMERO LA CONDUCCIÓN DEL AGUA, QUE EL NACIMIENTO DE LA CVC. HAY QUE PAGARLE A LA CVC.”

INTERVIENE EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO: NOSOTROS TUVIMOS REUNIÓN CON CVC Y SE NOS DIJO: ELLOS NO ESTÁN LEGALIZADOS, Y, ES MÁS, AQUÍ NO HAY NINGUNA RESOLUCIÓN DE CVC DE AFORO.

CONTINUA EL SEÑOR RUBEN ROSERO: “ENTONCES PÓNGANLE CUIDADO, ESE AFORO VA

CARGADO A LA FACTURA. TENDRÍAMOS QUE ESTAR LIGADOS A LA LEY 149 DE SERVICIOS PÚBLICOS A PARTIR DE QUE SE INSTALE LA RED DE DISTRIBUCIÓN NUEVA DE AGUA POTABLE. ESA VA A CARGO DE QUIÉN. Y SI VAMOS LIGADOS A LA LEY 149 DE SERVICIOS PÚBLICOS, A PARTIR DE LA RED PRINCIPAL HACIA LA DOMICILIARIA, LA INTRADOMICILIARIA VA A CARGO DEL USUARIO. ENTONCES ESA RED DE DISTRIBUCIÓN, ¿QUIÉN LA PAGA? Y A PARTIR DE LA RED DOMICILIARIA INTRADOMICILIARIA VA A CARGO DEL USUARIO. UN MEDIDOR ESTÁ ALREDEDOR DE 400 MIL PESOS CON LA LÍNEA ACUAVALLE.

ENTONCES ESOS GASTOS OPERATIVOS, ESOS GASTOS DE INSTALACIÓN DE RED, HAY QUE DECIRLE AL USUARIO, A CUALQUIERA DE NUESTROS HABITANTES DEL PEDREGAL, QUE SOLAMENTE POR EL MEDIDOR LE VAN A COBRAR 400 MIL PESOS. ENTONCES TODO ESO HAY QUE DECÍRSELO. DECIMOS: QUEREMOS AUTONOMÍA PROPIA. PERO COMO DECÍA AQUÍ TU ESPOSA, ¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE SALEN A FRENTAR EL TAJO CUANDO LA COSA SE PONE DIFÍCIL? ENTONCES TODO ESE TEMA TIENE QUE ESTAR MUY BIEN ANALIZADO PORQUE ALLÁ EN EL PEDREGAL, EN NUESTRA COMUNIDAD, HAY MUCHOS ODIOS, HAY MUCHOS ODIOS POR ESE TEMA DEL AGUA. ENTONCES LA PERSONA QUE EL PAPÁ HACE 60 AÑOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ESE CANAL CREE QUE HOY NO LE PUEDEN COBRAR EL AGUA PORQUE EL PAPÁ AYUDÓ A HACER LA CHAMBA. ENTONCES, ¿CÓMO SERÍA LA METODOLOGÍA? YO ESCUCHO QUE HAY MUCHAS TRABAJADORAS SOCIALES. ¿YA LAS TRABAJADORAS SOCIALES TOCARON ESE TEMA? ¿YA TOCARON ESA PARTE SENSIBLE? ¿YA TIENEN DOCUMENTADO TODA ESA PARTE?"

INTERVIENE LA SEÑORA FRANCY VELEZ: "NO, NO, PORQUE ESTO SE LLAMA ESTUDIO Y NOSOTROS LO QUE HACEMOS ES EL ACOMPAÑAMIENTO DESDE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ORGANIZAR ESTAS REUNIONES. EN CASO DE QUE SE PRESENTEN CONFLICTOS EN EL TERRITORIO CON LAS PERSONAS QUE ESTÁN HACIENDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, NOSOTROS HARÍAMOS LAS INTERVENCIONES. NUESTRA FUNCIÓN ES CONOCER LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD Y HACER EMPALME CON USTEDES PARA SABER CÓMO FUNCIONA LA COMUNIDAD, CÓMO FUNCIONA EL ENTORNO ALLÍ. PERO REALMENTE ESTE ACOMPAÑAMIENTO YA LO VIENE A HACER VALLECAUCANA DE AGUAS DESDE ESTA MISIÓN."

CONTINUA EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO: "¡CLARO! ... UNA COSITA, MIRA. ENTRE LAS OBRAS A EJECUTAR ESTARÍA TODAS LAS OBRAS QUE ESTAMOS ENUMERANDO, QUE ES HACER EL DESARENADOR, HACER EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SI VAMOS A HACER LA ESTACIÓN DE BOMBEO SI SE NECESITA, LAS REDES Y HASTA LOS MEDIDORES ESTARÍA A CARGO, NO DE NOSOTROS, SINO DE LA GOBERNACIÓN. ENTONCES YO CREO QUE USTEDES ENTIENDAN PRIMERO QUE TODO: USTEDES SON UNOS AFORTUNADOS PORQUE LA GOBERNACIÓN SACA PROYECTOS A DESARROLLAR. EL OTRO AÑO NO SACA NINGÚN PROYECTO DE DISEÑO PORQUE NO LE INTERESA QUE ELLA NO ESTÉ EN EL 2028. ENTONCES ELLA NECESITA EJECUTAR. NOSOTROS TRABAJAMOS CON VALLECAUCANA. HACE OCHO DÍAS, A LAS DOCE Y MEDIA DEL DÍA, NOS CITÓ A TODOS LOS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN PROYECTOS, PORQUE NECESITA TENER LOS PROYECTOS EN OCTUBRE LISTOS PORQUE ELLOS TIENEN QUE HACER LAS LICITACIONES A FINAL

DE AÑO Y SE PUEDAN EJECUTAR EL PRÓXIMO AÑO. ENTONCES YA USTEDES DIRÁN... ES MÁS, NOSOTROS VIMOS LA SOCIALIZACIÓN, AQUÍ LA GENTE EMPEZÓ A GRITAR: NOSOTROS NO QUEREMOS AGUA, NO SÉ QUÉ MÁS. LLAMAMOS A VALLECAUCANA: LISTO, ENTONCES CAMBIEMOS A OTRO MUNICIPIO, PORQUE ATRÁS DE USTEDES HAY OTROS MUCHOS CORREGIMIENTOS, INGENIERO, SI ES POSIBLE, POR ESCRITO, ENTREGARLES A ELLOS LA ALTERNATIVA BIEN CLARITO. LA PRÓXIMA TRAER LA ALTERNATIVA Y CON BASE EN ESO AQUÍ LA PODEMOS HACER.”

INTERVIENE EL EÑOR RUBEN ROSERO: “SI TRAEN UNA PRESENTACIÓN PARA NOSOTROS MIRAR PRESUPUESTOS, AHÍ ESTÁ TODO PARA QUE HAGAMOS ALGO BIEN ILUSTRADO, PORQUE LO QUE DICE EL SEÑOR ES CIERTO. SI NOSOTROS NO TENEMOS CLARIDAD EN LAS REUNIONES, ENTONCES AHÍ ES DONDE SE FORMAN LOS OBJETOS. NOSOTROS MISMOS EMPEZAMOS A EXPLICARLE A LA GENTE PORQUE LA GENTE NO HA ENTENDIDO. ES INCOMPRENSIBLE, ESO ES NORMAL. PERO SI LLEVAMOS CLARIDAD... Y HAY ALGO MUCHO MÁS IMPORTANTE: LAS ESTRATEGIAS QUE SE VIENEN PARA FORTALECER EL PROYECTO. PORQUE ES QUE NOSOTROS QUEREMOS ALGO, HAY QUE ADICIONARLE ESTRATEGIAS A PARTIR DEL TEMA, PERO A MÍ ME VOY SORPRENDIDO POSITIVAMENTE PORQUE NOS DICE DON EDUARDO QUE EL PROYECTO INCLUYE LOS MEDIDORES.”

INTERVIENE LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO: “QUÉ PENA, BUENOS DÍAS. QUÉ PENA LOS QUE NO ME CONOCEN, MI NOMBRE ES ANDREA LONDOÑO. LLEGUÉ TARDE PORQUE HAY UNA HUELGA, NOS RETRASÓ UNA HORA EL TRANSPORTE. YO SOY LA COORDINADORA DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. DE PRONTO NO ES QUE EL COMPAÑERO DANIEL NO HUBIERA SABIDO QUE NO HABÍA MICROMEDIDORES, PORQUE LA VEZ QUE ESTUVIMOS CON EL ALCALDE ESO ESTÁ REGISTRADO EN UN ACTA Y SÍ SE INFORMÓ EN LAS CONDICIONES DE QUE SE IBA A TENER EL PROYECTO, QUE EL PROYECTO INCLUYE LO QUE EL INGENIERO EDWARD ESTIPULÓ CON LAS ALTERNATIVAS QUE SE ESTUVIERON HABLANDO. DE HECHO CON EL ALCALDE AQUÍ MISMO, EN ESTE LUGAR, SE HABLÓ DE LA PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS, QUE ERA SUPREMAMENTE IMPORTANTE HACER UNA CONVOCATORIA MUY MASIVA PORQUE LA SELECCIÓN DE ESA ALTERNATIVA, EL QUE GANE MAYORITARIAMENTE, ESA VA A SER, PORQUE ESO YA ES UNA VOTACIÓN LEGAL. ENTONCES DENTRO DE ESTE EJERCICIO, YA PORQUE USTEDES ESTÁN NUEVOS Y ESTÁN CONOCIENDO LA DINÁMICA DEL EJERCICIO EN RELACIÓN AL PROYECTO, SE REALIZÓ UNA SOCIALIZACIÓN, COMO DECÍA EL INGENIERO EDWARD. EN ESE MOMENTO HUBO EL RECHAZO. TAMBIÉN OBTUVE LA INFORMACIÓN POR TERCEROS, QUE PUEDE SER FALSO O REAL, DE QUE ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE SE OPOÑÍAN REALMENTE AL PROYECTO DE QUE SE TOCARA EL AGUA QUE TIENEN USTEDES CON LA PLANTA FIME, PORQUE ELLOS YA ESTABAN TENIENDO EL AGUA POTABLE POR ACUAVALLE. ENTONCES COMO QUE NO LES AFECTABA QUE EL RESTO DE LA COMUNIDAD NO TUVIERA SU AGUA POTABLE, SINO QUE POR LO CONTRARIO, ELLOS ESTABAN YA CONECTADOS AL AGUA DE ACUAVALLE Y NO QUERÍAN IR A DEJAR TOCAR LA OTRA PLANTA. EL INGENIERO MUY INTELIGENTEMENTE, PORQUE AQUÍ EN ESTE GRUPO CREO FIRMEMENTE

QUE ES UN HOMBRE EXTREMADAMENTE INTELIGENTE, PORQUE ÉL IDEÓ DIFERENTES ESTRATEGIAS DE TAL FORMA QUE, CON ESTO QUE TENEMOS PUEDO HACER ESTO, PUEDO HACER LO OTRO O PRESENTARLES ESTO A LA COMUNIDAD. Y YA AQUÍ EN LA REUNIÓN SE DIJO: NO, PERO TAMBIÉN PODEMOS SACAR ESTA OTRA ALTERNATIVA.

ENTONCES ESTA REUNIÓN TAMBIÉN SE CONVOCÓ PORQUE QUERÍAMOS QUE SUPIERAN QUE EL DIAGNÓSTICO YA SE ENTREGÓ, QUE YA TAMBIÉN SE HABÍA INFORMADO EN LA SOCIALIZACIÓN Y EN LA REUNIÓN ANTERIOR QUE EL PROYECTO VIENE POR FASES, VIENE POR ENTREGAS DE UN PRODUCTO 1, EL PRODUCTO 2 Y ASÍ SUCESIVAMENTE, Y QUE EL PRODUCTO 1 INCLUÍA LO QUE ERA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. ESTA INFORMACIÓN QUE TENEMOS EN RELACIÓN A QUE HAY PERSONAS QUE NO QUIEREN, PERO QUE ES PORQUE TIENEN ESTO, PORQUE ESTÁN BENEFICIADOS; HAY PERSONAS QUE, COMO USTED DECÍA (REFIRIENDOSE AL SEÑOR RUBEN ROSERO), PORQUE ABRIERON EL CANAL, SE CREEN DUEÑOS HASTA DEL AGUA. PERO EN SÍ EN SÍ LA MAYORÍA DE LA COMUNIDAD SÍ VE LA NECESIDAD DE TENER AGUA POTABLE. Y TAMBIÉN SE LES HA EXPLICADO QUE EL AGUA POTABLE ES USO EXCLUSIVO PARA EL CONSUMO HUMANO COMO TAL, NO PARA IR A HACER SUS RIEGOS, NO PARA IR A ESTO Y LO OTRO. Y APOYADOS EN ESO ES QUE EL INGENIERO EDWARD, CON EL MISMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, CON LA JUNTA AQUÍ REUNIDOS, ÉL LES PLANTEA: UTILICEMOS ESTA ESTRATEGIA TENIENDO EN CUENTA QUE ES VERDAD QUE USTEDES NECESITAN EL AGUA PARA TODO SU PROCESO AGROINDUSTRIAL, POR ASÍ DECIRLO. ENTONCES EN ESTA REUNIÓN TAMBIÉN QUERÍAMOS DECIR QUE EL PROCESO NO SE HA PARADO, PERO HAY UN CONDUCTO REGULAR QUE HAY QUE SEGUIR. ¿CUÁL ES? QUE NOSOTROS SOMOS EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, QUE CUANDO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN HAY QUE ENTREGÁRSELO A LA INTERVENTORÍA, LA INTERVENTORÍA LO DEBE REVISAR, LO DEBE APROBAR Y PARA ESO HAY UNOS TIEMPOS. ENTONCES QUE YA LA INFORMACIÓN SE HABÍA ENTREGADO EN RELACIÓN AL DIAGNÓSTICO, QUE YA SE ENTREGÓ. ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA INTERVENTORÍA LO EVALÚE Y LO ENTREGUE, Y DE AHÍ PASARÍAMOS AL PROCESO DE LAS ALTERNATIVAS. TAMBIÉN HABÍA HABLADO CON DON CRISTÓBAL Y LE HABÍA DICHO QUE ME PARECÍA QUE ERA MUY IMPORTANTE QUE TAMBIÉN EMPEZÁRAMOS A IDEAR LAS ESTRATEGIAS, PORQUE EN LA REUNIÓN DONDE SE VAYA A SOCIALIZAR TANTO EL DIAGNÓSTICO COMO LAS ALTERNATIVAS, OBIAMENTE TIENE QUE QUEDAR EL CONCEPTO MUY CLARO. ENTONCES ME PARECE DELICADO QUE EN ESTA REUNIÓN SE ESTÉ DICIENDO QUE EL COMPAÑERO (REFIRIENDOSE AL SEÑOR DANIEL COCALON) NO SABÍA QUE SE IBAN A COLOCAR MICROMEDIDORES.

EN ESTE MOMENTO TAMBIÉN ESTÁN EN UN PROCESO DONDE A ELLOS SE LES DEBIÓ HABER ENTREGADO EN OTRAS CONDICIONES, CON UNOS ESTUDIOS REALIZADOS QUE NOSOTROS YA TENEMOS, CON UNOS ESTUDIOS QUE POSIBLEMENTE EXISTAN O NO, PERO QUE HEMOS ESCRITO AL CONTRATISTA DE LA PLANTA Y PUES NO DA COMO UNA RESPUESTA. PORQUE DE HECHO SE LA CONECTAMOS CON EL CONTRATISTA DE LA PLANTA Y PUES NO DA COMO UNA RESPUESTA, PORQUE DE HECHO SE LA CONECTARON POR TANTA PRESIÓN QUE YA EMPEZAMOS A EJERCER,

QUE SE LAS ENTREGARON. ENTONCES TAMBIÉN HAY QUE ENTRAR A MIRAR UNOS PROCESOS CON LA PLANTA QUE TIENEN ELLOS AHÍ, PORQUE IGUAL LA PLANTA ESTÁ. SI APLICA, SI NO APLICA PARA LA CALIDAD DE LA QUE ELLOS TIENEN, POR ESO SE LES PLANTEÓ DIFERENTES ALTERNATIVAS. PERO INDEPENDIENTE DE LA PLANTA, ENTONCES DIGAMOS, EL PROYECTO QUE INCLUÍA BIEN FUERA ACONDICIONAR LA PLANTA FIME, SI SE PODÍA O NO, PORQUE ESTRUCTURALMENTE HAY QUE VER SI ESA PLANTA APLICA O NO APLICA PARA EL TIEMPO. ENTONCES YA SE SABE QUE NADA MÁS POR EL TIEMPO PUES NO APLICA. ENTONCES, ¿QUÉ SE PLANTEÓ? PUES ELLOS TIENEN UN LOTE ALLÍ, PODER CONSTRUIR UNA PLANTA NUEVA. LA PLANTA SIGNIFICA TANQUES, CON SUS RESPECTIVOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DEL PROCESO Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN. Y LLEGA EL PROYECTO COMO TAL DE CONSTRUCCIÓN, LLEGARÍA HASTA LOS MICROMEDIDORES. ESE SERÍA EL PROYECTO COMO TAL. SE HABLÓ ESO EN LA SOCIALIZACIÓN, SE HABLÓ ESO AQUÍ CON EL ALCALDE, TAMBIÉN CON LA VEEDURÍA, CON REPRESENTANTES DE LA JUNTA, CON REPRESENTANTES DEL ACUEDUCTO. Y YA PUES SERÍA COMO EL TEMA DE MIRAR, ¿QUÉ ESTRATEGIA UTILIZARÍAMOS?”

INTERVIENEN EL SEÑOR ALEX CORREA PONTÓN: “EL ACUEDUCTO SI LO TENEMOS PERO PUES IGUAL YO CREO QUE NO ES IGUAL UNO IR TENER QUE CARGAR TARROS, PORQUE LA GENTE VA NOTAR EL CAMBIO EN LA CALIDAD, CLARO LO QUE DICE EL COMPAÑERO TAMBIÉN NOSOTROS, LA SALUD DE NOSOTROS, YO ESTOY MALO DEL ESTÓMAGO, Y DECIMOS QUE DE PRONTO QUE COMÍ TAL COSA Y NO, ES EL AGUA, ES QUE EL AGUA ES TODO LO QUE USTED CONSUME, SUS ALIMENTOS, LAVAS, TODO ES CON AGUA, SÍ ME ENTIENDES, YO POR ESO NO ENTENDÍA CÓMO ME DECÍA LA GENTE, NO ES QUE NOSOTROS NO QUEREMOS AGUA, NOSOTROS YA ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A ESTA AGUA Y YO, NO, Y LE CUENTO INGENIERO, NOSOTROS EN MI CASA, NOSOTROS EN MI CASA TENEMOS AGUA POTABLE, YO TENGO MEDIDOR DE ACUAVALLE, EL QUE ME HACE LA MEDICIÓN ENTRA, TOCA LA CASA Y ES POR DETRÁS PORQUE YO TUVE LA FORTUNA PUES QUE ME DIERAN PERMISO Y YO HICE OBRA YA QUE ESTAMOS CERCA ACÁ LA PLANTA, ENTONCES ME DIERON AGUA POTABLE, PERO YO ESTOY AQUÍ DANDO LA PELEA PORQUE ES QUE ESO ES MUY NECESARIO, CUANDO NO TENÍA AGUA POTABLE LA NIÑA SE ME ENFERMÓ, LE SALIERON UNAS RONCHAS, ENTONCES YO ESTOY AQUÍ EN ESE PROCESO PORQUE YO QUIERO QUE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, ADEMÁS, YO TENGO UN PROYECTO ALLÁ Y SE QUE SERÍAMOS LOS MÁS BENEFICIADOS TAMBIÉN EN CON MIS USUARIOS PARA QUE TENGAN AGUA POTABLE, PERO LO QUE DICE EL COMPAÑERO TAMBIÉN ES REAL, HAY QUE SABER CÓMO VAMOS A DARLE INFORMACIÓN PARA QUE ESTE PROYECTO SEA UN ÉXITO, VEAN LAS TRES OPCIONES, NO IMPORTA. PERO NO DEJAR QUE SE VAYA, QUE SE CAIGA, NO DEJAR QUE SE CAIGA, PORQUE ESTE PROYECTO TIENE QUE CONTINUAR, CULMINAR, CON LOS TRES, CON LOS QUE SEA, CON LO QUE QUIERA, PERO TIENE QUE HACERSE, PORQUE LA NECESIDAD ESTÁ, ENTONCES SÍ ES IMPORTANTE SABER CÓMO VAMOS NOSOTROS A MOSTRARLE A LA GENTE EL PROYECTO, CÓMO SE LO VAMOS VENDER PARA QUE ELLOS ASUMAN, TENGAN CONCIENCIA Y TOMEN UNA DECISIÓN CON PIES EN TIERRA DE LO QUE VA PASAR. TAMBIÉN ES POSIBLE QUE MUCHOS NO VAYAN A COGER CONCIENCIA EN EL MOMENTO, PERO TENEMOS UN EJEMPLO QUE EL

INGENIERO EDWARD NOS HA DADO DESDE EL INICIO. CONTINUA EL SEÑOR CRISTOBAL MORENO: ENTONCES SERÍA PREPARAR LAS ALTERNATIVAS BIEN ILUSTRADAS PARA TODOS, NOS REUNIMOS PRIMERO CON USTEDES PARA QUE LAS CONOZCAN UNOS 15 DÍAS ANTES DE LA ASAMBLEA PARA LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA FINAL EN COMUNIDAD, EL INGENIERO SERÁ EL ENCARGADO DE DISEÑAR LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA COMPARTIRLES LAS TRES ALTERNATIVAS CON TODOS LOS DATOS, LOS COSTOS Y DEMÁS PARA QUE SE TOME UNA DECISIÓN BIEN INFORMADA. CONTINUA EL SEÑOR RUBEN RORERO: ME PARECE BUENA IDEA PARA NOSOTROS LLEVAR EL MENSAJE Y PREPARAR LA COMUNIDAD PARA QUE TOMEN UNA DECISIÓN BIEN INFORMADA. INTERVIENE LA INGENIERA ANDREA LONDOÑO: DE TODAS MANERA ME PARECE MUY IMPORTANTE DEJAR ALGO CLARO PARA LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y ES QUE, VALLECAUCA DE AGUAS EN NINGUN MOMENTO IMPUSO EL PROYECTO A LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL; POR LO CONTRARIO, FUE LA COMUNIDAD QUIEN EN LOS DÍALOGOS VALLECAUCANOS - ENTRE VARIOS PROYECTO- EJERCIERON SU VOTO PARA QUE ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SU CORREGIMIENTO. POR LO TANTO, POR ESO EL SEÑOR HERIBERTO COLLAZOS, EXPRESÓ SU INCORFORMIDAD EL DÍA DE LA SOCIALIZACIÓN PORQUE LOS ASITENTES EMPEZARON A GRITAR QUE NINGUNO DE ELLOS HABÍA VOTADO, CUANDO LA INFORMACIÓN LA ENVIABAN POR VÍA WHATSAPP Y LA GENTE LO APOYÓ EN SU MOMENTO; ES ASÍ QUE CUANDO LLEGAMOS ESTABAMOS CON TODA LA DISPONIBILIDAD DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NUCA IMAGINAMOS TANTA NEGATIVA POR PARTE DE LA COMUNIDAD. EL SEÑOR RUBEN ROSERO CONTINUO: ME PARECE MUY IMPORTANTE LA ACLARACIÓN Y YA SÓLO NOS QUEDA ES TRABAJAR DE MANERA MUY ARTICULADA Y COMO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUNTO CON LA VEEDURÍA BUSCAR ESTRATEGIAS PARA IR INFORMANDO ESTAS TRES ALTERNATIVAS A LA COMUNIDAD, DE TAL MANERA QUE CUANDO SE LLEVE A CABO LA PROXIMA REUNIÓN YA TENGAMOS MÁS CLARO HACIA DÓNDE DIRECCIOANR EL PROYECTO. PARA CONSTANCIA SE FIRM LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
OBSERVACIONES:		
CONCLUSIONES:		
1. SE DESARROLLÓ UN ESPACIO DE DIÁLOGO, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL QUE LOS REPRESENTANTES DE LA VEEDURÍA CIUDADANA, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, EL ACUEDUCTO Y LA COMUNIDAD TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SUS INQUIETUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FRENTE AL		




DESARROLLO DEL PROYECTO.






2. DURANTE LA REUNIÓN SE BRINDARON ACLARACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LAS TRES ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO, PERMITIENDO AMPLIAR LA COMPRENSIÓN DE LOS ASISTENTES SOBRE SUS ALCANCES, VENTAJAS, CONDICIONES TÉCNICAS Y ASPECTOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN LA TOMA DE DECISIONES POSTERIOR.
3. SE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA VEEDURÍA CIUDADANA Y DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO, RECONOCIENDO SU PAPEL FUNDAMENTAL EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN VERAZ, EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA COMUNITARIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN QUE SE DESARROLLARÁN EN LAS SIGUIENTES ETAPAS.
4. SE RESALTÓ LA NECESIDAD DE TRABAJAR DE MANERA ARTICULADA ENTRE LA COMUNIDAD, LA VEEDURÍA, LAS ORGANIZACIONES LOCALES Y EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE RESISTENCIAS, ACLARAR INQUIETUDES OPORTUNAMENTE Y PROMOVER UNA PARTICIPACIÓN INFORMADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO.
5. SE REITERÓ LA IMPORTANCIA DE QUE LOS REPRESENTANTES COMUNITARIOS CONTINÚEN PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LOS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO, FORTALECIENDO SU CONOCIMIENTO SOBRE EL PROYECTO PARA FACILITAR EL DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD Y SERVIR COMO CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS HABITANTES Y LAS ENTIDADES RESPONSABLES.
6. SE INFORMÓ QUE, UNA VEZ CULMINEN LOS ANÁLISIS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁ UNA ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA EN LA CUAL SERÁN SOCIALIZADAS LAS ALTERNATIVAS VIABLES IDENTIFICADAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO, PERMITIENDO QUE LA COMUNIDAD CONOZCA DE MANERA AMPLIA CADA PROPUESTA Y PARTICIPE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA QUE MEJOR RESPONDA A SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS.
7. LA REUNIÓN SE DESARROLLÓ EN UN AMBIENTE DE RESPETO, ESCUCHA Y PARTICIPACIÓN, CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL AVANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL.





REGISTO FOTOGRÁFICO





ACTA No <u>04</u>	
NOMBRE DEL PROYECTO: "FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA".	
ACTIVIDAD REALIZADA	Reunión con la veeduría del corregimiento El Pedregal Primera Etapa, municipio de Florida.
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA ACTIVIDAD NOMBRE: ING. ANDREA LONDOÑO VÁSQUEZ ENTIDAD: UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025 CARGO: COORDINADORA CORREO: andrealondono1978@gmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE: NOMBRE: Daniel Cuello Cárdenas ENTIDAD: Veeduría CARGO: Presidente CORREO: danielcuellocardenas@gmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Lissette Rosas Bermúdez ENTIDAD: Veeduría se CARGO: Secretaria CORREO: lissette71@gmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Alex Celis P. ENTIDAD: VEEVURIA CARGO: CORREO: alcepo2@hotmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Edward En Solanica ENTIDAD: UT CARGO: Ingeniero Hidráulico CORREO: eesolancia@eesolancia.com	FIRMA: 

ACTA No. <u>04</u>	
NOMBRE DEL PROYECTO: "FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA".	
ACTIVIDAD REALIZADA	Reunión con la veeduría del corregimiento El Pedregal Primera Etapa, municipio de Florida.
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Maily Andrea Tuniga ENTIDAD: Veeduría CARGO: Población CORREO: almaluna76@hotmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Vivian Valencia Cortez ENTIDAD: Unión Temporal CARGO: Social CORREO: vivianvalencia76@hotmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Cristóbal Vercel ENTIDAD: Vallecaucana CARGO: Social CORREO: cristobalvercel@gmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Islena Portilla ENTIDAD: Población CARGO: Porcicultura CORREO: Portillamonica Islena Gagnier	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Franay Vélez ENTIDAD: Interventoría M y M CARGO: Trabajadora Social CORREO: profecionalsocialfug@gmail.com	FIRMA: 

ACTA No <u>04</u>	
NOMBRE DEL PROYECTO: "FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA".	
ACTIVIDAD REALIZADA: Reunión con la veeduría del corregimiento El Pedregal Primera Etapa, municipio de Florida.	
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Jorge Collazos Renza ENTIDAD: JAC pedregal CARGO: Tesorero CORREO: jcollazos@gmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Yanyá Jorjón de Herrera ENTIDAD: Asain Pedregal CARGO: Jorjón CORREO:	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Danilo Becerra ENTIDAD: Pedregal I CARGO: miembro del Pedregal CORREO: danilobecerra123@gmail.com	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE: Ruben Pizarro ENTIDAD: J.A.C Pedregal CARGO: Presidente CORREO:	FIRMA: 
PERSONA ASISTENTE NOMBRE:  ENTIDAD:  CARGO:  CORREO:	FIRMA: 

Contrato Consultoria No.2000.13.04.006-2025 -

NIT: 902.009.437-8.

PROYECTOS DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. - GRUPO 3

Fecha: 04 / 01 / 2025

FORMATO DE ASISTENCIA

Version 1.0

NOMBRE DEL PROYECTO:

“FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE FLORIDA”

THEMA:

RESPONSABLE: ANDREA LONDONO VASQUEZ

CARGO:	COORDINADORA UNIÓN TEMPORAL GE VALLE 2025
--------	---

FECHA: 30/06/2026

HORA DE INICIO:

10:30 am

HORA DE FINALIZACIÓN:

12.15.14

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

CARGO

TELEFÓNICO

FIRMS

4092 00172512

6,301,705

TESORO JAC

3156453159

100-443887-100

every 1000 deflators

25 500 918.

as per Products.

3137946178

W. A. R. R.

Donald B. Rogers

100704046

Gravel

3234823685

Drift Piers

Huber 1/25/92

16.889.338

President J. A. C.

3113027168

[illegible]

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Observations:

1

Roldanillo, Valle 16 junio de 2026

Ingeniero

DIEGO CALDERÓN

Director Técnico

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Santiago de Cali (Valle)

Asunto: Solicitud de información sobre estado de trámite – Reiteración de solicitud.

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito realizar seguimiento al oficio remitido el día 06 de junio de 2026 al correo electrónico tecnica@eva.gov.co, mediante el cual se solicitó información relacionada con la respuesta a la consulta técnica presentada respecto al proyecto denominado: "Estructuración y Formulación de Estudios y Diseños para Obras de Protección del Acueducto y Alcantarillado del Centro Poblado El Placer, Municipio de El Cerrito".

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del área técnica de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y considerando que los aspectos objeto de la consulta son fundamentales para la definición del alcance técnico, la programación de actividades y la toma de decisiones requeridas para la adecuada ejecución del proyecto, agradecemos nos sea informado el estado actual de la solicitud presentada, así como la fecha estimada para la emisión del respectivo concepto o pronunciamiento técnico.

Lo anterior, con el propósito de contar oportunamente con los lineamientos técnicos necesarios para la continuidad de las actividades contractuales y garantizar el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos dentro del contrato.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la atención del trámite.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE – VALLE 2025

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com

Coordinadora: Andrea Lonoño Vásquez.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com. Tel: 317-3307112.

Roldanillo, Valle, 16 de junio de 2026

Ingeniero

CARLOS MARTINEZ

Representante Legal

Interventoría

Martínez y Manrique Arquitectura & Ingeniería S.A.S.

Santiago de Cali (Valle)

Asunto: Seguimiento a solicitud de información sobre estado de revisión del Diagnóstico del Corregimiento La Tupia, municipio de Pradera.

Cordial saludo,

La Unión Temporal GE-VALLE 2025, en el marco de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.005-2025 y del proyecto denominado "Formulación y Estructuración del Proyecto del Sistema de Alcantarillado del Corregimiento La Tupia, Municipio de Pradera", se permite realizar seguimiento al oficio remitido el pasado 06 de junio de 2026, mediante el cual se solicitó información relacionada con el estado de revisión del documento y anexos del diagnóstico entregado a la Interventoría el día 20 de mayo de 2026.

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido respuesta respecto al avance de la revisión, observaciones o aprobación del citado documento, respetuosamente solicitamos se nos informe el estado actual del trámite y, de ser posible, la fecha estimada para la emisión del respectivo concepto técnico.

Lo anterior, considerando que los resultados de dicha revisión constituyen un insumo fundamental para dar continuidad a las actividades contempladas en las siguientes fases del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con la formulación, evaluación y selección de alternativas técnicas, así como la programación de las jornadas de socialización con la comunidad beneficiaria.

En este sentido, agradecemos muy comedidamente la información que nos puedan suministrar, la cual permitirá realizar una adecuada planeación de las actividades pendientes y contribuir al cumplimiento de los plazos establecidos dentro del contrato.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración, y quedamos atentos a sus comentarios y observaciones.

Cordialmente,



ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL GE - VALLE 2025

Correo electrónico: ch.asociados.sas@gmail.com

Coordinadora: Andrea Lonoño Vásquez.

Correo electrónico: andrealondono1978@gmail.com.

Tel: 317-3307112.

