

256

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 1 de 28

DOCUMENTO SOPORTE DE LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA

PROYECTO:

**CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO,
GRADERÍAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E
ILUMINACIÓN, VEREDA ALTO LAS CHINAS DEL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA**

Municipio de San Agustín

Departamento del Huila

Colombia

2026

258


 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 2 de 28

TABLA DE CONTENIDO

7. INTRODUCCIÓN.....	4
8. ANTECEDENTES GENERALES	5
9. JUSTIFICACIÓN.....	6
10. UBICACIÓN.....	7
11. FASE DEL PROYECTO.....	7
12. ALCANCE.....	7
13. DURACIÓN DEL PROYECTO.....	8
14. COSTO Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.....	8
15. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO.....	8
16. ENTIDAD EJECUTORA PROPUESTA.....	9
17. CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO.....	9
18. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	10
19. DIAGNÓSTICO	11
19.1 Problema central.....	11
19.2 Antecedentes.....	12
19.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS	13
20. OBJETIVOS.....	14
20.1 Objetivo general.....	14
20.2 Objetivo específico.....	14
20.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS.....	15
21. ALTERNATIVA.....	16
22. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA.....	16
23. ESTUDIO DE NECESIDADES.....	17
24. INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA	18

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 3 de 28

25.	COSTOS DE ACTIVIDADES	20
26.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	25
27.	ANÁLISIS DE RIESGOS.....	26
28.	FUENTES DE FINANCIACIÓN.....	27
29.	BIBLIOGRAFÍA	28

 Aldia Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 4 de 28

1. INTRODUCCIÓN.

El municipio de San Agustín se encuentra en el Macizo Colombiano, suroccidente de Colombia. En el municipio viven cerca de 36.000 habitantes tanto en la zona rural como urbana. Así mismo, gran parte de la población vive en los niveles del SISBEN más bajos, lo cual representa que haya altas Necesidades Básicas Insatisfechas.

De esta manera, el municipio de San Agustín a través de su Plan de Desarrollo «La ciudad se construye desde el campo 2024-2027», en su programa de Deporte; busca generar dinámicas que incrementen actividades sanas en términos de la práctica deportiva en espacios libres y cerrados, causando así que los niños y jóvenes tengan ocupados sus ratos libres y no sean vulnerables ante enfermedades, drogadicción y otros.

De esta manera, aunque se evidencia una falta de escenarios deportivos en condiciones óptimas para la buena práctica del deporte y uso del tiempo libre, por parte de la comunidad adulta, niños, niñas y adolescentes del Municipio de San Agustín, el municipio hace esfuerzos para gestionar recursos y optimizar sus recursos propios para generar escuelas deportivas y espacios que involucren a la comunidad para la práctica deportiva.

Sin embargo, se es necesaria la implementación de diversas disciplinas deportivas y el fortalecimiento de las ya existentes como fútbol, microfútbol, futsal y baloncesto, para lo cual se requiere la construcción de nuevos escenarios deportivos, mantenimiento y mejoramiento de los existentes.

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 5 de 28

PROYECTO: «CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERÍAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACIÓN, VEREDA ALTO LAS CHINAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA».

2. ANTECEDENTES GENERALES

Según datos de la oficina de cultura, turismo y deporte para el periodo 2016-2019, se realizó mantenimiento a un total de 17 escenarios deportivos. En cuanto a construcción de escenarios deportivos tenemos que el periodo 2016 - 2019 realizó un total de 6 escenarios deportivos.

Por otra parte, para el cuatrienio 2020-2023; según el informe de gestión, se tiene que se construyó y dotó 3 canchas, se mejoró 10 canchas y se realizó 3 estudios y diseños para el mejoramiento y/o construcción de canchas deportivas (o polideportivos).

Finalmente, la importancia de un plan de acción que contemple las necesidades deportivas en el municipio de San Agustín, que sirva de carta de navegación en este sector es de vital importancia, el cual nos puede arrojar un conocimiento cuantitativo y cualitativo de cuantas disciplinas deportivas existen, cuántos escenarios, cuántos hay que construir, a qué poblaciones más alejadas llegar, con qué instructores se debe contar y qué gestión se debe hacer, un plan que logre hacer del deporte un hábito cultural en todo sentido. Por esto, es importante impulsar la gestión de recursos para fortalecer este sector tan importante para la comunidad de San Agustín.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 6 de 28

3. JUSTIFICACIÓN.

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.

Entre las actividades físicas más comunes cabe mencionar caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes, participar en actividades recreativas y juegos; todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar. La actividad física regular, como caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes o participar en actividades recreativas, es muy beneficiosa para la salud. Es mejor realizar cualquier actividad física que no realizar ninguna. Al aumentar la actividad física de forma relativamente sencilla a lo largo del día, las personas pueden alcanzar fácilmente los niveles de actividad recomendados.


La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

Por tanto, en términos de la importancia de la actividad física para todas las cohortes de edades en la población, es menester realizar obras de infraestructura que contribuyan a que la práctica deportiva sea un hábito seguro para la comunidad.

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 7 de 28

4. UBICACIÓN.

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en la zona rural del Municipio de San Agustín específicamente en La vereda Alto Las Chinas.

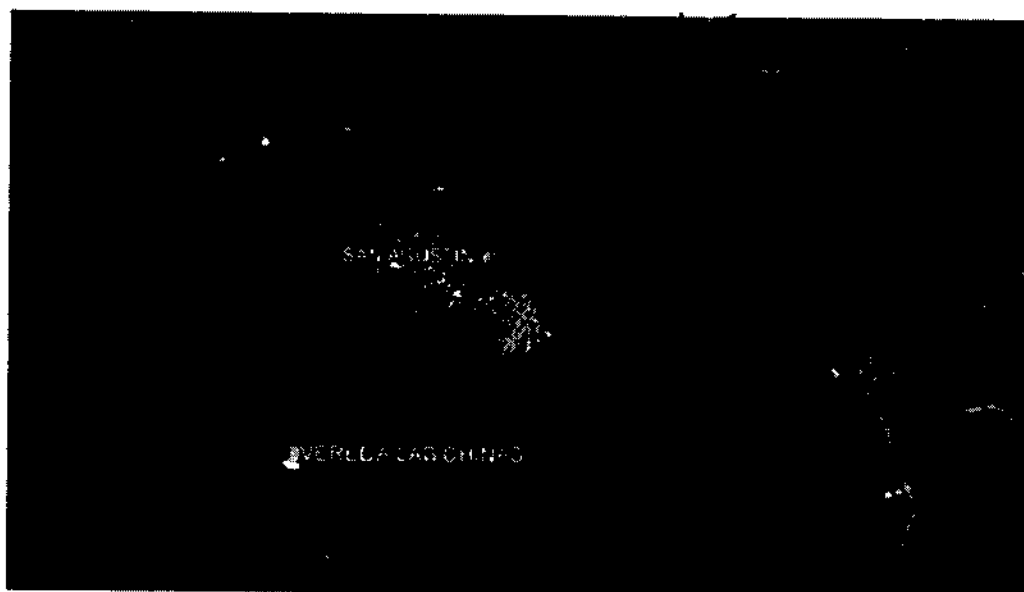

Fuente: Google Earth

Coordenadas

Latitud	Longitud
1°51'39.98"N	76°17'4.40"O.

5. FASE DEL PROYECTO.

Fase III (Factibilidad).

6. ALCANCE.

Mejorar los escenarios de práctica deportiva que haya en el municipio, con la intervención del polideportivo existente, el cual se encuentra en malas condiciones, para ello se realizará la construcción de cubierta de polideportivo, graderías, cerramiento contra impacto e iluminación; con el fin de incrementar el

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 8 de 28

nivel de práctica deportiva en la población de la vereda Alto Las Chinas del Municipio de San Agustín, Huila.

7. DURACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tendrá una duración de ocho (8) meses en sus etapas de ejecución: precontractual dos (02) meses, física cinco (05) meses y liquidación un (01) mes.

8. COSTO Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tendrá un coste total de mil cuatrocientos noventa y ocho millones trescientos treinta mil quinientos treinta y dos pesos (\$ 1.498.330.532,00) COP. Sus fuentes de financiación son:

- INDERHUILA – RECURSOS PROPIOS

9. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO.

Municipio: San Agustín

Representante Legal de la Entidad: Heber Nel Muñoz Yasno - Alcalde

Dirección: Calle 3 con cra 12 esquina. Código Postal 41668000.

Correo Electrónico: alcaldia@sanagustin-huila.gov.co

Localización y límites del municipio: San Agustín es un municipio colombiano ubicado en el sur del departamento de Huila. Yace sobre la parte oriental de la región del macizo colombiano, donde se encuentra el más alto valle del río Magdalena, resguardado por las primeras estribaciones de las cordilleras central y oriental. Su extensión territorial es de 1.574 km², su altura es de 1.730 msnm y su temperatura promedio es de 18°C.

- Límites:

Por el norte Municipio de Isnos

Por el sur Departamento del Cauca

Por el oriente Municipio de Pitalito

San Agustín, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 <http://www.sanagustin-huila.gov.co>

NIT: 891180056-6 Código Postal: 41668000

264

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 9 de 28

Por el occidente Departamento del Cauca.

Extensión geográfica total: 1.574 km²

Extensión geográfica área urbana: 185.85 km²

Extensión geográfica área rural: 1.388.15 km²

Población: Según la base de datos del SISBEN a corte de 2025, el municipio tiene una población de 35.264. Distribuidos de la siguiente manera:

Rural: 25.412.	Primera infancia 0 – 5 años: 2.014
Urbana: 9.852.	Infancia 6 – 11 años: 3.160
0-14 años: 6.914.	Adolescencia 12- 18 años: 4.034
15-19 años: 2.873	Juventud 14 – 26 años: 7.722
20-59 años: 19.867.	Adultez 27 – 59 años: 15.588
60+ años: 5.610.	Vejez 60 años y más: 19.867
Femenino: 17.691.	
Masculino: 17.573.	

10. ENTIDAD EJECUTORA PROPUESTA

Entidad: Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA.

NIT: 813005578-7

Representante Legal de la Entidad: Felipe Victoria Barragán - Director

Dirección: Carrera 18 calle 17 Esquina Unidad DPT.

Correo Electrónico: atencionusuario@inderhuila.gov.co

11. CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO.

Plan de Desarrollo Nacional: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Transformación: 2. Seguridad humana y justicia social.

Catalizador: 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz.

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 10 de 28

Pilar: 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida).

Componente: a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física.

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.

Política Departamental: Por un Huila grande (2024-2027).

Estrategia: Infraestructura deportiva para todos. Apoyar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura recreo deportiva en los diferentes municipios del departamento, para propiciar espacios de integración y participación en los grupos poblacionales del departamento del Huila.

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.

Política Municipal: La ciudad se construye desde el campo (2024-2027).

Estrategia: Pacto por la equidad, la familia y la sociedad.

Programa: 4302 - Formación y preparación de deportistas.

12. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Participante	Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Municipio de San Agustín

Posición: Cooperante

Intereses o expectativas: Contar con infraestructura física para la promoción y fomento del deporte.

Formulación del proyecto y gestión de recursos.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 11 de 28

Actor: Departamental

Entidad: Huila

Posición: Cooperante

Intereses o expectativas: Fortalecer programas y proyectos a nivel departamental.

Contribución técnica y/o financiera.



Actor: Otro

Entidad: Comunidad Vereda Alto Las Chinas.

Posición: Beneficiario

Intereses o expectativas: Contar con infraestructura física para la promoción y fomento del deporte.

Veeduría ciudadana durante ejecución de obras y en la etapa de operación del proyecto.

La administración municipal de San Agustín, Huila, en articulación con los líderes y presidentes de las juntas de acción comunal de la vereda Alto Las Chinas, promueven la gestión de un proyecto para ser presentado ante el Inderhuila, con el objetivo de gestionar recursos para la construcción de obra física de tal manera que permita a la comunidad contar con espacios deportivos adecuados para el fomento y la promoción del deporte en el sector rural municipal.

13. DIAGNÓSTICO

13.1 Problema central.

Bajo nivel de práctica deportiva en la población de la vereda Alto Las Chinas del Municipio de San Agustín, Huila.

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 12 de 28

13.2 Antecedentes.

El Municipio de San Agustín, cuenta con escenarios deportivos en estado no óptimo. Así mismo, el mal estado de los escenarios recre-deportivos es un asunto recurrente en muchas regiones en desarrollo. Esto sucede debido a que a veces no se focaliza de manera adecuada los recursos para el cierre de brechas en las comunidades más vulnerables, así como el poco mantenimiento y mejoramiento de los escenarios ya existentes. Esto hace que situaciones como la baja práctica deportiva incrementen en la población, así como un mayor riesgo de morbilidad asociada al sedentarismo, el incremento de situaciones de inseguridad y baja tolerancia también son efectos adversos a tener escenarios no adecuados, de la misma manera, sin escenarios adecuados no se puede formar de manera idónea a los deportistas del municipio.

Estado Actual sin proyecto:


De esta manera, se adjunta evidencia fotográfica:

Magnitud actual del problema:

1.516 habitantes del sector, comprendido por las veredas Altos Las Chinas y zona de influencia como la vereda Mirador, Robles, Tabor, Pedregal y Llanada de Naranjos, carecen de infraestructura deportiva apropiada para la promoción y fomento del deporte

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 13 de 28

13.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS

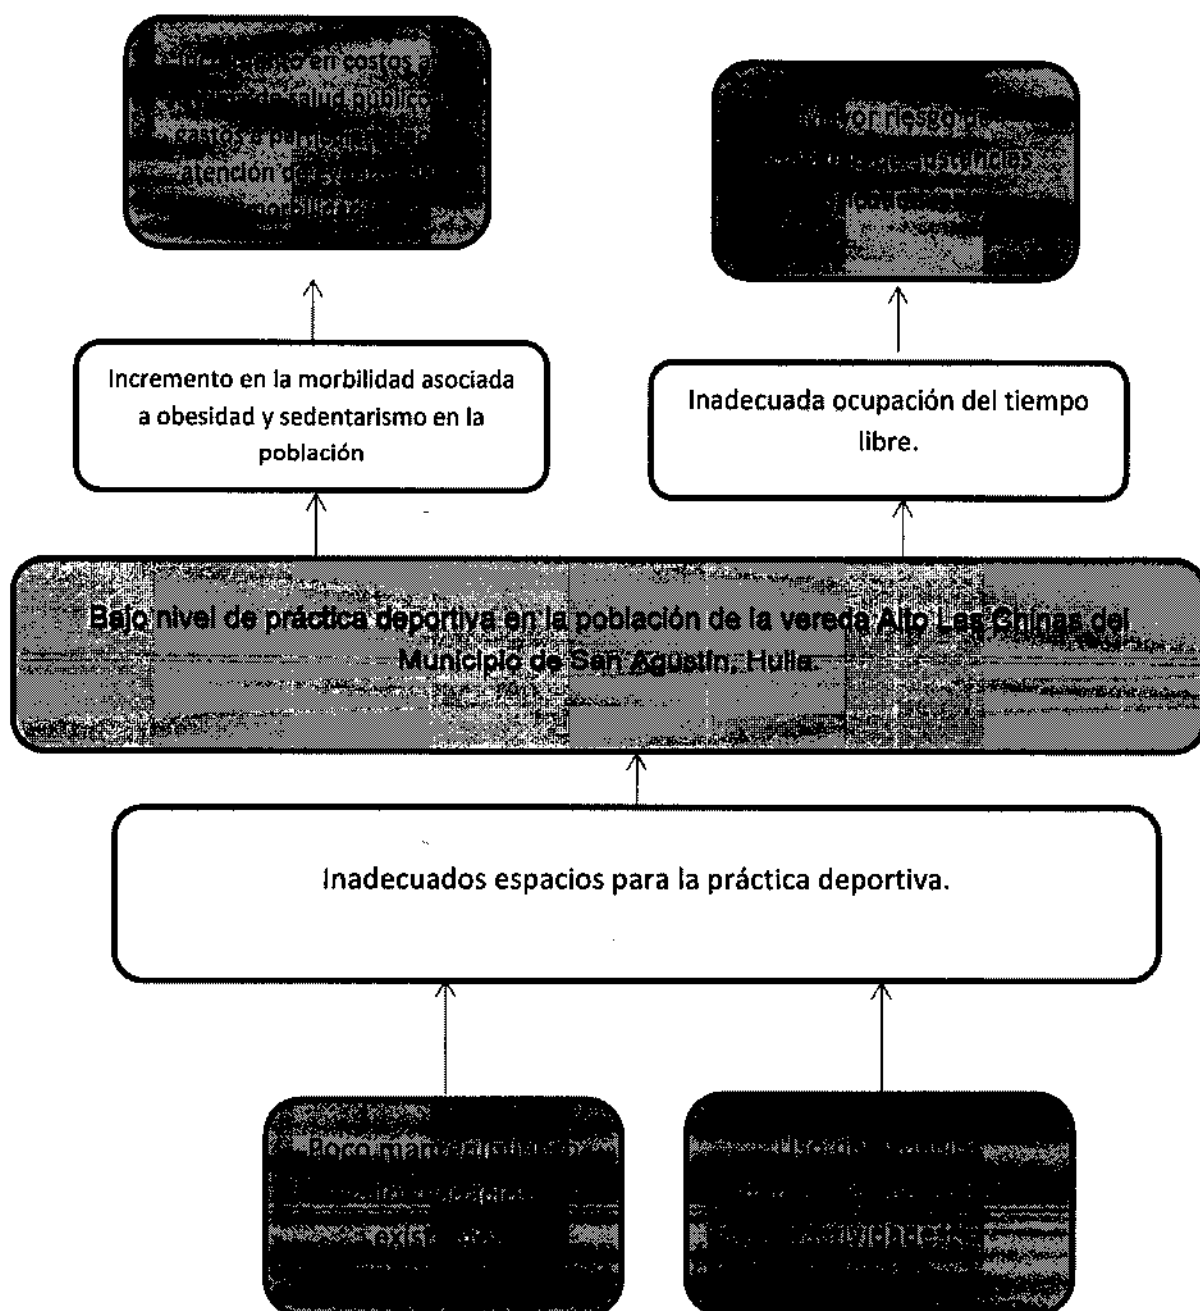

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 14 de 28

14. OBJETIVOS

14.1 Objetivo general.


Incrementar el nivel de práctica deportiva en la población de la vereda Alto Las Chinas del Municipio de San Agustín, Huila.

14.2 Objetivo específico.

- ✓ Mejorar los escenarios de práctica deportiva que haya en el municipio.
- ✓ Incrementar el mantenimiento preventivo de los escenarios recreo-deportivos.
- ✓ Fomentar un uso adecuado de os escenarios existentes.

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 15 de 28

14.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS

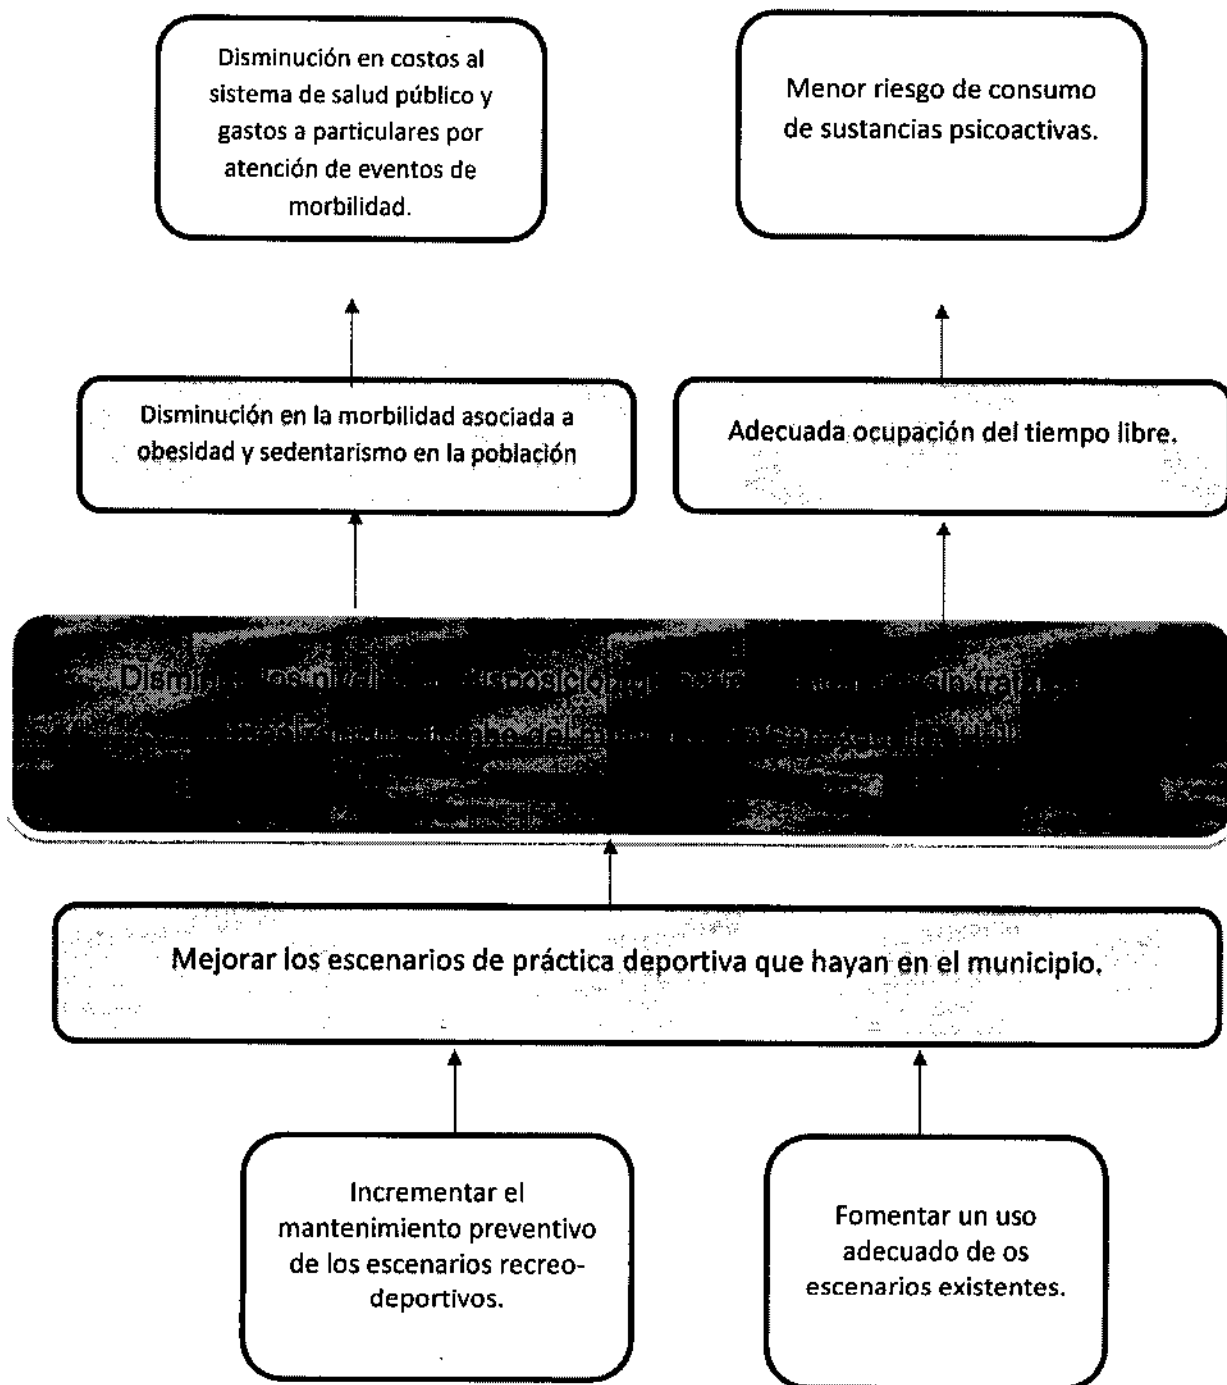

271

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 16 de 28

15.ALTERNATIVA

Realizar la construcción de polideportivo cubierto, graderías, cerramiento contra impacto e iluminación en la vereda Alto Las Chinas, Municipio de San Agustín, Huila.

16.ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA.

Proyecto ubicado en la vereda Alto las Chinas del municipio de San Agustín Huila cuya área a intervenir es de aproximadamente 670.04 M2 que consta de una cancha múltiple con medidas reglamentarias adecuadas para practicar deportes como el voleibol, baloncesto y microfútbol o futsal. Cuenta también con zona de seguridad, zona de circulación, gradería, área PMR y sus respectivas rampas de acceso.

La cubierta se conforma de un sistema de tejas auto soportadas en una viga canal que descansan en perfiles metálicos HEA 450 anclados a pedestales de concreto apoyados en las zapatas amarradas por vigas de amarre de cimentación.

Dicho escenario deportivo también cuenta con un cerramiento contra impacto en malla eslabonada calibre 22 ubicado en los costados donde se encuentra ubicadas las canchas multifuncionales móviles.

El polideportivo cubierto será dotado con canecas pivotantes metálicas para la disposición de residuos generados en la realización de los eventos deportivos, y diferentes elementos como malla de voleibol y balones de diferentes deportes.

En cuanto a la recolección de aguas lluvias se prevé la instalación de 4 bajantes de 4" de diámetro en la cubierta dirigidos hacia cajillas de recolección encauzadas por tubos colectores de 6" de diámetro hacia una zanja natural ubicada a un costado del terreno. También se cuenta con una cuneta trapezoidal con rejilla inspeccionable cada 1,30 m, ubicada a un costado de la cancha con el fin de recolectar y conducir la escorrentía superficial del talud contiguo al escenario.

Este tipo de espacios admiten el desarrollo de nuevos dinamismos para las personas en general; generando impactos positivos de integración, cohesión social y unión familiar; mejora y fortalece la calidad de vida de quienes habitan y visitan el lugar, mejora de la salud y el bienestar, fomenta la interacción social, reducen la delincuencia juvenil y promocionan estilos de vida activos.

San Agustín, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 <http://www.sanagustin-huila.gov.co>


NIT: 891180056-6 Código Postal: 41668000

778

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 17 de 28

Situación actual del problema.

Se evidencia que el estado actual sin proyecto el polideportivo no tiene las condiciones necesarias para brindar mayor calidad en la prestación del servicio. Esto hace que se genere problemas adversos por falta de la infraestructura necesaria complementaria.

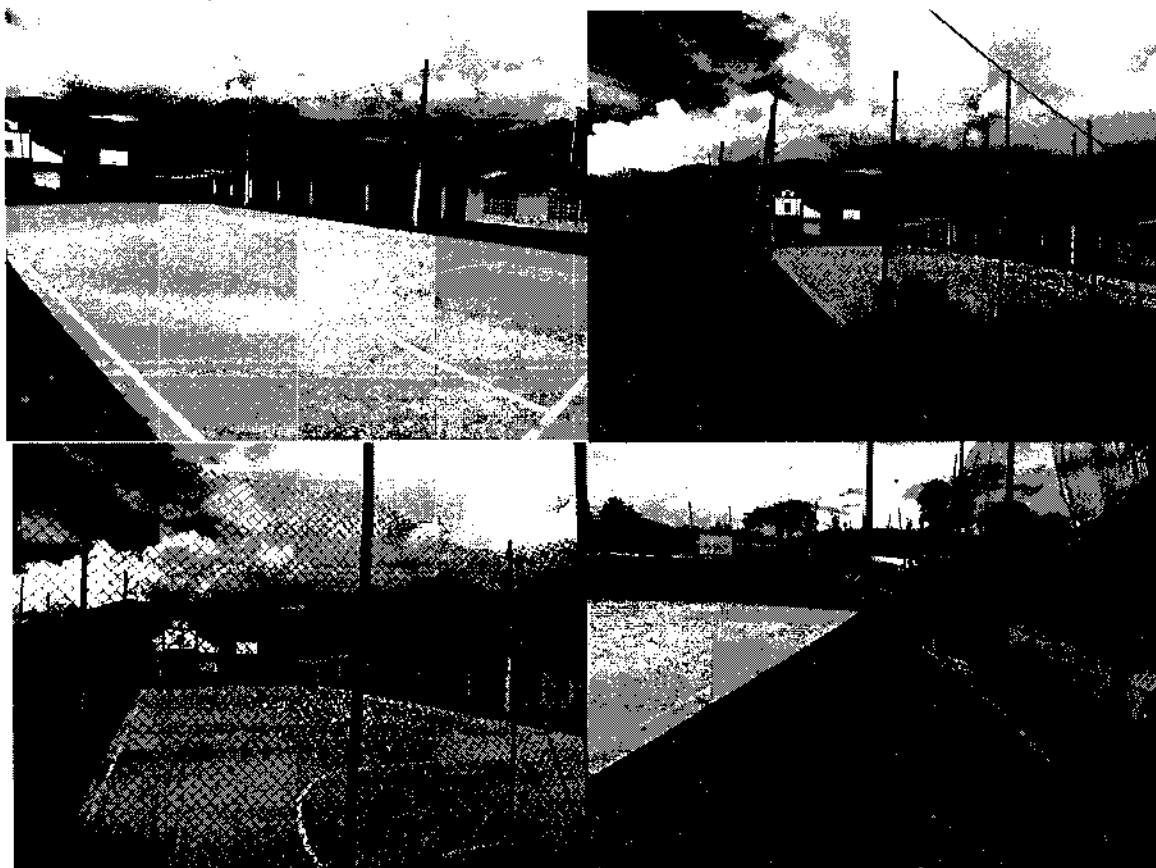

17. ESTUDIO DE NECESIDADES.

Bien o servicio	Medido a través de	Descripción	Inicio	Final	Último
Escenario deportivo mejorado.	Número	Mejoramiento del polideportivo de la vereda Alto las Chinas.	2020	2026	2031
Descripción de la oferta			Descripción de la demanda		
Polideportivos que han sido mejorados.			Polideportivos que necesitan ser		

273

 Aldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 18 de 28

Año	Oferta	mejorados.	
		Demanda	Déficit
2020	0,00	1	-1
2021	0,00	1	-1
2022	0,00	1	-1
2023	0,00	1	-1
2024	0,00	1	-1
2025	0,00	1	-1
2026	0,00	1	-1
2027	0,00	1	-1
2028	0,00	1	-1
2029	0,00	1	-1
2030	0,00	1	-1
2031	0,00	1	-1

18.INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA

Beneficio No. 01

Tipo	Descripción	Medido a través de	Bien producido	RPC
Beneficios	Ahorro a padres de familia por pago de inscripción a escuelas de formación deportiva privadas	Pesos	FC inversión servicios	0,8000
Descripción de la cantidad		Descripción del valor unitario		
Personas en edades entre 8-17 susceptibles a participar en escuelas deportivas.		Coste por estudiante anualizado.		
Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
00				
01	284,00	\$ 1.000.000,00	\$ 284.000.000,00	
02	284,00	\$ 1.000.000,00	\$ 284.000.000,00	
03	284,00	\$ 1.000.000,00	\$ 284.000.000,00	

San Agustín, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 <http://www.sanagustin-huila.gov.co>

NIT: 891180056-6 Código Postal: 41668000

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 19 de 28

04	284,00	\$ 1.000.000,00	\$ 284.000.000,00
05	284,00	\$ 1.000.000,00	\$ 284.000.000,00

Se toma un estimado de \$ 1.000.000 en los gastos relacionados al coste relacionados a pertenecer a una escuela deportiva privada, lo que anualmente en el conjunto de los afectados sería \$ 284.000.000,00 pesos.

Beneficio No. 02

Tipo	Descripción	Medido a través de	Bien producido	RPC
Beneficios	Ahorro en costos de consultas y tratamiento ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas, según el perfil epidemiológico municipal.	Pesos	FC inversión servicios	0,8000
Descripción de la cantidad		Descripción del valor unitario		
Número de viviendas beneficiarias.		Coste por atención médica.		
Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
00				
01	200,00	\$ 1.200.000,00	\$ 240.000.000,00	
02	200,00	\$ 1.200.000,00	\$ 240.000.000,00	
03	200,00	\$ 1.200.000,00	\$ 240.000.000,00	
04	200,00	\$ 1.200.000,00	\$ 240.000.000,00	
05	200,00	\$ 1.200.000,00	\$ 240.000.000,00	

Se toma un estimado de \$ 1.200.000,00 por gastos médicos anualizados. Lo que se tiene en conjunto al año de \$ 240.000.000,00.

Totales:


 Aldia Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 20 de 28

Periodo	Total ingresos	Total beneficios	Total General
00			
01		\$ 524.000.000,00	\$ 524.000.000,00
02		\$ 524.000.000,00	\$ 524.000.000,00
03		\$ 524.000.000,00	\$ 524.000.000,00
04		\$ 524.000.000,00	\$ 524.000.000,00
05		\$ 524.000.000,00	\$ 524.000.000,00
06			
07			
08			
Totales	\$ 0,00	\$ 2.620.000.000,00	\$ 2.620.000.000,00

19. COSTOS DE ACTIVIDADES

El proyecto tiene un costo de mil cuatrocientos noventa y ocho millones trescientos treinta mil quinientos treinta y dos pesos (\$ 1.498.330.532,00) COP.

1.0	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	670,04	\$2.577,00	\$ 1.726.693,00
1.2	DÉMOLICIÓN DE CONCRETO (LOSA Y ANDENES EXISTENTES), INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS	M2	278,28	\$59.567,00	\$ 16.576.305,00
1.3	DESMONTE DE CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA EXISTENTE EN MALLA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION)	ML	67,37	\$13.475,00	\$ 907.811,00
1.4	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO DE SISTEMA DE BAJA TENSION	UND	4,00	\$562.866,00	\$ 2.251.464,00
2.0	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)	M3	171,45	\$50.293,00	\$ 8.622.735,00
2.2	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM	M3	2,60	\$664.273,00	\$ 1.727.110,00
2.3	CONCRETO PARA ZAPATAS Y CONTRAPESOS DE 3000 PSI	M3	63,15	\$762.210,00	\$ 48.133.562,00
2.4	CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA MEDIA ZONGA DIAMETRO 0.20M, 60% CONCRETO DE 3000 PSI	M3	67,20	\$669.806,00	\$ 45.010.963,00
2.5	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	9,47	\$837.059,00	\$ 7.926.949,00
2.6	ACERO 60.000 PSI PARA CIMENTACION (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y	KG	7993,86	\$8.513,00	\$ 68.051.730,00

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código: FOR-PE110-13
			Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES		Versión: 02
			Página 21 de 28

	TRASIEGO)				
3.0	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA				
3.1	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)	M3	16,07	\$1.061.495,00	\$ 17.058.225,00
3.2	ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES (60.000 PSI), INCLUYE FIGURADO Y ARMADO	KG	3448,62	\$8.513,00	\$ 29.358.102,00
3.3	COLUMNA METALICA HEA 450 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE)	KG	8918,45	\$24.449,00	\$ 218.047.184,00
3.4	PLATINA ANCLAJE 550MMx700MM E=1" (INCLUYE 12 PERNOS D=1 1/8", GROUTING DE NIVELACIÓN, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE)	UND	12,00	\$2.744.304,00	\$ 32.931.648,00
3.5	VIGA DE AMARRE METÁLICA FORMADA 2C 400X105X9,5MM, INCLUYE PERNOS 7/8", PRESILLA 100X255X9,5MM, SOLDADURA E70XX, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE	KG	5658,96	\$27.941,00	\$ 158.117.001,00
3.6	CANAL METÁLICO EN LAMINA HR ESPESOR 6 MM, LONGITUD DE DESARROLLO 1,04 M (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE)	ML	62,20	\$1.038.429,00	\$ 64.590.284,00
4.0	CUBIERTA				
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONFORMACION E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOSOPORTADA TIPO MEMBRANA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 22, COLOR BLANCO EXTERIOR GRIS FONDO	M2	719,65	\$178.552,00	\$ 128.494.947,00
5.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
5.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)	M3	27,58	\$50.293,00	\$ 1.387.081,00
5.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN (RECEBO COMUN)	M3	22,85	\$143.065,00	\$ 3.269.035,00
5.3	BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" (INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES Y PINTURA EN ESMALTE)	ML	41,32	\$21.036,00	\$ 869.208,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC CXE 1/4 90° SANITARIO	UND	4,00	\$14.363,00	\$ 57.452,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC CXC 45° SANITARIO	UND	20,00	\$11.662,00	\$ 233.240,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA D=6"	ML	63,72	\$35.242,00	\$ 2.245.620,00

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código: FOR-PE110-13
			Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES		Versión: 02
			Página 22 de 28

5.7	CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI, SECCIÓN TRAPEZOIDAL, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL Y REJILLA (SEGÚN DETALLE DE PLANO HIDRÁULICO)	ML	21,24	\$210.629,00	\$ 4.473.760,00
5.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI CON ACCESO LATERAL Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$778.432,00	\$ 778.432,00
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$779.374,00	\$ 779.374,00
5.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI 1 m < Hmax < 2 m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	\$1.022.228,00	\$ 2.044.456,00
6.0	POLIDEPORTIVO Y AMPLIACION DE PLACA				
6.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)	M3	82,06	\$50.293,00	\$ 4.127.044,00
6.2	RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN)	M3	82,06	\$143.065,00	\$ 11.739.914,00
6.3	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CORTE PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	M3	41,03	\$756.047,00	\$ 31.020.608,00
6.4	RAMPA ACCESO EN CONCRETO REFORZADO R=3000 PSI	M2	4,50	\$227.613,00	\$ 1.024.259,00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA #6, HUECO DE 15X15CM	M2	410,29	\$8.900,00	\$ 3.651.581,00
6.6	SELLO DE JUNTAS DE LOSA DE CONCRETO (INCLUYE CORDON DE POLIETILENO Y AUTONIVELANTE)	ML	310,95	\$14.196,00	\$ 4.414.246,00
6.7	ESTRUCTURA MULTIPLE, (MICRO - BALONCESTO) MOVIL, ELABORADA EN TUBERIA AGUA NEGRA DE PRIMERA CALIDAD, DE DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1½ PULGADA, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS. DEBIDAMENTE DEMARCADOS CON AROS Y MALLA DE BALONCESTO. MEDIDAS EXTERNAS ARCO MICRO 3,14 MTS FRENTE, ALTURA 2,07 MTS ALTURA, PROFUNDIDAD SUPERIOR 60 CMS INFERIOR 122 CMS, LLEVA RUEDAS Y CONTRAPESO + MALLA DE MICROFUTBOL	UND	2,00	\$5.947.036,00	\$ 11.894.072,00
7.0	GRADERIAS				
7.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)	M3	5,88	\$50.293,00	\$ 295.723,00
7.2	RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO	M3	1,96	\$143.065,00	\$ 280.407,00

San Agustín, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 <http://www.sanagustin-huila.gov.co>

NIT: 891180056-6 Código Postal: 41668000

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			Código: FOR-PE110-13	
				Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015	
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES			Versión: 02	
				Página 23 de 28	

	COMUN)				
7.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM	M3	,49	\$664.273,00	\$ 325.494,00
7.4	VIGA DE CIMENTACION Y AMARRE DE GRADERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,92	\$754.467,00	\$ 2.957.511,00
7.5	PLACAS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLAS, INCLUYE FORMALETA	M3	3,31	\$760.789,00	\$ 2.518.212,00
7.6	MURO DOBLE EN LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL A LA VISTA 6X12X24 CM (INCLUYE DOBELA DIAMETRO 3/8" CADA 0.70 M Y MORTERO DE 17 MPA)	M2	18,82	\$293.417,00	\$ 5.522.108,00
7.7	ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO)	KG	129,36	\$8.513,00	\$ 1.101.242,00
7.8	ACERO 60.000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN GRADERIAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO)	KG	227,54	\$8.513,00	\$ 1.937.048,00
7.9	BARANDA EN TUBERIA ESTRUCTURAL TUBULAR CON BALAUSTRAS DE 2" X 2,5MM, PASAMANOS DE 2" X 1,5 MM Y TRES BARANDALES DE 1/2" X 1,5 ,MM (INCLUYE PLACAS DE ANCLAJE DIAMETRO 15 CM Y ESPESOR 1/4", TAPONES DE 2", ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA EN ESMALTE)	ML	27,10	\$314.341,00	\$ 8.518.641,00
8.0	SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO				
8.1	DEMARCACIÓN A DOS MANOS, DE CANCHA DE MICROFUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRAFICO ALTO (ANCHO 10CM DE ACUERDO A COLORES DE DISEÑO ARQUITECTONICO)	ML	311,68	\$7.787,00	\$ 2.427.052,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL GUIA DE CEMENTO 40 X 40 CM (SEGÚN PLANO ARQUITECTÓNICO)	M2	30,47	\$95.933,00	\$ 2.923.079,00
9.0	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO				
9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)	M3	24,48	\$50.293,00	\$ 1.231.173,00
9.2	RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN)	M3	14,59	\$143.065,00	\$ 2.087.318,00
9.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM	M3	2,72	\$664.273,00	\$ 1.806.823,00
9.4	ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	7,40	\$759.208,00	\$ 5.618.139,00
9.5	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE FORMALETA)	M3	0,21	\$989.430,00	\$ 207.780,00
9.6	MURO EN LADRILLO A LA VISTA, PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	M2	13,15	\$112.322,00	\$ 1.477.034,00

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 24 de 28

9.7	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,77	\$989.430,00	\$ 761.861,00
9.8	MALLA CONTRA IMPACTO ESLABONADA CALIBRE 12, ESTRUCTURA EN TUBERÍA NEGRA DE 1 1/2" X 1.9 MM Y ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS)	M2	152,37	\$199.382,00	\$ 30.379.835,00
9.9	ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO)	KG	575,13	\$8.513,00	\$ 4.896.082,00
10.0	ILUMINACION POLIDEPORTIVO				
10.1	SUMINISTRO ELECTRICO				
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 8M EN FIBRA DE VIDRIO 750KG	UND	1,00	\$2.551.989,00	\$ 2.551.989,00
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 CM (INCLUYE HERRAJE Y CONCRETO)	UND	1,00	\$446.894,00	\$ 446.894,00
10.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE 15A - 220V POR TUBERIA EMT 3/4"	UND	1,00	\$235.686,00	\$ 235.686,00
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE 20A - 220V POR TUBERÍA EMT 3/4"	UND	1,00	\$229.918,00	\$ 229.918,00
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED HIGHBAY 100W DL GC015 DIM	UND	12,00	\$706.698,00	\$ 8.480.376,00
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES EN 3N*12 POR TUBERÍA EMT 3/4" H: 10	ML	100,00	\$36.510,00	\$ 3.651.000,00
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES EN 3N*8 POR TUBERÍA PVC 1"	ML	25,00	\$39.418,00	\$ 985.450,00
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA ILUMINACIÓN H: 10	UND	12,00	\$130.809,00	\$ 1.569.708,00
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8CTOS INCLUYE PROTECCIONES	UND	1,00	\$605.426,00	\$ 605.426,00
10.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDA DIRECTA CON PROTECCIÓN IP44	UND	1,00	\$944.742,00	\$ 944.742,00
10.2	ANILLO SUPERIOR				
10.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONFORMACION DE ANILLO SUPERIOR DEL POLIDEPORTIVO	UND	1,00	\$14.331.385,00	\$ 14.331.385,00
10.3	BAJANTES				
10.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONFORMACION DE BAJANTES DE CONDUCCION ELECTRICA DEL POLIDEPORTIVO	UND	1,00	\$675.308,00	\$ 675.308,00
10.4	SISTEMA PUESTA A TIERRA				

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 25 de 28

10.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONFORMACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	\$4.456.626,00	\$ 4.456.626,00
10.5	CAJAS DE DISTRIBUCION				
10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFORMACION DE LAS CAJAS DE DISTRIBUCION	UND	1,00	\$406.967,00	\$ 406.967,00
10.6	DPS				
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA DPS	UND	1,00	\$3.381.875,00	\$ 3.381.875,00
10.7	EXCAVACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				
10.7.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZONA BLANDA PROFUNDIDAD 0.5M CON LONGITUD DE 30M	ML	40,00	\$32.372,00	\$ 1.294.880,00
Elaboró:		TOTAL COSTO DIRECTO:			\$ 1.055.062.887,00
		ADMINISTRACIÓN (25%)			\$ 263.765.722,00
		IMPREVISTOS (1%)			\$ 10.550.629,00
		UTILIDAD (4%)			\$ 42.202.515,00
		PGIO			\$ 19.891.405,00
		RETIE Y RETILAP			\$ 8.835.750,00
INGENIERO CIVIL		TOTAL PRESUPUESTO OBRA:			\$ 1.400.308.908,0
MP# 091037-0617188CND		VALOR INTERVENTORÍA:			\$ 98.021.624,00
email: santiagocuellarlarnunez99@gmail.com		TOTAL COSTO PROYECTO:			\$ 1.498.330.532,00
versión # 5 Fecha: 09/02/2026					

20. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El proyecto tendrá una duración de ocho (8) meses en sus etapas de ejecución: precontractual dos (02) meses, física cinco (05) meses y liquidación un (01) mes.

ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
PRECONTRACTUAL									
PRELIMINARES									
CIMENTACION									
ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA									
CUBIERTA									

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Código: FOR-PE110-13
			Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES		Versión: 02
			Página 26 de 28

INSTALACIONES									
HIDROSANITARIAS									
POLIDEPORTIVO Y									
AMPLIACION DE PLACA									
GRADERIAS									
PINTURA Y DEMARCACIÓN									
DE ELEMENTOS									
CERRAMIENTO CONTRA									
IMPACTO									
ILUMINACION									
POLIDEPORTIVO									
DOTACIÓN DE PLACA									
DEPORTIVA CUBIERTA									
ASEO GENERAL									
PMT									
PMA									
SST									
INTERVENTORÍA									
CIERRE									

21. ANÁLISIS DE RIESGOS.

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general): Incrementar el nivel de práctica deportiva en la población de la vereda Alto Las Chinas del Municipio de San Agustín, Huila.					
Administrativos	Se presentan fallas de coordinación entre los actores del proyecto.	3. Moderado	Se presentan demoras en el cumplimiento del cronograma para ejecutar el proyecto.	3. Moderado	Socializar de manera oportuna las actividades del proyecto.
2-Componente (Productos): - Mejoramiento del polideportivo existente, el cual se encuentra en malas condiciones.					
De costos.	Los costes del producto no se encuentran actualizados.	3. Moderado	Se generan sobrecostes mayores a los presupuestados.	4. Mayor	Actualizar los costes del proyecto conforme a los precios del mercado.
3-Actividad: Realizar obras preliminares					
Operacionales.	La mano de obra no cumple con la cualificación	3. Moderado	La actividad no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.	4. Mayor	Velar por medio de la supervisión que la mano de

San Agustín, Huila Colombia

Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 <http://www.sanagustin-huila.gov.co>

NIT: 891180056-6 Código Postal: 41668000

 Alcaldía Municipal de San Agustín	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 27 de 28

	requerida.				obra cumpla con la cualificación requerida.
--	------------	--	--	--	--

22. FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Etapa	Tipo de Entidad	Nombre de entidad	Tipo de recurso
Inversión	Departamentos	Huila	Recursos Propios
Periodo		Flujo de caja de la fuente de financiación.	Costos incluidos en la cadena de valor.
Periodo 0		\$ 1.498.330.532,00	\$ 0.00


Brainer Torres Repizo
 Economista – MP 55241

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-13
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Versión: 02
		Página 28 de 28

23. BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía, San Agustín. Plan de Desarrollo Municipal “La ciudad se construye desde el campo 2024-2027”. Consultado en: https://www.sanagustin-huila.gov.co/normatividad/009_2024-25264

Alcaldía, San Agustín. Municipio. Consultado en: <http://www.sanagustin-huila.gov.co/tema/municipio>

DANE. Necesidades básicas insatisfechas (NBI). Consultado en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

Gobernación del Huila. Plan de Desarrollo “Por un Huila Grande 2024-2027”. Consultado en: <https://www.huila.gov.co/administrativo-de-planeacion/publicaciones/14654/informacion-plan-de-desarrollo-2024-2027/>

DNP. Plan de Desarrollo Nacional “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”. Consultado en: <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>

Organización Mundial de la Salud. Práctica Deportiva. Consultado en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
