




| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                                                                                                                  | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 0  |                                                                                   |  | PROGRAMACIÓN SAN JUAN                                                                                                            | 106 días | lun 31/08/2  | mié 6/01/2   |              |
| 1  |                                                                                   |  | ETAPA PRECONTRACTUAL                                                                                                             | 30 días  | lun 31/08/26 | mar 6/10/26  |              |
| 2  |                                                                                   |  | ACTA DE INICIO                                                                                                                   | 1 día    | mar 6/10/26  | mié 7/10/26  | 1            |
| 3  |                                                                                   |  | SOCIALIZACIÓN                                                                                                                    | 1 día    | vie 9/10/26  | sáb 10/10/26 | 2CC+3 días   |
| 4  |                                                                                   |  | PRELIMINARES                                                                                                                     | 28 días  | sáb 10/10/26 | vie 13/11/26 |              |
| 5  |                                                                                   |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.                                          | 7 días   | sáb 10/10/26 | lun 19/10/26 | 3            |
| 6  |                                                                                   |  | DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.                                                                                                     | 21 días  | mar 20/10/26 | vie 13/11/26 | 5            |
| 7  |                                                                                   |  | DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE.                                                                                            | 14 días  | mar 20/10/26 | jue 5/11/26  | 6CC          |
| 8  |                                                                                   |  | DESMONTE DE PUERTA, VENTANA Y MARCO                                                                                              | 14 días  | mar 20/10/26 | jue 5/11/26  | 7CC          |
| 9  |                                                                                   |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN AC                                                                                                       | 14 días  | mar 20/10/26 | jue 5/11/26  | 8CC          |
| 10 |                                                                                   |  | DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.                                                                                             | 14 días  | mar 20/10/26 | jue 5/11/26  | 9CC          |
| 11 |                                                                                   |  | INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                                         | 25 días  | jue 29/10/26 | sáb 28/11/26 |              |
| 12 |                                                                                   |  | TUBERIA A.N. PVC S 4".                                                                                                           | 4 días   | jue 29/10/26 | mar 3/11/26  | 6CC+8 días   |
| 13 |                                                                                   |  | TUBERIA REVENTILACIÓN PVC L 2".                                                                                                  | 4 días   | jue 29/10/26 | mar 3/11/26  | 12CC         |
| 14 |                                                                                   |  | SALIDA SANITARIA INODORO 4".                                                                                                     | 1 día    | lun 2/11/26  | mar 3/11/26  | 13CC+3 días  |
| 15 |                                                                                   |  | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2".                                                                                               | 1 día    | lun 2/11/26  | mar 3/11/26  | 14CC         |
| 16 |                                                                                   |  | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2" DESCOLGADO.                                                                                    | 1 día    | lun 2/11/26  | mar 3/11/26  | 15CC         |
| 17 |                                                                                   |  | LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSCH AHORRADOR DE AGUA Y ACOPLES DE INSTALACIÓN.                   | 1 día    | vie 27/11/26 | sáb 28/11/26 | 59           |
| 18 |                                                                                   |  | SANITARIO INSTITUCIONAL SENCILLO DOS PIEZAS.                                                                                     | 1 día    | vie 27/11/26 | sáb 28/11/26 | 17CC         |
| 19 |                                                                                   |  | CAJA DE INSPECCION 60X60X60 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. | 1 día    | jue 29/10/26 | vie 30/10/26 | 6CC+8 días   |



|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: PROGRAMACIÓN SA<br>Fecha: vie 31/07/26 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




| Id |  | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea                                                                                                                        | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 38 |                                                                                   |    | TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.                                                     | 14 días  | mar 24/11/26 | jue 10/12/26 | 37CC         |
| 39 |                                                                                   |    | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA TIPO LED 24W.                                                                                         | 4 días   | vie 20/11/26 | mié 25/11/26 | 54           |
| 40 |                                                                                   |    | INTERRUPTOR SENCILLO + TOMACORRIENTE POLO A TIERRA. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.                                              | 1 día    | jue 26/11/26 | vie 27/11/26 | 38CC+2 días  |
| 41 |                                                                                   |    | ALAMBRE DE COBRE SUAVE, AISLADO CON PVC Y CUBIERTA DE NYLON CAL. No. 12 AWG. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.                     | 1 día    | lun 9/11/26  | mar 10/11/26 | 34FC-3 días  |
| 42 |                                                                                   |    | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                        | 14 días  | jue 5/11/26  | lun 23/11/26 |              |
| 43 |                                                                                   |    | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ENTRAMADO.                               | 2 días   | mar 10/11/26 | jue 12/11/26 | 45           |
| 44 |                                                                                   |    | IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO 3MM.                                                                                                | 8 días   | jue 12/11/26 | lun 23/11/26 | 43           |
| 45 |                                                                                   |    | CORREA METALICA EN PERFIL EN C 100X50 MM CAL 2MM                                                                                       | 4 días   | jue 5/11/26  | mar 10/11/26 | 49           |
| 46 |                                                                                   |    | <b>CARPINTERIA</b>                                                                                                                     | 47 días  | mié 14/10/26 | jue 10/12/26 |              |
| 47 |                                                                                   |    | SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON ZOCALO Y HERRAJE EN ACERO, CON MANIJA. UBICACIÓN Y DISEÑO SEGUN PLANO. | 8 días   | mar 24/11/26 | jue 3/12/26  | 29           |
| 48 |                                                                                   |    | PUERTA 1,00 X 2,10 M MADERA ENTAMBORADA , INCLUYE PINTURA Y CERRADURA.                                                                 | 12 días  | mar 24/11/26 | mar 8/12/26  | 47CC         |
| 49 |                                                                                   |    | PUERTA 0,90 X 2,10 M MADERA ENTAMBORADA , INCLUYE PINTURA Y CERRADURA.                                                                 | 12 días  | mié 25/11/26 | mié 9/12/26  | 48CC+1 día   |
| 50 |                                                                                   |    | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO GRIS INCLUYE VIDRIO 4MM SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN.                                   | 6 días   | jue 3/12/26  | jue 10/12/26 | 47           |
| 51 |                                                                                   |   | MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN MADERA                                                                                                    | 1 día    | sáb 28/11/26 | lun 30/11/26 | 48CC+4 días  |
| 52 |                                                                                   |  | MANTENIMIENTO DE REJAS PROTECTORES DE VENTANAS                                                                                         | 1 día    | mié 14/10/26 | jue 15/10/26 | 5CC+3 días   |
| 53 |                                                                                   |  | <b>CIELO RASO</b>                                                                                                                      | 6 días   | jue 12/11/26 | jue 19/11/26 |              |


|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: PROGRAMACIÓN SA<br>Fecha: vie 31/07/26 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                                                                                                                                                                              | Duración       | Comienzo            | Fin                 | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 54 |                                                                                   |  | CIELO RASO EN PVC. INCLUYE PERFILERIA ESTRUCTURA EN PVC.                                                                                                                                     | 6 días         | jue 12/11/26        | jue 19/11/26        | 43           |
| 55 |                                                                                   |  | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36 días</b> | <b>mar 27/10/26</b> | <b>mié 9/12/26</b>  |              |
| 56 |                                                                                   |  | ALISTADO DE PISO 2CM MORTERO 1:4.                                                                                                                                                            | 14 días        | mar 27/10/26        | jue 12/11/26        | 6CC+6 días   |
| 57 |                                                                                   |  | PISO PORCELANATO FORMATO 60 X 60CM.                                                                                                                                                          | 21 días        | jue 12/11/26        | mar 8/12/26         | 56CC+14 días |
| 58 |                                                                                   |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO EN PORCELANATO TRÁFICO COMERCIAL, COLOR A ELECCIÓN. H=10CM                                                                                                | 9 días         | sáb 28/11/26        | mié 9/12/26         | 57FC-8 días  |
| 59 |                                                                                   |  | BALDOSA CERÁMICA PARA ENCHAFE DE PARED VARIOS FORMATOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.                                                                                                            | 12 días        | jue 12/11/26        | vie 27/11/26        | 57CC         |
| 60 |                                                                                   |  | <b>OTROS SISTEMAS</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 días</b> | <b>vie 11/12/26</b> | <b>sáb 26/12/26</b> |              |
| 61 |                                                                                   |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | 12 días        | vie 11/12/26        | sáb 26/12/26        | 30           |
| 62 |                                                                                   |  | <b>RETIE</b>                                                                                                                                                                                 | 30 días        | sáb 28/11/26        | lun 4/01/27         | 33FC-10 días |
| 63 |                                                                                   |  | <b>RETILAP</b>                                                                                                                                                                               | 30 días        | sáb 28/11/26        | lun 4/01/27         | 33FC-10 días |
| 64 |                                                                                   |  | <b>INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                         | 76 días        | mar 6/10/26         | mié 6/01/27         | 2CC          |


|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: PROGRAMACIÓN SA<br>Fecha: vie 31/07/26 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

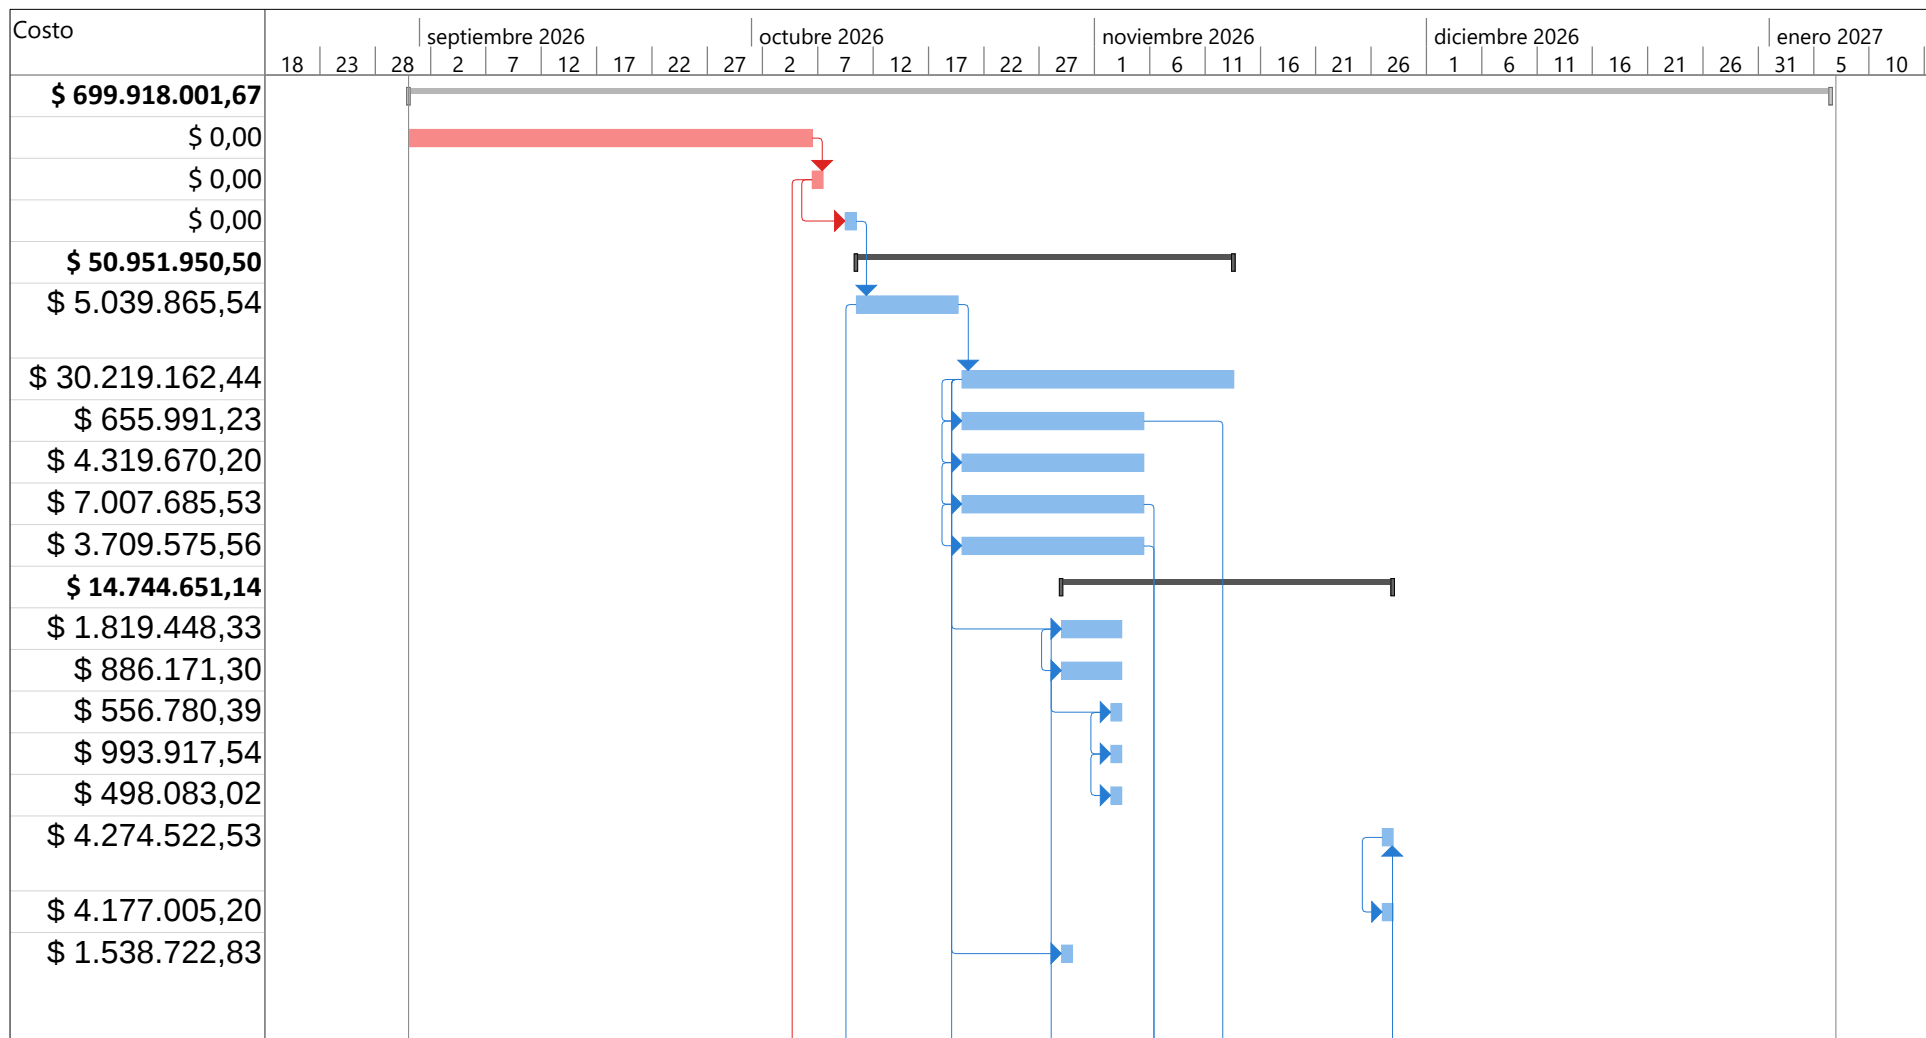


|                                                                     |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Proyecto: PROGRAMACIÓN SA</div> <div>Fecha: vie 31/07/26</div> | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                                     | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                                     | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                                     | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                                     | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                                     | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                                     | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

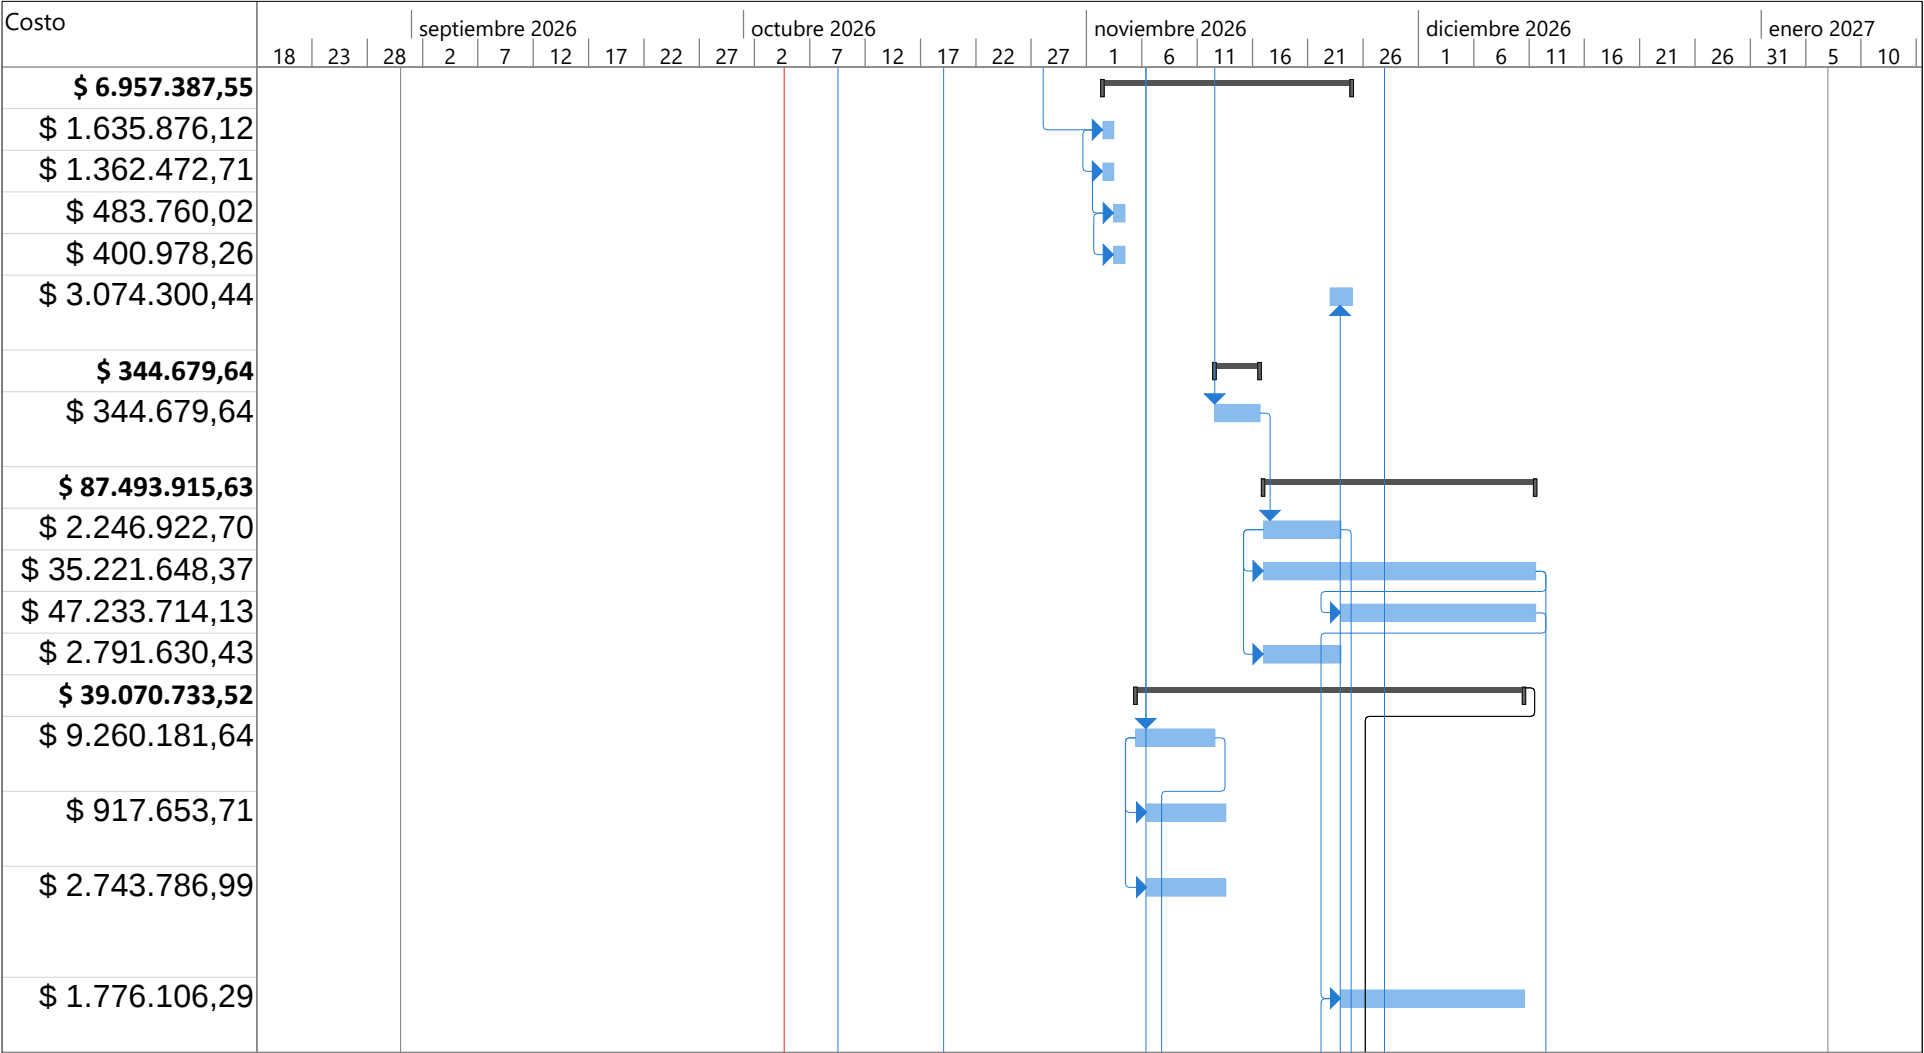

|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: PROGRAMACIÓN SA<br>Fecha: vie 31/07/26 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |
|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |

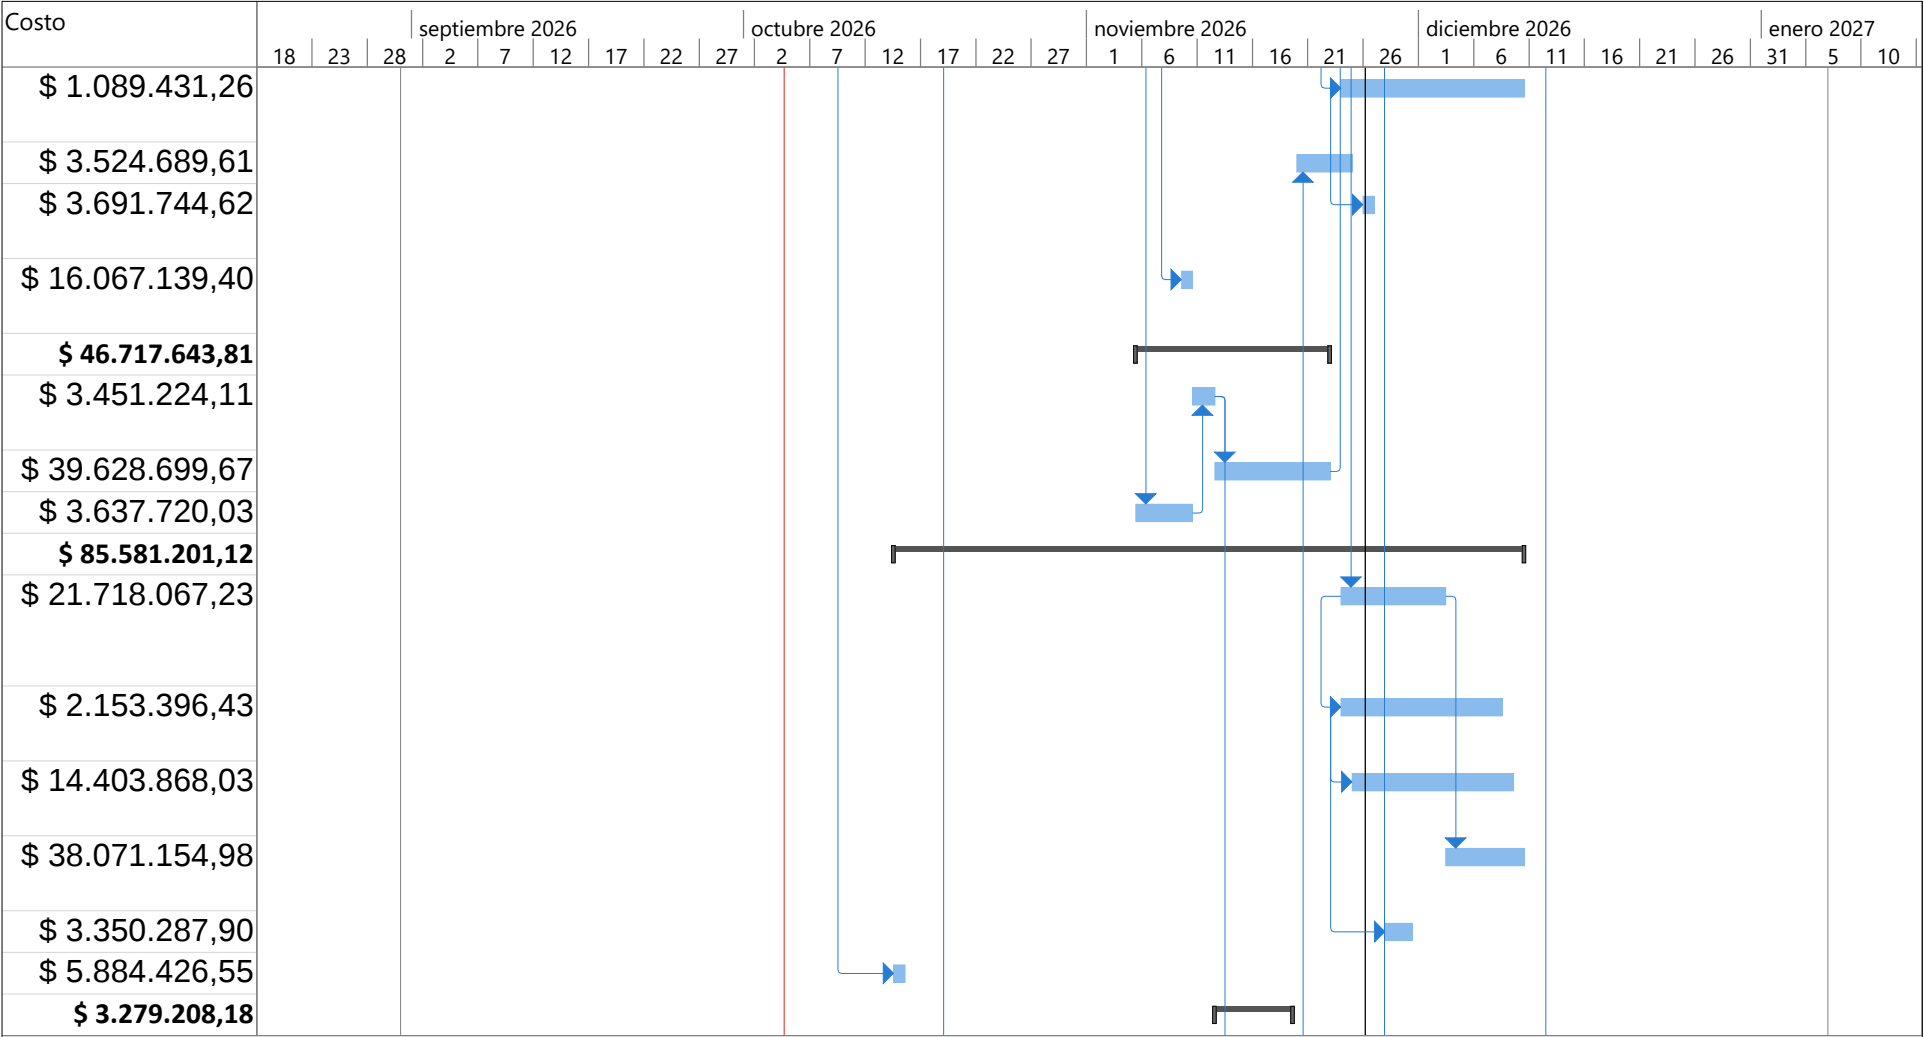

|                                                  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: PROGRAMACIÓN SA<br>Fecha: vie 31/07/26 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

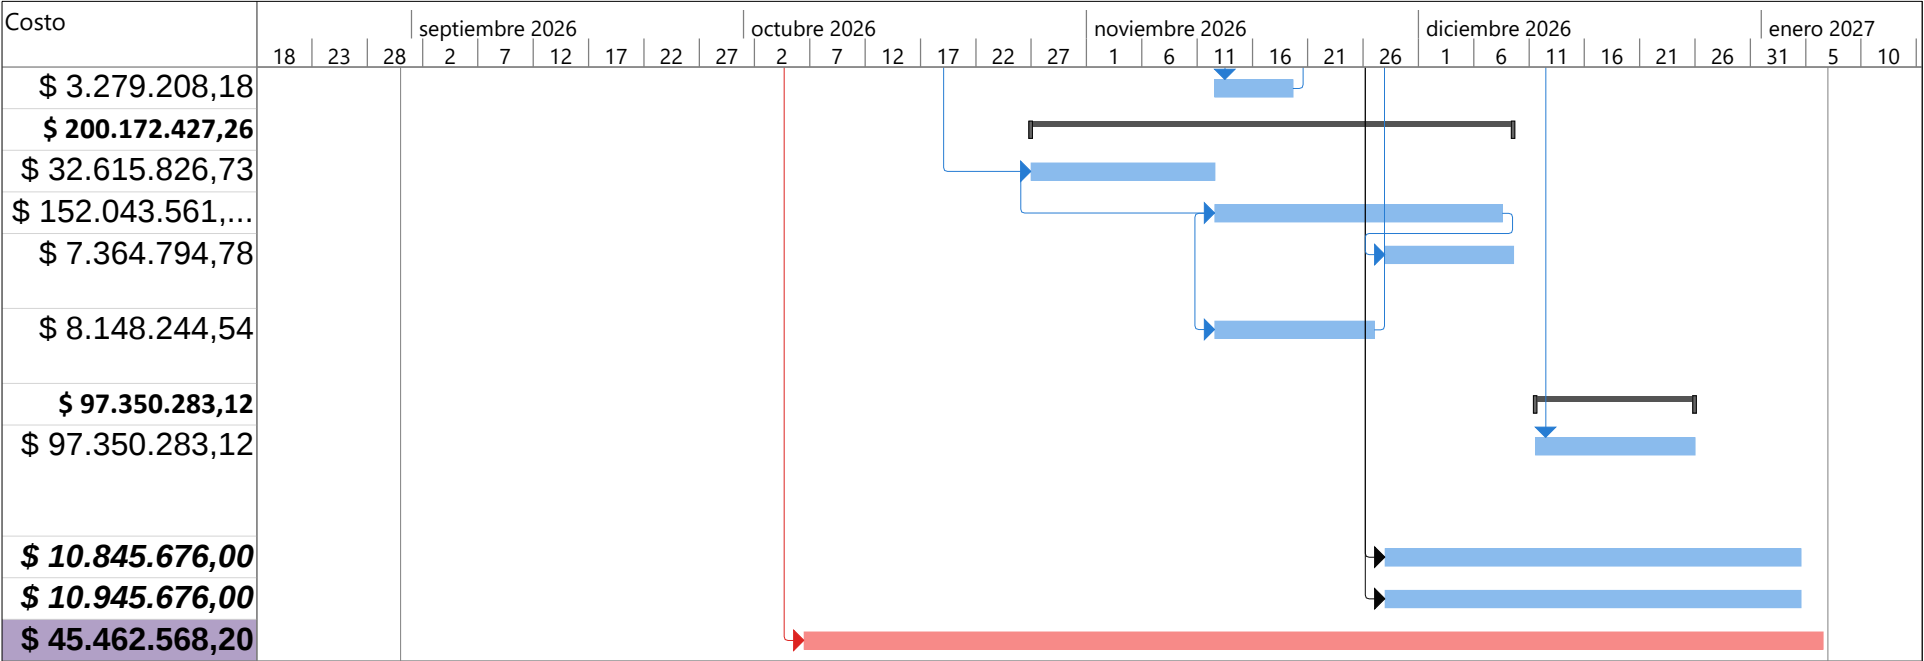

|                                                  |                      |             |                           |             |                  |             |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Proyecto: PROGRAMACIÓN SA<br>Fecha: vie 31/07/26 | Tarea                | <div></div> | Resumen inactivo          | <div></div> | Tareas externas  | <div></div> |
|                                                  | División             | <div></div> | Tarea manual              | <div></div> | Hito externo     | <div></div> |
|                                                  | Hito                 | <div></div> | solo duración             | <div></div> | Fecha límite     | <div></div> |
|                                                  | Resumen              | <div></div> | Informe de resumen manual | <div></div> | Tareas críticas  | <div></div> |
|                                                  | Resumen del proyecto | <div></div> | Resumen manual            | <div></div> | División crítica | <div></div> |
|                                                  | Tarea inactiva       | <div></div> | solo el comienzo          | <div></div> | Progreso         | <div></div> |
|                                                  | Hito inactivo        | <div></div> | solo fin                  | <div></div> | Progreso manual  | <div></div> |
