



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Contrato No	176 de 2024
Referencia SECOP II	CMA-001-2024
Contratista	VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C. 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.
Plazo de ejecución	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024
Valor del contrato	CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095,00) M/CTE
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP
Supervisor	ORLANDO PAZ RONDÓN

Entre los suscritos a saber, **MARIO FERNANDO DIAZ PAVA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.791.429 de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del ITFIP-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, Establecimiento Público de Educación Superior, redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No.1895 de 2007 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, quién para los efectos del presente contrato se denominará **EL ITFIP** y por otra parte, **LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.515.658 de Ibagué representante legal de **VERUH INGENIERIA S.A.S.** Nit. 901.396.950-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no está incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y la Ley, especialmente en las contenidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Consultoría de conformidad con resolución adjudicación No. 0380 del 17 de julio de 2024, que resolvió Adjudicar el contrato proveniente del Concurso de Méritos Abierto No CMA 001 de 2024, que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP", de conformidad con las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, contenido en las cláusulas que se expresan a continuación de las siguientes consideraciones: **A)** Que el presente contrato se sujetará a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normatividad complementaria. **B)** Que en atención al numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Numeral 2 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, se realizó el proceso de Concurso de Méritos Abierto No CMA 001 de 2024. **C)** Que en desarrollo del cronograma previsto para el proceso de Concurso de Méritos Abierto No CMA 001 de 2024, se ordenó la apertura del referido proceso atendiendo que se presentaron observaciones a dichos pre pliegos de condiciones y las mismas fueron resueltas dando lugar a la publicación de los pliegos definitivos. **D)** Que mediante Resolución No. 0348 del 04 de julio de 2024 se dio apertura al proceso de Concurso de Méritos Abierto No CMA 001 de 2024 que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP". **E)** Que se recibieron dos (2) propuestas en el día fijado para realizar el cierre del proceso. **F)** Que el comité evaluador emitió el respectivo informe, el cual fue publicado en la plataforma SECOP II y del mismo se dio traslado a los proponentes por el término señalado en el pliego de condiciones, y no se presentaron observaciones. **G)** Que como resultado de ese informe de evaluación el comité evaluador determinó que la propuesta

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

presentada por PROPONENTE 1: VERUH INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.515.658 de Ibagué, cumplió con cada uno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones, lo cual permitió establecer que la propuesta presentada resulta elegible en la evaluación realizada para tal fin. H) Dado que el proponente VERUH INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.515.658 de Ibagué, cumple con los requisitos para ser elegible, se emitió la Resolución No. 0380 del 17 de julio de 2024, la cual en el artículo primero resuelve: "Adjudicar el contrato proveniente del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2024, que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP", al proponente VERUH INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.515.658 de Ibagué. Por la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095,00) M/CTE, por haber sido la propuesta presentada y seleccionada de acuerdo a la verificación de los requisitos habilitantes y a la evaluación de los factores de ponderación". I) Que, de acuerdo a lo anterior EL CONTRATISTA aportó la documentación requerida para la suscripción del presente contrato, la cual hizo parte de la propuesta presentada en el transcurso del cronograma publicado durante el proceso precontractual del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2024. J) El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por la ley.

PRIMERA - Objeto:

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP"

SEGUNDA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	No. MESES
Director de Interventoría		25%	2.05	6.00
Residente de Interventoría		100%	2.05	6.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL				
2. PERSONAL TECNICO	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	No. MESES
Tecnólogo SISO		100%	2.05	6.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO				
3. OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
Alquiler de Oficina (Incluye servicios públicos).	MES	6.00		
Computador, cámara fotográfica o firmadora y equipo de oficina.	MES	6.00		

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Edición e impresión de informes y planos.	MES	6.00		
Comunicaciones	MES	6.00		
Soporte jurídico y contable	MES	6.00		
IVA 19%				

TERCERA – TÉRMINO DE EJECUCIÓN:

SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

CUARTA – VALOR DEL CONTRATO:

Para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tendrá un valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095.00) M/CTE, conforme a la siguiente propuesta económica:

1. PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	VALOR MES	No. MESES	V. PARCIAL
Director de Interventoría	\$7.500.000	25%	2.05	3.843.750	6.00	\$23.062.500
Residente de Interventoría	\$3.000.000	100%	2.05	6.150.000	6.00	\$36.900.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL						\$59.962.500
2. PERSONAL TECNICO	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	VALOR MES	No. MESES	V. PARCIAL
Tecnólogo SISO	\$1.300.000	100%	2.05	2.665.000	6.00	\$15.990.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO						\$75.952.500
3. OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO			V. PARCIAL
Alquiler de Oficina (Incluye servicios públicos).	MES	6.00	\$1.300.000			\$7.800.000
Computador, cámara fotográfica o firmadora y equipo de oficina.	MES	6.00	\$750.000			\$4.500.000
Edición e impresión de informes y planos.	MES	6.00	\$750.000			\$4.500.000
Comunicaciones	MES	6.00	\$233.000			\$1.398.000
Soporte jurídico y contable	MES	6.00	\$800.000			\$4.800.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$22.998.000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$98.950.500
IVA 19%						\$18.800.595
VALOR TOTAL						\$117.751.095

QUINTA - FORMA DE PAGO:

El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP pagará al INTERVENTOR el noventa por ciento (90%) del valor de contrato, en pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución del contrato.

El diez por ciento (10%) restante, se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra y se reciba a satisfacción por parte de la Entidad.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes de acuerdo con la entrega del producto a la entidad, previa presentación de la factura o documento soporte, previa entrega a

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

satisfacción, presentación y aprobación de la factura con el visto bueno por parte del supervisor del contrato, deberá presentar adicionalmente informe de reporte de ejecución del contrato; acompañada del informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal en la cual conste el recibo del objeto contratado a satisfacción y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja).

El contratista deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el ITFIP consignará los respectivos pagos.

Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

El ITFIP deducirá del valor del contrato, los impuestos de ley a través del área financiera, adicionalmente, se deducirá del valor las facturas, lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas y las demás retenciones que sean del caso.

SEXTA - SUJECCIÓN DE LOS PAGOS Y REGISTRO PRESUPUESTAL:

La obligación que asume EL ITFIP de cancelar el valor del presente contrato quedará subordinada a las apropiaciones y registros presupuestales que de tales sumas o valores se haga, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 27424 del 25 de junio de 2024 Expedido por el área contable y financiera del ITFIP.

SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción de actas de inicio, suspensiones, prorrogas o modificaciones, y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato, incluyendo acta de liquidación.
2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.
5. Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo, y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto contractual.
6. Propender por el logro de los productos pactados.
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del contrato.
8. Realizar un cronograma de trabajo entre las partes.
9. Elaborar mensualmente un informe cada una de las partes, que dé cuenta del cumplimiento del contrato, sus obligaciones y alcance.

OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista Seleccionado deberá cumplir el contrato de conformidad con los requerimientos técnicos dados por el ITFIP y acordes con las necesidades de la administración. La propuesta presentada debe contemplar los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor, ejecutando las demás actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales, tales como:

Actividades Técnicas y Administrativas.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1° Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: Info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS:

Corresponde al interventor:

1. Realizar con la periodicidad acordada con la Supervisión, visitas al sitio de la obra o de ejecución del contrato, con el fin de ejercer correctamente sus actividades en el sitio o área donde habrá de ejecutarse el contrato, las especificaciones técnicas y los planos de la obra, tanto topográficos como técnicos (de suelos, estructurales, hidráulicos, sanitarios), con el fin de constatar la total coordinación entre ellos, para su debida aplicación en la ejecución del objeto del contrato.
2. Revisar que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto estén aplicándose o ejecutándose en debida forma.
3. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos de condiciones, planos y especificaciones generales para la debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de discrepancias prevalecerán los pliegos de condiciones.
4. Velar cuando se requiera, que se cumpla con la colocación de vallas de señalización, la cual debe contener identificación del sitio, fecha de inicio y entrega, igualmente, se debe identificar al contratista, a la entidad contratante y el costo de la obra, según especificaciones de la municipalidad y determinadas en el manual de Interventoría del ITFIP.
5. Suscribir con el contratista el acta de iniciación de la obra, dentro del término establecido en el contrato. Por medio de esta acta se hará entrega del sitio de la obra.
6. Cuando el contrato es de obra pública, deberá, suscribir con el contratista y propietarios de inmuebles o predios vecinos, las actas de vecindad a que hubiere lugar, antes de dar inicio a los trabajos, complementando estas actas con descripciones o registro fotográfico, si fuere necesario.
7. Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la actualización de la programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación.
8. Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con los pliegos de condiciones y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos.
9. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de ejecución del contrato, en la "Bitácora o Libro de Obras", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los documentos del contrato y de la Interventoría. Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos.
10. Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al contratista, a los ingenieros o arquitectos que hayan participado en la elaboración del proyecto o a los consultores que sea necesario citar en algún momento durante la marcha de la obra.
11. Participar al inicio de la obra y en forma activa en el control de la ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción.
12. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las funciones de Interventoría de la obra.
13. Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el Diario de Medidas, discriminando fechas, especificación del ítem medido, su ubicación en la obra (identificando ejes de construcción), unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas deberá efectuar cortes mensuales o quincenales de obra.
14. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas de recibo parcial de obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

15. Elaborar, con base en los cuadros para reajustes automáticos o revisión de precios incluidos en la minuta del contrato, cuando a ello hubiere lugar, las actas correspondientes, en las cuales se haga constar el valor de éstos y el del acta de recibo correspondiente, la cual será suscrita conjuntamente con el contratista, el ordenador del gasto o de su delegado.
16. Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones de la invitación o cotización que hayan servido de base para la adjudicación del contrato.
17. Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos para establecer exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el correcto desarrollo del objeto contractual, y con base en los resultados de los mismos proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos. Para el caso de obras civiles, en cuanto a los ensayos de los concretos se deberá tener en cuenta lo establecido en el Código Colombiano de Construcciones sismo resistentes. Para ensayos y aceptación de otros materiales se deberán usar las condiciones estipuladas por el Icontec y códigos específicos que regulen la materia.
18. Aportar copia de los resultados de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en el folder del proyecto, discriminando la ubicación, orden y fechas de ejecución.
19. Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas por la entidad u organismo que regule la materia aplicable al objeto del contrato. Tratándose de obras civiles, las establecidas en el Código Colombiano de construcciones sismo resistentes, y las demás disposiciones técnicas aplicables.
20. Exigir el total cumplimiento de las especificaciones de construcción para todos los ítems de la obra, así como las que aparezcan en los planos constructivos, toda vez que obras mal ejecutadas no podrán ser recibidas.
21. Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta, además, la programación establecida para los trabajos y su secuencia técnica.
22. Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación escrita.
23. Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y elementos que relacionó en la propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio. Los cuales podrán exigirse en el evento de no existir.
24. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra, brindando así seguridad a quienes allí laboran y ocasionalmente transitan por los alrededores de la obra. Igualmente verificar la afiliación a riesgos laborales de todo el personal de obra e interventoría vinculado.
25. Ordenar lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para terceros.
26. Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra, con facultades para recomendar al ITFIP modificaciones cuando por razones técnicas o dadas la naturaleza de la obra, se haga necesario, sin cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado en el contrato. Cualquier recomendación de modificación deberá acompañarse de la respectiva programación de la obra y el flujo de caja correspondiente a ésta, así como de la justificación escrita y el visto bueno del diseñador.
27. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, deberán ser aclaradas con el funcionario responsable por parte de la entidad contratista.
28. Presentar al Supervisor responsable del proyecto para el trámite de aprobación y con la anticipación suficiente los estudios que indiquen la realización de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales estipulando, el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las mismas. Estos estudios corresponden a modificaciones del valor o plazo de los

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: Info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC0793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- contratos.
29. Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta con el contratista, actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presenten para la aprobación, del supervisor y ordenador de gasto.
 30. Recibida la autorización del contrato adicional el interventor podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente.
 31. Ejercer un control de calidad de materiales, de mano de obra y de los elementos que se vayan a utilizar en la construcción de la obra adicional.
 32. Realizar estudio que determine el valor de las obras, actividades y/o trabajos adicionales, según los criterios que establezca el contrato inicialmente pactado, dicho estudio debe remitirse para la respectiva revisión al Supervisor, responsable del proyecto y someterse a la aprobación del Ordenador del Gasto o su delegado de lo que se suscribirá acta con el contratista.
 33. Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en cada acta.
 34. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.
 35. Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse, ser visada por el Secretario de Despacho, responsable del proyecto y sometida a la aprobación por parte del ordenador del gasto. Una vez recibida la comunicación de aprobación, procederá a suscribir conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto, un acta denominada de suspensión temporal.
 36. Elaborar acta de reiniciación de obra, suscrita por el contratista y el ordenador del gasto o su delegado, dejando constancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. Esta acta, junto con la de suspensión servirán como base, para establecer mediante contrato adicional la modificación al vencimiento del plazo del contrato y el tiempo de suspensión.
 37. Realizar una verificación previa a la entrega de la obra, bien o servicio contratado, a fin de constatar el cumplimiento del contrato y ordenar el mejoramiento de aspectos deficientes, disponiendo a cargo del contratista las pruebas y ensayos de laboratorio requeridos.
 38. Exigir al contratista los planos de la obra ejecutada; memorias y/o manuales de operación, cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere pertinente y que se anexaran al control de Interventoría.
 39. Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, adecuar las pólizas o garantías exigidas, según el caso.
 40. Elaborar y firmar con el contratista el acta de liquidación, en la que constará:
 - El estado en que se recibe la obra, cantidades y áreas, el área total de construcción y de las obras exteriores, el valor final del contrato, incluyendo reajustes o revisiones de precios, descripción de su estado y los datos que exija el Estatuto Contractual vigente.
 - El cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas las cantidades recibidas.
 41. Firmar en compañía del funcionario delegado para contratar el acta de liquidación final del contrato, dejando constancia de las reclamaciones que se presenten y de los asuntos que no se hubiesen podido superar de común acuerdo entre las partes del contrato.
 42. Dar información de todo acto relacionado con el contrato, al funcionario responsable de la Supervisión del proyecto y a cualquier autoridad competente que la requiera.

A.1. Revisión, análisis de Metodología y especificaciones - Coordinación de actividades

El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos suministrados por el ITFIP, que sirven para adelantar la ejecución del contrato sobre el cual se ejerce la Interventoría. Esta labor tiene

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

por objeto el lograr el conocimiento detallado de la metodología de trabajo y especificaciones para la reducción de tiempos y costos, lo mismo que lograr precisiones en la coordinación de las actividades y especificaciones.

Igualmente, el interventor revisará avalará y entregará al ITFIP los documentos finales del contrato entregados por el contratista.

Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el contratista en su oferta.

A.2. Programación y Presupuesto

Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema que permita cumplir con el tiempo contractual.

Revisará cuidadosamente el presupuesto del Objeto Contractual, las especificaciones técnicas, la metodología de trabajo y detalles suministrados por el ITFIP.

A.3. Escogencia y coordinación de formatos

Es necesario que la interventoría coordine: la presentación de informes, aplicación de controles, avances de las actividades, las condiciones de seguridad industrial, las formas de pago, retenciones etc.

A.4 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INTERVENTORÍA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Verificar el cumplimiento del objeto conforme al Plan de Acción, los pliegos de condiciones y la propuesta.

Medios de Verificación:

- Los pliegos de condiciones, documento de la propuesta.
- Contrato
- Visitas de Interventoría.
- Papeles de trabajo.
- Cronograma, comparación entre las actividades programadas y las ejecutadas.
- Informes de avance de la ejecución física presentados por el contratista.

Evaluar y emitir concepto de aprobación o rechazo de la calidad y cantidad de los resultados o productos parciales y finales obtenidos.

Medios de Verificación

- Visitas de Interventoría.
- Registros de verificación de la ejecución física (impresos, archivo magnético, fotográfico, audiovisual, entre otros).
- Informes de Interventoría.
- Informes de avance de la ejecución física presentados por el contratista.
- Presentación de avances, de resultados parciales y finales.

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Medios de Verificación

- Visitas de Interventoría.
- Registros de verificación de la ejecución física (impresos, archivo magnético, fotográfico, audiovisual, entre otros).
- Informes de avance de la ejecución física presentados por el contratista.
- Informes del contratista previendo dificultades en la ejecución física del contrato.

Velar por la calidad y conservación del entorno ambiental donde se realice el proyecto.

Medios de Verificación

- Visitas de Interventoría.

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y LEGALES

ASPECTO FINANCIERO

OBJETIVO: Verificar la legalidad financiera, de todos los requisitos necesarios desde el inicio del contrato, hasta la liquidación del mismo, de modo que permita realizar un seguimiento económico de todas las transacciones involucradas.

DEFINICIÓN: Es la verificación que se hace sobre las inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.

Medios de Verificación

- Contrato.
- Verificación de precios.
- Cronograma de actividades.

Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al plan de acción y al proyecto formulado.

Medios de Verificación

- Plan de acción.
- Contrato.
- Cronograma de actividades.
- Los documentos que soportan la inversión.

Verificar si existe una cuenta especial para el manejo de los desembolsos Efectuados al contrato.

Medios de Verificación:

- Certificado de apertura de la cuenta bancaria.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato.

Medios de Verificación

- Contrato principal u otro sí.
- Recibos de consignación.
- Comprobantes de egreso del pago anticipado o anticipo.
- Valor de los demás desembolsos, respecto al valor total del contrato.
- Extractos bancarios que den cuenta del movimiento de la cuenta donde está depositado el anticipo.
- Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato y exigir al contratista el reintegro de los mismos al ITFIP.
- Extractos bancarios.
- Certificación de los rendimientos financieros expedida por la Entidad
- Bancaria correspondiente.
- Informes financieros del contratista.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato,

Medios de Verificación

- Plan de Acción.
- Facturas o cuentas por cobrar.
- Certificado de cumplimiento de actividades.
- Cuentas de cobro.
- Órdenes de pago.
- Comprobantes de egreso.

Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Medios de Verificación

- Contrato.
- Otrosí al contrato.
- Informes de Interventoría.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, requerimientos de la autoridad ambiental competente y además las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales pactados contractualmente igualmente asegurar q el contratista realice las labores de mitigación del impacto ambiental pactado.

Resolución de la autoridad competente y plan de manejo ambiental o instructivo de mínimas aplicaciones ambientales (en los casos que se aplique).

Además, la Interventoría debe verificar que el contratista conforme una estructura humana y técnica suficiente que garantice al ITFIP el cumplimiento de los programas acciones y actividades establecidas en el plan de manejo ambiental en el caso que se aplique.

OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Informes mensuales de la prestación del servicio
- Informe final de la prestación del servicio.
- Actas de comité técnico, de reunión, de obra y balances económicos respectivos.
- Bitácora diaria de avance
- Archivo magnético de todo el proyecto.

OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad; Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el ITFIP.
2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía única de cumplimiento, por los servicios y/o bienes objeto del contrato.
3. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
4. Constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el presente documento.
5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.
6. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.
7. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el ITFIP, a través del supervisor del mismo, así como del interventor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
8. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos, laborales) y demás impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos pagos.
9. Presentar al supervisor del contrato mensualmente fotocopia del pago de los aportes parafiscales del mes anterior, discriminando el pago del servicio correspondiente al contrato y copia de los recibos de los pagos del cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002.
10. Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar.
11. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el ITFIP con el objeto de llevar el control y pagos respectivos.
12. Pagar si a ello hubiere lugar, los impuestos con motivo de la suscripción del contrato objeto de la presente selección.
13. Las demás que se deriven del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, así mismo todas aquellas que le señale la Constitución la Ley.
14. Hacer entrega de la factura objeto del contrato al ITFIP por intermedio del supervisor.
15. Informar oportunamente al ITFIP sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del contrato.
16. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, EL CONTRATISTA debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el CONTRATISTA debe comunicar a la compañía de seguros.
17. Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, avalado por el supervisor del acto contractual.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

18. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

NOVENA – OBLIGACIONES DEL ITFIP.

1. Verificar que la consultoría cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
2. Suministrar al contratista al inicio de ejecución del contrato, toda la información requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual.
3. Realizar los pagos previa presentación correcta por parte del contratista, los documentos requeridos y acorde con los plazos establecidos por el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional.
4. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.
5. La comunicación en lo referente a solicitud de servicios, quejas o reclamos se efectuará por escrito.
6. Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.
7. Elaborar un informe mensual que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte del contratista, según sus obligaciones y alcance del mismo.
8. Otras que sean necesarias para coadyuvar a la interventoría del Contrato y para la correcta ejecución contractual.

DÉCIMA - SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

Debido a que el presente contrato está sometido a seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico mediante la supervisión de ORLANDO PAZ RONDÓN, Docente del ITFIP quien podrá efectuar las observaciones y recomendaciones que considere procedentes para su cabal cumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA - CADUCIDAD:

En caso de Presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá el ITFIP, mediante resolución motivada, darlo por terminado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, pero se hará acreedor a las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN UNILATERALES:

Cuando surjan motivos que hicieren necesario la Interpretación, Modificación, Terminación y Liquidación unilaterales del presente contrato, EL ITFIP dispondrá de las facultades excepcionales al derecho común y dará aplicación a lo previsto en la Ley.

DÉCIMA TERCERA - SANCIONES:

EL ITFIP, podrá imponer las siguientes sanciones: a) MULTAS. EL ITFIP, podrá imponer al contratista una multa hasta por el 10% del valor total del contrato por deficiencias o incumplimientos de las obligaciones contraídas en el presente contrato. b) PENAL PECUNIARIA: Adicionalmente en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el Contratista, pagará al ITFIP el veinte 20% del valor total del contrato. PARÁGRAFO 1: PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El pago de las multas

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

y de la penal pecuniaria podrá ser exigido directamente al contratista, o reclamándola de la garantía constituida y, si nada de ello fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva, constituyéndose el presente contrato como una obligación clara, expresa y exigible derivada del contratista.

DÉCIMA CUARTA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se resolverán en Audiencia de Conciliación ante un Centro de Conciliación de la Ciudad de El Espinal.

DÉCIMA QUINTA – GARANTÍAS:

De conformidad al decreto 1082 de 2015, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente contrato, El contratista se obliga a constituir, suscribir y presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

Descripción Amparo	Cuantía	Vigencia
Cumplimiento del contrato	20% sobre el valor total del contrato	Por el término de duración del contrato y doce (12) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10% sobre el valor total del contrato	Por el término de duración del contrato y tres (03) años más.
Calidad del servicio	20% sobre el valor total del contrato	Por el término de duración del contrato y doce (12) meses más.

DÉCIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Expirado el plazo para la ejecución del contrato, o cumplido el objeto del contrato, o terminado anticipadamente éste, se procederá a su liquidación final, mediante acta suscrita de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el ITFIP procederá su liquidación unilateral.

DÉCIMA SÉPTIMA – RELACIÓN LABORAL:

Por la ejecución del presente contrato, ni el contratista, ni el personal a través del cual presta sus servicios, adquieren vínculo de dependencia o relación laboral alguna con EL ITFIP, el Contratista actuara con total autonomía en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el ITFIP, razón por la cual el ITFIP no está obligado al pago de prestaciones sociales, ni de ningún tipo de emolumento diferente al valor acordado en el presente contrato.

DECIMA OCTAVA – CESIÓN:

EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin el consentimiento previo y escrito de EL ITFIP.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"


Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

DÉCIMA NOVENA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Para efectos de las obligaciones del CONTRATISTA, se considera como fuerza mayor o caso fortuito cualquier hecho o suceso imprevisto e irresistible ajeno a la voluntad de las partes, que demore o impida el cumplimiento de sus obligaciones sin que pueda remediarlo. En la eventualidad de presentarse caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho a una prórroga del plazo de ejecución a juicio del ITFIP, pero no podrá reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

VIGÉSIMA - INDEMNIDAD:

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al ITFIP de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa el desarrollo del objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes. Para su ejecución requiere: 1) Constitución de garantías dentro de los cinco días siguientes a la suscripción del presente contrato. 2) Aprobación de las garantías pactadas por parte de la Asesora Jurídica del ITFIP. 3. Registro presupuestal.

VIGÉSIMA SEGUNDA – ANEXOS:

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1. Estudios y documentos previos. 2. El Pliego de Condiciones del proceso de Concurso de Méritos Abierto CMA 001 de 2024, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3. La Oferta presentada por el Contratista.

VIGÉSIMA TERCERA - NOTIFICACIONES:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

ITFIP	CONTRATISTA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL ITFIP	LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 B/ ARKABAL – ESPINAL/ TOLIMA	DIRECCIÓN: CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR / ESPINAL – TOLIMA
TEL: 098-2483503 Ext. 2201 o 2203	TELÉFONO: 3014798256
e-mail: rectoria@itfip.edu.co , juridica@itfip.edu.co y contratacionitfip@itfip.edu.co	e-mail: veruhsas@hotmail.com

VIGÉSIMA CUARTA - DOMICILIO:

Las partes contratantes señalan la ciudad de Espinal, como domicilio para todos los efectos relacionados con el presente Contrato.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1

No. PÓLIZA	1-100035315	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18115328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 17/07/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 17/01/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA				N/A			
TOMADOR	VERUH INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	901.396.910-1
DIRECCIÓN	CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR					TELÉFONO	3014798256
ASEGURADO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP					No. DOC. IDENTIDAD	880.173.719-0
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL					TELÉFONO	82483501
BENEFICIARIO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP					No. DOC. IDENTIDAD	880.173.719-0
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL					TELÉFONO	82483501

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 176 del 2024, CUYO OBJETO ES:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO. CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/07/2024	24:00 Horas Del 17/01/2026	23.550.219,00	63.760,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/07/2024	24:00 Horas Del 17/01/2028	11.775.109,50	61.892,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/07/2024	24:00 Horas Del 17/01/2026	23.550.219,00	63.760,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 58.875.547,50	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN
CES AGENCIA LTDA		AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/07/2024
------------------	---

PRIMA BRUTA	\$	189.412,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	189.412,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	36.938,00
TOTAL A PAGAR	\$	231.350,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 4712/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

LEONARDO VALENTIN
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS: 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18115328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	31/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA	IBAGUE	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
	17/07/2024		17/01/2028		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100035315 y endoso, 0 cuyo afianzado es: VERUH INGENIERIA SAS Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP / INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP , expedida por la Compañia en 31/07/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañia.

AGENCIA IBAGUE a los 31 días del mes JULIO del año 2024.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

18115328

Fecha de Facturación

31/07/2024

Fecha Límite de Pago

30/08/2024

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

I-100035315

Prima (incluye gastos de expedición)

194.412,00

IVA

36.938,00

Periodo Facturado

17/07/2024

17/01/2028

VALOR TOTAL A PAGAR \$

231.350,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL
ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 30/04/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática estipulada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit: 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, Nit, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

18115328

Fecha de Facturación

31/07/2024

Fecha Límite de Pago

30/08/2024

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

I-100035315

Prima (incluye gastos de expedición)

194.412,00

IVA

36.938,00

Periodo Facturado

17/07/2024

17/01/2028

VALOR TOTAL A PAGAR \$

231.350,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA


Cheque

Banco


No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000018115328(3900)000000231350(96)20240830


**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018115328(3900)000000231350(96)20240830


INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES				
				

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		
		

 CORRESPONSALES	
--	--

Tu compañía siempre



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO No. 176 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP."

CONTRATISTA: VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.

SUPERVISOR: ORLANDO PAZ RONDON

La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ITFIP, en la fecha procede a evaluar la garantía única conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015 presentada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO en el marco del Contrato de la referencia.

Para el efecto se recibe la Póliza del contrato de seguro de cumplimiento ante entidades estatales No.I-100035315, expedida por Seguros mundial, tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 31 de julio de 2024, la cual presenta el siguiente detalle:

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$23.550.219.00	17	07	2024	17	01	2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$11.775.109.50	17	07	2024	17	01	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$23.550.219.00	17	01	2024	17	01	2026
POLIZA N°	I-100035315 ANEXO 0						
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
NIT:	860.037.013-6						

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente al requerimiento y en consecuencia se imparte la aprobación a las Pólizas

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

emitidas por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** No I-100035315 tomada por VERUH INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 31 de julio de 2024.

En constancia se firma en El Espinal - Tolima el 31 de julio de 2024.

AMPARO SANCHEZ PERDOMO

Asesora Jurídica ITFIP

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

Celular Atención al Ciudadano 316 6254592

Correo: info@itfip.edu.co

El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.0541783
Versión del contrato 1
Estado de contrato Firmado
Fecha de generación del estado 13 días de tiempo transcurrido (17/07/2024 6:57:13 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato 176 DE 2024
Objeto del contrato CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP
Tipo de Contrato Interventoría
¿Asociado a otro contrato? ☐ SI ☒ No
Duración del contrato 6 Meses
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del contrato 31/12/2024 12:00 AM
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐ SI ☒ No
Obligaciones Ambientales ☐ SI ☒ No
Obligaciones pos consumo ☐ SI ☒ No
Reversión ☐ SI ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
COLOMBIA, Espinal

0 Recomendación
(45)

Información del Proveedor contratista



VERUH SAS
COLOMBIA, Espinal
Número de documento 901396950

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VERUH SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	41100001451

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor
Aprobado LEIDY VANESSA
por: VANEGAS LASSO Fecha de aprobación: 30/07/2024 9:59:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado MARIO FERNANDO
por: DIAZ PAVA Fecha de aprobación: 31/07/2024 2:16:43 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐ SI ☒ No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ SI ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ SI ☒ No

Seriedad de la oferta ☒ SI ☐ No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento ☒ SI ☐ No

Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido (21/07/2024 6:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

☐ Valor de la garantía

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

☐ Valor de la garantía

10,00

20,00

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

9 días de tiempo transcurrido (21/07/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

9 días de tiempo transcurrido (21/07/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐ Si ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías:

9 días de tiempo transcurrido (21/07/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:							
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Entero	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.14757153	Seriedad de la oferta	-	11.775.700,90 COP -		20/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.6541783

Proveedor

VERUH SAS

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato			
Descripción	Nombre		
☐ CONTRATO 176 DE 2024.pdf	CONTRATO 176 DE 2024.pdf		Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 18 Carrera 1* Barrio/Arkabal Espinal, Tolima - Colombia

Ubicación

CO-TOL-73268 - Espinal

País

COLOMBIA

Departamento

Tolima

Municipio

Espinal

Dirección

Calle 18 Carrera 1* Barrio/Arkabal Espinal, Tolima - Colombia

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

Dirección

1 Calle 18 Carrera 1* Barrio/Arkabal Espinal, Tolima - Colombia

Ubicación

COLOMBIA > Tolima > Espinal

CO1.PCCNTR.6541783							
Código de barras							
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
1	81101900	CONTRATAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMA ATLETICA EDPA 3 COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP	1,00	UN	117.757.009,00	117.751.006,00	117.757.009,00

Documentos del contrato			
Descripción	Nombre del documento		Detalle
☐ CONTRATO 176 DE 2024.pdf	CONTRATO 176 DE 2024.pdf		(Detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Tipo de documento

Número de documento

Guardar y notificar

Supervisor

Tipo de documento

Número de documento

Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

1. *What is the purpose of this study?*

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

☐ SI ☒ No *

RSI No.

7517 No *

FSIR No.:

FSIR No.:

CS/2 No *

7517 No.

SI No *

SI No *

Total 117,751,095

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

2018011000107 2024 Validado

SIIF ☒ SI ☐ No

00 11 00

00 11 00

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

27424	COP	Generado	117.757.009 COP	117.757.009 COP	22-41-00	Edita
-------	-----	----------	-----------------	-----------------	----------	-------

Fecha de consulta SIF: 4/07/2015

For more information, call 1-800-451-7262 or visit www.4mat.com


1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Objeto compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/UCP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Saldo total comprometido

Fecha de consulta SIF -



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImportal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-41-00
Fecha y Hora Sistema: 31/07/2024 12:00:00 p. m.

LILIAN MERCEDES PORTELA PACHECO
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27424 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111724	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / subunidad Ejecutora:	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	117.751.095,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	117.751.095,00
				Tasa de Cambio:	117.751.095,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901396950	Razón Social:	VERUH INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	41100001451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARIO FERNANDO DIAZ PAVA	Cargo:	RECTOR
-----------------	------------	---------	--------------------------	--------	--------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CONTRATO DE INTERVENCIÓN	Fecha:	2024-07-31
						DE 2024		

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 ITFIP - GESTION GENERAL	C-2202-0700-10-20203K-202050-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO ESPINAL	Nación	10	CSF		117.751.095,00	0,00	117.751.095,00	117.751.095,00
					Total:	117.751.095,00	0,00	117.751.095,00	117.751.095,00

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENCIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL-ITFIP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 ITFIP - GESTION GENERAL	3-3 CMC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2024-07-31	117.751.095,00	117.751.095,00	NINGUNO
	CSF				



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

31

ACTA DE INICIO DE UN CONTRATO			
Fecha:	12	08	2024
	Día	Mes	Año
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.:	176 DE 2024		
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".		
VALOR:	\$ 117.751.095,00 M/CTE	PLAZO:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FORMA DE PAGO:	El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP pagará al INTERVENTOR el noventa por ciento (90%) del valor de contrato, en pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución del contrato. El diez por ciento (10%) restante, se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra y se reciba a satisfacción por parte de la Entidad.		
GARANTÍAS	Amparos	Valor	Vigencia
CUMPLIMIENTO No. I-100035315	CUMPLIMIENTO	\$ 23.550.219,00	17/07/2024 hasta 17/01/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 11.775.109,00	17/07/2024 hasta 17/01/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 23.550.219,00	17/07/2024 hasta 17/01/2026

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC8702.1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co


Se reunieron: **ORLANDO PAZ RONDÓN** supervisor del contrato **No. 176 de 2024**, y **LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO**, representante legal de **VERUH INGENIERIA SAS** en calidad de representante legal de la interventoría del contrato **No. 176 de 2024** para dar inicio al citado contrato de interventoría **No. 176 de 2024**.

DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	ORLANDO PAZ RONDÓN
	Cargo	Supervisor
DATOS DEL CONTRATISTA INTERVENTOR	Razón Social	VERUH INGENIERIA SAS
	NIT	901.396.950 -1
	Nombre	LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO
	Identificación	CC. 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.

Hoy, 12 de Agosto de 2024, las partes hacen constar la fecha de iniciación y terminación, de acuerdo con el plazo pactado en el contrato, así:

FECHA DE INICIACIÓN	12 de Agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2024

Para constancia firma por quienes intervinieron:

 ORLANDO PAZ RONDÓN	 LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO
Supervisor	Representante Legal de VERUH INGENIERIA SAS. Interventor

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6701.1

No. PÓLIZA	T-100035315	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18117015	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 12/08/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 12/02/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	VERUH INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	901.396.950-1
DIRECCIÓN	CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR					TELÉFONO	3014798256
ASEGURADO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP					No. DOC. IDENTIDAD	800.173.719-0
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL					TELÉFONO	82483501
BENEFICIARIO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP					No. DOC. IDENTIDAD	800.173.719-0
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL					TELÉFONO	82483501

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2024. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 176 DEL 2024, CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/08/2024	24:00 Horas Del 12/02/2026	23.550.219,00	63.760,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/08/2024	24:00 Horas Del 12/02/2028	11.775.109,50	61.892,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 12/08/2024	24:00 Horas Del 12/02/2026	23.550.219,00	63.760,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 58.875.547,50	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
CES AGENCIA LTDA		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO				
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/08/2024				

PRIMA BRUTA	\$	189.412,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	189.412,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	36.938,00
TOTAL A PAGAR	\$	231.350,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS-MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO, OIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNIR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Complimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18117015	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	27/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	12/08/2024	24:00 Horas Del	12/02/2028			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguros-mundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA & APE
Asociación Paramétrica de Plumas
Parametrica Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100035315 y endoso, 2 cuyo afianzado es: VERUM INGENIERIA SAS Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP / INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP , expedida por la Compañía en 27/08/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 27 días del mes AGOSTO del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

18117015

Fecha de Facturación

27/08/2024

**TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

I-100035315

Período Facturado

12/08/2024

12/02/2028

Fecha Límite de Pago

26/09/2024

Prima

194.412,00

IVA

36.938,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

231.350,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 26/09/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática estipulada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, IHT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

18117015

Fecha de Facturación

27/08/2024

**TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

I-100035315

Período Facturado

12/08/2024

12/02/2028

Fecha Límite de Pago

26/09/2024

Prima

194.412,00

IVA

36.938,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

231.350,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA


Cheque

Banco


No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)0000018117015(3900)00000231350(96)20240926

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018117015(3900)00000231350(96)20240926

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES










OPCIÓN 2


BANCOS








CORRESPONSALES



Tu compañía siempre



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO No. 176 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP."

CONTRATISTA: VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.

SUPERVISOR: ORLANDO PAZ RONDON

La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ITFIP, en la fecha procede a evaluar la garantía única conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015 presentada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO en el marco del Contrato de la referencia.

Para el efecto se recibe la Póliza del contrato de seguro de cumplimiento ante entidades estatales No.I-100035315, expedida por Seguros mundial, tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 27 de agosto de 2024, la cual presenta el siguiente detalle:

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$23.550.219.00	12	08	2024	12	02	2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$11.775.109.50	12	08	2024	12	02	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$23.550.219.00	12	08	2024	12	02	2026
POLIZA N°	I-100035315 ANEXO 2						
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
NIT:	860.037.013-6						

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente al requerimiento y en consecuencia se imparte la aprobación a las Pólizas

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

emitidas por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** No **I-100035315** tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 27 de agosto de 2024.

En constancia se firma en El Espinal - Tolima el 27 de agosto de 2024.

AMPARO SANCHEZ PERDOMO
Asesora Jurídica ITFIP

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE SUSPENSIÓN 001

Fecha: Agosto 12 de 2024

Lugar: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Asunto: Acta De suspensión 001 Contrato No. 210 de 2024

Información del Contrato:

Contrato No.	176 de 2024.
Fecha del contrato	Julio 31 de 2024.
Contratista	VERUH INGENIERIA SAS.
Plazo de ejecución	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
Valor del contrato	CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095,00) M/CTE.
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP.
Interventor	VERUH INGENIERIA SAS.
Supervisor	ORLANDO PAZ RONDÓN.

ASISTENTES

No.	Nombre	Cargo
1	VERUH INGENIERIA SAS	Contratista
2	ORLANDO PAZ RONDÓN	Supervisor

ORDEN DEL DÍA

1. Análisis y compromisos
2. Suspensión de las actividades propias del contrato No. 176 de 2024

Entre los suscritos a saber, **ORLANDO PAZ RONDÓN** mayor de edad, obrando en calidad de supervisor del Contrato de la referencia suscrito por el **INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP**, Establecimiento

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Público de Educación Superior, redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, por otra parte y **VERUH INGENIERIA SAS NIT 901.396.950-1** representado legalmente por **LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.515.658 de Ibagué, Tolima, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se suscribe la presente Acta de Suspensión 001, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

1. Que entre el ITFIP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el VERUH INGENIERIA S.A.S, se celebró el Contrato No. 176 de 2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP, por un valor CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095,00) M/CTE, INCLUIDO IVA y un plazo de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
2. Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue del día doce (12) de agosto de 2024, quedando con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024.
3. Que en el marco del contrato de obra No. 210 de 2024, las partes suscribieron acta de suspensión el día doce (12) de Agosto de 2024 de acuerdo con la justificación que soporta tal suspensión.
4. Que el Contrato de obra No. 210 de 2024, objeto de seguimiento de esta interventoría, fue suspendido debido a: Que La entidad contratante, contratista e interventoría se encuentran realizando revisión de Estudios y diseños del proyecto para optimizarlo, por lo que se analizan las diferentes observaciones al respecto, contenidas en el comité de obra No. 01, como por ejemplo las consultas a los diseñadores originales con respecto a la construcción del cárcamo externo de la pista de atletismo, manejo de aguas lluvias y drenes, pendiente transversal de la pista, manejo a darse al tramo existente de la pista atlética construida, entre otras, por lo que se acuerda por quienes intervienen en

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

la presente acta suspender el contrato hasta que se determine las acciones a seguir con relación a lo anteriormente expuesto.

5. Que por lo expresado anteriormente se considera procedente suspender el plazo del contrato de obra No. 210 de 2024, por el término de 20 días, es decir, para ser reiniciado el dos (02) de septiembre del presente año, lapso en el cual se prevé que se superen las causas de la suspensión; que, en todo caso, si las causas llegan a superarse antes de lo previsto, se podrá solicitar la reanudación del contrato antes del término solicitado.
6. Que por lo expresado en el ítem anterior se considera procedente suspender de la misma manera, el plazo del contrato de interventoría No. 176 de 2024, hasta que se subsanen estas situaciones sobrevinientes del contrato de obra No. 210 de 2024, y que no pueden ser atribuidas al contratista de interventoría.
7. Que el contratista de interventoría, la supervisión y el ITFIP INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL manifiestan libre y espontáneamente que esta suspensión no generará indemnización, lucro cesante o daño emergente, ni reclamaciones por sobre - costo en beneficio del Contratista por este acto.

ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato No. 176 de 2024, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por un término no mayor de veinte (20) días. Si antes de este término cesan las causas que originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato.

PARÁGRAFO: La presente suspensión no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

SEGUNDO. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la Compañía Aseguradora y allegar el anexo modificatoria de la garantía única de cumplimiento.

TERCERO. Los demás términos y condiciones del contrato No. 176 de 2024 permanecen vigente.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"


Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1

**INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"**

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

En constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, en Espinal a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2024. ✓

Supervisor Designado por EL ITFIP, EL CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: Orlando Paz Rondón
Supervisor del Contrato

Firma: 

Nombre: Leidy Vanessa Vanegas
Lasso. R.L VERUH INGENIERIA
SAS.
Contratista ✓

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE REINICIO 001

Fecha: Lunes Septiembre 02 de 2024. ✓

Lugar: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Asunto: Acta De Reinicio 01 Contrato No. 176 de 2024

Información del Contrato:

Contrato No.	176 de 2024.
Fecha del contrato	Julio 31 de 2024. ✓
Contratista	VERUH INGENIERIA SAS
Plazo de ejecución inicial	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
Valor del contrato	CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095,00) M/CTE.
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP.
Interventor	VERUH INGENIERIA SAS
Supervisor	ORLANDO PAZ RONDÓN
Acta de inicio	12 de agosto de 2024 ✓
Acta de Suspensión 1	12 de agosto de 2024 ✓

ASISTENTES

No.	Nombre	Cargo
1	VERUH INGENIERIA SAS	Contratista
2	ORLANDO PAZ RONDÓN	Supervisor

ORDEN DEL DÍA

1. Análisis y compromisos ✓
2. Reinicio de las actividades propias del contrato No. 176 de 2024.


Entre los suscritos a saber, **ORLANDO PAZ RONDÓN** mayor de edad, obrando en calidad de supervisor del Contrato de la referencia suscrito por el **INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP**, Establecimiento

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Público de Educación Superior, redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No.1895 de 2007 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, por otra parte y **VERUH INGENIERIA SAS NIT 901.396.950-1** representado legalmente por **LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.515.658 de Ibagué, Tolima, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se suscribe la presente Acta de Reinicio 001, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

1. Que entre el ITFIP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el VERUH INGENIERIA S.A.S, se celebró el Contrato No. 176 de 2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP, por un valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$117.751.095,00) M/CTE, INCLUIDO IVA y un plazo de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
2. Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue del día doce (12) de agosto de 2024, quedando con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024.
3. Que mediante Acta de Suspensión No. 1 el plazo del contrato se suspendió a partir del doce (12) de Agosto de 2024, por que el Contrato de obra No. 210 de 2024, objeto de seguimiento de esta interventoría, fue suspendido debido a: Que La entidad contratante, contratista e interventoría se encuentran realizando revisión de Estudios y diseños del proyecto para optimizarlo, por lo que se analizan las diferentes observaciones al respecto, contenidas en el comité de obra No. 01, como por ejemplo las consultas a los diseñadores originales con respecto a la construcción del cárcamo externo de la pista de atletismo, manejo de aguas lluvias y drenes, pendiente transversal de la pista, manejo a darse al tramo existente de la pista atlética construida, entre otras, por lo que se acuerda por quienes intervienen en la presente acta suspender el contrato hasta que se determine las acciones a seguir con relación a lo anteriormente expuesto.
4. Que una vez superadas las causas que le dieron origen a la suspensión los firmantes de la presente acta se reúnen para realizar el reinicio del contrato con

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

el fin de continuar con la ejecución del mismo de conforme a las especificaciones contenidas en el contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato No. 176 de 2024, cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, reanudando la ejecución del contrato.

SEGUNDO. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a actualizarlas, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la Compañía Aseguradora y allegar el anexo modificadorio de la garantía única de cumplimiento.

TERCERO. EL CONTRATISTA manifiesta que la reanudación del contrato no generará sobrecostos para el ITFIP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

CUARTO. Los demás términos y condiciones del contrato No. 176 de 2024 permanecen vigente.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024. ✓

Supervisor Designado por EL ITFIP, EL CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: Orlando Paz Rondón
Supervisor del Contrato

Firma: _____

Nombre: Leidy Vanessa Vanegas Lasso. R.L VERUH INGENIERIA SAS.
Contratista

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18119118	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA	IBAGUE	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
	12/08/2024		05/03/2028		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



321



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

Afiliados



Asociación Panamericana de Empresas
de Seguros y Reaseguros

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100035315 y endoso, 3 cuyo afianzado es: VERUH INGENIERIA SAS Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP / INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP, expedida por la Compañía en 24/09/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 24 días del mes SEPTIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APE

- CLIENTE -
Referencia de Pago No.

18119118

Fecha de Facturación

24/09/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Póliza No.

I-100035315

Periodo Facturado

12/08/2024

05/03/2028

Fecha Límite de Pago

24/10/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

20.000,01

IVA

3.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.800,01

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

Cheque
Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque
TOTAL
ESPACIO PARA EL TIMBRE
Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 24/10/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo endosélo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No.

18119118

Fecha de Facturación

24/09/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Póliza No.

I-100035315

Periodo Facturado

12/08/2024

05/03/2028

Fecha Límite de Pago

24/10/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

20.000,01

IVA

3.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.800,01

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR


901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

Cheque
Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque
TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000018119118(3900)000000023800(96)20241024

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018119118(3900)000000023800(96)20241024

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

OPCIÓN 2

BANCOS

CORRESPONSALES

Te damos más

Tu compañía siempre



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO No. 176 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP."

CONTRATISTA: VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.

SUPERVISOR: ORLANDO PAZ RONDON

La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ITFIP, en la fecha procede a evaluar la garantía única conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015 presentada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO en el marco del Contrato de la referencia.

Para el efecto se recibe la Póliza del contrato de seguro de cumplimiento ante entidades estatales No.I-100035315, expedida por Seguros mundial, tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 24 de septiembre de 2024, la cual presenta el siguiente detalle:

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$23.550.219.00	02	09	2024	05	03	2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$11.775.109.50	02	09	2024	05	03	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$23.550.219.00	02	09	2024	05	03	2026
POLIZA N°	I-100035315 ANEXO 3						
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
NIT:	860.037.013-6						

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente al requerimiento y en consecuencia se imparte la aprobación a las Pólizas

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

emitidas por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** No I-100035315 tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 27 de agosto de 2024.

En constancia se firma en El Espinal - Tolima el 24 de septiembre de 2024.

AMPARO SANCHEZ PERDOMO
Asesora Jurídica ITFIP

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA No.

FECHA: 7-October del 2024.

LUGAR: Sala de juntas, Rectoría ITFIP.

ASUNTO: Comité de Obra

ASISTENTES

No	NOMBRE	CARGO
1	Gerardo Fernando Díaz Parra	Rector.
2	Sandra Piedad Riano B.	Vicerector Administrativo
3	Erley Ricardo Parra	Control Interno (C.I.)
4	Luis Alberto Vasquez G.	Asesor Planeación
5	Dantele Saavedra.	Profesional Contratado
	Adjunta lista de asistencia:	

ORDEN DEL DIA

1. Revisión y Aprobación Actos Contrato N.340-2023.
2. Revisión y Aprobación Actos. Contrato N.341-2023.
3. Revisión y Aprobación Actos Contrato N. 370-2024
4. Revisión y Aprobación Actos contrato N. 176-2024.
5. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO

Saludo del doctor Mario.

1. Contrato N.340, segunda etapa del complejo deportivo, correspondiente a iluminación. Actos fecha terminación del 5 de julio, con las certificaciones de RETIEL y RETILAC. Valor pendiente por cancelar el 10%.
- Contrato Integral. \$233.873.447.
- Contrato Adicional. \$120.844.761.

Seguen el Supervisor del contrato el Ingeniero Orlando Paz. Se recibe a satisfacción la obra.

2 contrato Interventoría N. 341 del, saldo por pago \$ 248 17.751.

Todo este funearonolo perfectamente, según informa el Interventor obra. el contratista VERU H. Ingen.
SAs.

3. El Ingeniero ordeno Puz, solo aclarar que solo falta retirar el material que esta pendiente del retiro de material del canal. Informan que este material se retira hoy.

4. Abordando el punto 3. el acta de obra N. 1. Avance del 26%
El cual se inicio el 12 Agosto 2024, Suspensión 12 Agosto y re inicio el 2 septiembre 2024.

Aclaración de los pagos del contrato 210. 2024: contratista: Union Temporal Pista ITFIP 2024 cuyo valor es \$ 1.682.217.806.

La ctra Sandra Pizano Informe que los recursos Nación del compromiso y CDP, corresponde a \$ 309.217.806, por tal motivo se debe hacer una factura por este monto para efectos de pago y solicitud de PAC. El saldo es recursos propios.

Informe del cuzona Financiero:
Avance del 26.90 % \$ 452.432.264

- Nación \$ 309.217.806=

- Propios \$ 143.216.458=

Se cancela el valor de propios por adelantado porque los recursos Nación es para pago en el mes de noviembre.

Continuado con el orden del dia, Revisión Acta Contrato N. 176. Interventoría Pista atletica, quien informa que ya fue verificado y analizado el avance de obra junto con el supervisor.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Version: 2.0

Código: F08-MGCD02

TEMA: Cornife de Ebrej

Fecha de ejecución: 7 octubre / 2024

HORA: 10:45

OBSERVACIONES:

Firma INSTRUCTOR



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

EL SUSCRITO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ITFIP ESPINAL -TOLIMA

EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

VERUH INGENIERIA SAS, identificada con NIT. No 901.396.950-1, ha cumplido parcialmente hasta la fecha, con lo pactado en el contrato de interventoría No 176 de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".

En verificación del cumplimiento se revisaron las actividades ejecutadas por la interventoría, contenidas en el Acta Parcial No 01 de fecha 03 de octubre de 2024.

Se revisó el pago de Seguridad social del contratista y corresponde a lo exigido en la normatividad vigente.

La presente certificación se expide a los tres días (03) días del mes de octubre de 2024, para efectos de pago de la Factura electrónica de venta No. VERU 76, con fecha del tres (03) de octubre de 2024, expedida por VERUH INGENIERIA SAS.

ORLANDO PAZ RONDON

C.C. No. 93.122.668 De El Espinal Tolima

Supervisor del contrato

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1

ACTA PARCIAL N°1 - CONTRATO DE INTERVENTORIA N°176/2024						
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".						
CONTRATANTE: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP	VALOR INICIAL CONTRATO: CINCO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$163.435.790,00) M.C.T.E.		\$ 117.751.095,00	FECHA DE ESTA ACTA: 03 DE OCTUBRE DE 2024		
	VALOR ADICIONAL:		\$ 0,00	FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2024.		
	VALOR TOTAL CONTRATO MAS ADICION:		\$ 117.751.095,00	FECHA DE LA MODIFICACION:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: VERUH INGENIERIA SAS RIT No 901.396.990-1, Rep Legal LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO C.C No. 1.116.515.638	PLAZA INICIAL: SEIS (06) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			FECHA DE TERMINACION INICIAL: 11 DE FEBRERO DEL 2025 O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
	FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 12 DE AGOSTO DE 2024.		FECHA DE REINICIO N°1: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		NUEVA FECHA DE TERMINACION: 01 DE MARZO DE 2025 O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
	FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:		FECHA DE REINICIO N°2:		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
SUPERVISOR: Ingeniero ORLANDO PAZ RONDON - Supervisor y Docente.	FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:		FECHA DE REINICIO N°3:		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
1. PERSONAL PROFESIONAL						
	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	VALOR MES	No. MESES	V. PARCIAL
Director de Interventoria	\$7.500.000	25%	2,05	3.843.750	6,00	\$23.062.500
Residente de Interventoria	\$3.000.000	100%	2,05	6.150.000	6,00	\$36.900.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL						\$59.962.500
2. PERSONAL TECNICO						
	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	VALOR MES	No. MESES	V. PARCIAL
Tecnologo SISO	\$1.300.000	100%	2,05	2.665.000	6,00	\$16.990.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO						\$76.950.500
3. OTROS COSTOS DIRECTOS						
	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO			V. PARCIAL
Alquiler de Oficina (incluye servicios públicos).	MES	6,00	\$1.300.000			\$7.600.000
Computador, camara fotografica o firmadora y equipo de oficina.	MES	6,00	\$750.000			\$4.500.000
Edicion e Impresión de Informes y planos.	MES	6,00	\$750.000			\$4.500.000
Comunicaciones	MES	6,00	\$233.000			\$1.398.000
Soporte juridico y contable	MES	6,00	\$800.000			\$4.800.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$22.998.000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$98.950.500
IVA 19%						\$18.800.595
VALOR TOTAL						\$117.751.095
BALANCE DEL CONTRATO						
EJECUCION						% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO (AVANCE PORCENTAJE DE OBRA)
VALOR CONTRATO		\$117.751.095,00				
ACTA PARCIAL 1		\$ 31.675.045,00				26,90%
VALOR ADICIONAL						
SALDO POR COBRAR		\$86.076.050,00				
SUMAS IGUALES		\$117.751.095,00		\$117.751.095,00		
INFORMACION PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1						
COSTO DIRECTO		\$ 26.617.685,00				
IVA 19%		\$ 5.057.360,00				
VALOR PRESENTE ACTA		\$31.675.045,00				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  ING. ORLANDO PAZ RONDON Supervisor del Contrato </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  VERUH INGENIERIA SAS Rep. Legal - LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO Interventor </div> </div>						

MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 176 DEL 31 DE JULIO DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL PROYECTO “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA
ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP”.

CONTRATANTE
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP

CONTRATISTA
VERUH INGENIERÍA S.A.S

INFORME DE INTERVENTORIA No. 01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL
PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2024.

OCTUBRE 01 DE 2024.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	9
4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA.....	10
5. ACTAS SUSCRITAS	10
6. GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA.....	10
6.1 GARANTIAS:.....	11
7. ESTADO INICIAL DEL SITIO DE OBRA PARA EL PERIODO DEL INFORME	13
7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DETALLADAS EN EL CUADRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA)	14
7.2 VALLA INFORMATIVA Y AVISOS	14
8. DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA	14
9. RESUMEN OBRAS CONTRATADAS.....	15
10. INFORME TÉCNICO.....	19
10.1 REVISIÓN DE DISEÑOS E IMPLANTACIÓN EN TERRENO DEL PROYECTO	19
10.2 CONTROL DE CAMBIOS O MODIFICACIONES AL DISEÑO	20
11. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	20
12. INFORME FINANCIERO.....	20
13. BALANCE FINANCIERO.....	23
13.1 RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA	23
14. ACTAS MODIFICATORIAS EN EL PERIODO	24
15. CONTROL PERSONAL DE OBRA.....	24
15.1 CONTROL DE EQUIPO DE OBRA.....	24
15.2 REGISTRO ESTADO DEL CLIMA	24
16. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	25
16.1 ENSAYOS DE LABORATORIO.....	25
16.2 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS.....	25
17. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	26
17.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	26
18. ACTAS SUSCRITAS	27

18.1 ACTAS SUSCRITAS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO.....	27
19. ESTADO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	27
19.1. GARANTIAS:.....	27
20. DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE INTERVENTORIA	29
21. CONTROL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....	29
22. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29
23. CONTROL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.....	30
24. BITÁCORAS DE INTERVENTORÍA.....	¡Error! Marcador no definido.
25. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	30
26. ANEXOS.....	33
26.1 ANEXO RESUMEN GENERAL DEL PERIODO	33
26.2 ANEXO PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA	¡Error! Marcador no definido.
26.3 ANEXO BITÁCORA DE OBRA	¡Error! Marcador no definido.
26.4 ANEXO PAGOS Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE OBRA.....	¡Error! Marcador no definido.
26.5 ANEXO PAGOS Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE INTERVENTORÍA.....	33
26.6 ANEXO CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33
26.7 ANEXO CONTROL SS.....	¡Error! Marcador no definido.
26.8 ANEXO CONTROL SST	33
26.9 POLIZAS DE OBRA	33
26.10 POLIZAS DE INTERVENTORÍA.....	33
26.11 COMUNICACIONES Y ACTAS.....	¡Error! Marcador no definido.
26.12 ANEXO PLANOS MODIFICACIONES	¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

“El ITFIP como INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, presta servicios a la comunidad de la región a través de programas académicos y servicios de educación superior en búsqueda del mejoramiento de la sociedad y del entorno regional y nacional, por tal motivo y en aras de prestar un mejor servicio a la comunidad académica, tiene como objetivos mejorar su estructura general como institución y en este caso en particular, optimizar su infraestructura física en especial la de recreación y deporte.

La Institución formuló desde la oficina del asesor de planeación el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA, con el objetivo de Mejorar las condiciones de la infraestructura física del Campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP- del Espinal Tolima. El proyecto fue viabilizado, de acuerdo a la Ficha EBI del SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS – SUIFP, código BPIN 2018011000079, emitido por el Departamento Nacional de Planeación. La ejecución del proyecto de inversión fue aprobada para adecuar, mejorar y mantener infraestructura física institucional y los ambientes de aprendizaje. Para ello se requirió de contratar la obra y la interventoría de acuerdo con los estudios y diseños del proyecto.

En concordancia, y teniendo en cuenta que el ITFIP cuenta con escenarios deportivos entre los que se encuentran la cancha de fútbol, el gimnasio, la piscina semi olímpica y el coliseo cubierto, se realizó por parte de funcionarios de la entidad, visita técnica en la cual se constató la necesidad de realizar la obra pública para la remodelación del sistema de iluminación de la cancha de futbol, toda vez que las luminarias del escenario de grama natural, ya habían cumplido con su vida útil, y eran de una tecnología actualmente obsoleta, como la metal halide y por ello, ya no generaban la luminosidad necesaria para su óptima utilización presentando un mayor consumo de energía eléctrica.

Por lo anterior, la entidad realizó un análisis fotométrico, cumpliendo con las normas para garantizar la estabilidad, durabilidad y calidad. En consecuencia, nació la necesidad de cambiar las luminarias existentes que son metal halide de 1000 w por proyectores tipo LED de 960 w, de mayor eficiencia, con el fin de contar con una iluminación eficiente en cuanto a su consumo para la cancha de fútbol de grama natural, donde se prioriza la relación visual que tienen las personas con el medio ambiente que habitan, optimizando al máximo la luz tanto natural como artificial, y generando en las personas un ambiente de seguridad y confianza.

Así pues, se justificó la necesidad por parte del ITFIP, de adelantar un proceso de contratación para la CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE, con el fin de cumplir con el alcance del proyecto de inversión y así Mejorar las condiciones de la infraestructura física del Campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP- de El Espinal Tolima”. *Tomado del Documento de estudios previos den proceso Licitación Pública N° LP-002-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE”, con fecha 02/08/2024.*

En ese sentido la interventoría consistirá en el seguimiento que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. Para el presente proceso, atendiendo a la complejidad de la obra a la cual se le pretende llevar a cabo la interventoría como consecuencia de su onerosidad, se hace necesario la contratación de la Interventoría”. *Tomado del documento Estudios previos IPMC 029-2023, de Estudios previos para la selección bajo la modalidad de invitación pública de mínima cuantía.*

Posteriormente como resultado del citado proceso de selección, por parte de la entidad, se suscribió contrato de interventoría No.176 el treinta y uno (31) de Julio de 2024, entre el Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional ITFIP y Veruh Ingeniería S.A.S, por las anteriores consideraciones y como parte de la ejecución de este contrato de interventoría, se da origen a este primer informe mensual de interventoría, el cual abarca el periodo desde el dos (02) de Septiembre del 2024 al primero (01) de Octubre del 2024, el cual busca documentar el seguimiento y control realizado al contrato de obra o contrato principal, cumpliendo así con las obligaciones contractuales del contrato No. 176 de 2024 específicamente las referidas a los informes periódicos consignados en la minuta contractual del mismo contrato.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La entidad pública contratante por medio de la oficina de planeación formuló y presentó el proyecto denominado: **“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE”**, con la finalidad de mejorar la infraestructura física destinada para la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de la población de la institución, municipio y región. Por ello se celebró contrato de obra No. 210 del ocho (08) de Agosto del 2024, entre Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP y la UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024.

Las principales actividades para desarrollar en cumplimiento del objeto contractual del contrato a vigilar son:

ITEM	CONCEPTO	UN	CANTIDAD
	PISTA ATLETICA		
1	PRELIMINARES		
1,1	Campamento de obra 18 M2	UN	1
1,2	Acometida eléctrica provisional L0 30 mts	UN	1
1,3	Descapote y limpieza e=0,20 mt. Y retiro apile a 15 mt.	M2	2520
1,4	Localización y Replanteo	M2	2520
1,5	Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas menores y desenraice.	UN	25
	TOTAL CAPITULO		
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,1	Excavación en material común	M3	850
2,2	Nivelación, perfilación y compactación mecánica de subrasante	M2	2520
2,3	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo	M3	280
2,4	Suministro e instalación Geotextil NT 1600	M2	2800
2,5	Llenos compactados en subbase granular y base Incl. Transporte, compactación mecánica.	M3	945
2,6	Reconformación, perfilación de la sub base	M2	2400
2,7	Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.	M3	1008
	TOTAL CAPITULO		

3	INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJES		
3,1	Excavación en material común	M3	75
3,2	Suministro e instalación tubo pvc alcantarillado S4 200 mm.	ML	45
3,3	Suministro y extendida de arena para recubrimiento de tubería de alcantarillado	M3	10,5
3,4	Construcción de Caja de inspección de 1,0 x1,0 mt. hasta H=1,20 mt.	UND	2
3,5	Suministro e instalación de Filtro drenante de 8" tubería drenaje Incluye Triturado G. geotextil NT 2500	ML	90
3,6	Conexión a pozo existente incluye resane y pañete impermeabilizado	UND	2
	POZOS DE ALCANTARILLADO		
3,7	Base y cañuela en concreto de 3000 Psi E = 0,25 mt.	UND	2
3,8	Pañete impermeabilizado para pozos	M2	10
3,9	Cilindro en ladrillo tolete E= 0,25 mt.	UND	2
3,1	Cono de reducción H= 0,25 mt.	UND	2
3,11	Suministro e instalación de aro tapa HG D= 0,60 mt.	UND	2
3,12	Pasos en U D= 3/4", incluye anticorrosivo	UND	8
	TOTAL CAPITULO		
4	ANDENES Y CARCAMOS EN CONCRETO		
4,1	Placa en concreto para anden de 3000 psi de e=0,15 mts.	M2	300
4,2	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho 0,40 mt. x H= promedio 0,40 mt. Interno de pista en los dos costados	ML	650
4,3	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo ancho 0,50 mt. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 mts.	ML	650
4,4	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.	kg	2365
	TOTAL CAPITULO		
5	PAVIMENTO FLEXIBLE PISTA ATLETICA		
5,1	Imprimación	M2	2520
5,2	Rodadura asfáltica pista e=0,07 mts. Inc. Guías de nivelación en espacio reducido, compactación y sellado con llanta,	M2	2520
5,3	Sardinell de confinamiento de la estructura y asfalto en concreto fundido en sitio de 0,20 x 0,80 mts	ML	650
5,4	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Kg	3430

5,5	Demolición de sardinel en concreto	ML	7
5,6	Tratamiento para empalmar el asfalto instalado con el asfalto a aplicar	UND	1
5,7	Mezcla asfáltica de nivelación mdc -10 para rodadura	M2	560
TOTAL CAPITULO			
6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
6,1	Poste metálico troncocónico de 8 m. con brazo doble propósito, para luminaria horizontal normal AP301-1	UND	4
6,2	Suministro e instalación de luminaria horizontal tipo led de 40-54W. Incluye fotocelda	UND	8
TOTAL CAPITULO			
6	PINTURA RECUBRIMIENTO SINTETICO DE ALTA GAMA		
6,1	<p>Capa primer: Esta capa tiene la finalidad de afinar las irregularidades de asfalto, sellar la superficie y aislarla para recibir la capa de base acrílica. Base acrílica: Aplicación de una (1) capa compuesta por una mezcla de resinas acrílicas y arenilla sílice redondeada que proporcionará una textura fina y que tendrá por objetivo sellar la superficie. CUSHION: Aplicación de dos (2) capas compuestas por una mezcla de resinas acrílicas, arenilla sílice redondeada y gránulos de caucho que proporcionará una textura fina, acolchada, confortable y con propiedades de absorción del golpe. Capa de color: Aplicación de una primera capa acrílica de color mezclada con arena sílice cuya composición incrementa la dureza y resistencia del sistema al rayado y abrasión. Capa protección color: Aplicación de una segunda capa acrílica de color, que reforzará el acabado final del sistema sintético.</p>	M2	1634,8
DEMARCACIÓN			
6,2	emarcación: Localización de líneas y competencias, demarcación con pintura de alto tráfico.	ML	3250

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato se lleva a cabo en el municipio de El Espinal, localizado al Noroccidente del departamento del Tolima, a una altura de 323 m.s.n.m.; su extensión total es de 231 Km² y cuenta con una temperatura promedio de 32°C, el mejoramiento a intervenir se encuentra localizado en la cancha de futbol de grama sintética, dentro de la entidad, Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP.


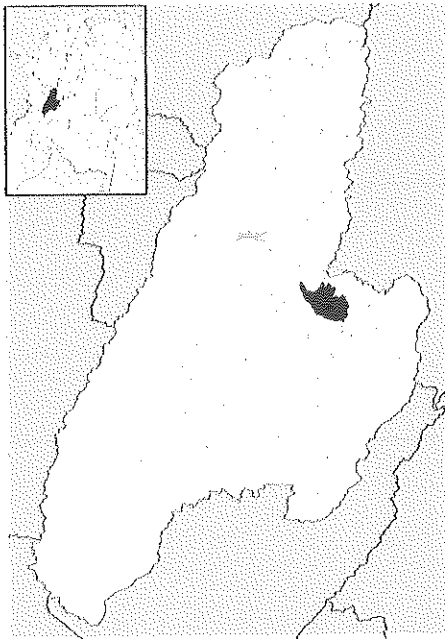
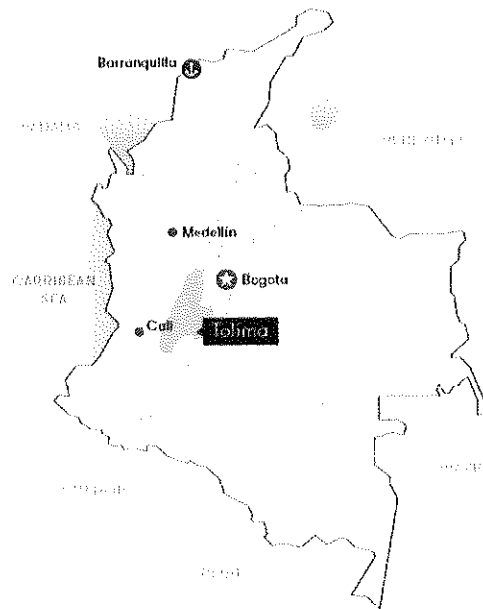


Imagen satelital de la localización del proyecto dentro del área del predio del ITFIP, representado por el recuadro de color rojo.

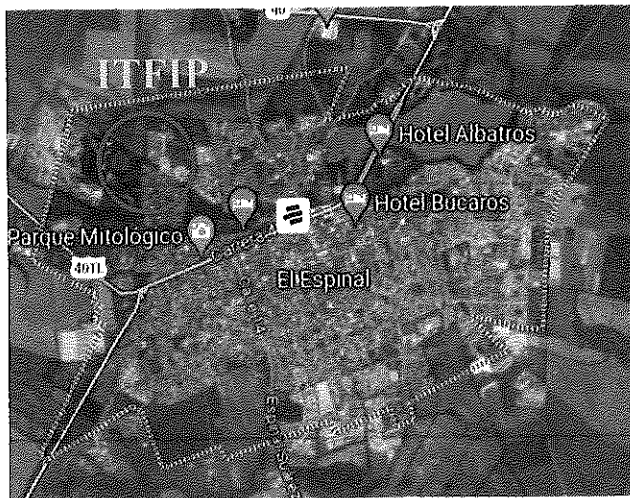

La localización del proyecto dentro del área del predio del ITFIP, el cual se desarrollará la pista atlética alrededor de la actual de la cancha de fútbol de grama sintética de la entidad contratante, ubicada en la zona central a lado de la cancha de grama natural en sentido oriente, en la sede principal del ITFIP, en El Espinal Tolima.

4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Contrato De Obra:	No. 210 De 2024.
Contratante:	Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional ITFIP.
Contratista:	Unión Temporal Pista ITFIP 2024.
Representante Legal:	Luis Fernando Lozano Ríos.
Objeto:	“Contratar La Construcción De La Pista Atlética Etapa 3 – Complejo Deportivo Instituto Tolimense De Formación Técnica Y Profesional ITFIP”.
Valor Del Contrato:	Mil seiscientos ochenta y dos millones doscientos diecisiete mil ochocientos seis pesos (\$1.682.217.806,00) M/CTE.
Fecha De Suscripción:	Ocho (08) De Agosto De 2024.
Plazo De Ejecución:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
Acta De Inicio:	Doce (12) De Agosto De 2024.
Fecha De Terminación:	Treinta y uno (31) de Diciembre del 2024.

5. ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 1:	DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2024

6. GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

El contrato de Obra No. 210 de 2024, se encuentra amparado por la póliza expedida, por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual fue revisada y aprobada por parte de la entidad.

6.1 GARANTIAS:

PÓLIZA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					
Compañía de Seguros	Póliza o Cerf. Modificar. No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
Póliza De Cumplimiento					
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A	25-44-101193709 (Anexo N°0)	Cumplimiento del contrato	08/08/2024	08/08/2025	\$336.443.561,20
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A	25-44-101193709 (Anexo N°0)	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/08/2024	08/02/2028	\$168.221.780,60
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A	25-44-101193709 (Anexo N°0)	Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara, 5 años, 0 meses y 0 días.		\$336.443.561,20
Póliza De RCE					
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A	25-40-101051569 (Anexo N°0)	Predios labores y operaciones	08/08/2024	08/02/2025	\$260.000.000,00
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A	25-40-101051569 (Anexo N°0)	Contratistas y subcontratistas	08/08/2024	08/02/2025	\$260.000.000,00
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A	25-40-101051569 (Anexo N°0)	Vehículos propios y no propios	08/08/2024	08/02/2025	\$260.000.000,00
NOTA: EL ANEXO N°1 FUE EXPEDIDO POR LA ASEGURADORA SIN VIGENCIAS, PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE CAMBIO DE FECHA POR LO TANTO CON ESE ERROR NO FUE POSIBLE DARLE USO Y SE DESCARTA PARA LA UTILIZACION DE ESTE CONSECUTIVO CONTRACTUAL.					

PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA					
Póliza De Cumplimiento					
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101193709 (Anexo N°2)	Cumplimiento del contrato	12/08/2024	12/08/2025	\$336.443.561,20
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101193709 (Anexo N°2)	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/08/2024	12/02/2028	\$168.221.780,60
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101193709 (Anexo N°2)	Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara, 5 años, 0 meses y 0 días.		\$336.443.561,20
Póliza De RCE					
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-40-101051569 (Anexo N°2)	Predios labores y operaciones	12/08/2024	12/02/2025	\$260.000.000,00
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-40-101051569 (Anexo N°2)	Contratistas y subcontratistas	12/08/2024	12/02/2025	\$260.000.000,00
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-40-101051569 (Anexo N°2)	vehículos propios y no propios	12/08/2024	12/02/2025	\$260.000.000,00
PÓLIZA DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA					
Póliza De Cumplimiento					
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101193709 (Anexo N°3)	Cumplimiento del contrato	12/08/2024	02/09/2025	\$336.443.561,20
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101193709 (Anexo N°3)	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/08/2024	02/03/2028	\$168.221.780,60

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101193709 (Anexo N°3)	Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara, 5 años, 0 meses y 0 días.		\$336.443.561,20
Póliza De RCE					
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-40-101051569 (Anexo N°3)	Predios labores y operaciones	12/08/2024	02/03/2025	\$260.000.000,00
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-40-101051569 (Anexo N°3)	Contratistas y subcontratistas	12/08/2024	02/03/2025	\$260.000.000,00
Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-40-101051569 (Anexo N°3)	vehículos propios y no propios	12/08/2024	02/03/2025	\$260.000.000,00

7. ESTADO INICIAL DEL SITIO DE OBRA PARA EL PERIODO DEL INFORME

La entidad contratante, contratista e interventoría, realizaron una visita a la obra, para revisar el estado inicial de la zona de la obra e identificar la estructura del proyecto, respecto al plano. Cuando revisaron los planos de la pista, evidenciaron que no se contempló la demolición del cárcamo y sendero existe, dentro del presupuesto actual del proyecto. Adicionalmente realizaron la evaluación de Estudios y diseños del proyecto para optimizarlo, por lo que se analizó lo siguiente:

Se recomendó la revisión de los estudios y diseños del proyecto para que verificaran y corroboraran si cumplían correctamente las pendientes transversales y longitudinales de la pista, las especificaciones técnicas, y adicionalmente cumplieran con la normativa deportiva colombiana correspondiente.

Para el capítulo 3 en las actividades de pozos de alcantarillado, revisaron los estudios y diseños del proyecto en la sección que se recomendó de los mismos y su necesidad de acuerdo con las condiciones iniciales apreciadas en la zona norte y oriente del complejo deportivo, en cuanto a acumulación de aguas superficiales por topografía del terreno dentro de la propiedad de la institución, para que así conocieran en detalle el diseño dentro del proyecto respecto a este importante tema.

Durante la revisión de los ítems que contemplan el presupuesto de obra, se recomendó por parte de la interventoría realizar un replanteo del área de trabajo, para verificar que la cantidad de especies arbóreas a talar presupuestadas, fueran las correctas y estrictamente necesarias. El Ing. Ambiental del ITFIP Juan Pablo Nieto, corroboró que las especies arbóreas a talar no requerían un permiso especial, ya que todas son especies frutales, por lo tanto, se decidió que no era necesario tramitar permisos especiales, pero si el procedimiento recomendado por parte del ITFIP para dicha actividad según CORTOLIMA en las etapas anteriores de este mismo proyecto.

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la implementación, monitoreo y control de las obras se realizaron de acuerdo con los diseños establecidos en los planos proporcionados por la entidad y las especificaciones técnicas correspondientes.

7.2 VALLA INFORMATIVA Y AVISOS

La valla informativa no se exigió en la minuta contractual el contrato de obra No. 210 de 2024.

8. DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA

A continuación, se enumeran los documentos necesarios para llevar a cabo un proceso administrativo y técnico adecuado:

- Contrato de Obra No. 210 de 2024, firmado y legalizado.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
- Garantías exigidas dentro del contrato.
- Aprobación de las garantías exigidas.
- Presupuesto general de las obras contratadas.
- Estudio y diseños del proyecto aprobados por el ITFIP.
- Presupuesto de obra y APU.

- Cronograma de obra.
- Documentos de la oferta económica del entonces proponente y demás documentos del proceso de selección.

9. RESUMEN OBRAS CONTRATADAS

A continuación, se presenta cuadro resumen con todos los capítulos e ítems de obra contratados, y el valor total contractual de cada uno de ellos.

ITEM	CONCEPTO	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	PISTA ATLETICA				
1	PRELIMINARES				
1,1	Campamento de obra 18 M2	UN	1	\$ 2.521.506	\$ 2.521.506
1,2	Acometida eléctrica provisional L0 30 mts	UN	1	\$ 2.019.017	\$ 2.019.017
1,3	Descapote y limpieza e=0,20 mt. Y retiro apile a 15 mt.	M2	2520	\$ 7.782	\$ 19.610.640
1,4	Localización y Replanteo	M2	2520	\$ 9.270	\$ 23.360.400
1,5	Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas menores y desenraice.	UN	25	\$ 984.524	\$ 24.613.100
	TOTAL CAPITULO				\$ 72.124.663
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1	Excavación en material común	M3	850	\$ 32.652	\$ 27.754.200
2,2	Nivelación, perfilación y compactación mecánica de subrasante	M2	2520	\$ 7.800	\$ 19.656.000
2,3	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo	M3	280	\$ 104.184	\$ 29.171.520
2,4	Suministro e instalación Geotextil NT 1600	M2	2800	\$ 9.890	\$ 27.692.000
2,5	Llenos compactados en subbase granular y base Incl.	M3	945	\$ 125.500	\$ 118.597.500

	Transporte, compactación mecánica.				
2,6	Reconformación, perfilación de la sub base	M2	2400	\$ 1.950	\$ 4.680.000
2,7	Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.	M3	1008	\$ 31.200	\$ 31.449.600
	TOTAL CAPITULO				\$ 259.000.820
3	INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJES				
3,1	Excavación en material común	M3	75	\$ 32.652	\$ 2.448.900
3,2	Suministro e instalación tubo pvc alcantarillado S4 200 mm.	ML	45	\$ 72.541	\$ 3.264.345
3,3	Suministro y extendida de arena para recubrimiento de tubería de alcantarillado	M3	10,5	\$ 112.300	\$ 1.179.150
3,4	Construcción de Caja de inspección de 1,0 x1,0 mt. hasta H=1,20 mt.	UND	2	\$ 956.230	\$ 1.912.460
3,5	Suministro e instalación de Filtro drenante de 8" tubería drenaje Incluye Triturado G. geotextil NT 2500	ML	90	\$ 175.852	\$ 15.826.680
3,6	Conexión a pozo existente incluye resane y pañete impermeabilizado	UND	2	\$ 352.500	\$ 705.000
	POZOS DE ALCANTARILLADO				
3,7	Base y cañuela en concreto de 3000 Psi E = 0,25 mt.	UND	2	\$ 988.256	\$ 1.976.512
3,8	Pañete impermeabilizado para pozos	M2	10	\$ 30.785	\$ 307.850
3,9	Cilindro en ladrillo tolete E= 0,25 mt.	UND	2	\$ 725.410	\$ 1.450.820
3,1	Cono de reducción H= 0,25 mt.	UND	2	\$ 389.545	\$ 779.090
3,11	Suministro e instalación de aro tapa HG D= 0,60 mt.	UND	2	\$ 452.587	\$ 905.174
3,12	Pasos en U D= 3/4", incluye anticorrosivo	UND	8	\$ 39.852	\$ 318.816
	TOTAL CAPITULO				\$ 31.074.797

4	ANDENES Y CARCAMOS EN CONCRETO				
4,1	Placa en concreto para anden de 3000 psi de e=0,15 mts.	M2	300	\$ 115.200	\$ 34.560.000
4,2	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho 0,40 mt. x H= promedio 0,40 mt. Interno de pista en los dos costados	ML	650	\$ 178.560	\$ 116.064.000
4,3	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo ancho 0,50 mt. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 mts.	ML	650	\$ 158.471	\$ 103.006.150
4,4	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.	kg	2365	\$ 12.635	\$ 29.881.775
	TOTAL CAPITULO				\$ 283.511.925
5	PAVIMENTO FLEXIBLE PISTA ATLETICA				
5,1	Imprimación	M2	2520	\$ 6.500	\$ 16.380.000
5,2	Rodadura asfáltica pista e=0,07 mts. Inc. Guías de nivelación en espacio reducido, compactación y sellado con llanta,	M2	2520	\$ 82.100	\$ 206.892.000
5,3	Sardinell de confinamiento de la estructura y asfalto en concreto fundido en sitio de 0,20 x 0,80 mts	ML	650	\$ 135.641	\$ 88.166.650
5,4	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Kg	3430	\$ 8.200	\$ 28.126.000
5,5	Demolición de sardinell en concreto	ML	7	\$ 11.250	\$ 78.750
5,6	Tratamiento para empalmar el asfalto instalado con el asfalto a aplicar	UND	1	\$ 757.441	\$ 757.441
5,7	Mezcla asfáltica de nivelación mdc -10 para rodadura	M2	560	\$ 52.500	\$ 29.400.000
	TOTAL CAPITULO				\$ 369.800.841
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6,1	Poste metálico troncocónico de 8 m. con brazo doble	UND	4	\$ 5.120.648	\$ 20.482.592

	propósito, para luminaria horizontal normal AP301-1				
6,2	Suministro e instalación de luminaria horizontal tipo led de 40-54W. Incluye fotocelda	UND	8	\$ 1.174.814	\$ 9.398.512
	TOTAL CAPITULO				\$ 29.881.104
6	PINTURA RECUBRIMIENTO SINTETICO DE ALTA GAMA				
6,1	<p>Capa primer: Esta capa tiene la finalidad de afinar las irregularidades de asfalto, sellar la superficie y aislarla para recibir la capa de base acrílica.</p> <p>Base acrílica: Aplicación de una (1) capa compuesta por una mezcla de resinas acrílicas y arenilla sílice redondeada que proporcionará una textura fina y que tendrá por objetivo sellar la superficie.</p> <p>CUSHION: Aplicación de dos (2) capas compuestas por una mezcla de resinas acrílicas, arenilla sílice redondeada y gránulos de caucho que proporcionará una textura fina, acolchada, confortable y con propiedades de absorción del golpe.</p> <p>Capa de color: Aplicación de una primera capa acrílica de color mezclada con arena sílice cuya composición incrementa la dureza y resistencia del sistema al rayado y abrasión.</p> <p>Capa protección color: Aplicación de una segunda capa acrílica de color, que reforzará el acabado final del sistema sintético.</p>	M2	1634,8	\$ 127.451	\$ 208.356.895
	DEMARCACIÓN				

6,2	emarcación: Localización de líneas y competencias, demarcación con pintura de alto tráfico.	ML	3250	\$ 9.500	\$ 30.875.000
TOTAL CAPITULO					\$ 239.231.895
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 1.284.626.045
Administración				24%	\$ 308.310.251
Imprevistos				1%	\$ 12.846.260
Utilidad				5%	\$ 64.231.302
IVA/utilidad				19%	\$ 12.203.947
VALOR TOTAL DE OBRA					\$ 1.682.217.806

10. INFORME TÉCNICO

El informe técnico detalla los aspectos clave para el desarrollo exitoso de las obras contratadas, realizadas según los estudios, diseños y especificaciones técnicas proporcionados por la entidad contratante. Este informe aborda temas como:

- Revisión de diseños, adaptados a las necesidades específicas del proyecto.
- Supervisión de las actividades programadas versus las ejecutadas por el contratista durante el período reportado.

Estos elementos garantizan la adecuado seguimiento y control de la obra, asegurando su cumplimiento con los requisitos establecidos.

10.1 REVISIÓN DE DISEÑOS E IMPLANTACIÓN EN TERRENO DEL PROYECTO

El contratista y la interventoría revisaron los estudios y diseños, verificando su adecuación a las condiciones reales del sistema y localizando las zonas específicas de la obra dentro de la institución, evaluando su:

- Coherencia con las condiciones actuales del sistema
- Pertinencia con las necesidades reales del proyecto

Este proceso permitió identificar y localizar las distintas zonas que componen la obra dentro del área institucional.

10.2 CONTROL DE CAMBIOS O MODIFICACIONES AL DISEÑO

En el periodo del presente informe si se realizaron solicitudes de cambio a los diseños entregados por la entidad contratante, los cuales fueron: modificación de sección transversal del cárcamo exterior de la pista de atletismo, se prescindió de la caja de inspección de la sección suroccidental de la cancha de futbol de grama sintética, proyectada dentro del proyecto de la pista de atletismo, la creación del diseño de los muros de contención, y el cambio del geodren por el dren francés. Dichas modificaciones fueron presentadas y aprobadas por la entidad contratante.

11. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO

De acuerdo con la programación de obra entregada por el contratista se presentan las actividades programadas para el periodo comprendido entre el dos (02) de Septiembre al primero (01) de Octubre de 2024 para lo cual se anexa al presente informe.

12. INFORME FINANCIERO

12.1 DETALLE POR CAPÍTULOS DE LOS COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA

El valor total del contrato de obra es por MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$1.682.217.806,00) M/Cte de acuerdo con el presupuesto contra actual.

ITEM	CONCEPTO	
	PISTA ATLETICA	
1	PRELIMINARES	
1,1	Campamento de obra 18 M2	\$ 2.521.506,00
1,2	Acometida eléctrica provisional L0 30 mts	\$ 2.019.017,00
1,3	Descapote y limpieza e=0,20 mt. Y retiro apile a 15 mt.	\$ 19.610.640,00
1,4	Localización y Replanteo	\$ 23.360.400,00

1,5	Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas menores y desenraice.	\$ 24.613.100,00
TOTAL CAPITULO		\$ 72.124.663,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	
2,1	Excavación en material común	\$ 27.754.200,00
2,2	Nivelación, perfilación y compactación mecánica de subrasante	\$ 19.656.000,00
2,3	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo	\$ 29.171.520,00
2,4	Suministro e instalación Geotextil NT 1600	\$ 27.692.000,00
2,5	Llenos compactados en subbase granular y base Incl. Transporte, compactación mecánica.	\$ 118.597.500,00
2,6	Reconformación, perfilación de la sub base	\$ 4.680.000,00
2,7	Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.	\$ 31.449.600,00
TOTAL CAPITULO		\$ 259.000.820,00
3	INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJES	
3,1	Excavación en material común	\$ 2.448.900,00
3,2	Suministro e instalación tubo pvc alcantarillado S4 200 mm.	\$ 3.264.345,00
3,3	Suministro y extendida de arena para recubrimiento de tubería de alcantarillado	\$ 1.179.150,00
3,4	Construcción de Caja de inspección de 1,0 x1,0 mt. hasta H=1,20 mt.	\$ 1.912.460,00
3,5	Suministro e instalación de Filtro drenante de 8" tubería drenaje Incluye Triturado G. geotextil NT 2500	\$ 15.826.680,00
3,6	Conexión a pozo existente incluye resane y pañete impermeabilizado	\$ 705.000,00
POZOS DE ALCANTARILLADO		
3,7	Base y cañuela en concreto de 3000 Psi E = 0,25 mt.	\$ 1.976.512,00
3,8	Pañete impermeabilizado para pozos	\$ 307.850,00
3,9	Cilindro en ladrillo tolete E= 0,25 mt.	\$ 1.450.820,00

3,1	Cono de reducción H= 0,25 mt.	\$ 779.090,00
3,11	Suministro e instalación de aro tapa HG D= 0,60 mt.	\$ 905.174,00
3,12	Pasos en U D= 3/4", incluye anticorrosivo	\$ 318.816,00
TOTAL CAPITULO		\$ 31.074.797,00
4	ANDENES Y CARCAMOS EN CONCRETO	
4,1	Placa en concreto para anden de 3000 psi de e=0,15 mts.	\$ 34.560.000,00
4,2	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho 0,40 mt. x H= promedio 0,40 mt. Interno de pista en los dos costados	\$ 116.064.000,00
4,3	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo ancho 0,50 mt. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 mts.	\$ 103.006.150,00
4,4	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.	\$ 29.881.775,00
TOTAL CAPITULO		\$ 283.511.925,00
5	PAVIMENTO FLEXIBLE PISTA ATLETICA	
5,1	Imprimación	\$ 16.380.000,00
5,2	Rodadura asfáltica pista e=0,07 mts. Inc. Guías de nivelación en espacio reducido, compactación y sellado con llanta,	\$ 206.892.000,00
5,3	Sardinel de confinamiento de la estructura y asfalto en concreto fundido en sitio de 0,20 x 0,80 mts	\$ 88.166.650,00
5,4	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	\$ 28.126.000,00
5,5	Demolición de sardinel en concreto	\$ 78.750,00
5,6	Tratamiento para empalmar el asfalto instalado con el asfalto a aplicar	\$ 757.441,02
5,7	Mezcla asfáltica de nivelación mdc -10 para rodadura	\$ 29.400.000,00
TOTAL CAPITULO		\$ 369.800.841,02
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	
6,1	Poste metálico troncocónico de 8 m. con brazo doble propósito, para luminaria horizontal normal AP301-1	\$ 20.482.592,00
6,2	Suministro e instalación de luminaria horizontal tipo led de 40-54W. Incluye fotocelda	\$ 9.398.512,00
TOTAL CAPITULO		\$ 29.881.104,00
6	PINTURA RECUBRIMIENTO SINTETICO DE ALTA GAMA	

6,1	<p>Capa primer: Esta capa tiene la finalidad de afinar las irregularidades de asfalto, sellar la superficie y aislarla para recibir la capa de base acrílica. Base acrílica: Aplicación de una (1) capa compuesta por una mezcla de resinas acrílicas y arenilla sílice redondeada que proporcionará una textura fina y que tendrá por objetivo sellar la superficie. CUSHION: Aplicación de dos (2) capas compuestas por una mezcla de resinas acrílicas, arenilla sílice redondeada y gránulos de caucho que proporcionará una textura fina, acolchada, confortable y con propiedades de absorción del golpe. Capa de color: Aplicación de una primera capa acrílica de color mezclada con arena sílice cuya composición incrementa la dureza y resistencia del sistema al rayado y abrasión. Capa protección color: Aplicación de una segunda capa acrílica de color, que reforzará el acabado final del sistema sintético.</p>	\$ 208.356.894,80
DEMARCACIÓN		
6,2	emarcación: Localización de líneas y competencias, demarcación con pintura de alto tráfico.	\$ 30.875.000,00
TOTAL CAPITULO		\$ 239.231.894,80

13. BALANCE FINANCIERO

Balance Del Contrato De Obra		
Valor Inicial		\$ 1.682.217.806,00
Valor Cobrado Actas		
Valor Por Cobrar	\$ 1.682.217.806,00	
Sumas Iguales	\$ 1.682.217.806,00	\$ 1.682.217.806,00

13.1 RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA

A la fecha no se ha realizado ningún desembolso al contratista de obra, por ningún concepto ni de actas de anticipo, ya que no lo contempla este contrato, ni de actas parciales de obra.

14. ACTAS MODIFICATORIAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se han suscrito actas modificatorias para el contrato supervisado por esta interventoría.

15. CONTROL PERSONAL DE OBRA

En el siguiente cuadro se muestra el personal profesional mínimo propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría:

Nombre	Cargo	Calificación
Jesús Sánchez Garnica	Director De Obra	Aprobado (el mismo de la oferta)
Oscar Andrés Marroquín Soto	Residente De Obra	Aprobado (el mismo de la oferta)
Alexander Bustos Prada	Topógrafo	Aprobado (el mismo de la oferta)
Héctor Andrés García Manchola	Asesor Geotecnista	Aprobado (el mismo de la oferta)
Maria Fernanda Sánchez Páez	Profesional - Asesor Siso	Aprobado (el mismo de la oferta)

Adicionalmente se presentó personal en obra, durante el presente periodo contractual.

15.1 CONTROL DE EQUIPO DE OBRA

En esta sección, se relaciona el equipo disponible en obra, aprobado por esta interventoría.

15.2 REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

De manera general en el sitio donde se desarrollaron las actividades de obra, se presentó un clima apto para la correcta ejecución de estas, sin presentar algún inconveniente por ello.

16. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

El monitoreo y control de calidad de las actividades contratadas se llevaron a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas del contratante y la normativa relevante, con un enfoque adicional en la verificación de la calidad de los materiales utilizados.

- ✓ Se solicitó certificados de calidad de los principales materiales utilizados por el momento en obra, como del cemento, arena, triturado, concreto, y acero.
- ✓ Se controla el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos entregados por la Entidad para la ejecución del contrato.
- ✓ Se controla la dedicación o participación según el proceso de contratación del contratista, director de obra, residente de obra, topógrafo, asesor geotecnista, profesional - asesor SISO.
- ✓ Se solicitó al contratista de obra el diseño de mezclas de concreto al igual que la toma de muestras para verificación de resistencia de los concretos.
- ✓ Se solicitó al contratista de obra los resultados de los ensayos elaborados para la verificación de las densidades de los materiales granulares.

16.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo del presente informe, se realizaron análisis o ensayos de laboratorio, como las densidades de los materiales granulares y resistencia a la compresión de los concretos, debido a que las labores a realizadas y/o ejecutadas lo requerían.

16.2 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Teniendo en cuenta que en el periodo que abarca el presente informe de interventoría, hacen parte actividades como: Ítem 2.1. y el INP7, la excavación en Material Común, la NTC 1500, Normas sobre excavaciones y movimientos de tierra, que incluyen especificaciones para la excavación en materiales comunes. Ítem 2.4. Suministro e Instalación de Geotextil, la NTC-SE-GE-003 de EMCALI. Adicionalmente se empleó la norma colombiana que regula la toma de muestras de concreto fresco es la NTC 454, para el ensayo de Slump, que mide la trabajabilidad y consistencia del concreto fresco, se aplicó la norma NTC 396, con la norma

NTC 2289 de aceros en Colombia, NTC 673 de 2010-02-17. Se encuentra acreditada Código SAP: CCR002 y CCR003 Resistencia a la compresión y principalmente bajo la norma técnica colombiana, también la NTC-454, NORMA TECNICA colombiana para la toma de muestras.

17. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría No. 176 de 2024, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP”**, suscrito el treinta y uno (31) de Julio del 2024, como se muestra en el siguiente cuadro:

17.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato De Interventoría:	No. 176 De 2024.
Contratante:	Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional ITFIP.
Contratista:	VERUH INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal:	Leidy Vanessa Vanegas Lasso.
Objeto:	“Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Al Proyecto “Contratar La Construcción De La Pista Atlética Etapa 3 – Complejo Deportivo Instituto Tolimense De Formación Técnica Y Profesional ITFIP”.
Valor Del Contrato:	Ciento Diecisiete Millones Setecientos Cincuenta Y Un Mil Noventa Y Cinco Pesos (\$117.751.095,00) M/Cte.
Fecha De Suscripción:	Treinta y uno (31) De Julio De 2024.
Plazo De Ejecución:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
Acta De Inicio:	Doce (12) De Agosto De 2024.
Acta de suspensión:	Doce (12) De Agosto de 2024.
Acta de reinicio:	Dos (02) De Septiembre de 2024.
Fecha De Terminación:	Treinta y uno (31) de Diciembre del 2024.

18. ACTAS SUSCRITAS

18.1 ACTAS SUSCRITAS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO: DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 1: DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2024

19. ESTADO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de Interventoría No. 176 de 2024, se encuentra amparado por la póliza expedida, por la Compañía Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, la cual fue revisada y aprobada mediante plataforma SECOP II con el siguiente detalle:

19.1. GARANTIAS:

PÓLIZA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
Compañía de Seguros	Póliza o Cert. Modificar No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°0)	Cumplimiento	17/07/2024	17/01/2026	\$23.550.219,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°0)	Prestaciones Sociales	17/07/2024	17/01/2028	\$11.775.109,50
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°0)	Calidad Del Servicio	17/07/2024	17/01/2026	\$23.550.219,00
PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°1)	Cumplimiento			

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°1)	Prestaciones Sociales			
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°1)	Calidad Del Servicio			
NOTA: EL ANEXO N°1 FUE EXPEDIDO POR LA ASEGURADORA CON UN ERROR EN LOS VALORES DE LOS AMPAROS, POR LO TANTO, CON ESE ERROR NO FUE POSIBLE DARLE USO Y SE DESCARTA PARA LA UTILIZACION DE ESTE CONSECUTIVO CONTRACTUAL, POR ENDE SE PASÓ CON EL CONSECUTIVO AL ANEXO N°2.					
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°2)	Cumplimiento	12/08/2024	12/02/2026	\$23.550.219,00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°2)	Prestaciones Sociales	12/08/2024	12/02/2028	\$11.775.109,50
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°2)	Calidad Del Servicio	12/08/2024	12/02/2026	\$23.550.219,00
PÓLIZA SEGÚN ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°3)	Cumplimiento	02/09/2024	05/03/2026	\$23.550.219,00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°3)	Prestaciones Sociales	02/09/2024	05/03/2028	\$11.775.109,50
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100035315 (Anexo N°3)	Calidad Del Servicio	02/09/2024	05/03/2026	\$23.550.219,00

20. DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE INTERVENTORIA

A continuación, se enumeran los documentos necesarios para llevar a cabo un proceso técnico y administrativo adecuado:

- Contrato de Interventoría No. 176 de 2024, firmado y legalizado.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
- Estudios y diseños.
- Garantías exigidas dentro del contrato, debidamente aprobadas.
- Presupuesto general de las obras contratadas y APU.
- Documentos de la oferta económica del entonces proponente y demás documentos del proceso de selección.

21. CONTROL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con la propuesta presentada a la Entidad Contratante, se relaciona a continuación el personal para el periodo de este informe.

PERSONAL	CARGO
Nelson Enrique Sánchez Cortes	Director Interventoría
Ángel Alberto Barreto Santos	Residente Interventoría
Jessica Paola Aviles Medina	Tecnólogo SISO

22. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Balance Del Contrato Interventoría No. 176 De 2024		
VALOR INICIAL		\$ 117.751.095,00
VALOR COBRADO POR ACTAS		
SALDO POR COBRAR	\$ 117.751.095,00	
SUMAS IGUALES	\$ 117.751.095,00	\$ 117.751.095,00

A la fecha la interventoría no ha realizado cobros.

23. CONTROL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

La interventoría contó durante este periodo con el siguiente equipo

- Alquiler de Oficina (Incluye servicios públicos).
- Computadores, cámaras fotográficas o filmadora y equipos de oficina.
- Edición e impresión de informes y planos.
- Comunicaciones.
- Gastos Transporte y Vehículo.
- Ensayos de laboratorio.
- Soporte jurídico y contable.
- Control topográfico de las obras y planos récord.

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se le recomendó al contratista de obra realizar todas y cada una de las actividades planteadas teniendo en cuenta lo estipulado en los estudios y diseños suministrados, planos y demás documentos entregados, garantizando el cumplimiento de los parámetros y criterios estipulados en estos.
- ✓ Se le solicitó al contratista la presentación de la programación de obra, actualizada con fecha de inicio.
- ✓ Se le recomendó al contratista poner a disposición de la interventoría con anterioridad de mínimo tres (03) días, previos a la ejecución de los trabajos, los certificados de afiliación a salud, pensión y ARL del personal.
- ✓ Se solicitó al contratista garantizar que las diferentes zonas intervenidas cuenten con la delimitación del área y la señalización adecuada y en buen estado, con el fin de que se mantenga con seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de las actividades, tanto para los trabajadores como para la comunidad educativa y demás usuarios en general, teniendo especial cuidado con la entrada y salida de personas y vehículos a la institución.
- ✓ Se le solicitó al contratista de obra dar aviso oportuno y solicitar autorización, a la supervisión y a la interventoría, para los días en que se vayan a realizar las actividades del citado contrato.

- ✓ Se le solicitó al contratista de obra la presentación de los certificados de calidad y fichas técnicas de los materiales a ser utilizados en la ejecución del contrato.
- ✓ Se le recomendó al contratista de obra la presentación de los ensayos de laboratorio materiales pétreos y otros a utilizar en obra.
- ✓ Se le exigió al contratista de obra la presentación de los diseños de mezclas para concretos.
- ✓ Se le recomendó al contratista la presentación del certificado de calibración de equipos de topografía y/o de laboratorios.
- ✓ Se le exigió al contratista la presentación de la seguridad Social de los trabajadores y del equipo de trabajo ofrecido en la propuesta (hojas de vida).
- ✓ Se le recomendó al contratista que los empleados de obra contaran con de ropa adecuada y EPP, o EPCC, según lo requiera cada actividad desarrollada.
- ✓ Se le sugirió al contratista que, tal como se contempla en la minuta del contrato de obra No. 210/2024, Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato. (medio físico y magnético).
- ✓ Se le sugirió al contratista la implementación para cada actividad específica cumplir con las recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y elementos utilizados.
- ✓ Se le recomendó al contratista tener a disposición de la interventoría los diferentes certificados de calidad de los materiales, antes de la compra de estos.
- ✓ El contratista debe presentar a la interventoría los planes de trabajo, con mínimo una anticipación de tres (03) días hábiles, para ser aprobados y de esta manera ser aplicados.
- ✓ Se deben actualizar las vigencias de las pólizas y sus amparos exigidos de los contratos de obra e interventoría, con la fecha del inicio de estos.
- ✓ Se recomienda a la entidad mantener actualizado el cargue de documentos generados en el desarrollo del contrato en el SECOP II.

- ✓ Se le sugirió al contratista ejecutar todas las actividades de obra basados en la normatividad vigente.
- ✓ Es de vital importancia que la entidad contratante adopte e implemente la información técnica entregada por parte del contratista de obra al finalizar el contrato, para que planifique los valores que le representan los futuros mantenimientos oportunos, tanto preventivos, como correctivos.

26. ANEXOS

26.1 ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

**26.2 ANEXO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE
INTERVENTORÍA**

26.3 ANEXO CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

26.4 ANEXO CONTROL SST

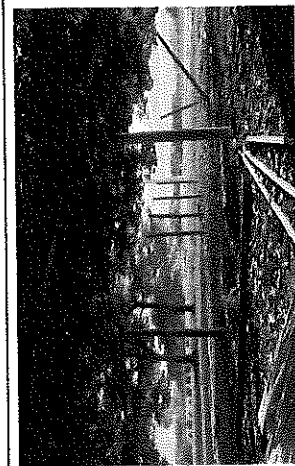
26.5 POLIZAS DE OBRA

26.6 POLIZAS DE INTERVENTORÍA




ING. NELSON ENRIQUE SANCHEZ CORTES
Director de Interventoría


Registro Fotográfico ítem no previsto INP 1



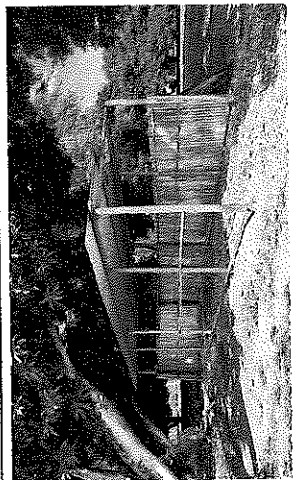Suministro e instalación del campamento de obra.



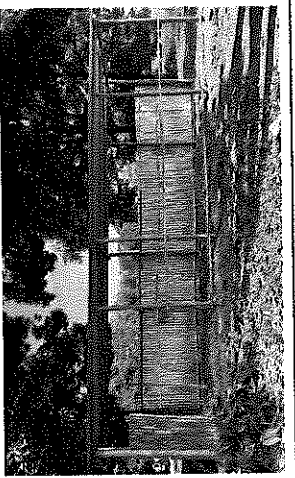Suministro e instalación del campamento de obra.




Suministro e instalación del campamento de obra.



Suministro e instalación del campamento de obra.




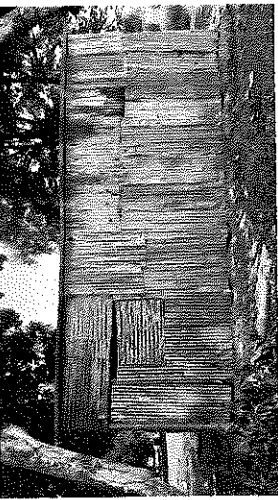Suministro e instalación del campamento de obra.



Suministro e instalación del campamento de obra.

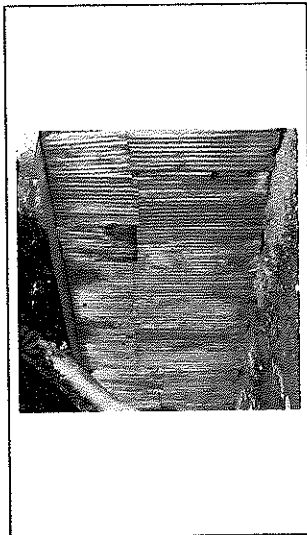
Registro Fotográfico ítem N°1.2



Selección de la ubicación de la Acometida eléctrica provisional LO 30 m.



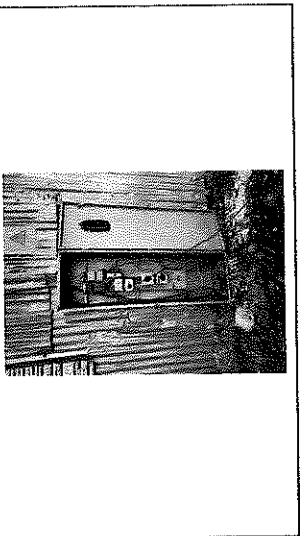Instalación del cableado para la Acometida eléctrica provisional LO 30 m.



Instalación de la Acometida eléctrica provisional LO 30 m.

3-5

3-1



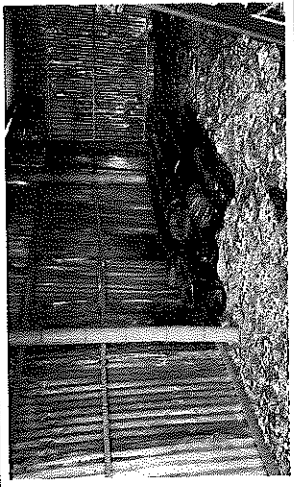

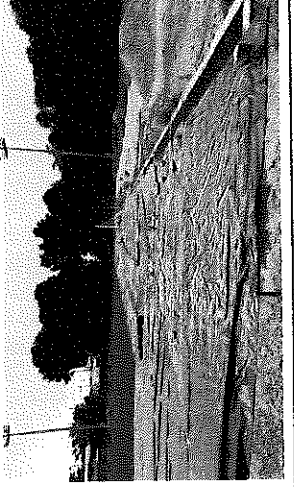
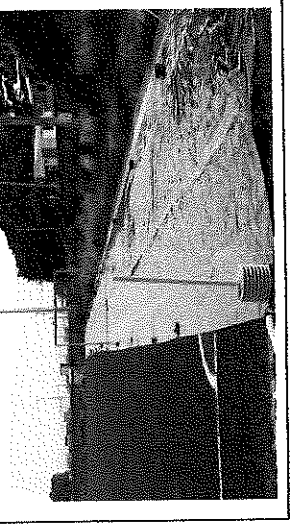
VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTF".

Registro Fotográfico ítem no previsto INP6


		
Almacenamiento de plástico (protección perímetro cancha).	Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).	Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).
		
Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).	Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).	Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com


VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024


LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".



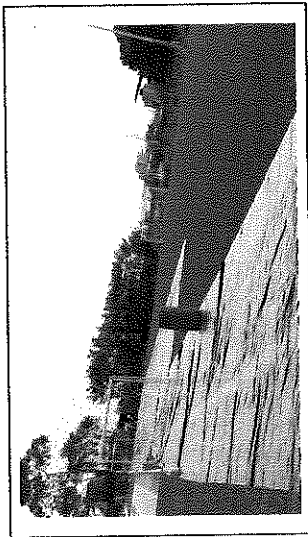
Registro Fotográfico ítem no previsto INP6



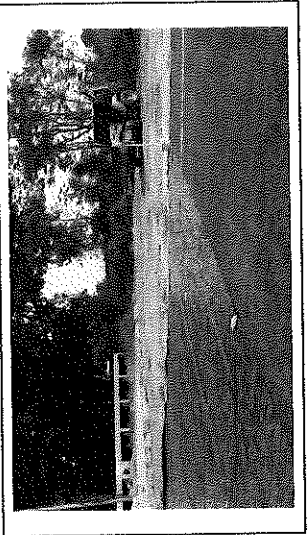
Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).



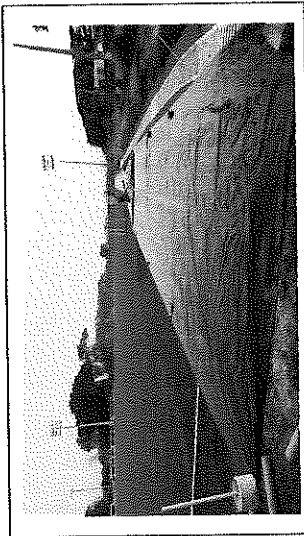
Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).



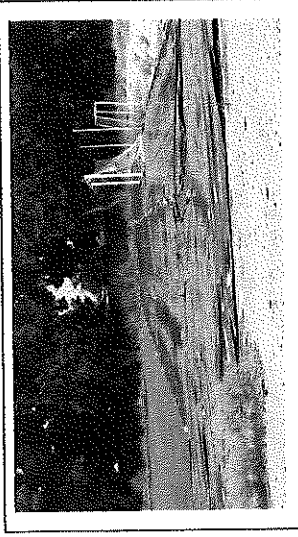
Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).



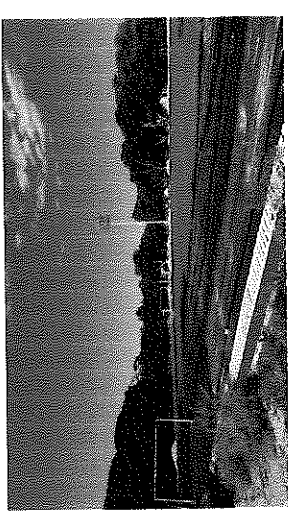Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).



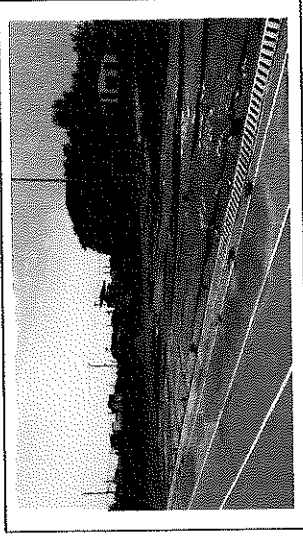Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).



Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S

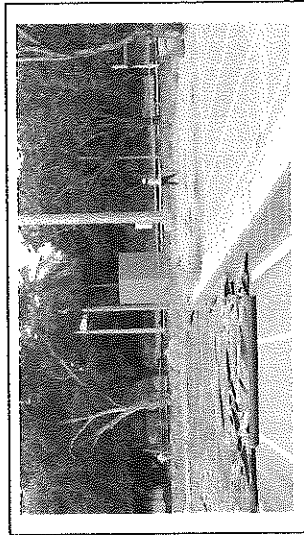
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem no previsto INP6




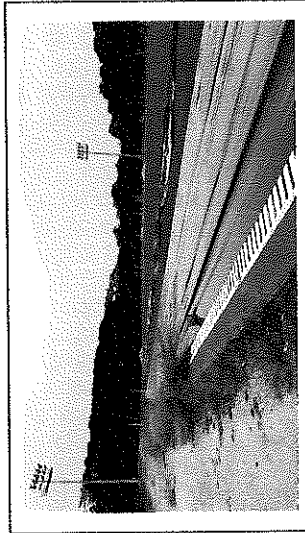Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).



Suministro e instalación de plástico (protección perímetro cancha).

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com







VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N° CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".

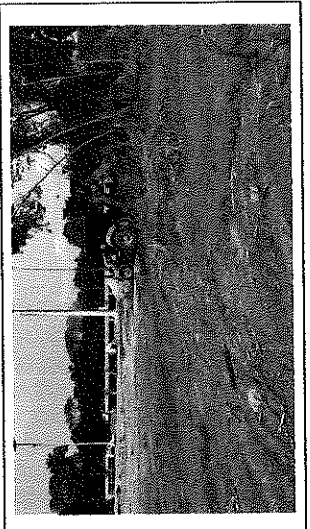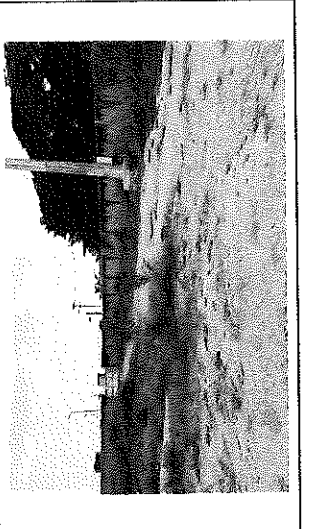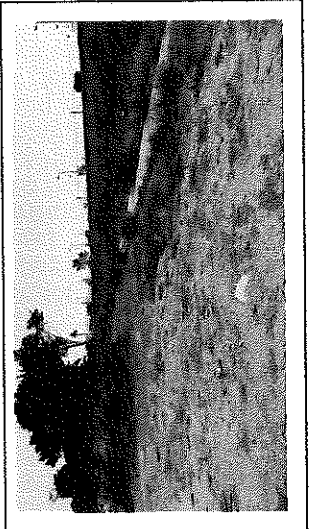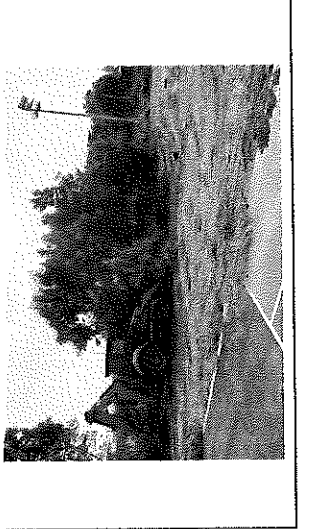
Registro Fotográfico ítem No. 1.3

		
Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.	Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.	Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.
		
Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.	Apile a 15 m.	Apile a 15 m.


Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024


LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFIP".



Registro Fotográfico ítem No. 1.3

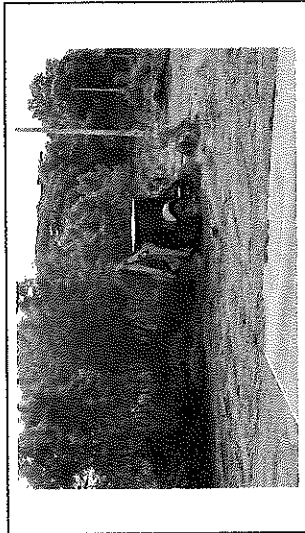


Apile a 15 m.

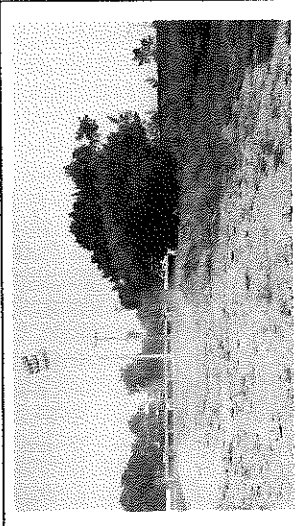


Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.



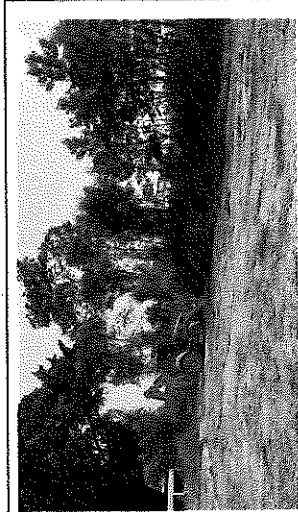
Apile a 15 m.



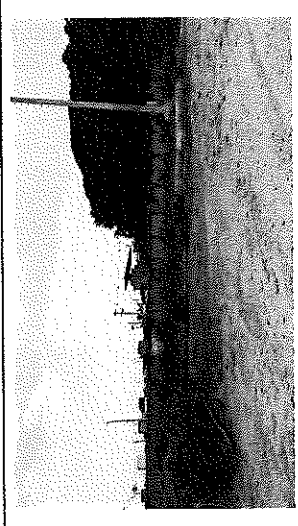Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.



Apile a 15 m.

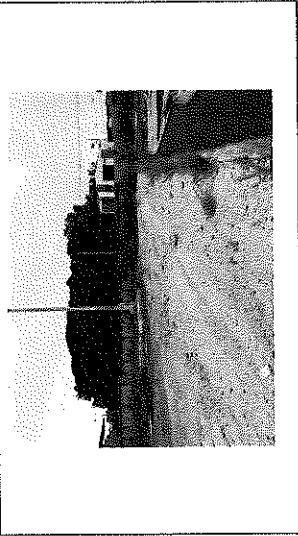

Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

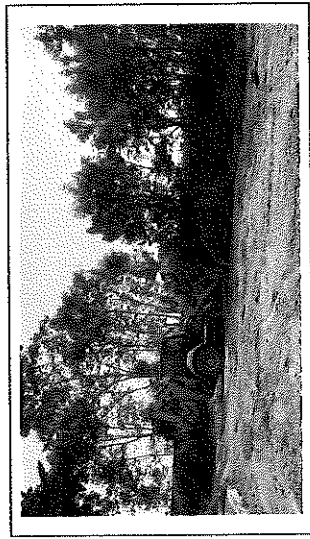


VERUH INGENIERIA S.A.S.


VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIP".


Registro Fotográfico ítem No. 1.3



Apile a 15 m.

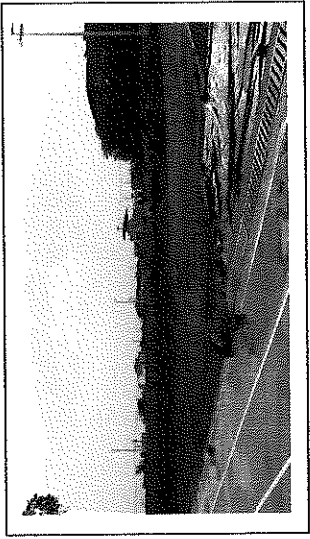

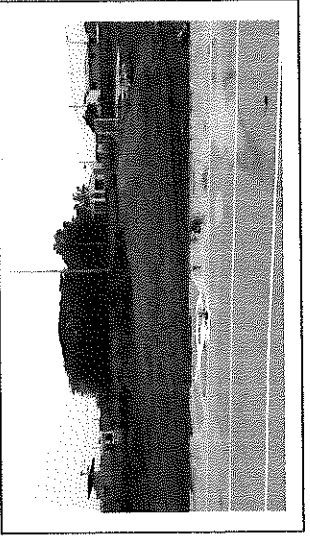
Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.



Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.



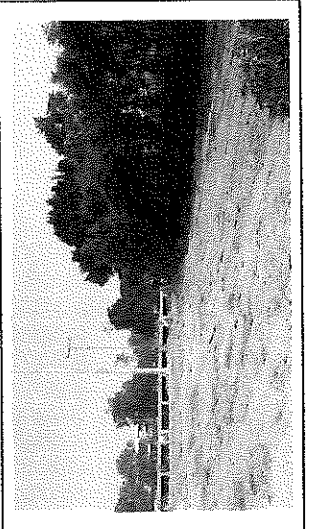
Apile a 15 m.




Descapote y limpieza e=0,20 m. Y retiro apile a 15 m.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

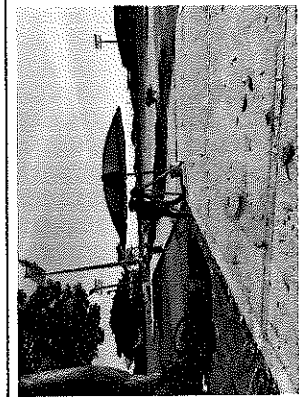
Registro Fotográfico ítem No. 1.4




Localización y Replanteo.

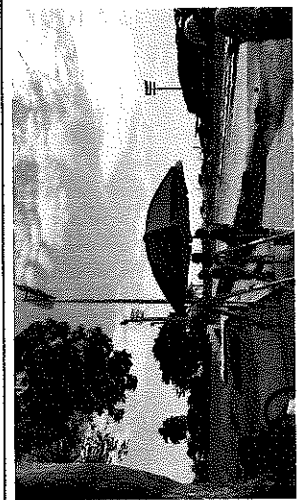

Localización y Replanteo.

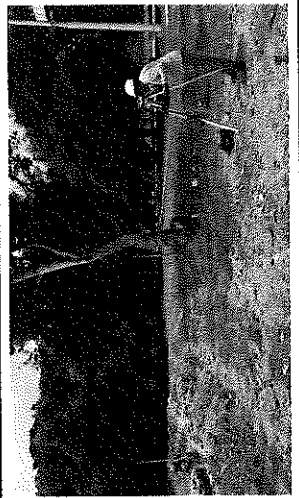


Localización y Replanteo.

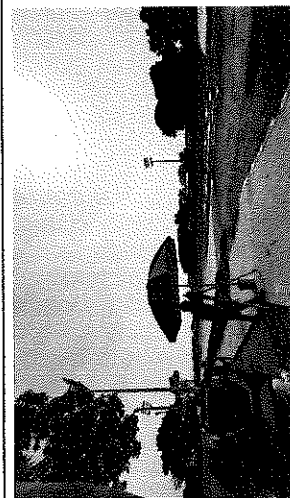

Localización y Replanteo.



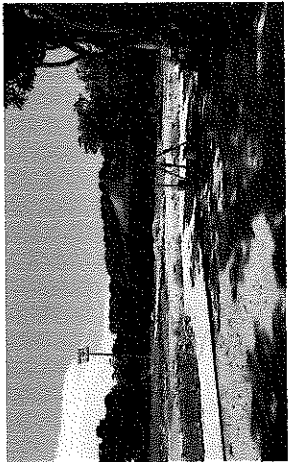Localización y Replanteo.




Localización y Replanteo.

380

VERUH INGENIERIA S.A.S


CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

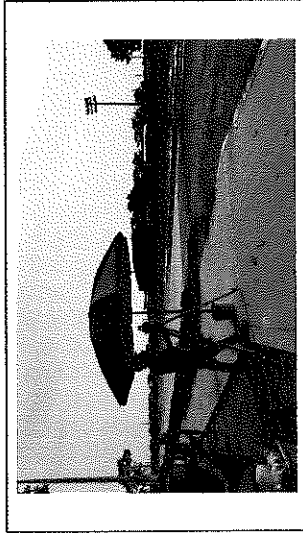
Registro Fotográfico ítem No. 1.4




Localización y Replanteo.

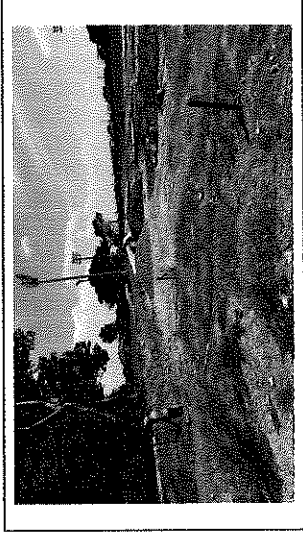

Localización y Replanteo.

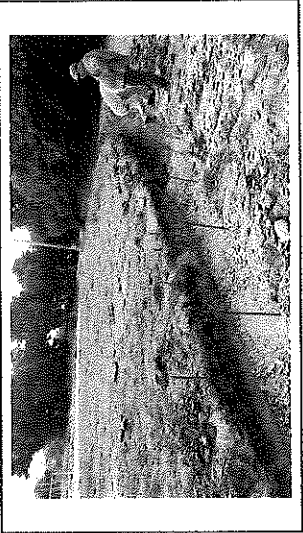

Localización y Replanteo.

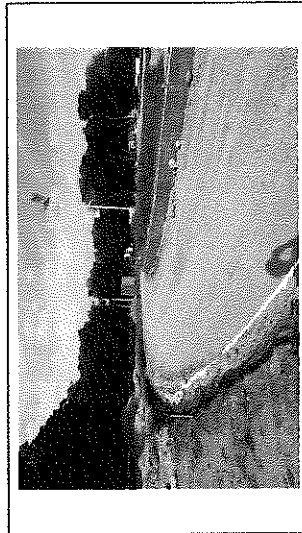


Localización y Replanteo.


Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador -- Espinal
Teléfono: 2394333 -- Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

382

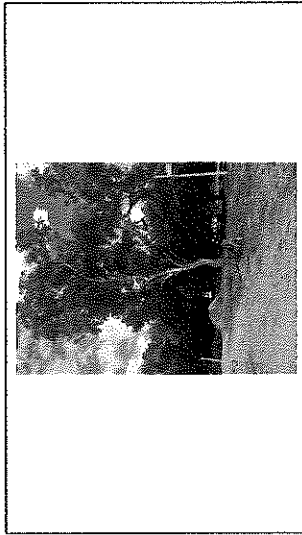
Registro Fotográfico ítem N°1.5




Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas



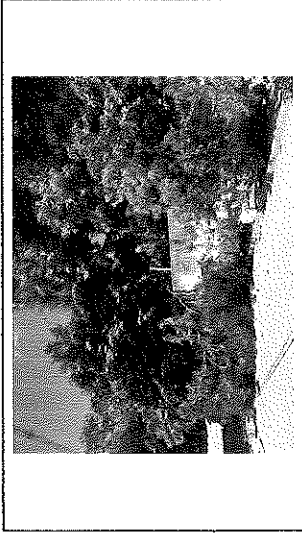
Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas



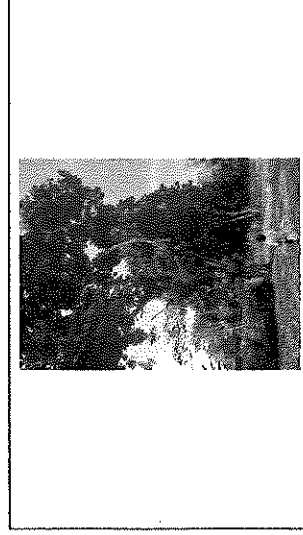Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas



Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas




Aprovechamiento de árboles frutales hasta 10 mayores de altura incluye retiro no mayor a 3 Km. hasta el punto que indique la institución por aprovechamiento tronco, ramas

VERUH INGENIERIA S.A.S




CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

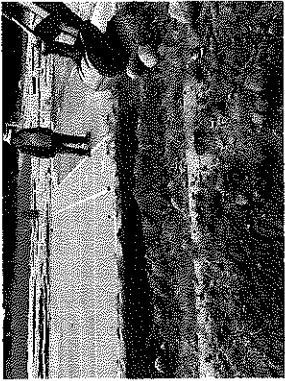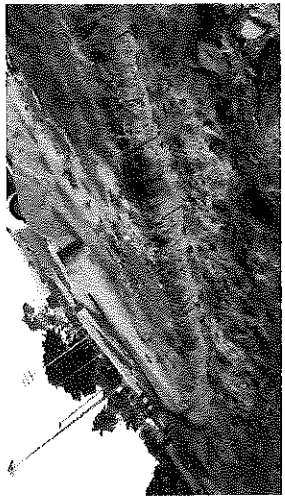Registro Fotográfico ítem N°2.1


		
Excavación en material común.	Excavación en material común	Excavación en material común
		
Excavación en material común	Excavación en material común	

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S






CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

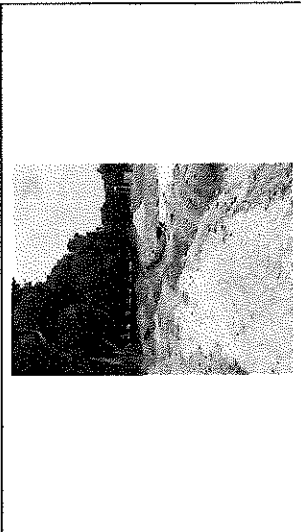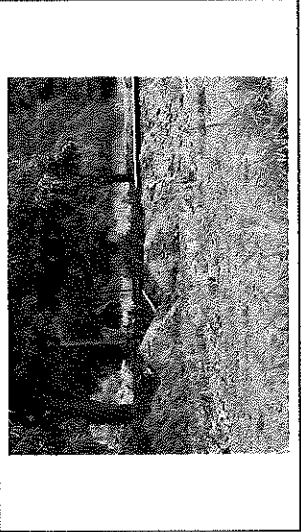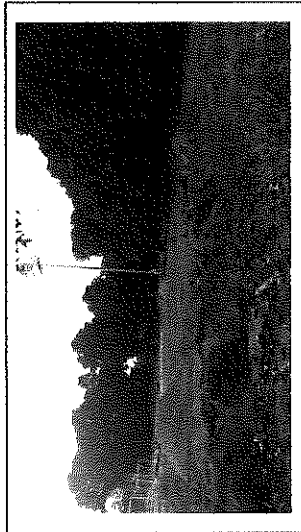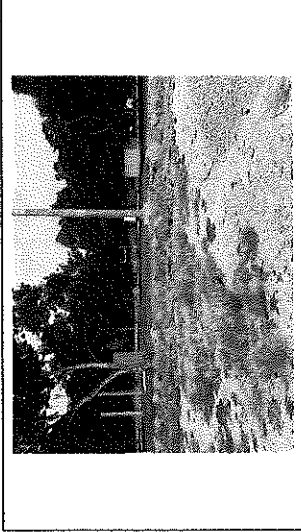Registro Fotográfico ítem N°2.1

		
Excavación en material común	Excavación en material común	Excavación en material común
		
Excavación en material común	Excavación en material común	Excavación en material común

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

385




VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 -- COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFIP".

Registro Fotográfico ítem N°2.1

	
Excavación en material común	Excavación en material común

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

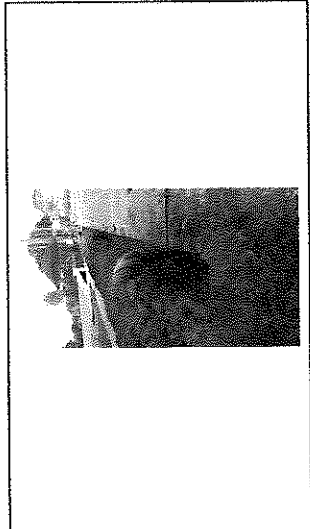
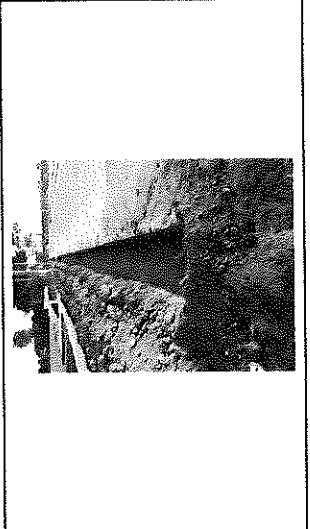
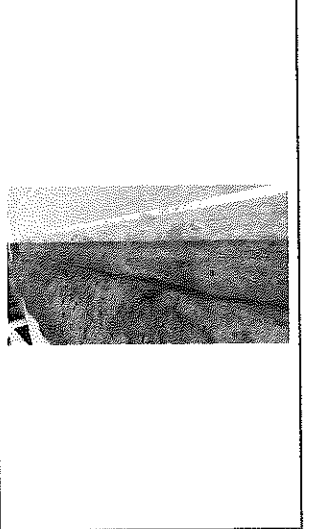
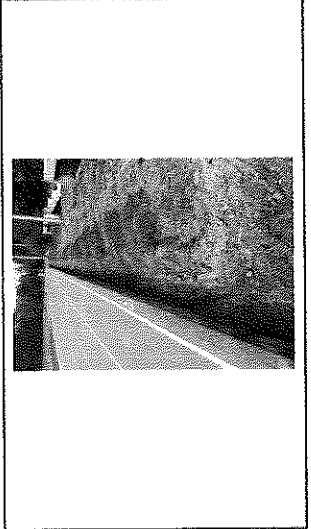
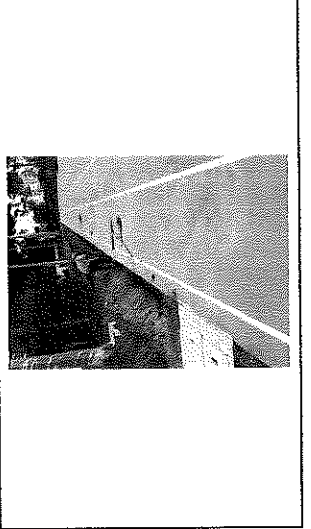
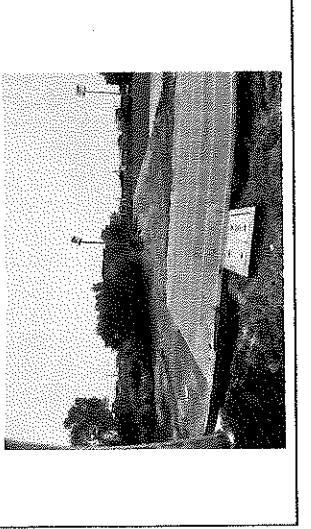


VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTFIP".

Registro Fotográfico ítem INP7

		
Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts
		
Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador - Espinal
Teléfono: 2394333 - Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com




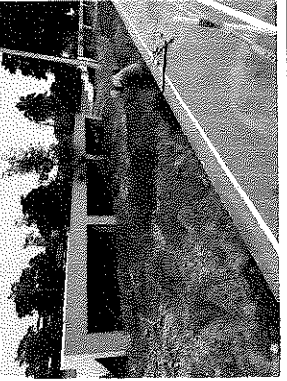


VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIP".

Registro Fotográfico ítem INP7


		
Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts
		
Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts	Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com


Registro Fotográfico ítem INP7



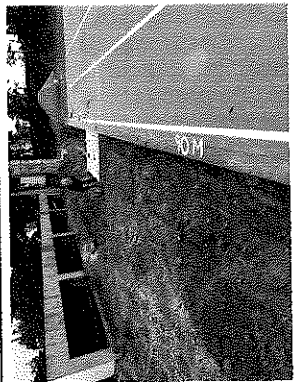
Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts



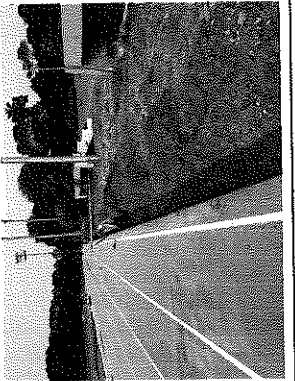
Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts



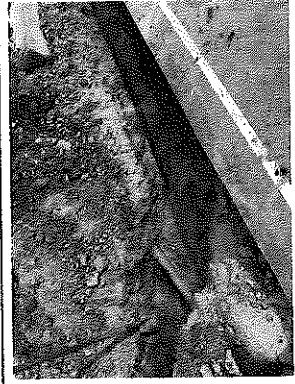
Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts



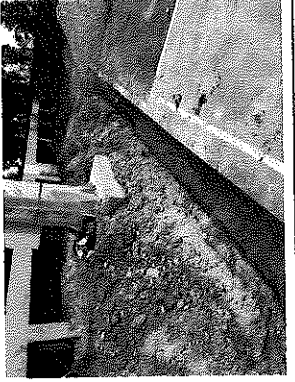Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts



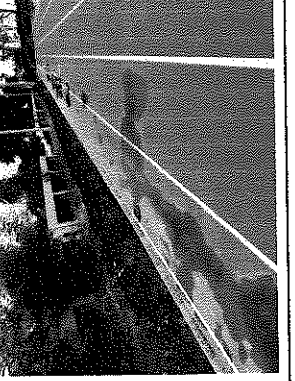Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts



Excavación manual en material comun h= 0,00 a 2,0 mts


Registro Fotográfico ítem INP7



Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts



Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts



Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts



Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts





Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts




Excavación manual en material común h= 0,00 a 2,0 mts


Registro Fotográfico ítem N°2.3

		
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.
		
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.

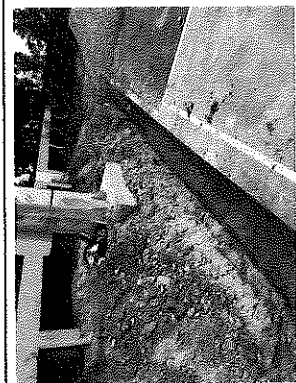
Registro Fotográfico ítem N°2.3



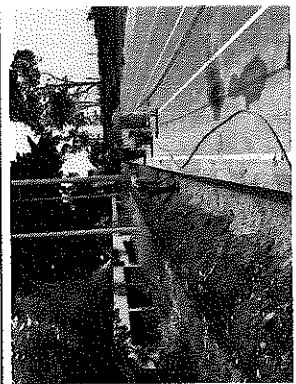
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



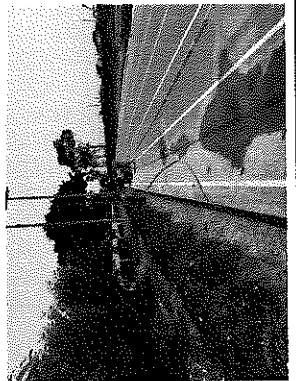
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



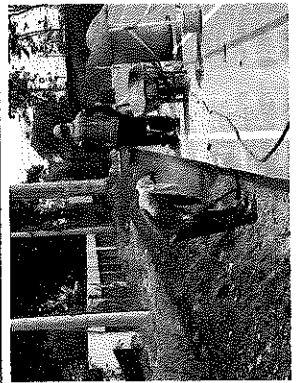
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.





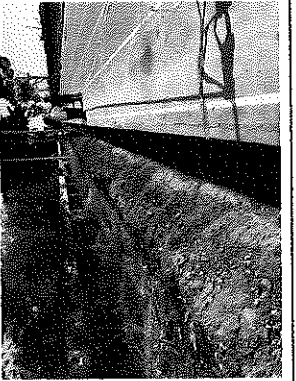Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.

Registro Fotográfico ítem N°2.3

		
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.
		
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.

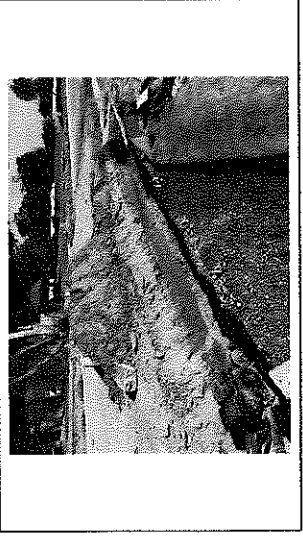
Registro Fotográfico ítem N°2.3



Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.




Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.





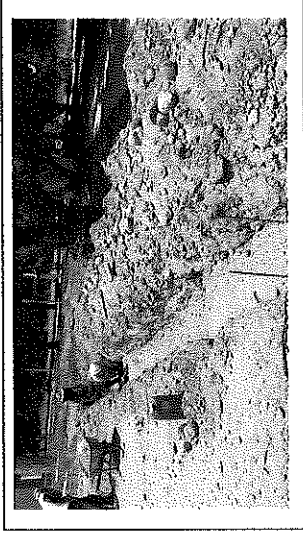Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.



Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.


Registro Fotográfico ítem N°2.3

		
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.
		
Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.	Suministro, extendida y compactación mecánica hasta densidad del 95% material de mejoramiento Recebo.


Registro Fotográfico ítem N°2.7



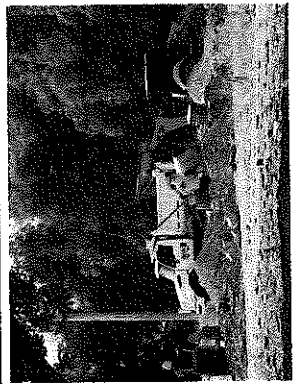Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.



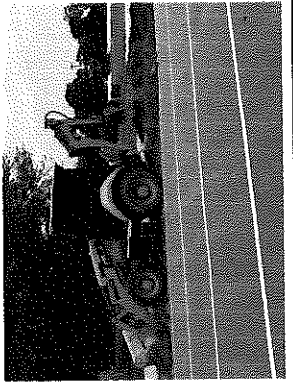
Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.




Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.



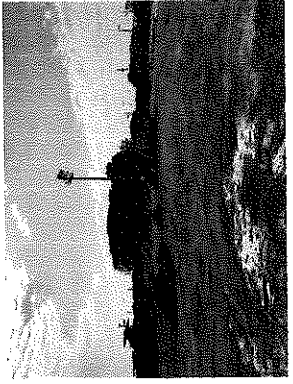Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.



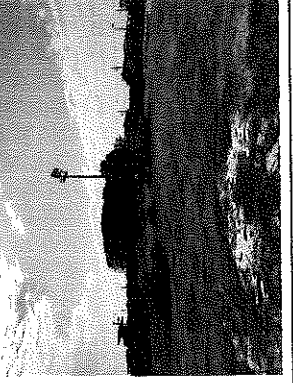Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.



Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.

VERUH INGENIERIA S.A.S

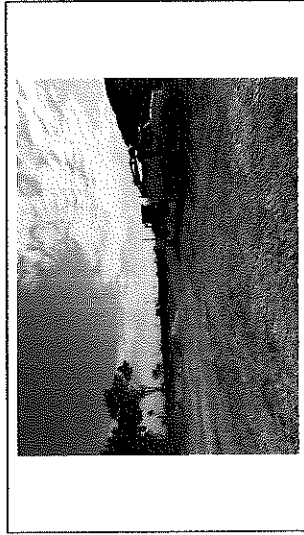
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESUL TANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem N°2.7



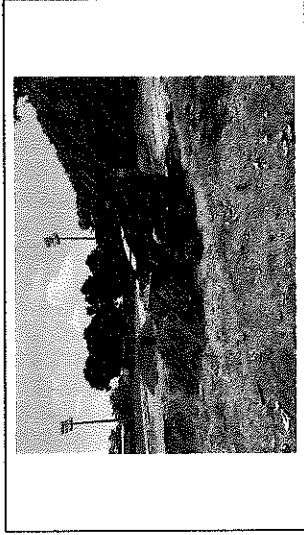Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.



Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.



Cargue y retiro de material proveniente de la excavación a una distancia menor a 10 km.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S

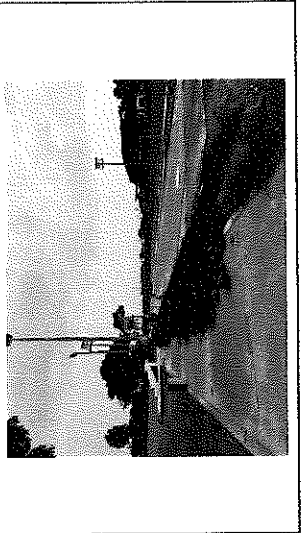
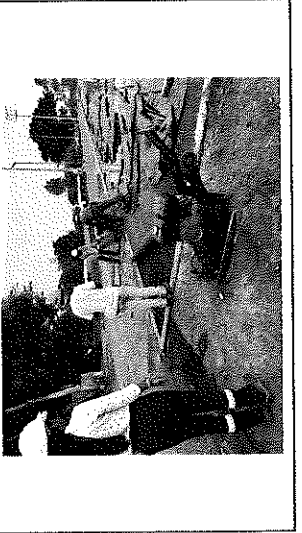
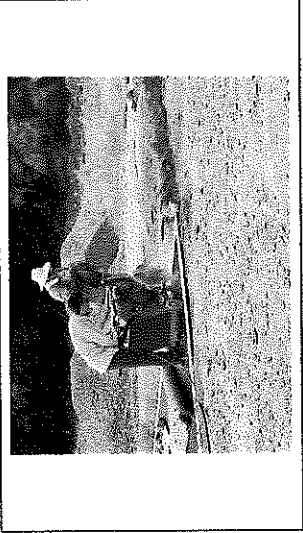
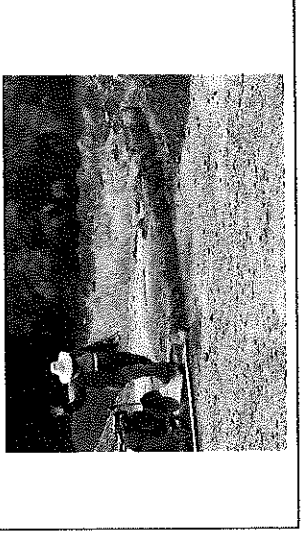
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFIP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem INP2


		
Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco	Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco	Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco
		
Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco	Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco	Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

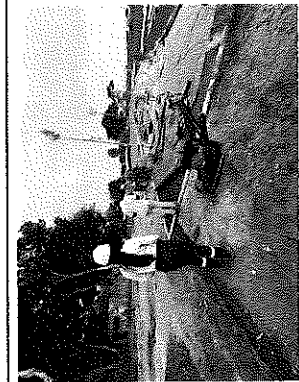Registro Fotográfico ítem INP2



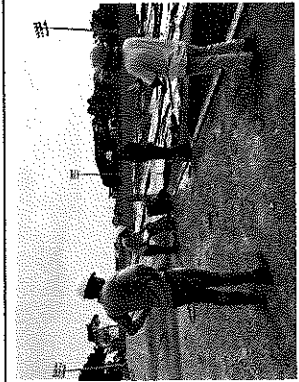Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco




Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco



Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco



Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco





Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco



Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco

Registro Fotográfico ítem INP2

		
Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco	Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco	Corte mecanico en piso de concreto incl. Disco

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

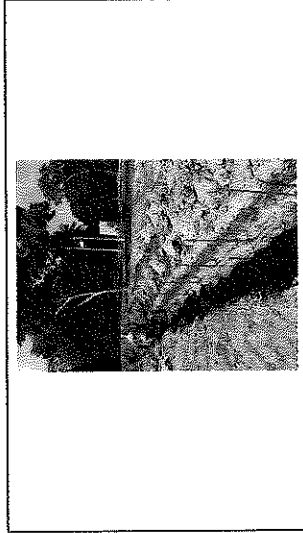
LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N°. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFIP".



Registro Fotográfico ítem N°4.4




Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.




Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.



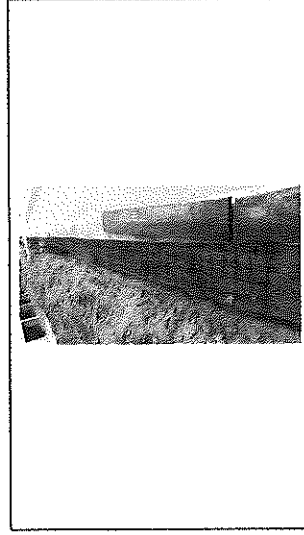
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.



Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.

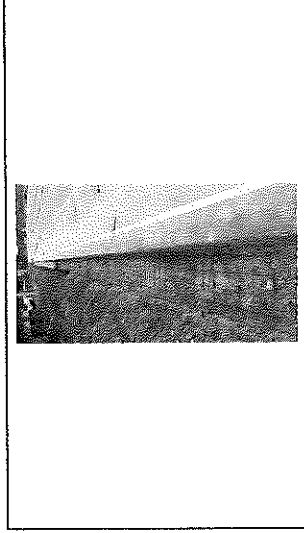


Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.

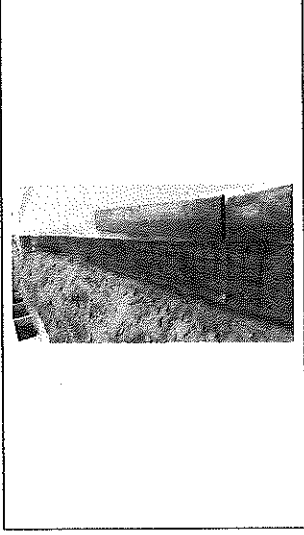

Malla electrosoldada de 0,15x0,15 mts.







Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com



VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFP".

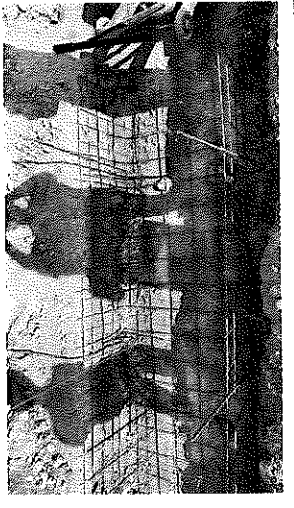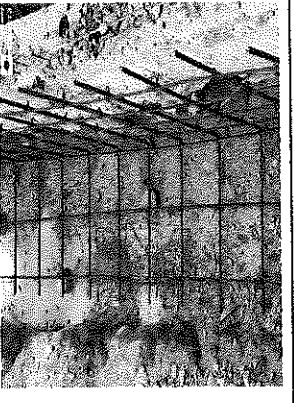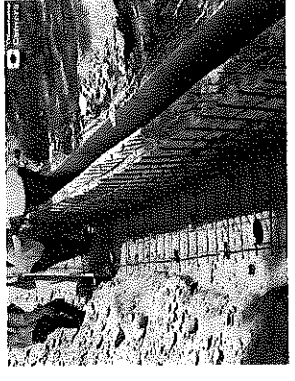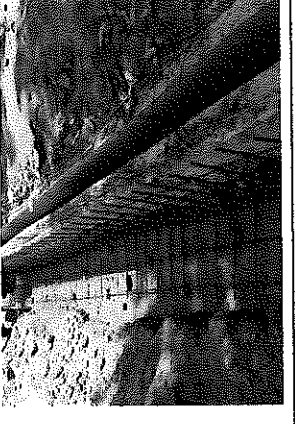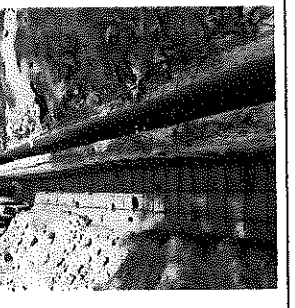Registro Fotográfico ítem N°5.4

		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

Y03

VERUH INGENIERIA S.A.S

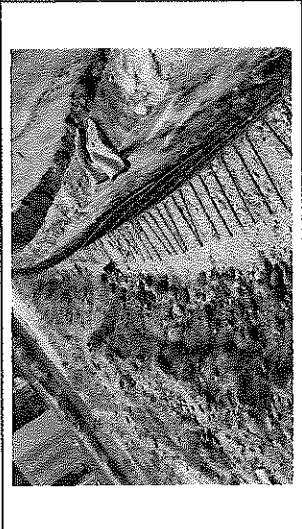
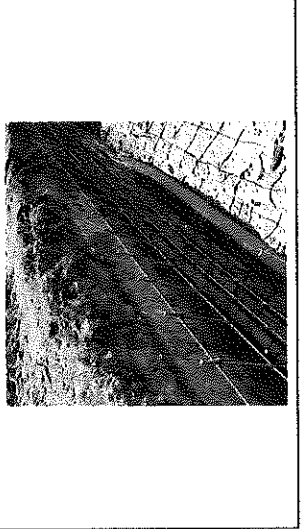
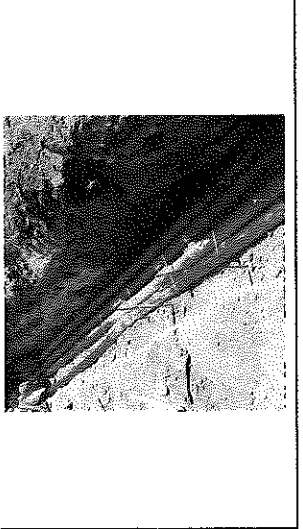
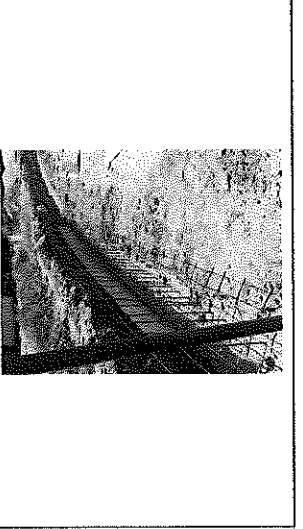
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem N°5.4

		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

404

VERUH INGENIERIA S.A.S

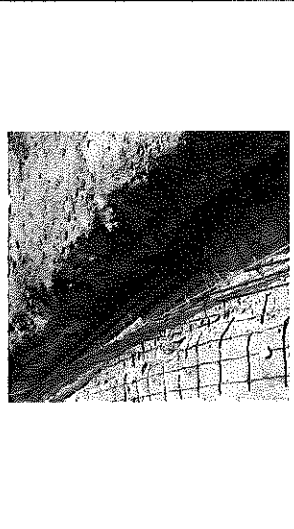
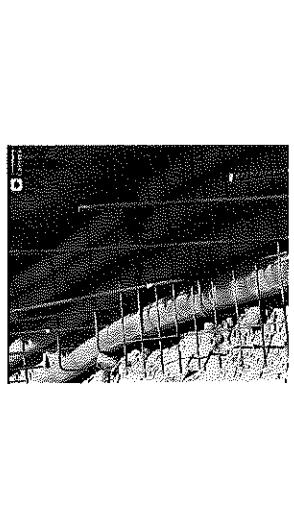
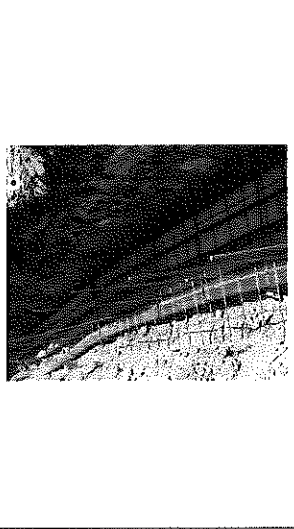
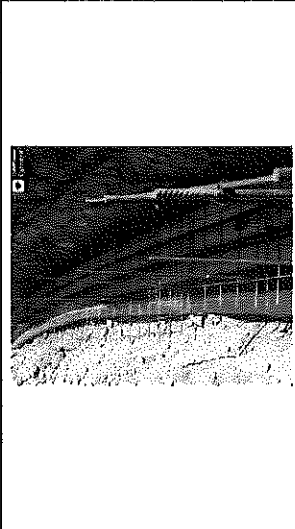
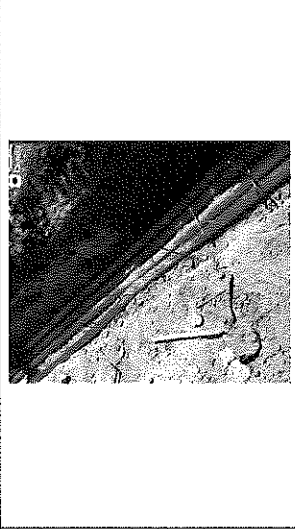
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem N°5.4

		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

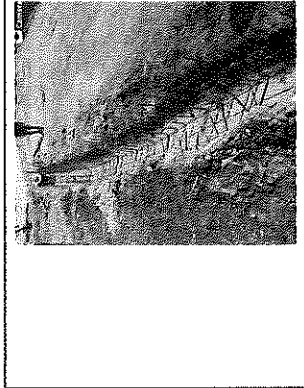
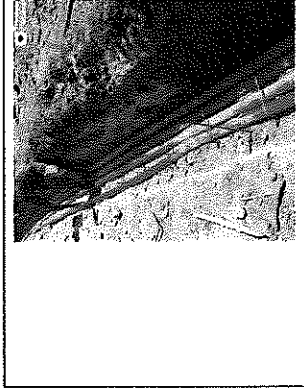



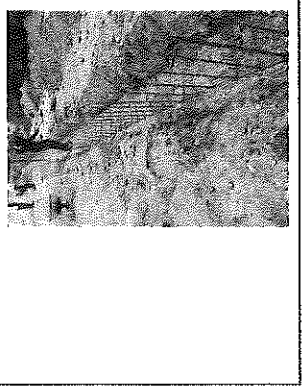
VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTFP".







Registro Fotográfico ítem N°5.4







		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

Registro Fotográfico ítem N°5.4

		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

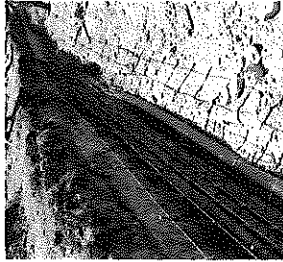
Registro Fotográfico ítem N°5.4

		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

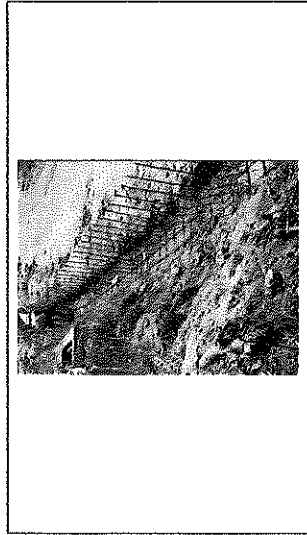
Registro Fotográfico ítem N°5.4



Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi



Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi




Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 psi

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S





CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".








VERUH INGENIERIA S.A.S.

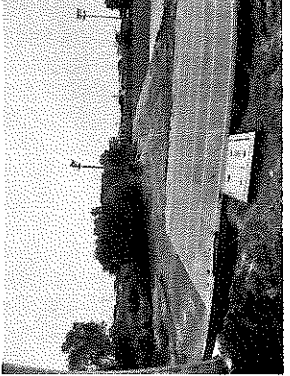Registro Fotográfico ítem N°3.1


		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.
		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

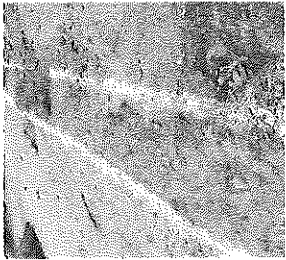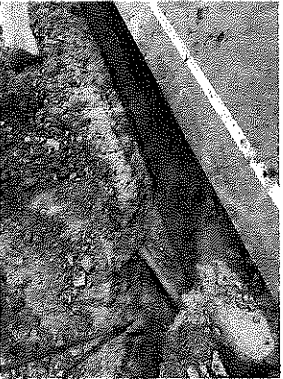
Registro Fotográfico ítem N°3.1

		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.
		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.

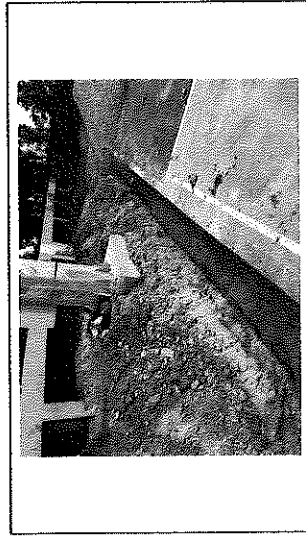
Registro Fotográfico ítem N°3.1




Excavación en material común.

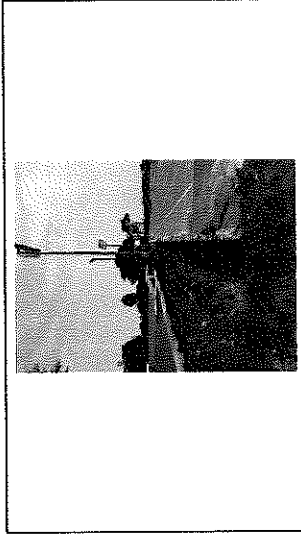

Excavación en material común.

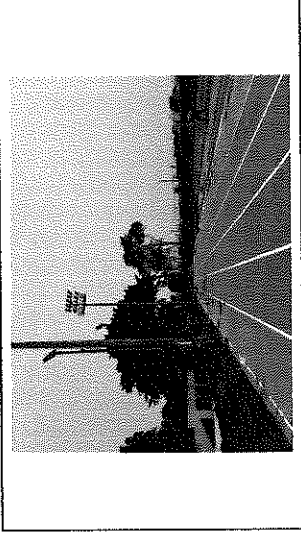


Excavación en material común.

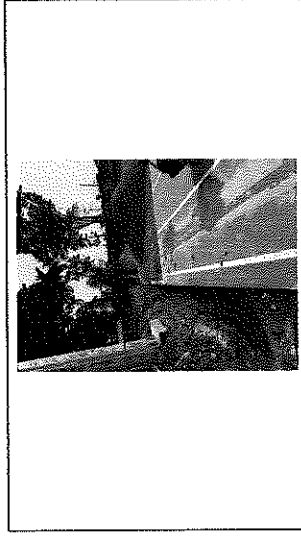

Excavación en material común.



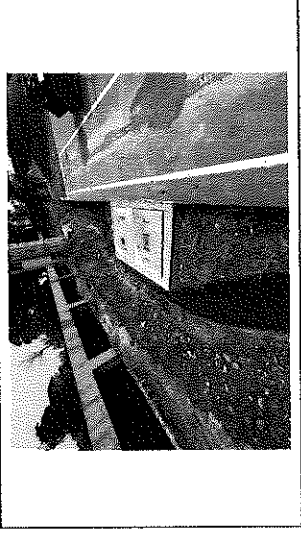
Excavación en material común.




Excavación en material común.

42





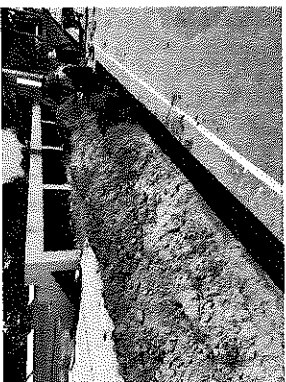
Registro Fotográfico ítem N°3.1

	
Excavación en material común.	Excavación en material común.



VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.





VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.


Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

415

VERUH INGENIERIA S.A.S




CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".









VERUH INGENIERIA S.A.S.

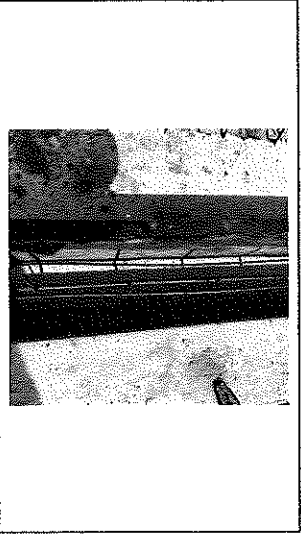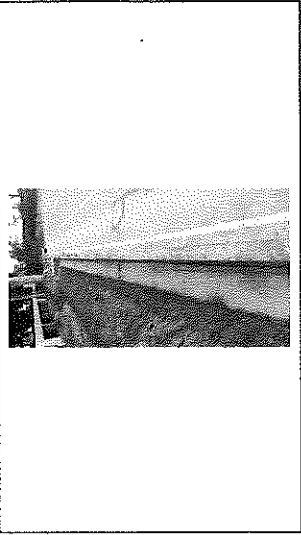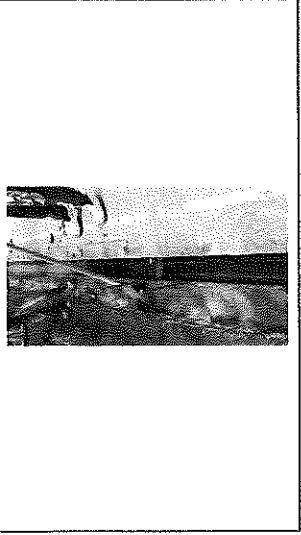Registro Fotográfico ítem INP4





		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.


Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

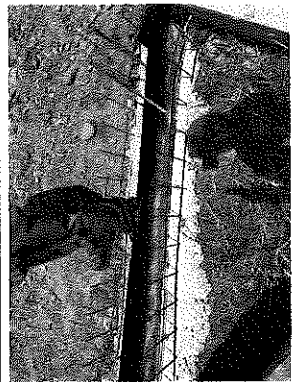Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

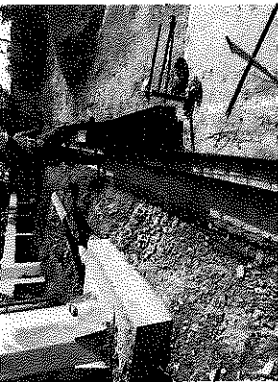Registro Fotográfico ítem INP4





		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.




VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".

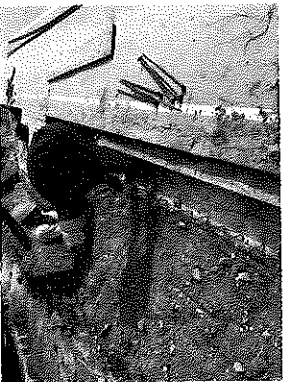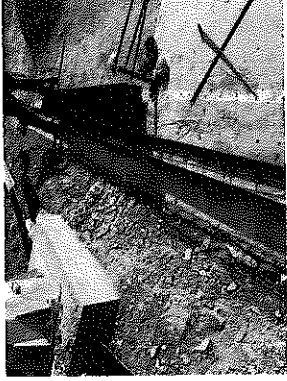Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.







VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S





CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFP".


Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

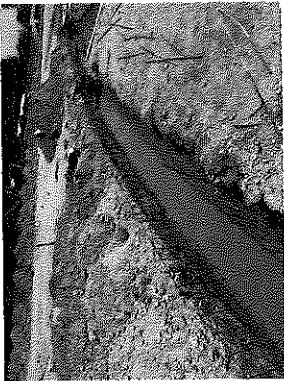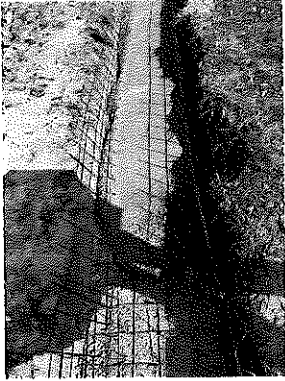
Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

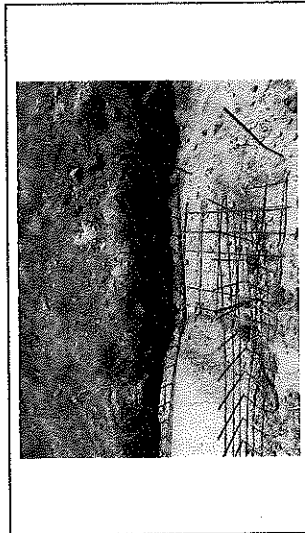
Registro Fotográfico ítem INP4



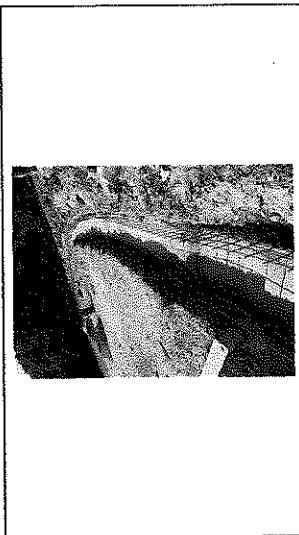
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



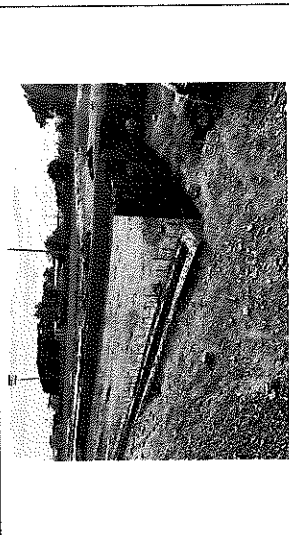
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



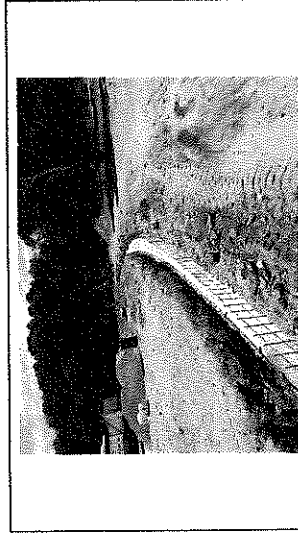
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



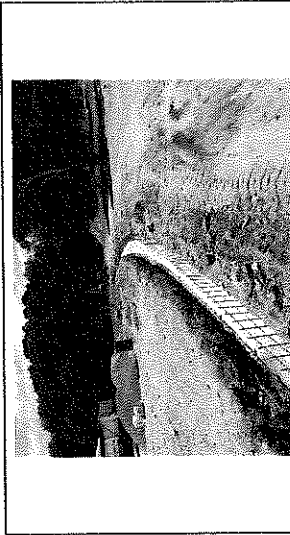Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.






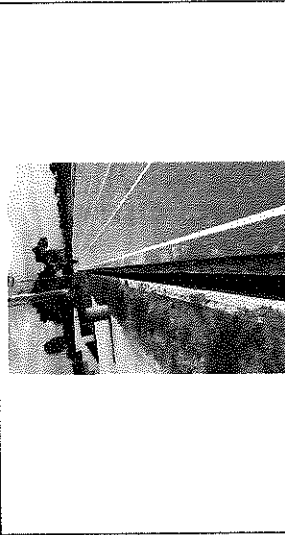Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

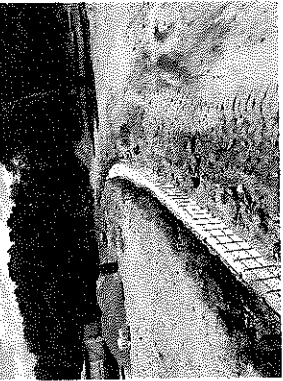Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

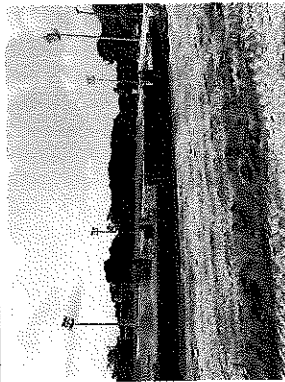
LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



Registro Fotográfico ítem INP4



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



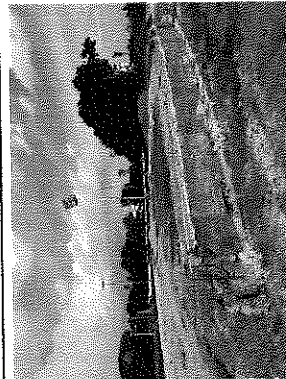
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.




Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com


VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024


LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




Registro Fotográfico ítem INP4

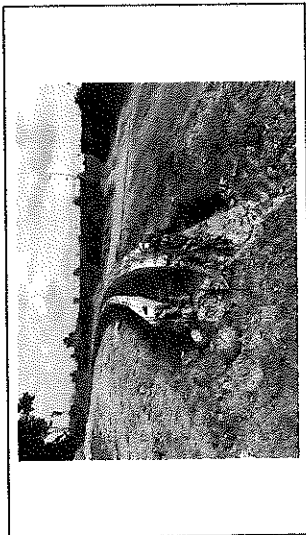

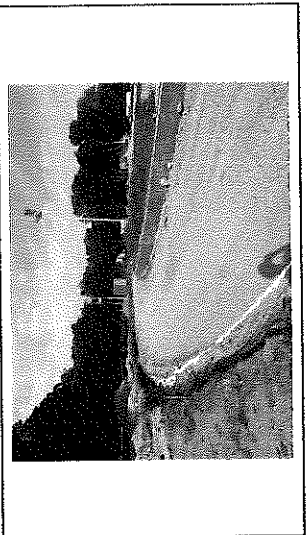
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



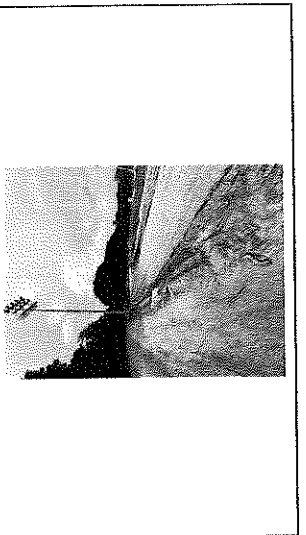
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



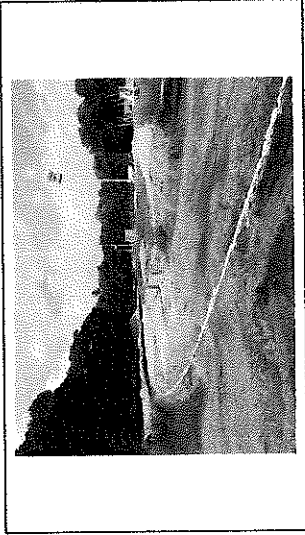
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



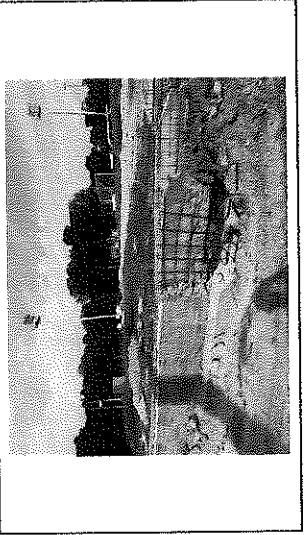Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



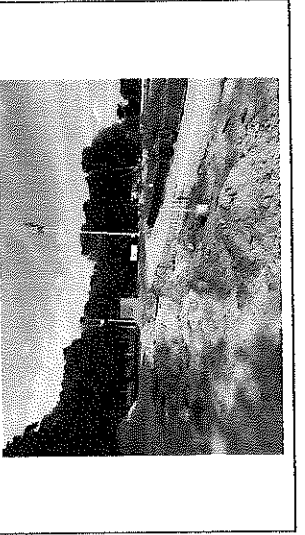
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador -- Espinal
Teléfono: 2394333 -- Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

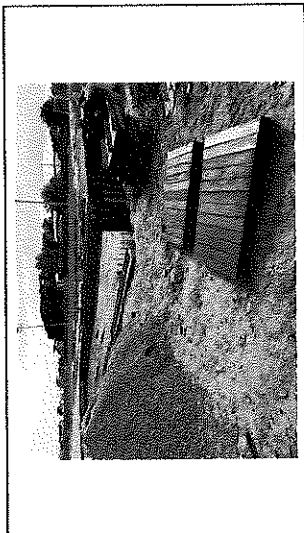
Registro Fotográfico ítem INP4



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



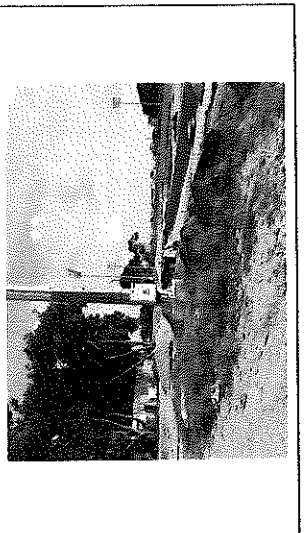Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno
0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

425

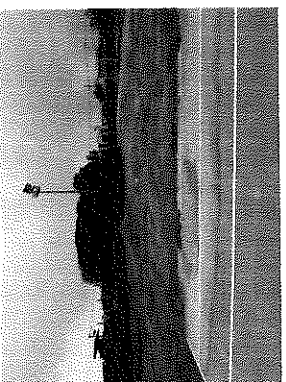


VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIP".

Registro Fotográfico ítem INP3

		
Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.
		
Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

427

VERUH INGENIERIA S.A.S

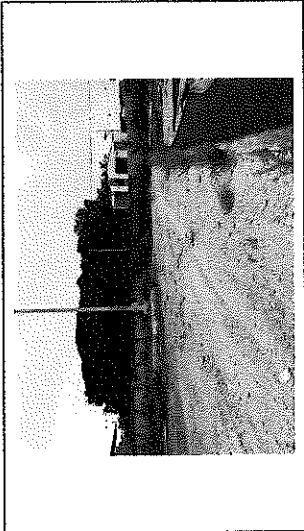
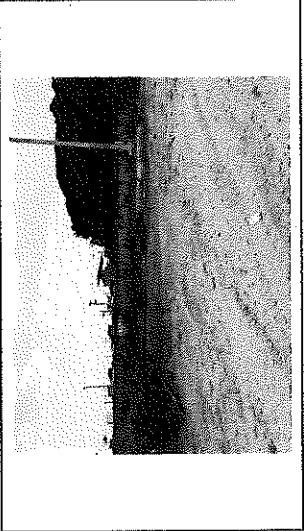
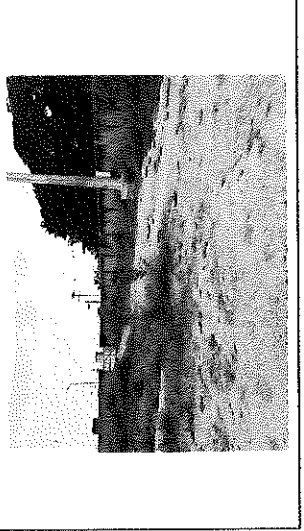
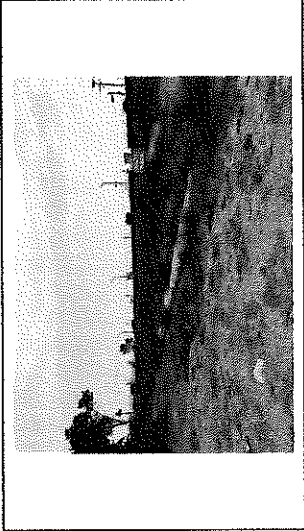
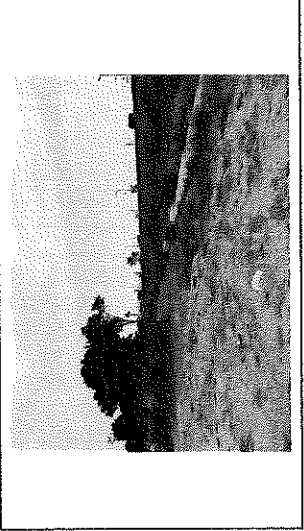
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem INP3


		
Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.
		
Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

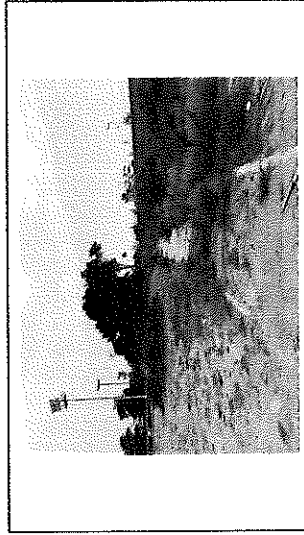
Registro Fotográfico ítem INP3



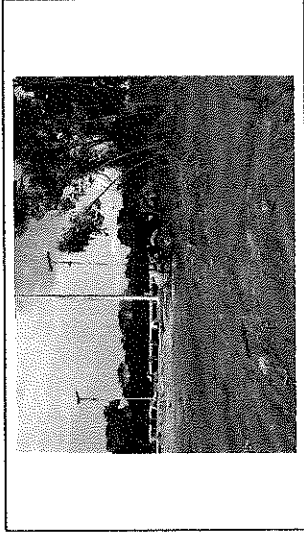
Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.



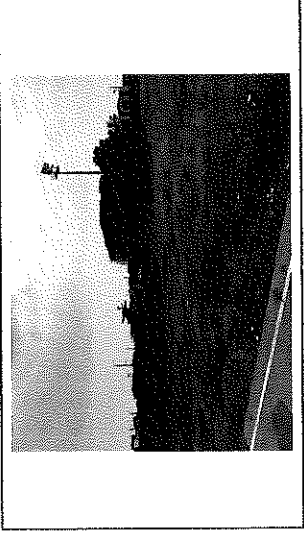Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.



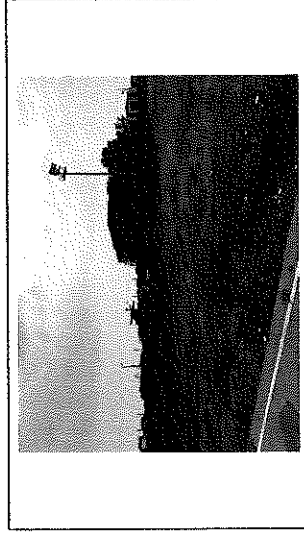Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.



Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.



Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.




Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.

VERUH INGENIERIA S.A.S



CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTIP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

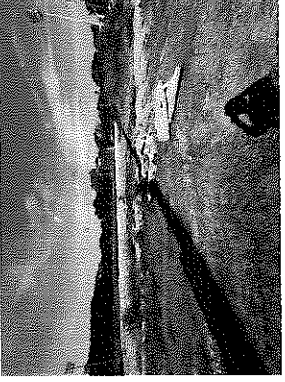Registro Fotográfico ítem INP3


		
Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.
		
Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.	Demolición de placa en concreto E=0,10m de anden.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S


CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



VERUH INGENIERIA S.A.S.

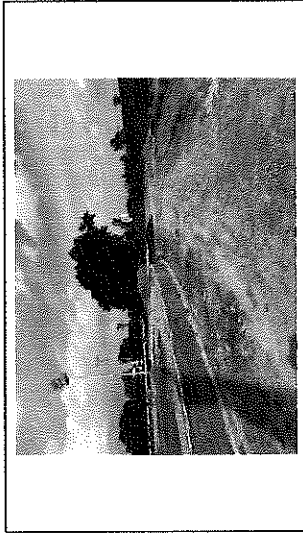Registro Fotográfico ítem INP3



Demolición de placa en concreto E=0,10m de andén.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador - Espinal
Teléfono: 2394333 - Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S




CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem N°4.4

		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.
		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

032









VERUH INGENIERIA S.A.S.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024






LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFP".

Registro Fotográfico ítem N°4.4


		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.
		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com






Registro Fotográfico ítem N°4.4

		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.
		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

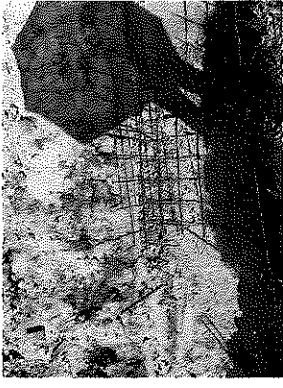Registro Fotográfico ítem N°4.4

		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.
		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

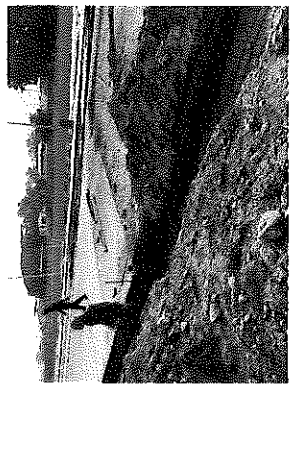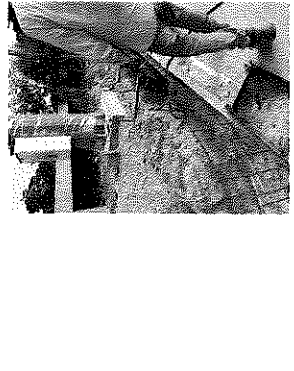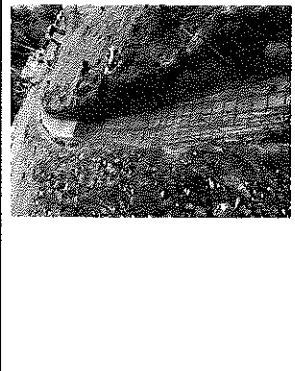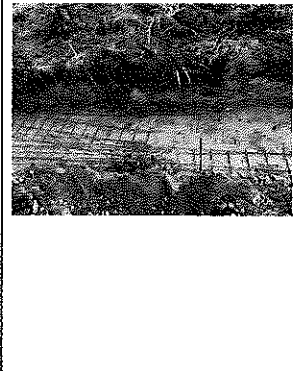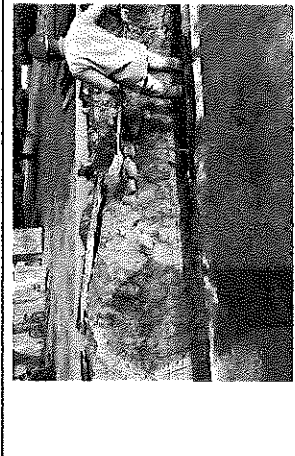Registro Fotográfico ítem N°4.4

		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.
		
Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.	Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

VERUH INGENIERIA S.A.S

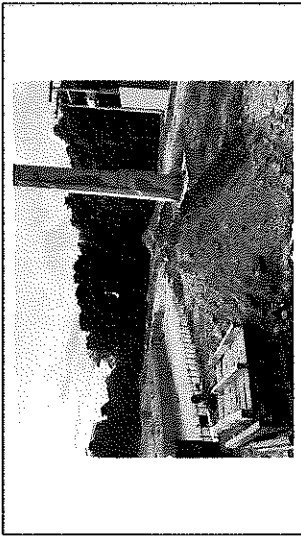
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




VERUH INGENIERIA S.A.S.


Registro Fotográfico ítem N°4.4




Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

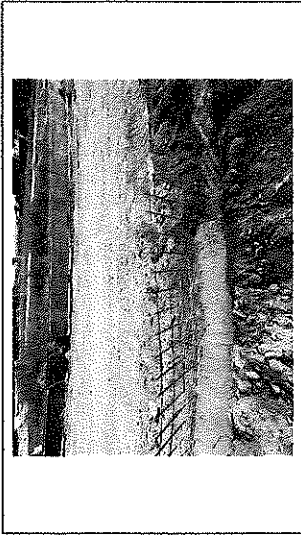


Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

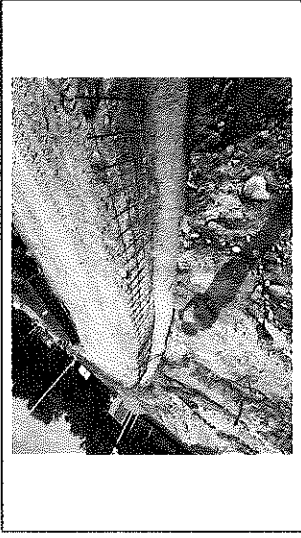

Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.


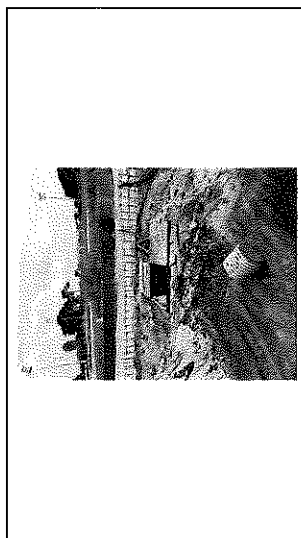


Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

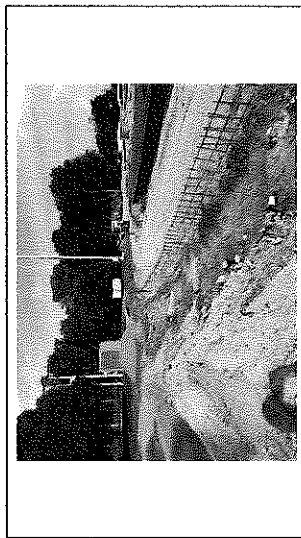

Malla electrosoldada de 0,15x0,15 m.

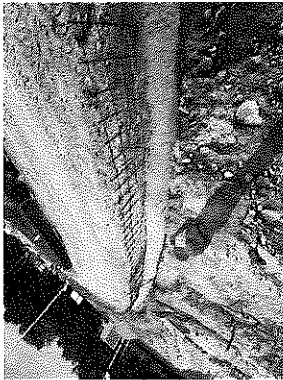Registro Fotográfico ítem N°5.4

		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI.	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI.	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI.
		
Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI.	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI.	Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIP".



Registro Fotográfico ítem N°5.4



Suministro figurada e instalación de acero de refuerzo 60000
PSI.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com



V39




VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTFP".


Registro Fotográfico ítem N°3.1

		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.
		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.

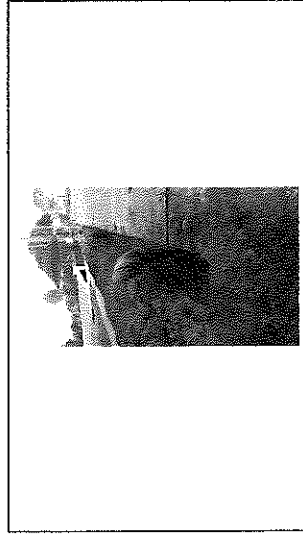
Registro Fotográfico ítem N°3.1




Excavación en material común.

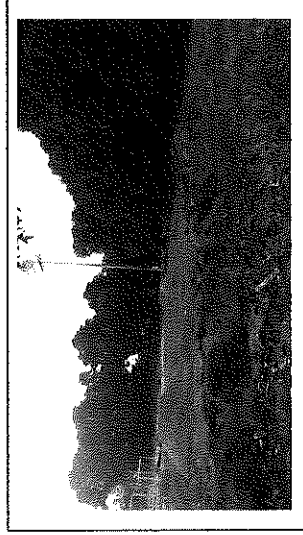


Excavación en material común.

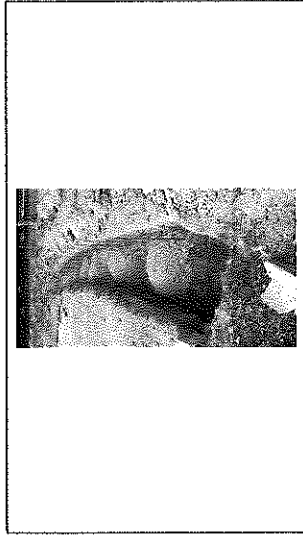

Excavación en material común.

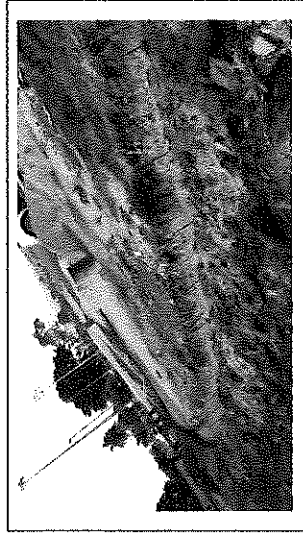

Excavación en material común.

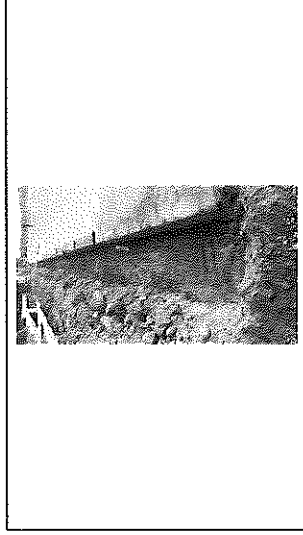


Excavación en material común.




Excavación en material común.


Registro Fotográfico ítem N°3.1




Excavación en material común.

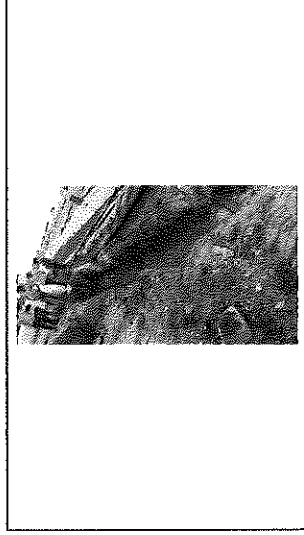


Excavación en material común.




Excavación en material común.

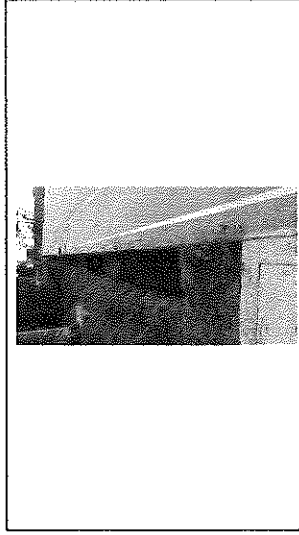

Excavación en material común.

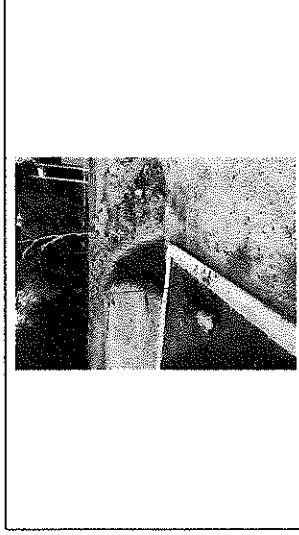

Excavación en material común.

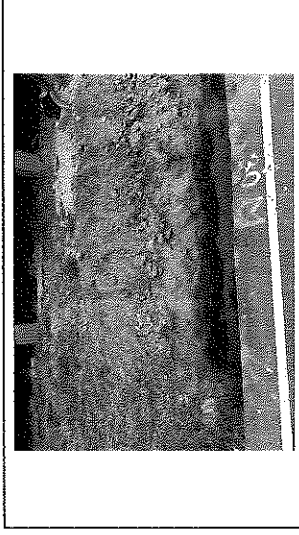

Excavación en material común.

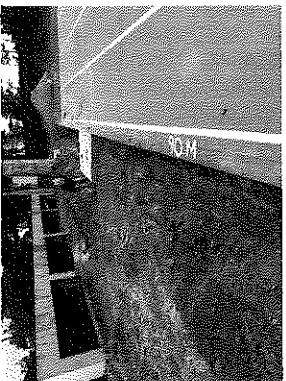
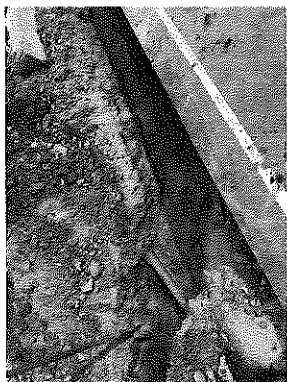
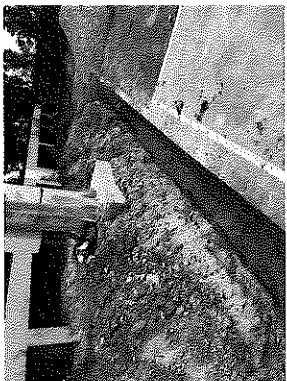


VERUH INGENIERIA S.A.S.






VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".


Registro Fotográfico ítem N°3.1

		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.
		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.

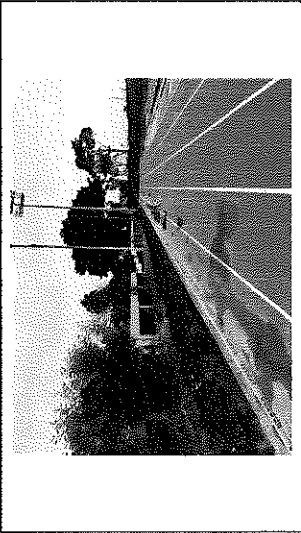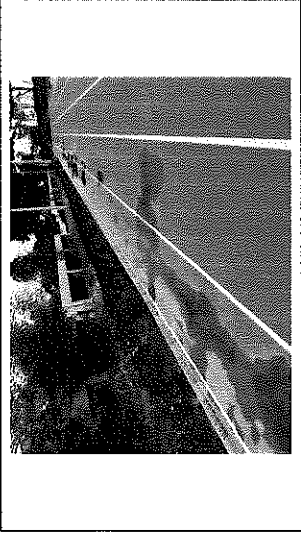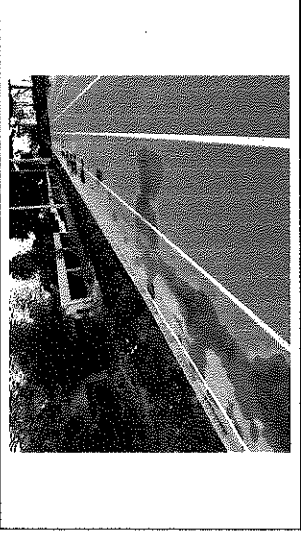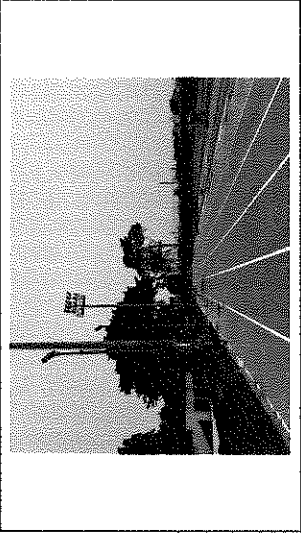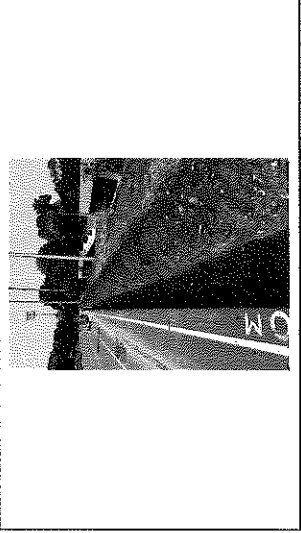
Registro Fotográfico ítem N°3.1

		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.
		
Excavación en material común.	Excavación en material común.	Excavación en material común.

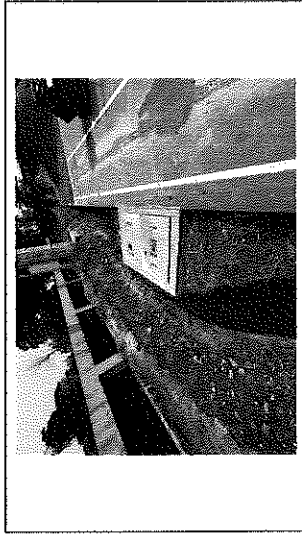
Registro Fotográfico ítem N°3.1



Excavación en material común.

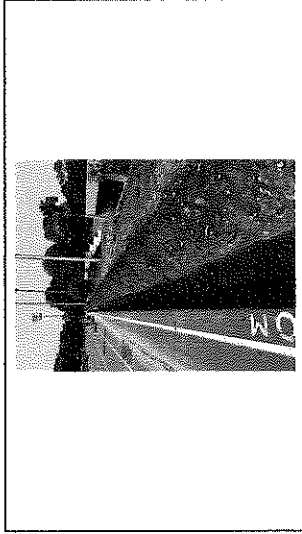

Excavación en material común.

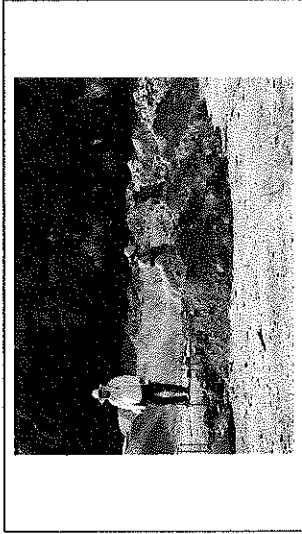


Excavación en material común.


Registro Fotográfico ítem INP4



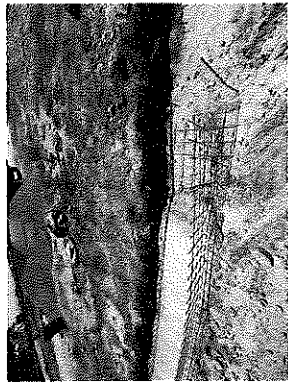
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.



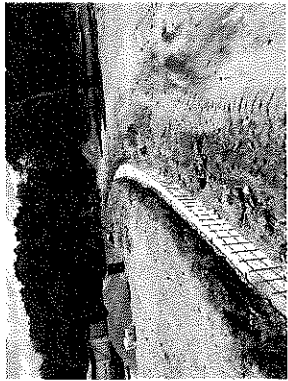
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.



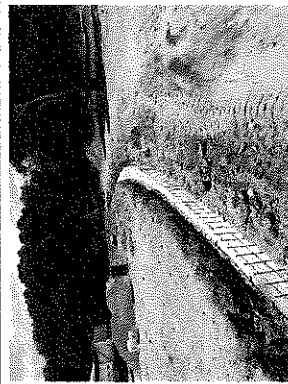Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.



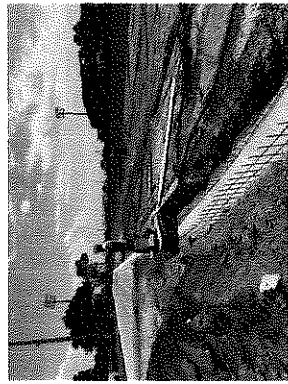Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.



Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m. H= variable. Incluye protección solar.

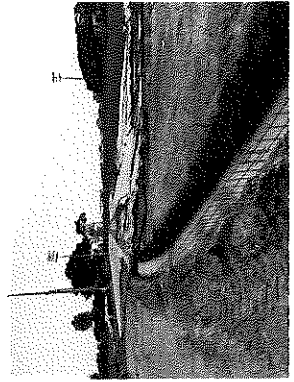
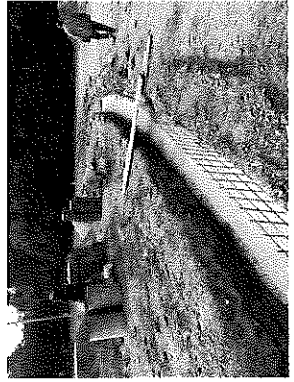
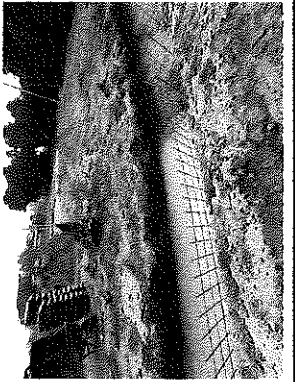
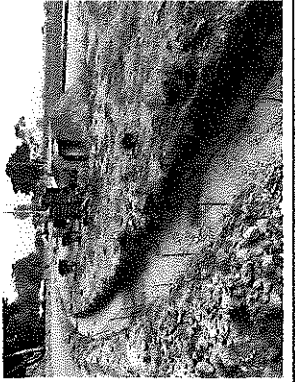
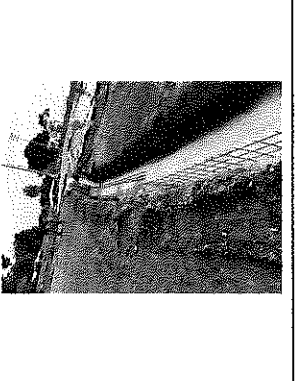
446

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N°. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITTFP".



Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com



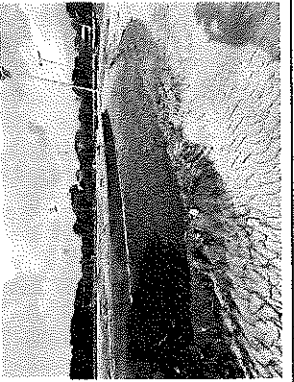
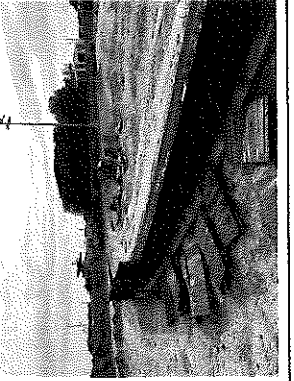
447

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

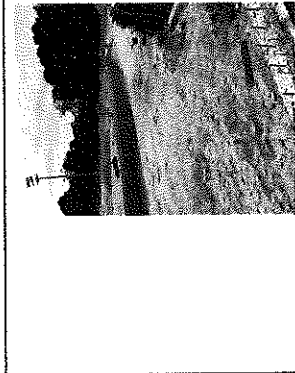
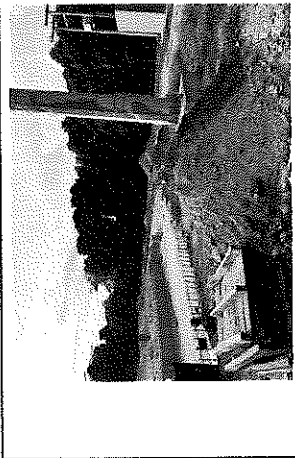
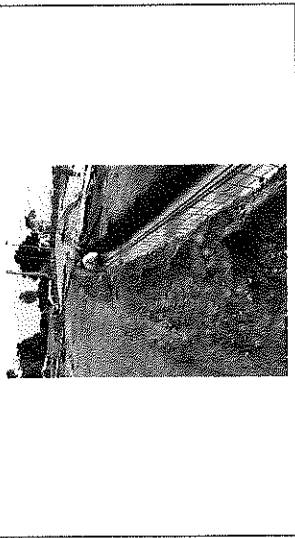
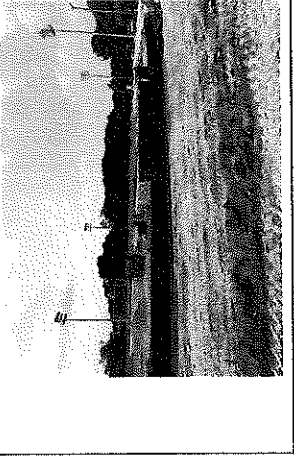
Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

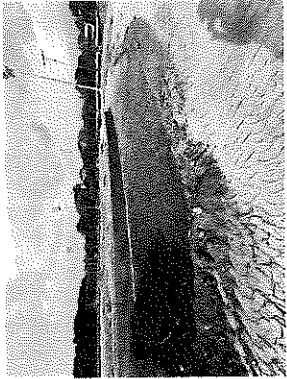
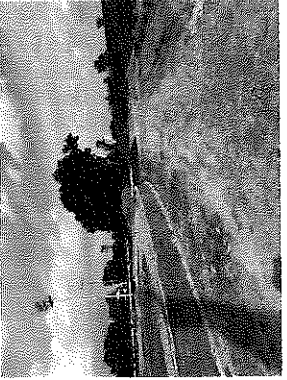
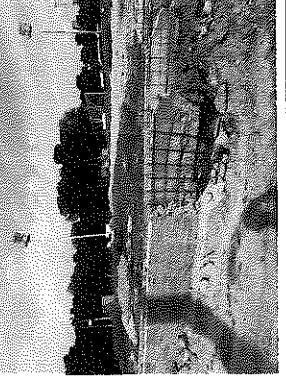
Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.

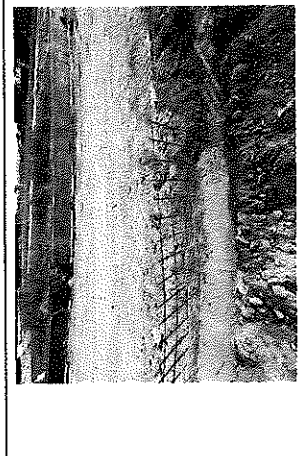
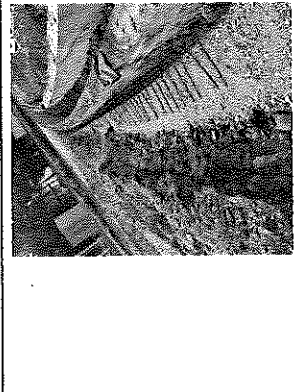
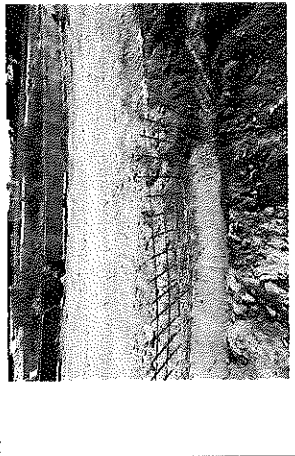
YSD



VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIFP".


Registro Fotográfico ítem INP4

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,40 m, H= variable. Incluye protección solar.





Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




Registro Fotográfico ítem INP5





		
Construcción cárcamo externo de la pista, en concreto de 3000 PSI ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




Registro Fotográfico ítem INP5

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com





VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTFIP".









VERUH INGENIERIA S.A.S.

Registro Fotográfico ítem INP5






		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

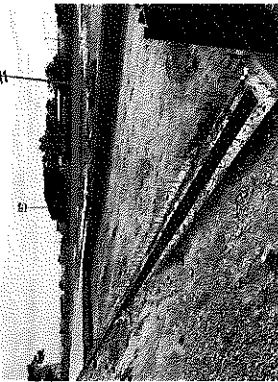Registro Fotográfico ítem INP5

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.

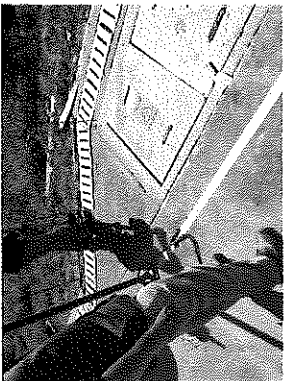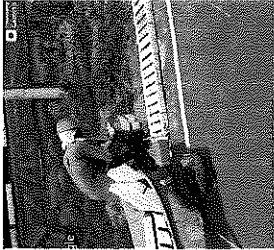Registro Fotográfico ítem INP5

		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.



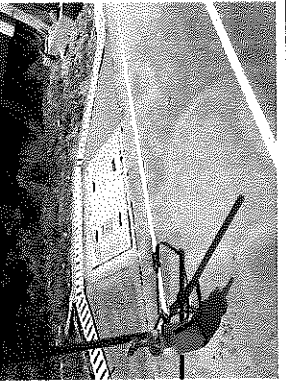



486



VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024





LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTFP".

Registro Fotográfico ítem INP5




		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.
		
Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.	Construcción cárcamo en concreto de 3000 psi ancho interno 0,20 m, H= variable. Incluye protección solar.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com


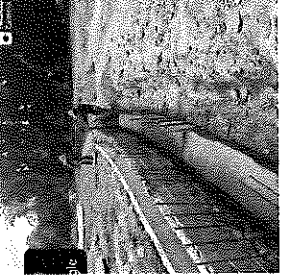

Registro Fotográfico ítem INP12

		
Vaciado de concreto de la zapata para el muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur oriente de la pista de atletismo.	Vaciado de concreto del muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur oriente de la pista de atletismo.	Vaciado de concreto de la zapata para el muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur de la pista de atletismo.
		
Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur oriente de la pista de atletismo.	Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur oriente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur oriente de la pista de atletismo.

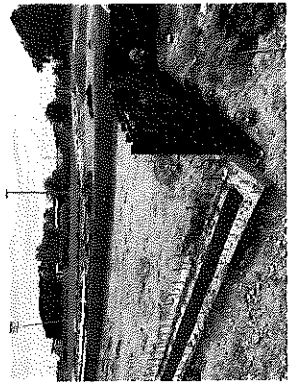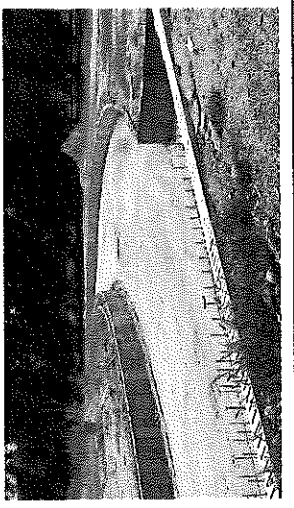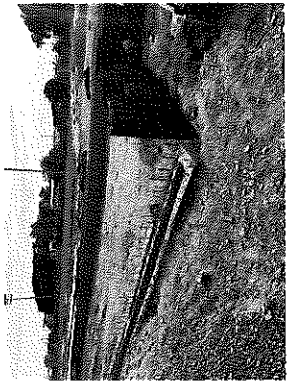Registro Fotográfico ítem INP12

		
Muro en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur de la pista de atletismo.	Muro interno y externo en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur occidente de la pista de atletismo.	Muro interno y externo en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur occidente de la pista de atletismo.
		
Muro interno y externo en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur occidente de la pista de atletismo.	Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur occidente de la pista de atletismo.	Demarcación zapata para muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona, Sur oriente de la pista de atletismo.

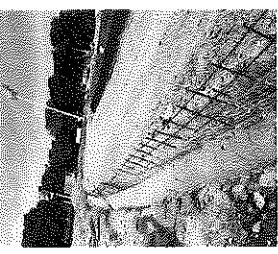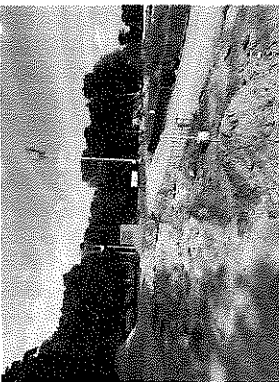Registro Fotográfico ítem INP12

		
Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroriental de la pista de atletismo.	Zapata del muro exterior en la zona Suroriental de la pista de atletismo.	Zapata del muro exterior en la zona Suroriental de la pista de atletismo.
		
Muro interno en concreto de 3000 PSI, y zapata del muro exterior en la zona Suroriental de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, y zapata del muro exterior en la zona Suroriental de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroriental de la pista de atletismo.

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

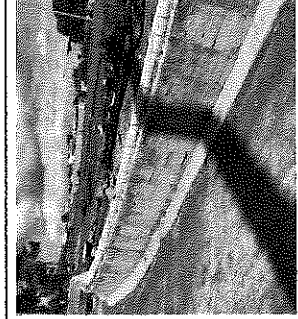
LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-901-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



Registro Fotográfico ítem INP12



Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Sur de la pista de atletismo.



Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.



Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.



Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.







Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.







Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

Registro Fotográfico ítem INP12

		
Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.
		
Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.

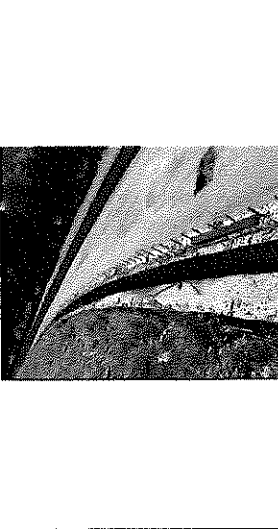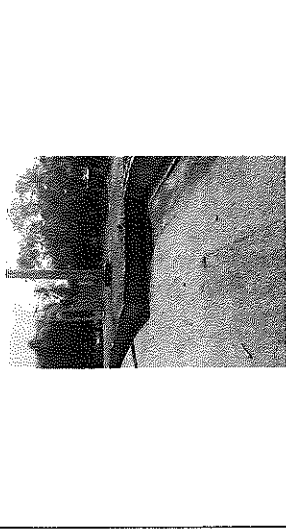Registro Fotográfico ítem INP12

		
Muro exterior en concreto de 3000 PSI, en la zona Sur de la pista de atletismo.	Muro interno y externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.
		
Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.



463

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO N.º CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




Registro Fotográfico ítem INP12


		
Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Sur de la pista de atletismo.	Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro interno en concreto de 3000 PSI, en la zona Sur de la pista de atletismo.
		
Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	Muro externo en concreto de 3000 PSI, en la zona Suroccidente de la pista de atletismo.	

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

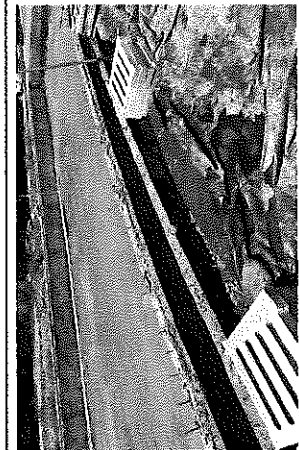Registro Fotográfico ítem N°4.3



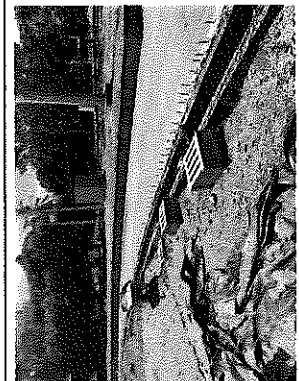Suministro de rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.




Suministro de rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.




Suministro de rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



Suministro de rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



Instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m. En la zona Suroccidente de la pista de atletismo.



Instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m. En la zona Suroccidente de la pista de atletismo.

465

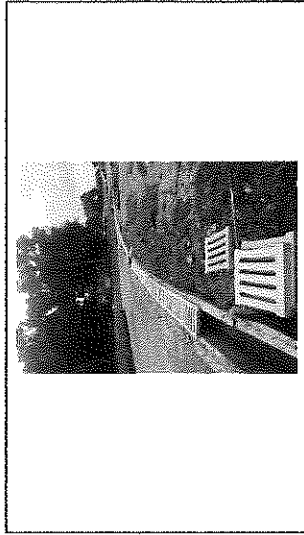
VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024


LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




Registro Fotográfico ítem N°4.3



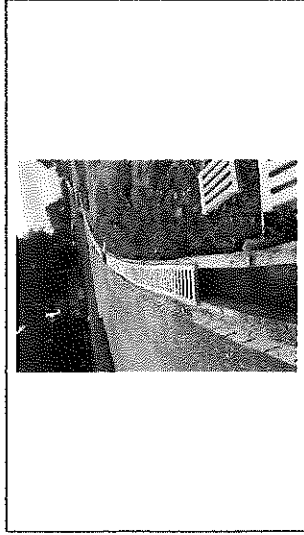
Instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m. En la zona Suroccidente de la pista de atletismo.



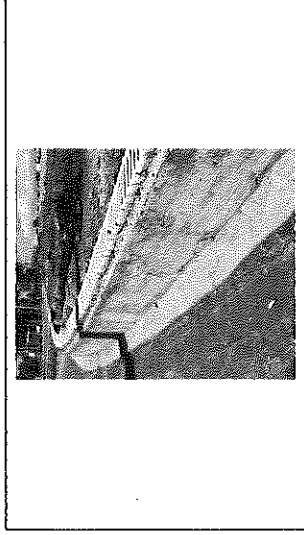
Instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m. En la zona Suroccidente de la pista de atletismo.



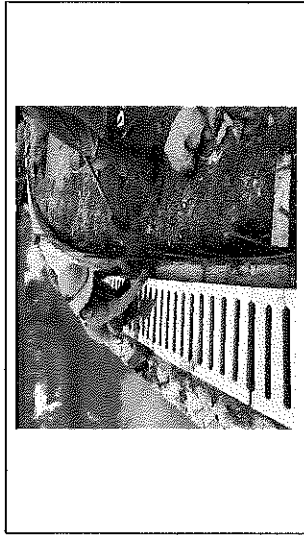
Instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m. En la zona Sur de la pista de atletismo.



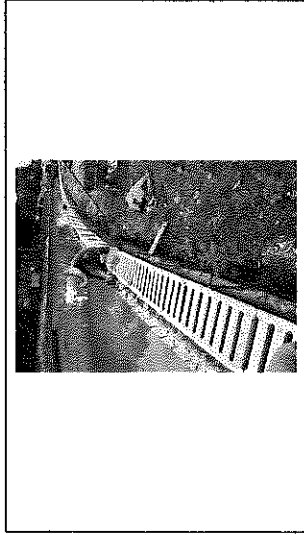Suministro e instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



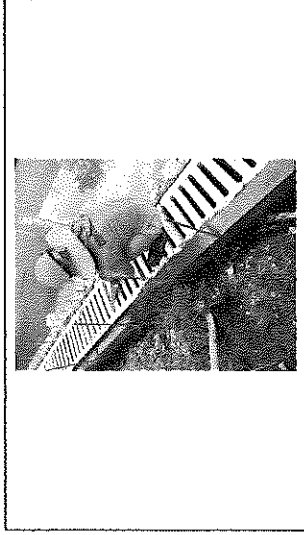Suministro e instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



Suministro e instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.


Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhas@gmail.com

466


VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024


LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".



Registro Fotográfico ítem N°4.3

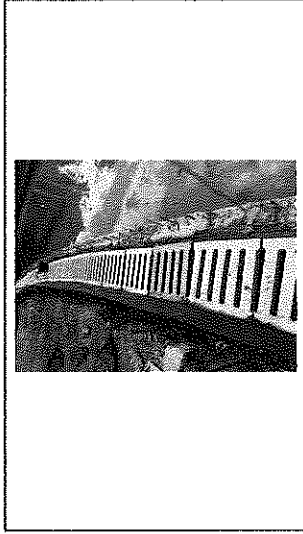

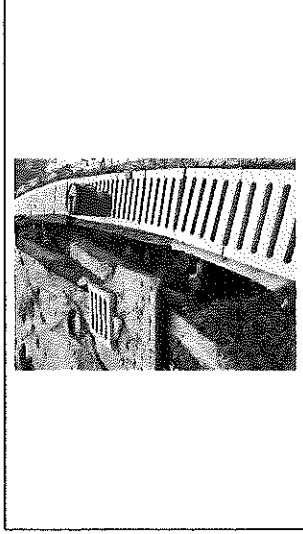Suministro e instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



Suministro e instalación rejilla para cárcamo interno de la pista con ancho 0,50 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

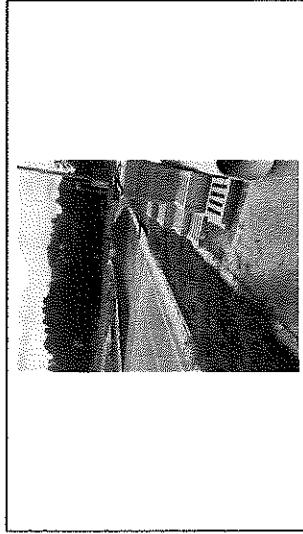
467

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024


LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFP".




Registro Fotográfico ítem INP10



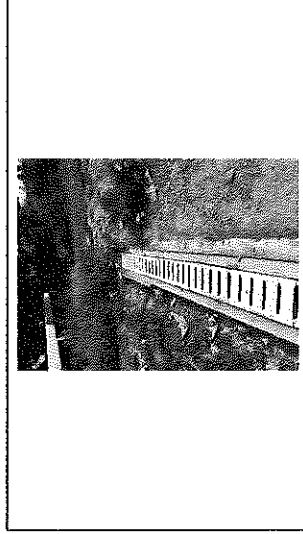
Suministro de rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



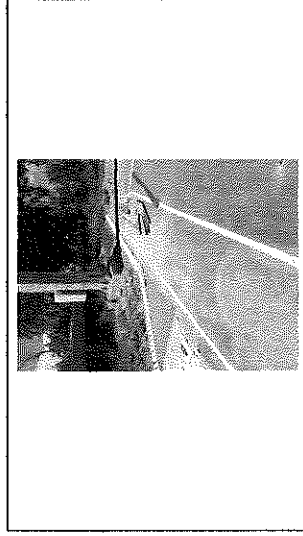
Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



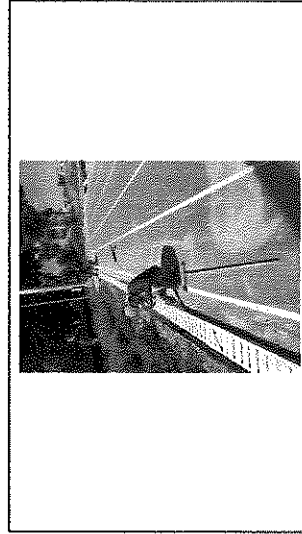
Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



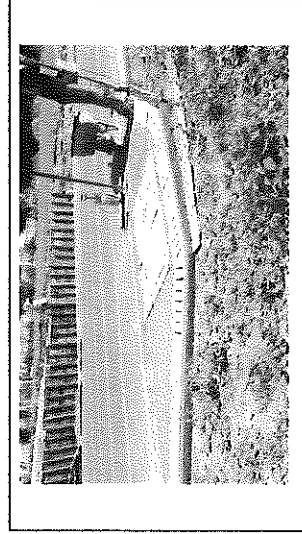Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.




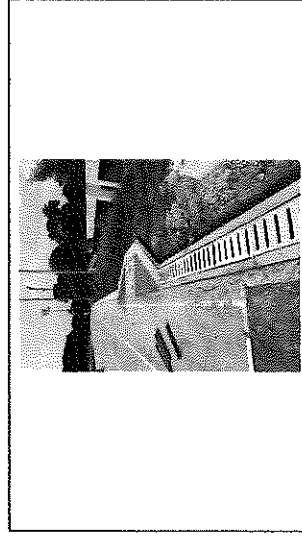Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.



Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.

Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com



AVIERA S.A.S.

AVIERA S.A.S.

--

512	56
-----	----

--

512	56
-----	----

AVIERA S.A.S.

469

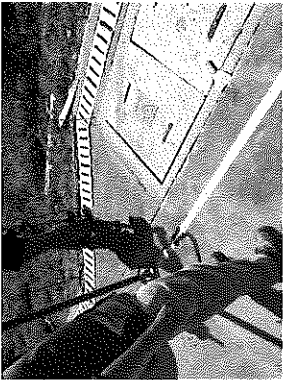
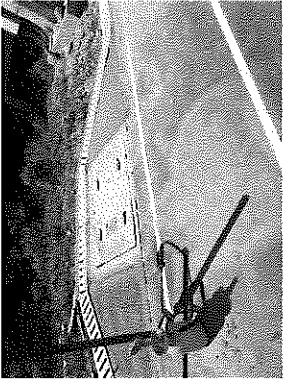


VERUH INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 176/2024

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP".




Registro Fotográfico ítem INP10

		
Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.
		
Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.


Carrera 6 No. 15-64 Barrio Libertador – Espinal
Teléfono: 2394333 – Celular: 301 479 8256
veruhsas@gmail.com

VERUH INGENIERIA S.A.S
CONTRATO 176/2024


LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO
ABIERTO No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITTIP".



Registro Fotográfico ítem INP10

		
Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.	Suministro e Instalación rejilla para cárcamo exterior de la pista con ancho 0,30 m. prefabricada en concreto reforzado. E= 0,06 m.

471



Resumen General de Pago

Identificación

CC 9133491

dv

Razon Social

SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

cra 6 no 15-64

Ciudad-Departamento

ESPINAL-TOLIMA

Telefono

2394836

Exonerado SENA e

ICBF

SI

Periodo

2024-08

Pension

Salud

Pago

900707938

Clave

9472430290

Tipo

Planilla

Planilla

I

Fecha

2024/09/20

Pago

2024/09/12

Banco

BANCOLOMBIA

Valor

\$602.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO

No.

Identificación

Nombres

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)

\$272,000

\$272,000

\$272,000

\$272,000

\$272,000

Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

1 CC 93213593 SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE

25-14

30

\$272,000

\$272,000

\$272,000

\$272,000

Total Afiliados(1)

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

\$1,700,000

RIESGOS

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)

\$0

\$0

\$0

\$0

Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)

\$0

\$0

\$0

\$0

1 CC 93213593 SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE

25-14

30

\$0

\$0

\$0

\$0

Total Afiliados(1)

\$0

\$0

\$0

\$0

PARAFISCALES

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Codigo

Dias

IBC

Aporte

SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)

\$0

\$0

\$0

\$0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)

\$0

\$0

\$0

\$0

Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)

\$0

\$0

\$0

\$0

1 CC 93213593 SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE

25-14

30

\$0

\$0

\$0

\$0

Total Afiliados(1)

\$0

\$0

\$0

\$0

Página 1 de 2

2024/09/12 10:55 AM




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 93133491		SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 no 15-64	ESPINAL-TOLIMA	2396836	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	90607938	9472430290	1	2024/09/20	2024/09/12	BANCOLOMBIA	0	\$602,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$272,000	\$0	\$0	\$0	\$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$118,400	\$0	\$0	\$0	\$118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$212,500	\$0	\$0	\$0	\$212,500
TOTAL									
			1		\$602,900	\$0	\$0	\$0	\$602,900

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
NIT 901396750	1	YERUH INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR	ESPINAL-TOLIMA	2392398	SI															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago	Valor														
2024-07	2024-08	908673539	9470551601	E		2024/08/14	2024/09/12	BANCOLOMBIA	\$325,900														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							
1	CC 93134130	BARRITO SANTOS ANGEL ALBERTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF40	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800			\$1,300,000	\$0	

794



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	JCBF
NIT 901369950	1	VERUH INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 15 64 888 LIBERTADOR	ESPINAL-TOLIMA	23972398	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
Perseón	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco			
2024-07	2024-08	908673539	9470351601	2024/08/14	2024/09/12	BANCOLOMBIA	29		\$325,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APT (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$4,500	\$0	\$212,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$4,500	\$0	\$212,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,800	\$200	\$0	\$7,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,800	\$200	\$0	\$7,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$52,000	\$1,200	\$0	\$53,200	
TOTAL				1	\$318,800	\$7,100	\$0	\$325,900	

435



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 93133491		SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 no 15-64	ESPINAL-TOLIMA	23968316	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago												
2024-09	970218013	970218013	9475114373	Planilla I	2024/10/22	2024/10/09	Banco	Dias Mora	Valor									
							BANCOLOMBIA	0	\$602,500									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$272,000				\$1,700,000	\$118,400			\$0
		Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)			\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$272,000				\$1,700,000	\$118,400			\$0
1	CC 93133491	SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE	25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5002	30	\$1,700,000	\$272,000		14-11	30	\$1,700,000	\$118,400	0		\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$272,000				\$1,700,000	\$118,400			\$0

476



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3333491		SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra. 6 no 15-64	ESPINAL-TOLIMA	2396836	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-09	970218013	9475114073		2024/10/23	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	\$602,900	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,000	\$0	\$0	\$272,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$272,000	\$0	\$0	\$272,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$212,500	\$0	\$0	\$212,500	
SALUD TOTAL	EP-S002	800,130,907	4	1	\$212,500	\$0	\$0	\$212,500	
TOTAL				1	\$602,900	\$0	\$0	\$602,900	


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

三

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e IGDP									
NIT 907196950	1	YERUBA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR,	ESPINAL-TOLIMA	2392398	51									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago										
Pension	Salud	Pago					Dias Mora	Valor									
2024-08	2024-09	970704432	947905495	E	2024/09/12	2024/10/09		27									
BANCOLOMBIA																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC
Siembra (PRINCIPAL) (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																	
1	CC:	93134130	BARRETO SANTOS ANGEL ALBERTO	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF46	30	\$1,300,000	\$52,000	14411	30	\$1,300,000
Total	Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901396950	1	VERLUX INGENIERIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 15 64 BRB LIBERTADOR	ESPINAL-TOLIMA	2392398	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	97010432	9475054495	2024/09/12	2024/10/09	BANCOLOMBIA		27	\$325,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$4,100	\$0	\$212,100
PORVENIR		210301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$4,100	\$0	\$212,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$200	\$0	\$7,000
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$200	\$0	\$7,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$1,100	\$0	\$53,100
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	1	\$52,000	\$1,100	\$0	\$53,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$1,100	\$0	\$53,100
FAMILIAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$52,000	\$1,100	\$0	\$53,100
TOTAL					1	\$318,800	\$6,500	\$0	\$325,300

479



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Dirección

Club/Departamento

Teléfono

Exonerado SRA e ICBF

CC 115643375

AVILES MEDINA JESSICA PAOLA

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

no c cda 12 el futuro

ESPINAL-TOLIMA

304113360

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Pago

Clave

Planilla

Planilla

Tipo

Fecha

Límite

Pago

Banco

Días Mora

Valor

2024-09

2024-09

988137444

9473926408

1

2024/10/17

2024/10/17

NEQUH

0

\$545,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.

Identificación

Nombres

Código

Días

PENSION

IBC

Aporte

Código

Días

SALUD

IBC

Aporte

Código

Días

CCF

IBC

Aporte

Código

Días

RIESGOS

IBC

Aporte

Código

Días

PARAFISCALES

IBC

Aporte

1

CC 115643375

AVILES JESSICA

230201

28

\$1,213,334

\$1,213,334

\$194,200

\$194,200

\$1,213,334

\$1,213,334

\$194,200

\$194,200

\$1,213,334

\$1,213,334

\$194,200

\$194,200

\$1,213,334

\$1,213,334

\$194,200

\$194,200

\$1,213,334

\$1,213,334

\$194,200

\$194,200

\$1,213,334

\$1,213,334

\$194,200

\$194,200

\$1,213,334

\$1,213,334


\$194,200

\$194,200

Página 1 de 2

2024/10/17 02:54 PM

480



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105648375		AVILES MEDINA JESSICA YAGLA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	mzc casa T2 el futuro	ESPINAL-TOJIMA	3041133260	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-09	988137344		947952608	1	2024/10/17	2024/10/17	NEQUI	0	\$345,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$194,200	\$0	\$0	\$0	\$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$194,200	\$0	\$0	\$0	\$194,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$151,700	\$0	\$0	\$0	\$151,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$151,700	\$0	\$0	\$0	\$151,700
TOTAL				1	\$345,900	\$0	\$0	\$0	\$345,900

CONTROL DE EQUIPOS

UNION TEMPORAL PISTA ITIP 2024



CONTRATO N° 210 DE 2024: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITIPF

CODIGO: VLCE-472023

VERSIÓN: 1

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME:	NÚMERO UNO (01)	INFORME:	PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DÍAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
INTERVENIENDO: 1 de octubre de 2024	210 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024	CONTRATO N°.	ACTIVIDAD	1	Se empleó el uso el día Martes 7 de Noviembre De 2023
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PISTA ITIP 2024	178 DEL 31 DE JULIO DE 2024	CONTRATO N°.			
INTERVENIENDO: PISTON INGENIERIA S.A.S			ACTIVIDAD	1	Se empleó el uso el día martes 7 de Noviembre De 2023
EQUIPO					
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Instalación del poste para subestación principal	1	Se empleó el uso el día Martes 7 de Noviembre De 2023
Fluorescenciamos 4182			Exposición mecánica para la subestación de tubería de 4"	1	Se empleó el uso el día martes 7 de Noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			INSTALACION Y CONDICION DE ESTRUCT. DE OBTURACION TRIMASCA.	1	Se empleó el uso el día miércoles 8 de Noviembre De 2023
Valvulas de 3/4 de placas GCP713			Entrega de material de trabajo (arena 3.162)	1	Se empleó el uso el día Miércoles 8 de Noviembre De 2023
Valvulas de 3/4 de placas GCP713			Entrega de material de trabajo (arena 3.162)	1	Se empleó el uso el día Viernes 10 de Noviembre De 2023
Carrón tipo furgón, de placas AMJ14			Instalación de protecciones estructura trípode	1	Se empleó el uso el día viernes 10 de Noviembre De 2023
Fluorescenciamos 4182			Exposición mecánica para la subestación de tubería de 4"	1	Se empleó el uso el día viernes 10 de Noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Entrega de material un vago de 800 and de tubería	1	Se empleó el uso el día Lunes 13 de Noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Entrega de material un vago de 800 and de tubería	1	Se empleó el uso el día jueves 16 de Noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Entrega de material un vago de 800 and de tubería	1	Se empleó el uso el día viernes 17 de Noviembre De 2023
Fluorescenciamos 4182			Exposición mecánica para la subestación de tubería de 4"	1	Se empleó el uso el día viernes 22 de Noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Instalación, limpieza y optimización de poste de concreto 12m 1050 19"	1	Se empleó el uso el día viernes 24 de noviembre De 2023
Fluorescenciamos 4182			Exposición mecánica para la subestación de tubería de 4"	1	Se empleó el uso el día viernes 24 de noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Instalación, limpieza y optimización de poste de concreto 12m 1050 19"	1	Se empleó el uso el día viernes 27 de noviembre De 2023
Fluorescenciamos 4182			Exposición mecánica para la subestación de tubería de 4"	1	Se empleó el uso el día viernes 27 de noviembre De 2023
Carrón Ford tipo grú de placas WNW211			Perforación de media vial para la subestación de tubería de 4"	1	Se empleó el uso el día jueves 27 de noviembre De 2023
Fluorescenciamos 4182			Instalación de poste medidor tipo resaca	1	Se empleó el uso el día martes 5 de diciembre del 2023



CONTRATO N° 210 DE 2024: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP

VL-CF-072023

VERSIÓN:

1

INFORMACIÓN GENERAL

[illegible]

Final

Nombres:

Summary

Nombre:

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		CÓDIGO:	VI-CSI-072023
			VERSIÓN:	1
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP		
CONTRATISTA DE OBRA:		UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024	NÚMERO DE CONTRATO:	210/2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:		VERUH INGENIERIA S.A.S.	NÚMERO DE CONTRATO:	176/2024
PERIODO DE SEGUIMIENTO:		MENSUAL / DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024		
DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	
	Bueno	Deficiente		
MAQUINARIA - EQUIPO			Ver control de equipos del formato VI-CE-072023.	
- Estado del equipo				
- Regularidad del mantenimiento				
- Vibraciones / Ruidos			Se empleo maquinaria pesada y ademas se requirió mixer a gasolina para realizar el concreto.	
- Protecciones / Guardas / Frenos				
- Idoneidad operarios				
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
- Dotación completa				
- Buen estado				
- Fácil acceso y operación				
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
- Dotación completa			Todos estaban técnicamente dotados para realizar las actividades correspondientes de la obra.	
- Buen estado			La dotación tenía un estado eficiente en condiciones de trabajo.	
- Uso según zona de trabajo			Tenían la dotación correspondiente según el área de trabajo y la actividad a desarrollar.	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN				
- Uso permanente			Se realiza durante las actividades la señalización correspondiente a la hora de trabajar.	
- Uso según zona de trabajo			Fue pertinente y acertada la señalización en el lugar de trabajo y actividades desarrolladas.	
ASEO E HIGIENE DE LA OBRA				
- Frecuencia			Mantuvieron en orden su área de trabajo a la hora de ejecutar la actividad y al terminar.	
- Alcance por zona de trabajo			Al desarrollar cada actividad lograron establecer un área de trabajo pertinente al desarrollar y culminar cada actividad.	
EMERGENCIAS Y OTROS				
- Plan de emergencias y rescate				
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARL				
- Capacitaciones y charlas			La profesional siio fue la encargada durante el periodo en dar charlas sobre la seguridad y salud de trabajo.	
APLICACIÓN DEL SG-SST				
- Realización de ATS y Matriz de riesgos.				
- Autorizaciones de trabajo y formalismos.			Se dio la pertinente documentación requerida.	
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>INTERVENTORÍA</p>				

484



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101193709		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 09 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 12 08 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 12 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-6	
DIRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM		CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	
		TELÉFONO: 3153204112	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0	
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL		CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	
		TELÉFONO 2483503	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUI0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTÍA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 210-2024, DE FECHA AGOSTO 08/2024, CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL ITFIP

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/08/2024	02/09/2025	\$336,443,561.20	\$336,443,561.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	12/08/2024	02/03/2028	\$168,221,780.60	\$168,221,780.60
ACCIDENTALES				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS +		\$336,443,561.20	\$336,443,561.20

DECLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA POLIZA. CONTRATO NO. 210-2024.

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001 DE FECHA AGOSTO 12-2024
FECHA DE REINICIO No. 001 DE FECHA SEPTIEMBRE 02-2024

MONTO PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****56,227.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,203.00	\$ *****76,430.00	\$ *****841,108,903.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COAS BOLSO		
NOMBRE	CLAVE	N. DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	N. PART.	VALOR ASEGURADO
OLGA MARINA VALENCIA LTDA	215280	100.00			

HA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) PARTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN EN LOS EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101193709

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Flanjas



FIRMA TOMADOR

CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 10-10 TELÉFONO: 601-2188977, 601-4019330

DLP215280A

1

485



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101193709		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 09 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 12 08 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 12 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-6			
DIRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM								CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA			
								TELÉFONO: 3153204112			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0			
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL								CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA			
								TELÉFONO 2483503			
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
*****58,227.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,203.00	\$ *****76,430.00	\$ *****841,108,903.00	CONTADO
INTERMEDARIO			DISTRIBUCION COALEGURO		
SE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DS OLGA MARINA VALENCIA LTDA	215280	100.00			

EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ENCONTRAN EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO QUE EL ASEGURADO DEBE COLABORAR EN SU COLABORACIÓN.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 40 NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

VALOR



REFERENCIA
PAGO:
1100561065779-1

(415) 7709998021167 (8020) 11005610657791 (3900) 000000076430 (96) 20250412

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

486



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.008.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101193709		ANEXO J	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 09 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 12 08 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 12 02 2030		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-6	
DIRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM		CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	
		TELÉFONO: 3153204112	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0	
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL		CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	
		TELÉFONO: 2483503	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LELAND RIOS LUIS FERNANDO	93127194	25.00
JOSEQUIN SOTO OSCAR ANDRES	93130597	10.00
SOLUCIONES INTEGRALES UTILITARIOS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	901694984-8	65.00

EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE EFECTÚAN EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO QUE EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

EFFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 40 NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101193709

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF219288A

487

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NIT. 860 009 578-6

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE		SUCURSAL IBAGUE		COD.SUC 25	NO PÓLIZA 25-40-101051569	ANEXO 3				
FECHA EXPEDICIÓN MES 09	AÑO 2024	VIGENCIA DESDE DÍA 12	MES 08	AÑO 2024	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 02	MES 03	AÑO 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

BREVE RAZÓN UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-6
CORRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM		CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA
		TELÉFONO: 3153204112

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DURADO: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0
CORRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL		CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA
		TELÉFONO 2483503
BENEFICIARIO: 800173719 - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP		

OBJETO DEL SEGURO

SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 P-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DEL SEGURO ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COBRAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES IMPUTADOS AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y SEGUROS DEL CONTRATO NO. 210/2024, DE FECHA AGOSTO 08/2024, CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS OBRAS CORRESPONDIENTES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA Y BARRIO ITFIP

AMPAROS

01: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

05	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
05 LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/08/2024	02/03/2025	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
05 ARTISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/08/2024	02/03/2025	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
05 BIENES PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/08/2024	02/03/2025	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00

MODIFICACIONES

DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACTAS SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PÓLIZA. CONTRATO NO. SUSPENSION No. 001 DE FECHA AGOSTO 12-2024 REINICIO No. 001 DE FECHA SEPTIEMBRE 02-2024

PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$32,054.00	\$3,000.00	\$6,660.00	\$41,715.00	\$260,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO	
OLGA MARINA VALENCIA LTDA	215280	100.00			

EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL SEGURO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) OBLIGACIÓN(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN EN LOS ACTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101051569

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VER ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDEL ESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 10-10 TELÉFONO: 601-2100877, 601-6019330

DLF218205A

1

1/88

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 880.009.978-8

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICION IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-40-101051569		ANEXO J	
FECHA EXPEDICION DIA MES AÑO 24 09 2024			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 12 08 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 02 03 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-8	
NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024							
DIRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM						CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	
						TELÉFONO: 3153204112	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0	
ASEGURADO: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP							
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL						CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	
						TELÉFONO: 2483503	
BENEFICIARIO: 800173719 - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP							

ANFAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MOLV	12/08/2024	02/03/2025	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MOLV	12/08/2024	02/03/2025	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MOLV	12/08/2024	02/03/2025	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00

ORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y ADERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. LA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO DEL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

EFFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101051569

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215280A

489



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 26-40-101051589	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 09 2024	12 08 2024		00:00	02 03 2025		23:59	ANEXO DE PRORROGA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-6
DIRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM						CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA	TELÉFONO: 3153204112	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0
DIRECCIÓN:	CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL	CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA
		TELÉFONO 2483503
BENEFICIARIO:		



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
*****32,054.00	\$ *****3,000.00	\$ *****6,650.00	\$ *****41,715.00	\$ *****260,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COAL SEGURO		
CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA		% PART.	VALOR ASEGURADO
OLGA MARINA VALENCIA LTDA	215280	100.00			

EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y SE CANCELARA EL SEGURO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. PRESUMIENDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ENCONTRE EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO QUE EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA NOTIFICAR LAS DIRECCIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 40 NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

CO	CHEQUE No.	VALOR



(415) 7709998021167 (8020) 11005610657817 (3900) 000000041715 (96) 20250812

REFERENCIA
PAGO:
1100561065781-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-40-101051569		ANEXO J	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 09 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 12 08 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 03 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024									
DIRECCIÓN: SIULTSAS@GMAIL.COM									
CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA									
TELÉFONO: 3153204112									
IDENTIFICACIÓN NIT: 901.857.443-6									

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP									
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 1 BARRIO ARKABAL									
CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA									
TELÉFONO: 2483503									
IDENTIFICACIÓN NIT: 800.173.719-0									
BENEFICIARIO: 800173719 - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP									

TEXTO ACLARATORIO																					
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :																					
<table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE</th><th>IDENTIFICACION</th><th>PARTICIPACION</th></tr></thead><tbody><tr><td>LEZANO RIOS LUIS FERNANDO</td><td>93127194</td><td>25.00</td></tr><tr><td>MARQUIN SOTO OSCAR ANDRES</td><td>93130597</td><td>10.00</td></tr><tr><td>SOLUCIONES INTEGRALES UTILITARIOS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS</td><td>901694984-8</td><td>65.00</td></tr></tbody></table>										NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION	LEZANO RIOS LUIS FERNANDO	93127194	25.00	MARQUIN SOTO OSCAR ANDRES	93130597	10.00	SOLUCIONES INTEGRALES UTILITARIOS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	901694984-8	65.00
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION																			
LEZANO RIOS LUIS FERNANDO	93127194	25.00																			
MARQUIN SOTO OSCAR ANDRES	93130597	10.00																			
SOLUCIONES INTEGRALES UTILITARIOS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	901694984-8	65.00																			

EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. PRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE EFICAZ EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

NOTAS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101051569

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF210700A



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Espinal, 18 de octubre de 2024

PARA: FREDY GENEY CORTES MONTEALEGRE

DE: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Rector

ASUNTO: Designación de Supervisión a los siguientes contratos:

Cordial saludo,

De manera atenta le informo que ha sido designado supervisor de los siguiente(s) contrato(s):

NO. CONTRATO	FECHA CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MODALIDAD	SUPERVISOR
168 DE 2024	10/07/2024	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL – ITFIP	CONSORCIO ADECUACIONES ITFIP 2024 REPRESENTA DO LEGALMENTE POR LUIS FERNANDO LOZANO RIOS	SELECCION ABREVIADA	ORLANDO PAZ RONDON
176 DE 2024	31/07/2024	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP	VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 REPRESENTA DA LEGALMENTE POR LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO	CONCURSO DE MERITOS	ORLANDO PAZ RONDON
210 DE 2024	09/08/2024	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP	UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024 REPRESENTA DA LEGALMENTE POR LUIS FERNANDO LOZANO RÍOS	LICITACION PUBLICA	ORLANDO PAZ RONDON

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

492

En atención a la incapacidad médica otorgada al DOCENTE DE PLANTA ORLANDO PAZ RONDÓN, con fecha 18 de octubre de 2024, se hace necesario adoptar medidas administrativas que garanticen la continuidad en la supervisión de los contratos previamente relacionados.

La situación de incapacidad médica imposibilita al funcionario ORLANDO PAZ RONDÓN para continuar ejerciendo las funciones inherentes a la supervisión contractual, en tanto esta labor requiere seguimiento permanente, control técnico, administrativo y financiero, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, actividades que no pueden ser suspendidas sin afectar la correcta ejecución de los contratos y el cumplimiento de los fines institucionales.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad del servicio, se considera procedente reasignar la supervisión de los contratos mencionados al DOCENTE DE PLANTA FREDY GENEY CORTÉS MONTEALEGRE, quien cuenta con la idoneidad y competencias necesarias para asumir dichas funciones, garantizando así la continuidad del servicio, el adecuado control contractual y la protección de los intereses de la entidad.

La presente decisión se adopta con fundamento en los principios de eficiencia, continuidad del servicio y responsabilidad administrativa, asegurando que la ejecución contractual no se vea afectada por la situación administrativa transitoria del funcionario inicialmente designado como supervisor.

Por lo anterior, garantizando una correcta supervisión de los contratos en mención, me permito informarle mediante el presente memorando que ha sido designado como persona idónea para continuar con las actividades propias de la supervisión de los aludidos contratos.

En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de la supervisión, de manera general se indican algunos parámetros a tener en cuenta:

1. Alcance de la actividad de supervisión.

Corresponde a las entidades públicas a través de los supervisores de los contratos o convenios que suscribe, vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011¹ dispone que la supervisión contractual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, es ejercida por la misma entidad estatal a través de los supervisores, cuando dicha actividad no requiere de conocimientos especializados.

Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, al referirse a las facultades y deberes de los supervisores señala que la supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Con el fin de adelantar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual, es su obligación realizar un estudio completo y detallado del contrato o convenio y de los documentos que soportan la contratación, además de adelantar entre otras, las siguientes actividades:

Los supervisores deben verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, están facultados para solicitar a los contratistas informes, aclaraciones y

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

493

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o convenio, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o convenio, o cuando tal incumplimiento se presente elaborando el informe respectivo

Adicional a lo anterior, el párrafo primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, modificó el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002² el cual consagra las faltas gravísimas en el Código Disciplinario Único, indicando que constituye falta de tal naturaleza:

"No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento".

Por lo tanto, corresponde al supervisor llevar a cabo la vigilancia de la ejecución del contrato o convenio, en los términos previstos en el mismo y, en caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, informar oportunamente a la Secretaría General y de Gobierno, con el propósito de obtener la asesoría legal necesaria y adoptar de manera conjunta, las acciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17³ de la Ley 1150 de 2007⁴ y artículo 86⁵ de la Ley 1474 de 2011.

Por otra parte, en ejercicio de la actividad de supervisión, deberán autorizarse los pagos respectivos previa verificación de su procedencia, para lo cual el contratista deberá presentar los informes de ejecución en los cuales se describa detalladamente cada una de las actividades realizadas durante el periodo, en el formato diseñado para el efecto por parte de la entidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada contrato o convenio, así como verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y pago de aportes parafiscales cuando haya lugar a ello.

Aunado a lo anterior el supervisor deberá revisar y analizar los informes antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato o convenio, anexando los productos o documentos que soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.

En lo relacionado con la conformación del expediente contractual en la etapa de ejecución, los supervisores deben remitir mensualmente al área de contratación de la Secretaría General y de Gobierno, todos los soportes de ejecución, informes de actividades, copia del recibo a satisfacción, productos si hay lugar a ello y demás documentos que soporten la ejecución del contrato o convenio.

En los casos de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que contemplen y generen gastos de desplazamiento por comisiones, el supervisor del contrato deberá verificar el cumplimiento del objeto de la comisión y de la entrega del informe con los respectivos soportes teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento de legalización de viáticos y la normatividad aplicable.

Así mismo, y entre otras obligaciones el Supervisor (a) designado (a) deberá, exigir, al contratista

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal - Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

494

mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados.

1. Plazo de ejecución del contrato o convenio.

El plazo de ejecución de los contratos estatales inicia a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. En este orden de ideas, una vez se expida el registro presupuestal y, si se pactó en el contrato o convenio, cuando además quede aprobada la garantía, empieza a contarse el plazo referido. Por lo anterior, NO podrá existir acta de inicio (cuando aplique) o no se podrá dar inicio a la ejecución del contrato o convenio, sin que se cumplan los requisitos de ejecución señalados anteriormente.

En caso de terminación anticipada por mutuo acuerdo, la finalización del contrato o convenio será la fecha que las partes convengan.

Es importante anotar que el ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del contrato o convenio en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con su liquidación cuando sea procedente. Sin embargo, es posible que la función se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de calidad, entre otros.

2. Modificaciones, prórrogas, cesiones y adiciones contractuales.

Cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el supervisor deberá presentar una solicitud por escrito al ordenador del gasto, por lo menos con cinco (5) días hábiles de anterioridad a la fecha prevista para que se legalice la actuación contractual respectiva; la cual deberá diligenciarse en el formato correspondiente.

Para adelantar las modificaciones contractuales, deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones:

- No podrá modificarse el objeto contractual.
- Las adiciones no podrán superar el 50% del valor total del contrato expresado en SMMLV.
- Las prórrogas no podrán superar el 50% del plazo inicialmente establecido.
- Las adiciones deberán contar con disponibilidad presupuestal previa y deben estar incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la correspondiente vigencia, publicado en el SECOP I.
- Implicarán, tratándose de modificaciones en tiempo o en valor, la modificación de la garantía única del contrato, ajustándola a las nuevas condiciones contractuales.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de formación y experiencia definidas en el contrato que se pretende ceder. En este evento el supervisor del contrato deberá solicitar la cesión del contrato anexando la comunicación en que el contratista manifieste las razones por las cuales no puede seguir ejecutando el contrato, así como el balance financiero, y la documentación soporte del cesionario, con el fin de verificar el cumplimiento del perfil.
- Para efectos de terminación anticipada, deberá aportarse la carta del contratista y la solicitud del supervisor indicando el balance financiero y la fecha de terminación del contrato, efectuando la radicación de la solicitud en la Secretaría General y de Gobierno por lo menos con cinco (5) días hábiles de anterioridad a la fecha prevista para la terminación.

3. Liquidación.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de liquidación.

Por lo anterior una vez termine la ejecución del contrato o convenio, el supervisor debe solicitar la liquidación aportando toda la documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio.

4. Consideraciones Generales Finales

Inhabilidades: Si al momento de efectuarse la presente notificación evidencia que se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés estipulado en la ley, deberá manifestarlo de inmediato y por escrito al ordenador del gasto.

Responsabilidad: Los supervisores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la supervisión, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y ejecución de los contratos o convenios respecto de los cuales se ejerza supervisión.

El supervisor deberá responder por el control y vigilancia del contrato o convenio hasta su liquidación. Igualmente, será responsable de suministrar oportunamente la información que se le solicite.

Los documentos, estudios previos y el contrato se encuentran publicados en la plataforma del SECOP II, donde podrá efectuar su consulta.

Con el recibo del presente memorando se entiende notificado de la presente designación.

La secretaria general y de Gobierno, estarán atentos a resolver las inquietudes que se presenten durante el ejercicio de la actividad de supervisión.

Es importante resaltar que, para el ejercicio de sus funciones como supervisor, se deberá tener en cuenta el Manual de contratación y el Manual de Supervisión del municipio.

Nota 1: El supervisor deberá informar al contratista la fecha de inicio de ejecución del contrato.

Nota 2: El supervisor deberá solicitar la liberación del saldo de los recursos no ejecutados a la Secretaría de Hacienda dentro del mes siguiente a la realización del pago. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los recursos durante la presente vigencia.

Nota 3: Para efectos de contabilizar los días de servicio efectivamente prestados, el supervisor deberá tener en cuenta la fecha de inicio del contrato, la cual corresponde a la de la expedición del Registro Presupuestal y/o de aprobación de la garantía cuando esta haya sido solicitada.

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

496

Nota 4: Adicionalmente, se debe tener en cuenta que si por cualquier causa, no se designa el supervisor en la forma prevista por la Entidad, se entenderá que la supervisión será ejercida por el jefe del área solicitante de la contratación y quien firmó los documentos previos. Lo anterior, aplica también para aquellos eventos en que no se efectúe cambio de supervisor en ausencias temporales del funcionario designado inicialmente.

Nota 5: En el evento de retirarse del cargo en virtud del cual se efectúa la designación de supervisión, deberá entregar al jefe inmediato un informe detallado y actualizado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que haya efectuado sobre el cumplimiento del objeto del contrato, aportando los soportes correspondientes. Igualmente, deberá efectuar el empalme correspondiente con el funcionario que en su reemplazo asuma la supervisión del contrato o convenio, so pena de incurrir en posibles sanciones disciplinarias.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Rector- ITFIP

Proyectó y Vo. Bo.
Daniela Saavedra Arias
Profesional Universitario
Grado 08- Oficina de
Contratación

Supervisor Designado,
Fredy Geney Cortes Montealegre
Docente De Planta

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1

NIT 860.037.014.6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: vc7HMRX7HW6zCXFTp15s5Q==

No. PÓLIZA	I-108035315	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18119118	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 12/08/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 05/03/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	VERUH INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	901.396.950-1
DIRECCIÓN	CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR					TELÉFONO	3014798256
ASEGURADO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP					No. DOC. IDENTIDAD	800.173.719-0
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL					TELÉFONO	82483501
BENEFICIARIO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP					No. DOC. IDENTIDAD	800.173.719-0
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL					TELÉFONO	82483501

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPECCION NUMERO 001 FIRMADA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y ACTA DE REINICIO NUMERO 001 FIRMADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.176 DEL 2024 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 05/03/2026	23.550.219,00	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 05/03/2028	11.775.109,50	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 05/03/2026	23.550.219,00	6.666,67
TOTAL ASEGURADO			\$ 58.875.547,50	

INTERMEDIARIOS		TIPO		% PARTICIPACIÓN	
CES AGENCIA LTDA		AGENCIAS		100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO					
COMPañÍA		TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO		DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/01/2028			

PRIMA BRUTA	\$	20.000,01
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	20.000,01
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	\$	23.800,01

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRAN - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18119118	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/08/2024	24:00 Horas Del	05/03/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"




LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-100035315 y endoso, 3 cuyo afianzado es: VERUH INGENIERIA SAS Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP / INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP , expedida por la Compañía en 24/09/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 24 días del mes SEPTIEMBRE del año 2024.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

18119118

Fecha de Facturación

24/09/2024

Fecha Límite de Pago

24/10/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

I-100035315

Prima

20.000,01

Periodo Facturado

12/08/2024

05/03/2028

IVA

3.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.800,01

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

TOTAL

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 24/10/2024 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la cartula de esta (artículo 1058 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque focal a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NR 900531292-7, al respaldo endosélo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, RIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

18119118

Fecha de Facturación

24/09/2024

Fecha Límite de Pago

24/10/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

I-100035315

Prima

20.000,01

Periodo Facturado

12/08/2024

05/03/2028

IVA

3.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.800,01

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque


Valor Cheque

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR


901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

TOTAL
Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000018119118(3900)000000023800(96)20241024

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018119118(3900)000000023800(96)20241024

501

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES












OPCIÓN 2



BANCOS








CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18127292	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 12/08/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 05/05/2028	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	VERUH INGENIERIA SAS				No. DOC. IDENTIDAD	901.396.950-1	
DIRECCIÓN	CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR				TELÉFONO	3014798256	
ASEGURADO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP				No. DOC. IDENTIDAD	800.173.719-0	
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL				TELÉFONO	82483501	
BENEFICIARIO	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP				No. DOC. IDENTIDAD	800.173.719-0	
DIRECCIÓN	CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL				TELÉFONO	82483501	

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN OTRO SI N 1 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2024, DE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 2 MESES Y SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$35.012.910, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.176 DEL 2024 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 - COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/12/2024	24:00 Horas Del 05/05/2026	30.552.801,00	74.884,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/12/2024	24:00 Horas Del 05/05/2028	15.276.400,50	77.094,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/12/2024	24:00 Horas Del 05/05/2026	30.552.801,00	24.247,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 76.382.002,50	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
CES AGENCIA LTDA		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/03/2028				

PRIMA BRUTA	\$	176.225,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	176.225,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	33.483,00
TOTAL A PAGAR	\$	209.708,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS-MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

JEIPE JANECA
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18127292	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	12/08/2024	24:00 Horas Del	05/05/2028			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

18127292

Fecha de Facturación

24/12/2024

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

I-100035315

Periodo Facturado

12/08/2024

05/05/2028

Fecha Limite de Pago

23/01/2025

Prima

176.225,00

IVA

33.483,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

209.708,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 23/01/2025 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente giro cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldarlo endosarlo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

18127292

Fecha de Facturación

24/12/2024

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

Póliza No.

I-100035315

Periodo Facturado

12/08/2024

05/05/2028

Fecha Limite de Pago

23/01/2025

Prima

176.225,00

IVA

33.483,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

209.708,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

VERUH INGENIERIA SAS

CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR

901396950

Intermediario

CES AGENCIA LTDA


Cheque

Banco


No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000018127292(3900)000000209708(96)20250123

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018127292(3900)000000209708(96)20250123

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

OPCIÓN 2

BANCOS

CORRESPONSALES

Te damos más

Tu compañía siempre



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO No. 176 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP."

CONTRATISTA: VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.

SUPERVISOR: FREDY GENEY CORTES MONTEALEGRE

La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ITFIP, en la fecha procede a evaluar la garantía única conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015 presentada por CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. NIT. 800.058.607-2 representada legalmente por ADRIANA MÁRQUEZ PARDO en el marco del Contrato de la referencia.

Para el efecto se recibe la Póliza del contrato de seguro de cumplimiento ante entidades estatales No.I-100035315, expedida por Seguros mundial, tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 24 de diciembre de 2024, la cual presenta el siguiente detalle:

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$30.552.801.00	24	12	2024	05	05	2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$15.276.400.50	24	12	2024	05	05	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$30.552.801.00	24	12	2024	05	05	2026
POLIZA N°	I-100035315 ANEXO 4						
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
NIT:	860.037.013-6						

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente al requerimiento y en consecuencia se imparte la aprobación a las Pólizas

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

emitidas por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** No I-100035315 tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 24 de diciembre de 2024.

En constancia se firma en El Espinal - Tolima el 24 de diciembre de 2024.

AMPARO SANCHEZ PERDOMO
Asesora Jurídica ITFIP

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PP5US2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100035315	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18127612	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	29/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
	12/08/2024		05/05/2028				
					N/A		N/A
					N/A		N/A
					N/A		N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosnumdial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosnumdial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO No. 176 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP."

CONTRATISTA: VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C. 1.110.515.658 de Ibagué Tolima.

SUPERVISOR: FREDY GENEY CORTES MONTEALEGRE

La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ITFIP, en la fecha procede a evaluar la garantía única conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015 presentada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO en el marco del Contrato de la referencia.

Para el efecto se recibe la Póliza del contrato de seguro de cumplimiento ante entidades estatales No. I-100035315, expedida por Seguros mundial, tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C. 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 29 de diciembre de 2024, la cual presenta el siguiente detalle:

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$30.552.801.00	24	12	2024	05	05	2026
PRESTACIONES SOCIALES	\$15.276.400.50	24	12	2024	05	05	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$30.552.801.00	24	12	2024	05	05	2026
POLIZA N°	I-100035315 ANEXO 5						
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
NIT:	860.037.013-6						

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente al requerimiento y en consecuencia se imparte la aprobación a las Pólizas

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
Celular Atención al Ciudadano 316 6254592
Correo: info@itfip.edu.co
El Espinal – Tolima



SC6793-1



CO-SC6793-1



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

emitidas por la aseguradora **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** No **I-100035315** tomada por VERUH INGENIERIA S.A.S. NIT 901.396.950-1 representada legalmente por LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO, C.C: 1.110.515.658 de Ibagué Tolima, el día 29 de diciembre de 2024.

En constancia se firma en El Espinal - Tolima el 29 de diciembre de 2024.

AMPARO SANCHEZ PERDOMO
Asesora Jurídica ITFIP

"EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS"

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

Celular Atención al Ciudadano 316 6254592

Correo: info@itfip.edu.co

El Espinal - Tolima




SC6793-1



CO-SC6793-1

CONSECUTIVO: EDY-CIL
Nº247

OBSERVACIONES
Los resultados presentados en este informe, solo son aplicables a los ítems sometidos a ensayo.
El presente informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación del laboratorio de EDYCONST S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Los datos de la muestra que figuran en este informe han sido proporcionados por el cliente.
El laboratorio no realiza opiniones, interpretaciones ni declaraciones de conformidad, sobre los ensayos ofertados. Se limitará solamente a expresar resultados en un informe de ensayo.
EDYCONST S.A.S, conservará muestras testigo de ensayos o contramuestras que lo permitan, por un periodo máximo de 15 días calendario, luego de la emisión del informe de resultados. si el cliente requiere la devolución de la muestra restante del análisis (en el caso de quedar disponible) los gastos de devolución, manipulación, embalaje, y transporte correrán a cargo del cliente.
Las solicitudes de modificación o corrección al informe de resultados de ensayos de laboratorio solo podrán ser solicitadas sobre información suministrada por el cliente y no sobre los resultados emitidos, estas deberán ser solicitadas por medio de un correo corporativo oficial.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La siguiente información relacionada en todos los formatos anexos a este informe: nombre o razón social, nombre del proyecto, No. de identificación o NIT, localización, tipo de material y procedencia son suministradas por el cliente con fines informativos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada o confirmada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados.
El laboratorio de EDYCONST S.A.S no es responsable del origen de donde haya sido tomada o extraída la muestra.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA DIRECTOR TECNICO APROBÓ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BRAYAN STIVEN VARGAS MANCILLA COORDINADOR DE LABORATORIO REVISÓ</p> </div> </div>
Nota. Por políticas del laboratorio, se garantiza total confidencialidad y reserva sobre los resultados obtenidos, además, los derechos de autor son propiedad total de la parte contratante.



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E - 410-2013

CÓDIGO: OPS-R-038
EMISIÓN: 10/10/2020
VERSIÓN: 2
CONSECUTIVO: EDY-CIL
N°247

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024

PROYECTO: PISTA DE ATLETISMO ETAPA 3, UBICADA EN EL INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIO, MUNICIPIO DE EL
ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: ESPINAL - TOLIMA

No.	ELEMENTO	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD DIAS	DIAM (Cm)	AREA (Cm2)	FUERZA LEIDA KNw	FUERZA Kg	ESFUERZO		TIPO DE FALLA	PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESION
		Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA						Kg/cm2	PSI		
1	PISO CARCAMO EXTERNO	210	3000	2024-09-16	2024-09-23	7	10.40	84.949	292.1	23785.6	102.5	2314	5	77.1%
2		210	3000	2024-09-10	2024-09-30	14	10.20	81.713	348.8	35567.4	191.3	2728	5	90.0%
3		210	3000	2024-09-16	2024-10-14	28	10.10	80.119	411.2	41930.4	228.7	3258	5	108.2%
4		210	3000	2024-09-16	2024-10-14	28	10.10	80.119	460.4	46150.1	340.9	3580	5	121.8%
5	MURO CARCAMO EXTERNO	210	3000	2024-09-18	2024-09-25	7	10.10	80.119	258.5	26559.75	325.0	4700	3	156.7%
6		210	3000	2024-09-18	2024-10-02	14	10.20	81.713	291.0	29873.85	363.1	5188	5	172.9%
7		210	3000	2024-09-18	2024-10-16	28	10.20	81.713	325.9	33292.67	406.7	5810	3	193.7%
8		210	3000	2024-09-18	2024-10-16	28	10.40	84.949	336.0	34262.50	403.3	5762	5	192.1%

RESISTENCIA ESPERADA A CADA EDAD	
3 DIAS	39% a 47%
7 DIAS	62% a 68%
14 DIAS	81% a 85%
28 DIAS	100% como mínimo

TIPOS DE FALLAS		CONVERSIONES	
1	2	1	Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
2	3	2	Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.
3	4	3	Grietas verticales que llegan a los extremos. Agrupamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
4	5	4	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
5	6	5	Fracturas en las esquinas (Usuales en los cilindros sin refrentar).
6		6	Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES:

ING. CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
DIRECTOR TECNICO

BRAYAN STEVEN VARGAS M.
COORDINADOR DE LABORATORIO

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio/Blanco Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel.: 3115571381-3175262303 gerencia@edyconst.com.co - edyconst@hotmail.com



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E - 410-2013

CÓDIGO: OPS-R-028
EMISIÓN: 10/10/2020
VERSIÓN: 2
CONSECUTIVO: EDY-CIL
N°247

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024

PROYECTO: PISTA DE ATLETISMO ETAPA 3, UBICADA EN EL INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIO, MUNICIPIO DE EL
ESPIRAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACIÓN: ESPINAL - TOLIMA

N°.	ELEMENTO	RESISTENCIA TEÓRICA		FECHA		EDAD DÍAS	DIAM. (Cm)	ÁREA (Cm²)	FUERZA LEÍDA KN	FUERZA Kg	ESFUERZO Kg/cm²	TIPO DE FALLA	PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
		Kg/cm²	PSI	TOMA	ROTURA							N°	
9	PISO CARCAMO INTERNO	210	3000	2024-09-23	2024-09-30	7	10.10	80.119	179.7	1824.37	228.7	5	108.9%
10		210	3000	2024-09-23	2024-10-07	14	10.10	80.119	224.9	2293.60	296.2	5	136.3%
11		210	3000	2024-09-23	2024-10-21	28	10.30	83.323	262.8	26788.24	321.6	5	153.2%
12		210	3000	2024-09-23	2024-10-31	28	10.20	81.713	245.8	25064.72	306.7	3	146.1%
13	MURO INTERNO SUR	210	3000	2024-09-26	2024-10-03	7	15.40	186.365	252.0	25775.82	163.9	5	76.1%
14		210	3000	2024-09-26	2024-10-10	14	15.40	186.365	387.9	39554.94	212.4	5	101.1%
15		210	3000	2024-09-26	2024-10-24	28	15.30	183.854	413.5	42105.42	225.3	5	109.2%

RESISTENCIA ESPERADA A CADA EDAD	
3 DIAS	39% a 47%
7 DIAS	62% a 68%
14 DIAS	81% a 85%
28 DIAS	100% como mínimo

TIPOS DE FALLAS		CONVENCIONES	
1	2	3	4
5	6	7	8
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos. Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos. Agrietamiento vertical calumbar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1. Fracturas en las esquinas (Usuales en los cilindros sin refrenar). Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.		CONVERSIONES	
		KN a Kg	
		Kg a KN	
		MPa a Kg/cm²	
		Kg/cm² a MPa	

OBSERVACIONES:

ING. CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
DIRECTOR TÉCNICO

BRAYAN STIVEN VARCAS M.
COORDINADOR DE LABORATORIO

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio/Blanco Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel.: 3115571381-3175262303 gerencia@edyconst.com.co - edyconst@hotmail.com



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E - 410-2013

CÓDIGO: OPS-R-028
EMISIÓN: 10/10/2020
VERSIÓN: 2
CONSECUTIVO: EDY-CIL
Nº247

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PISTA ITFIP 2024
LOCALIZACION: ESPINAL - TOLIMA
PROYECTO: PISTA DE ATLETISMO ETAPA 3. UBICADA EN EL INSTITUTO
TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIO, MUNICIPIO DE EL
ESPINAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

No.	ELEMENTO	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD DIAS	DIAM. (Cm)	AREA (Cm2)	FUERZA LEIDA KNW	FUERZA Kg	ESFUERZO		TIPO DE FALLA	PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESION
		Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA						Kg/cm2	PSI		
16	ZAPATA NORTE	210	3000	2024-09-25	2024-10-02	7	15.10	179.079	262.2	26737.06	149.3	2133	5	71.1%
17		210	3000	2024-09-25	2024-10-09	14	15.40	186.265	297.6	30246.87	162.9	2327	5	77.0%
18		210	3000	2024-09-25	2024-10-23	28	15.20	183.854	351.2	41812.57	210.8	3083	6	101.8%
19	MURO INTERNO NORTE	210	3000	2024-10-02	2024-10-09	7	15.30	183.854	438.5	46754.16	254.3	3633	5	121.1%
20		210	3000	2024-10-02	2024-10-16	14	15.00	176.715	440.5	45836.41	259.4	3705	5	123.5%
21		210	3000	2024-10-02	2024-10-30	28	15.30	183.854	551.4	56227.36	305.8	4369	5	145.6%
22	MURO EXTERIOR SUR	210	3000	2024-10-08	2024-10-15	7	15.30	183.854	270.8	28235.97	149.5	2136	5	71.3%
23		210	3000	2024-10-08	2024-10-22	14	15.10	179.070	359.7	38061.26	191.1	2742	5	91.4%
24		210	3000	2024-10-08	2024-11-05	28	15.30	183.854	381.5	45448.75	225.6	3223	5	107.4%

(*) RESISTENCIA ESPERADA A CADA EDAD	
3 DIAS	39% a 47%
7 DIAS	62% a 68%
14 DIAS	81% a 85%
28 DIAS	100% como minimo

TIPOS DE FALLAS			CONVERSIONES		
1	2	3	1	2	3
4	5	6	4	5	6
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos. Conos bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos. Agregamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1. Fracturas en las esquinas (Usuales en los cilindros sin refrenar). Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.			kN a Kg Kg/Cm2 MPa a Kg/Cm2		
			Multiplique por 101.972 Multiplique por 14.224 Multiplique por 10.1972		

OBSERVACIONES:

ING. CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
DIRECTOR TÉCNICO

BRAYAN STEVEN VARGAS M.
COORDINADOR DE LABORATORIO

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio/Blanco Girardot-Cundinamarca
Tel: 8887452- Cel.: 3115571381-3175262303 gerencia@edyconst.com.co - edyconst@hotmail.com



VERUH INGENIERIA SAS
NIT 901.396.950-1
carrera 6 No 16 84
Tel: (038) 2391246
Espinal - Colombia
veruhsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. VERU 76

Señores INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
NIT 800.173.719-0 **Teléfono** (808) 2483502
Dirección CL 18 CR 1 BRR ARKABAL ANTIGUO **Ciudad** Espinal - Colombia
SEMINARIO CONCILIAR

Fecha y hora Factura

Generación 03/10/2024, 16:52
Expedición 03/10/2024, 16:58
Vencimiento 03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO N° 176 DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL 26,90 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA ETAPA 3 – COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP	1.00	26,617,685.00
2	IVA 19%	1.00	5,057,360.00

Total ítems: 2**Total Bruto** 31,675,045.00**Valor en Letras:**

Treinta y un millones seiscientos setenta y cinco mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Total a Pagar 31,675,045.00**Forma de pago:**

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 31,675,045.00

Observaciones:FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS SEGÚN CERTIFICACIÓN
ADJUNTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073936444 aprobado en 20240627 prefijo VERU desde el número 73 al 200 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 13ef6b47807a5cbbd047838aa9fb0eae97c7a0709b81deed37c11bc59ef11181353d4645b0df4fe09b316b9d3a71865


Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

NELSON ENRIQUE SANCHEZ CORTES identificado con cédula de ciudadanía No.93.133.491 de El Espinal Tolima, en mi condición de Representante Legal Suplente de **VERUH INGENIERIA SAS**, identificada con NIT **901.396.950-1**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la misma y yo hemos cumplido, durante los últimos seis (6) meses a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, al igual que con el pago de los aportes parafiscales de todos nuestros empleados.

En constancia, se firma en Espinal, a los 03 días del mes de octubre del 2024.



NELSON ENRIQUE SANCHEZ CORTES

CC. 93.133.491 de El Espinal Tolima

Representante Legal Suplente VERUH INGENIERIA SAS - NIT 901.396.950-1

Certificado Bancario

Viernes, 17 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VERUH INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 901396950, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	41100001451	2021/06/10	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización		4. Número de formulario		14955453033	
		 (415) 7707212489984(8020) 0000014955453033			
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 9 6 9 5 0 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué	
14. Buzón electrónico 9					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social VERUH INGENIERIA SAS	
36. Nombre comercial		37. Sign VERUH SAS		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA		39. Departamento Tolima		40. Ciudad/Municipio Espinal	
41. Dirección principal CR 6 15 64 BRR LIBERTADOR		42. Correo electrónico veruhsas@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal 46. Código 47. Fecha inicio actividad		Actividad secundaria 48. Código 49. Fecha inicio actividad		Otras actividades 50. Código	
42 9 0 2 0 1 7 0 7 1 7		7 7 3 0 2 0 2 0 0 7 1 7		7 1 1 2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico 55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Uso de aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos					
60. No. de Folios					
61. Fecha					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.8.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre					
985. Cargo					



Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
VERUH INGENIERIA SAS

Fecha expedición: 2024/06/11 - 09:15:25 **** Recibo No. S000402732 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240611-0008

CODIGO DE VERIFICACIÓN XDPWyp6v9X

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: VERUH INGENIERIA SAS
SIGLA: VERUH SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901396950-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE
DOMICILIO : ESPINAL

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 103610
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 23 DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 392,781,486.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 6 NRO. 15-64
MUNICIPIO / DOMICILIO: 73268 - ESPINAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3014798256
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : veruhsas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 6 NRO. 15-64
MUNICIPIO : 73268 - ESPINAL
CORREO ELECTRÓNICO : veruhsas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : veruhsas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN



Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
VERUH INGENIERIA SAS

Fecha expedición: 2024/06/11 - 09:15:25 **** Recibo No. S000402732 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240611-0008

CODIGO DE VERIFICACIÓN XDPWyp6v9X

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JULIO DE 2020 DE LA CONSTITUCION, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11773 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE JULIO DE 2020, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA DENOMINADA VERUH INGENIERIA SAS.

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODAS O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- EL DISEÑO, CONSTRUCCION O EJECUCION DE CUALQUIER CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, OBRAS ELECTRICAS, MECANICAS, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS 2.- LA ELABORACION O REALIZACION DE TODO TIPO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 3.- LA INTERVENTORIA, LA CONSULTORIA Y EL CONTROL DE CALIDAD EN TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, OBRAS ELECTRICAS, MECANICAS, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS 4.- LA PRESTACION DE ASESORIAS TECNICAS, ECONOMICAS O FINANCIERAS EN OBRAS, ESTUDIOS O CUALQUIER CLASE DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA. 5.- LA REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DEDICADAS A OBRAS, ESTUDIOS O ASESORIAS DE INGENIERIA O ARQUITECTURA O A LA FABRICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA OBRAS DE INGENIERIA O ARQUITECTURA. 6.- LA ADQUISICION, VENTA, COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS O MATERIALES PARA OBRAS DE INGENIERIA O ARQUITECTURA. 7.- LA PARTICIPACION COMO SOCIA O ACCIONISTAS EN TODO TIPO DE SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES. EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR, EJECUTAR Y REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES, OPERACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES Y/O FINANCIEROS RELACIONADOS CON CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS, BIEN EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TALES COMO: A.- PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS O CONCURSOS ABIERTOS O CERRADOS U OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION, BIEN SEA INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, PUDIENDO CONFORMAR CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. B.- CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS ESTATALES O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS. C.- ADQUIRIR, ENAJENAR O ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ASI COMO DARLOS EN PRENDA O HIPOTECARLOS. D.- ADQUIRIR, ENAJENAR O ADMINISTRAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES O DE INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS DE CREDITO. E.- CELEBRAR OPERACIONES DE CREDITO DE CUALQUIER CLASE, BIEN COMO DEUDORA O ACREEDORA, OTORGANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR. F.- CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, CON O SIN INTERESES. G.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR Y ACEPTAR TITULOS VALORES Y REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES O EXTRANJERAS. H.- REALIZAR, CELEBRAR, EJECUTAR, DESARROLLAR Y LLEVAR A TERMINO TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CIVIL O COMERCIAL PREVISTOS O PERMITIDOS EN LAS LEYES, REGLAMENTOS O ESTATUTOS, TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO O REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL. I.- PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS PROPIOS O DE TERCEROS DE TODO TIPO DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBRAS Y TRABAJOS A LOS QUE SE REFIERE EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y QUE LA SOCIEDAD ADELANTE O EN LOS QUE ELLA PARTICIPE. EN FIN, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL, ASI COMO TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	200.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	100.000,00	1.000,00



Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
VERUH INGENIERIA SAS

Fecha expedición: 2024/06/11 - 09:15:25 **** Recibo No. S000402732 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240611-0008

CODIGO DE VERIFICACIÓN XDPWyp6v9X

CAPITAL PAGADO	100.000.000,00	100.000,00	1.000,00
----------------	----------------	------------	----------

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 2023-02 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14533 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE AGOSTO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	VANEGAS LASSO LEIDY VANESSA	CC 1.110.515.658

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 2023-03 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14570 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	SANCHEZ CORTES NELSON ENRIQUE	CC 93.133.491

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, DESIGNADOS PARA UN TERMINO INDEFINIDO, POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA



Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
VERUH INGENIERIA SAS

Fecha expedición: 2024/06/11 - 09:15:25 **** Recibo No. S000402732 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20240611-0008

CODIGO DE VERIFICACIÓN XDPWyp6v9X

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$702,814,514

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : M7112

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- Que los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
- Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.


No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=45> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación XDPWyp6v9X

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


ADRIANA CONDE TAFUR
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHImportel
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 27424 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	111724	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	65.004.119,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	65.004.119,00	Saldo x Obligar:	65.004.119,00			
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901396950	Razón Social:	VERUH INGENIERIA SAS								
CUENTA BANCARIA											
Número:	41100031451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	79791428	Nombre:	MARIO FERNANDO DIAZ PAVA	Cargo:	RECTOR						
VIÁTICOS											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CMA-001-2024, CTO 176 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENCIÓN RIA	Fecha:	2024-07-31
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
000 ITFIP - GESTION GENERAL	C-2202-0700-10-20203K-2202050-02 ADQUIS. DE BVS - AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO ESPINAL	Nación	10	CSF		29.991.203,00	0,00	29.991.203,00	29.991.203,00		
Total:						29.991.203,00	0,00	29.991.203,00	29.991.203,00		

126

000 ITFIP - GESTION GENERAL	C-2202-0700-13-20203K-2202025-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCERIA CONSTRUÍDAS - CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" DE ESPINAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						35.012.916,00	0,00		
						35.012.916,00	0,00	35.012.916,00	35.012.916,00
					Total:				

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	ITFIP - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	29.991.203,00	29.991.203,00	NINGUNO
000	ITFIP - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	35.012.916,00	35.012.916,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

527



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"

NIT 800.173.719-0

ORDEN DE PAGO No. 33173

VERSION: 3.0

CÓDIGO: F02-MGFP02

Ciudad: ESPINAL TOLIMA Medio Pago: ABONO EN CUENTA No. Fecha Final: 13/11/2024
Fecha creación: 07/11/2024 Fecha Inicial: 03/11/2024

PAGADO A: VERU INGENIERIA SAS DETALLE
PAGO CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLETICA ETAPA 3 COMPLEJO DEPORTIVO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL ITFIP. CONTRATO 176 DE 2024. ACTA PARCIAL NO. 1 (26,90%). CERTIFICACIÓN SUPERVISOR DE FECHA 03/10/2024. COMITE OBRA 07/10/2024. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VERU-76

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
Presupuesto:	RECURSOS CORRIENTES REC: 10
Vigencia:	2024 Valor
02202-0700-10-20203K-2202050\$	31,675,045.00
02	
Concepto:	ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Rubro:	\$
Concepto:	
Rubro:	\$
Concepto:	
Rubro:	\$
Concepto:	
Total Imputación Presupuestal:	\$ 31,675,045.00

Cuentas: INVERSION NACION SIIF

Registro Presupuestal No:	111724
Cuenta por Pagar No:	492121
Obligación No:	492021
Orden de Pago No:	474008024
Descuentos Varios	\$
Pro-Universidades	0.5% \$ 26,617,685 \$ 133,080
Contribu Fonsecon	% \$
Rte. Ica	% \$
Rte. Ica Servicio	% \$ 26,617,685 \$ 159,706
Rte. Fte	% \$
Rte. Fte Servicio	% \$ 26,617,685 \$ 1,597,061
Rte. IVA	15 % \$ 5,057,360
Neto a Pagar:	29,026,586.00
TOTAL:	\$ 31,675,045.00

SON: TREINTA Y UNO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

Firma Ordenador del Gasto: Firma Contabilidad: Fecha: 07-11-2024
Firma Presupuesto: Nelson D. Cardoso B. Firma Tesoreria: Nelson A. Cardoso B. Fecha: 07/11/2024
