


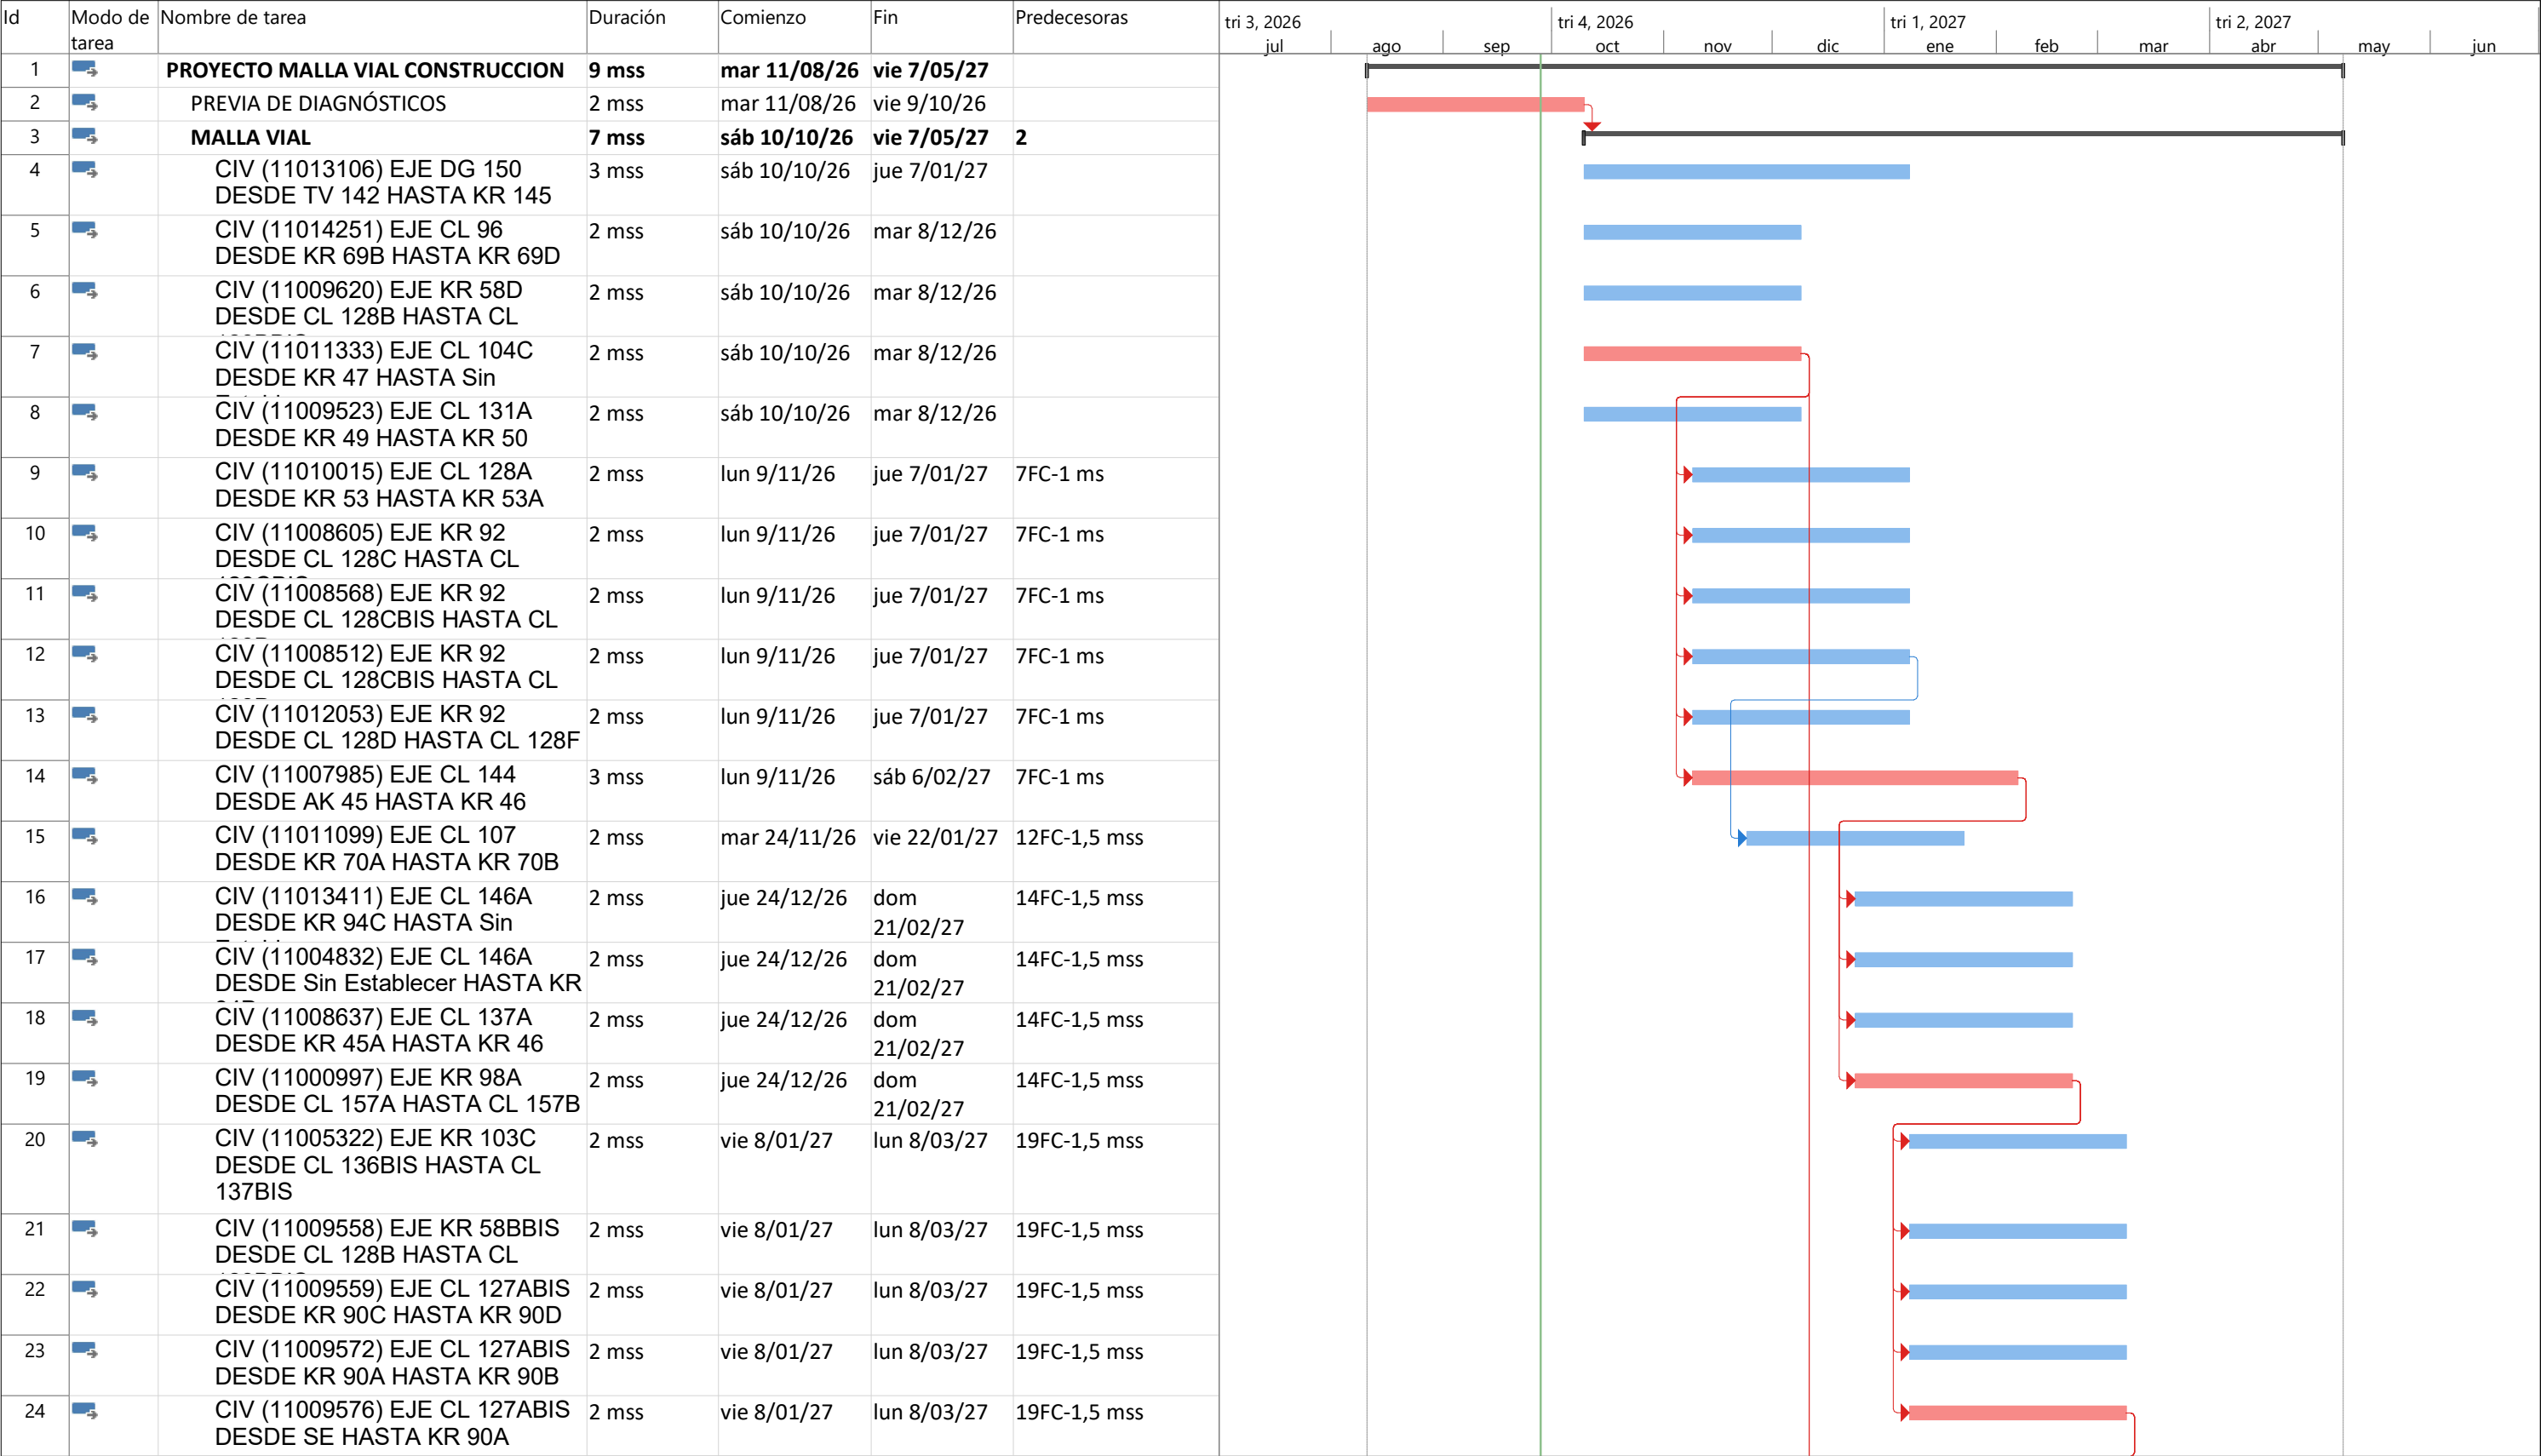

Proyecto: CRONOGRAMA
Fecha: lun 28/09/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 3, 2026			tri 4, 2026			tri 1, 2027			tri 2, 2027			
							jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
45		PK_ID (55259) DESDE KR 121C HASTA KR 122 BARRIO NUEVA TIBABUYES	2 mss	vie 8/01/27	lun 8/03/27	42FC-1 ms													
46		PK_ID (466904) DESDE CL 167A HASTA CL 167A BARRIO	2 mss	vie 8/01/27	lun 8/03/27	42FC-1 ms													
47		PK_ID (48591) DESDE KR 54 C HASTA KR 55A BARRIO	2 mss	vie 8/01/27	lun 8/03/27	42FC-1 ms													
48		PK_ID (48590) DESDE KR 54 C HASTA KR 55A BARRIO	2 mss	dom 7/02/27	mié 7/04/27	47FC-1 ms													
49		PK_ID (48561) DESDE KR 54 C HASTA KR 55A BARRIO	2 mss	dom 7/02/27	mié 7/04/27	47FC-1 ms													
50		PK_ID (48560) DESDE KR 54 C HASTA KR 55A BARRIO	2 mss	dom 7/02/27	mié 7/04/27	47FC-1 ms													
51		PK_ID (48657) DESDE KR 54B HASTA KR 54C BARRIO	2 mss	dom 7/02/27	mié 7/04/27	47FC-1 ms													
52		PK_ID (48655) DESDE KR 54A HASTA KR 54B BARRIO	2 mss	dom 7/02/27	mié 7/04/27	47FC-1 ms													
53		ENTREGA Y RECIBO FINAL	1 ms	jue 8/04/27	vie 7/05/27	36FF													

Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: lun 28/09/26	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			
