



PRIMER INFORME INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2570-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA”.

WWW.MEDIMARKETING.COM.CO



1ER INFORME DE INTERVENTORÍA

01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021

OBJETO

**REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE,
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN
ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL CAUCA”.**

Implementación de un programa
para la **participación y articulación**
del **Ecosistema Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Cauca**

CONTRATO 2570-2020

ENERO DE 2021



Tabla de contenido

PRIMER INFORME INTERVENTORÍA	1
1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA	6
3.1 OBJETIVO GENERAL	6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3.3 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.	6
3.4 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION.	10
4. DESARROLLO	12
4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	12
4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS	12
4.1.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN LÍNEA DEL TIEMPO	14
4.1.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	16
4.1.4 METAS Y ENTREGABLES DE PROYECTO	18
4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA	19
4.1.5 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS.	20
4.1.6 CONSIDERACIONES JURÍDICAS	20
4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA	21
4.2.5 TALENTO HUMANO	21
4.2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS	23
4.2.7 GASTOS DE TRANSPORTE	24
5. CONCLUSIONES	24
6. RECOMENDACIONES	24
7. ANEXOS	26
7.1 Acta de inicio digitalizada 10 de diciembre 2020	26
7.2 Acta de reunión del día 07 de diciembre a las 03:20 p.m. casa de la moneda y con soporte fotográfico	27

7.3	Envío acta de inicio	28
7.4	Reunión ejecutora, interventoría y supervisión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. sede vicerrectoría de investigaciones Unicauca- Popayán – cauca	29
7.5	Acta de reunión 15/12/2020.....	30
7.6	Acta de inicio firman las partes.	31
7.7	Solicitud de información ejecutor Unicauca 10/12/2020.....	32
7.8	Cronograma interventoría 23/12/2020	33
7.9	Convocatoria digitalizada a reunión sobre socialización de plan de trabajo, radicado cauecosis-003-2020 con soporte fotográfico.....	34
7.10	Remisión plan de trabajo.....	35
7.11	Solicitudes varias	36
7.12	RTA solicitud de aval de hojas de vida ejecutor Unicauca.	37
7.13	Invitación reunión comité 15/01/21.	38
7.14	Acta de reunión 15/01/202	39
7.15	Remisión corrección H.V. Omaria Calvo Giraldo ejecutor Unicauca 15/01/2021.	40
7.16	SOPORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.....	41
7.17	SOPORTES PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	47
7.18	SOPORTES PROFESIONAL ASPECTOS TÉCNICOS	54
7.19	SOPORTES TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	58
7.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	64



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento a la fecha, de la ejecución del contrato **No. 2570-2020**, suscrito entre el departamento del cauca y la Universidad del Cauca en el concurso de méritos abierto **No. DC-SDEC-CM-007-2020**.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA
BPIN	CÓDIGO BPIN: 2018000100041 (DENOMINADO ECOSISTEMA DE CTEI DEL CAUCA)
ACUERDO DE APROBACIÓN	SESIÓN DEL OCAD No. 66 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE EJECUCIÓN	40 MESES
EJECUTOR	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
EJECUCIÓN	15/12/2020
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	TOTAL: \$ 6.951.046.254,00
CONTRATO INTERVENTORÍA	2570 DE 2020
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	\$ 600,000,000
PLAZO	40 MESES
ACTA DE INICIO	10/12/2020

3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA

3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el Ecosistema regional de CTel para facilitar los procesos de uso del conocimiento en los sectores sociales y productivos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **OE1:** Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento
- **OE2:** Fortalecer la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.
- **OE3:** Fomentar la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.

3.3 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.

Tabla 1. Tabla de presupuesto asignado según el objetivo específico de cada proyecto.

CADENA VALOR DE LA ALTERNATIVA	\$ 6.951.046.254,00
---------------------------------------	----------------------------

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	\$ 2.439.335.883,00
FORTALECER REDES INTERINSTITUCIONALES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO-SOCIEDAD PARA EL USO DEL CONOCIMIENTO	
PRODUCTO	ACTIVIDAD
1.1 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	1.1.1 LEVANTAR LA LÍNEA BASE DEL NÚMERO Y ROLES DE LAS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA REGIONAL DE CTel Y EL ESTADO DEL RELACIONAMIENTO ENTRE ELLOS. COSTO: \$ 157.043.254 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS	1.1.2 CARACTERIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS REDES ESTRATÉGICAS REGIONALES UEES QUE SE VAN A INTERVENIR. COSTO \$ 85.527.961 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI



		CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CAPITAL HUMANO.
CANTIDAD:	1	1.1.3 IDENTIFICAR OFERTA TECNOLÓGICA PERTINENTE CON LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS CARACTERIZADAS EN LAS REDES ESTRATEGICAS REGIONALES A INTERVENIR. COSTO: \$ 65.281.374 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		1.1.4 GESTIÓN DE LAS REDES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO COSTO: \$ 1.128.709.182 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
COSTO:	\$ 2.439.335.883,00	1.1.5 ESTABLECER ESTRATEGIAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE USO DEL CONOCIMIENTO EN LAS EXPERIENCIAS DEFINIDAS DE CADA RED COSTO: \$ 562.505.123 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		1.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: \$ 240.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
		1.1.7 INTERVENTORIA COSTO: \$ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO



2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2		\$	2.236.446.559,00
FORTALECER LA GOBERNANZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
PRODUCTO		ACTIVIDAD	
2.1 DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN		2.1.1 ANALIZAR EL ESTADO DE LA POLÍTICA DE CTel EN EL CAUCA FRENTE A LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES. COSTO: \$ 158.413.500 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS		2.1.2 DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS ACTORES INSTITUCIONALES UEES EN LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA CTel COSTO \$ 801.159.322 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
CANTIDAD: 1		2.1.3 CREAR UN TANQUE DE PENSAMIENTO (THINK TANK) QUE REALICE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PUBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CTel. COSTO: \$ 203.956.902 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
		2.1.4 DEFINIR INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS QUE SOPORTEN LA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA. COSTO: \$ 246.584.544 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
COSTO: \$ 2.236.446.559,00		2.1.5 DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA LA GOBERNANZA DE LA CTel COSTO: \$ 388.063.302 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO	

	CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	1.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: \$ 238.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
	1.1.7 INTERVENTORIA COSTO: \$ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3		\$	2.275.263.813,00
FOMENTAR LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ENTRE LOS ACTORES UEES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
PRODUCTO		ACTIVIDAD	
3.1 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS		3.1.1 DISEÑAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUYENTES PARA GENERAR EN LOS CIUDADANOS LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO. COSTO: \$ 423.006.207 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS		3.1.2 DEFINIR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL PARA “CAUCA REGIÓN DE CONOCIMIENTO” COSTO \$ 461.251.190 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
CANTIDAD: 1		3.1.3 GENERAR UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN CTeI. COSTO: \$ 403.295.684 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
		3.1.4 SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	

COSTO: \$ 2.275.263.813,00	COSTO: \$ 258.901.482
	ETAPA: INVERSIÓN
	RUTA CRÍTICA: NO
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	3.1.5 DESPLEGAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL PROYECTO.
	COSTO: \$ 290.540.282
	ETAPA: INVERSIÓN
	RUTA CRÍTICA: NO
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	3.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO
	COSTO: \$ 238.268.988
	ETAPA: INVERSIÓN
	RUTA CRÍTICA: NO
	3.1.7 INTERVENTORIA
	COSTO: \$ 200.000.000
	ETAPA: INVERSIÓN
	RUTA CRÍTICA: NO

3.4 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION.

TIPO DE POBLACIÓN	PERSONAS
NÚMERO	3330
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Para definir la población objetivo se estableció una matriz de inclusión y exclusión en la que se tomaron en cuenta los siguientes criterios: a) Nivel de aporte de las redes al desarrollo económico y social del Cauca, b) Relación con los Focos estratégicos de CTel priorizados en el Cauca, c) Nivel de madurez de la red: d) Existencia de infraestructura (centros o parques tecnológicos, centros de investigación, incubadoras, EBT, etc) para el desarrollo tecnológico.

TABLA 1. FICHA DE VALORACION Y SELECCIÓN DEL ECOSISTEMA.

Núcleos o redes de Innovación	¿Cuál es el nivel de aporte de los NI al desarrollo económico y social del Cauca?					¿Tiene relación con los Focos estratégicos de CTel priorizados en el Cauca ?		¿Cual es el nivel de madurez del Nucleo?		¿Actualmente cuenta con infraestructura (centros o parques tecnológicos, centros de investigación , FBT etc)		Puntaje total
	Aporte Económico	Calificación	Aporte social	Calificación	Promedio calificación	Respuesta	Calificación	Respuesta	Calificación	Respuesta	Calificación	
Industrias culturales	0,3	0	25	0	0	Si (Foco Industria y sociocultural)	1	Medio-bajo	1	No	0	2
Biopolimeros	2,8	2	135	1	1,5	Si (Foco Biotecnología)	1	Medio-Alto	2	No	0	4,5
Negocios inclusivos	4,3	3	5	0	1,5	Si (Foco Industria)	1	Bajo	0	No	0	2,5
Turismo	5,5	3	45	0	1,5	Si (Foco Turismo)	1	Alto	3	No	0	5,5
Café	3,6	3	2.820	3	3	Si (Foco Industria)	1	Alto	3	Si (Parque Tecnológico delCafé-	1	8
TIC	2,4	2	465	3	2,5	Si (Foco TIC)	1	Alto	3	Si (Corporación de empresas de base tecnológica- Cluster - CREATIC)	1	7,5
Salud	4,6	3	30	0	1,5	Si (Foco Salud)	1	Medio-bajo	1	No	0	3,5
Agrocadena piscícola	0,1	0	1.515	3	1,5	Si (Foco Industria)	1	Medio-Alto	2	No	0	4,5
Agrocadena serícola	2,8	2	1.005	3	2,5	Si (Foco Industria)	1	Medio-bajo	1	NO	0	4,5
Agua	0,2	0	15	0	0	Si (Foco Territorio y ambiente)	1	Medio-bajo	1	No	0	2
Emprendimiento*			5	0	0	Si (Foco Industria)	1	Bajo	0	No	0	1

De acuerdo al puntaje total obtenido por cada red, se seleccionaron las tres con puntajes superiores a 5 (este número corresponde a la mitad del puntaje mayor posible + 1): Turismo, Café y TIC. Por tanto, el proyecto se enfoca en fortalecer estas tres redes a través del uso de conocimiento disponible en la región, la generación de precondiciones que faciliten su participación en la gobernanza de la CTel del territorio en espacios como el CUEE (Comité Universidad-Empresa-Estado) y su inclusión y participación activa en actividades de fomento de cultura de la CTel. Teniendo en cuenta que el ecosistema de CTel se define como una red de redes, es pertinente fortalecer aquellas redes que por sus características pueden jalonar un mayor número de actores y por ende generar un mayor impacto. Además, se convierten en un ejemplo a replicar en las demás redes, potenciando de esta manera el uso de conocimiento en todo el Ecosistema de CTel del Cauca.

Este proyecto llegará a 3.330 personas que hacen parte de los grupos u organizaciones productivas que participan en las redes de innovación seleccionadas. Este total corresponden a la suma de la población estimada en las tres redes priorizadas (ver tabla 1) y es el 10.4% de la población afectada.

4. DESARROLLO

El informe se realiza con motivo a todos los compromisos adquiridos con la administración vigente (2020-2013) del departamento del Cauca en representación del señor gobernador doctor **ELÍAS LARRAHONDO CARABALI**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 expedida en Buenos Aires (Cauca), quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** y el Sr. **JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ**, identificado con C.C. 7.166.728 de Tunja, quien obra en calidad de representante legal de **MEDIMARKETING LTDA** con Nit. 830.112.020-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Tabla 2. Tabla en detalle de los compromisos financieros adquiridos por entidad.

CONTRAPARTIDA	RUBRO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$247.638.600,00
CREPIC	\$40.229.973,00
AGROINNOVA	\$90.814.496,00
TECNICAFE	\$17.330.401,00
CLUSTER CREATIC	\$6.000.000,00
ACOPI - CAUCA	\$7.680.000,00
CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA	\$8.370.000,00



Medimarketing

UNICOMFACAUCA	\$11.532.460,00
I,U, COLMAYORCAUCA	\$7.500.000,00
FUP	\$12.974.204,00
AUTONOMA DEL CAUCA	\$9.121.476,00
UCC - SEDE CAUCA	\$19.289.400,00
UAN	\$93.825.285,00
UNAD	\$31.338.360,00
INNOVAGEN	\$9.644.000,00
CORSEDA	\$15.431.520,00
CORPOPALO	\$46.294.560,00
TOTAL DE CONTRAPARTIDA	\$675.014.735,00

Tabla 3. Tabla plan de pagos y recurso económico de SGR

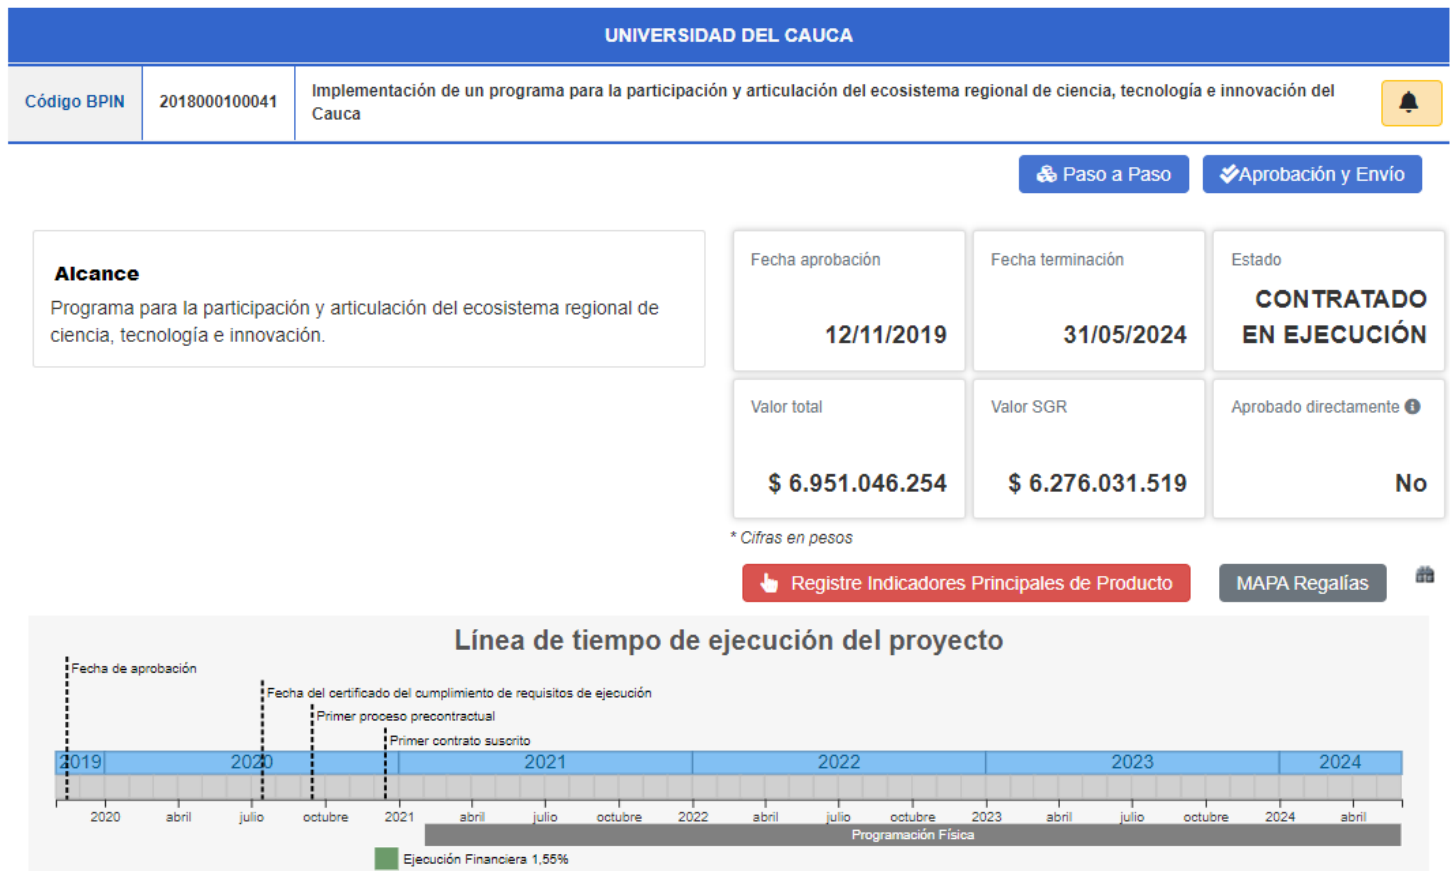
GIRO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
PERIODO DE COBERTURA		VALOR
Desde	Hasta	Giro Sistema General de Regalías
Mes 1	Mes 12	\$ 1.711.411.553,80
Mes 13	Mes 24	\$ 2.394.264.372,09
Mes 25	Mes 36	\$ 1.913.416.749,39
Mes 37	Mes 40	\$ 256.938.843,72
TOTAL		\$ 6.276.031.519,00

4.1.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN LÍNEA DEL TIEMPO

4.1.2.1 EJECUCION FINANCIERA DEL EJECUTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

1,56%



4.1.2.2 EJECUCION FISICA DEL EJECUTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

0%



El futuro es de todos

SGR MAPA regalias

BID

INICIO PROYECTOS RECURSOS PRODUCCIÓN FISCALIZACIÓN ENLACES GESPROY

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA

OCAD MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION ESTADO: APROBADO

Valor total del Proyecto: \$6.951.046.254 Recursos SGR: \$6.276.031.519

Comparte Tweet Correo Imprimir

Dónde estoy Inicio / Proyectos / IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓ...

Información general del proyecto

Sector CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fecha de aprobación 2019

Fecha de Inicio 2020

Fecha de Finalización 2023

BPIN 2018000100041

Avance del proyecto

0,0%

Ver Auditoria Visible ...

Ejecutor

• UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FICHA RESUMEN ENTIDAD ...

Entidades beneficiarias

Contratista

• PRINTTINK / ROA ROA PEDRO

Interventor

• MARIO FERNANDO ORDOÑEZ 10544879 Supervisor

• MEDIMARKETING LTDA

4.1.2.3 EJECUCION FISICA DEL INTERVENTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1 DE 40 MESES

2,5%

4.1.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD SEGÚN EL TIEMPO

	MESES																																							
ACT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0																																								
1																																								
1.1																																								
1.2																																								
1.3																																								
1.4																																								
1.5																																								
2																																								
2.1																																								
2.2																																								
2.3																																								
2.4																																								
2.5																																								
3																																								
3.1																																								
3.2																																								
3.3																																								
3.4																																								
3.5																																								
4																																								
5																																								

ACT	TABLA DE CORRESPONDENCIA
0	Preparación para inicio del proyecto
1	Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento
1.1	Levantar la línea base del Ecosistema Regional de CTel y el estado del relacionamiento entre ellos
1.2	Caracterizar las demandas sociales y productivas de las líneas regionales UEES que se van a intervenir:
1.3	Identificar oferta tecnológica pertinente con las demandas sociales y productivas caracterizadas en las líneas estratégicas a intervenir
1.4	Gestión de las Redes de confianza Universidad-Empresa-Estado
1.5	Establecer estrategias, procesos y herramientas para facilitar el proceso de uso del conocimiento en los 3 proyectos definidos en cada red
2	Promover la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.
2.1	Analizar el estado de la política de CTel en el Cauca frente a las tendencias nacionales y mundiales
2.2	Dinamizar la participación de nuevos actores institucionales UEES en las instancias de gobernanza
2.3	Crear un Tanque de pensamiento (Think Tank) que realice estudios y recomendaciones para la política pública de mediano y largo plazo en CTel
2.4	Definir instrumentos participativos que soporten el modelo de gobernanza
2.5	Definir una estrategia para la gobernanza de la CTel
3	Fomentar la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.
3.1	Diseñar estrategias de comunicación incluyentes para generar en los ciudadanos la valoración de conocimiento
3.2	Definir y desplegar la estrategia de marketing territorial para "Cauca región de Conocimiento"
3.3	Generar intercambios de conocimientos en CTel
3.4	Sistematizar la experiencia del proyecto y evaluar sus resultados
3.5	Desplegar la comunicación corporativa del proyecto
4	Supervisión del proyecto
5	Cierre del proyecto

El cronograma se toma del documento técnico del proyecto "IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" con el cual se dará seguimiento y verificación a las actividades realizadas.

4.1.4 METAS Y ENTREGABLES DE PROYECTO

ACTIVIDADES	VALOR POR ACTIVIDAD	META	ENTREGABLE
ACTIVIDAD 1. LEVANTAR LA LÍNEA BASE DEL NÚMERO Y ROLES DE LAS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA REGIONAL DE CTel Y EL ESTADO DEL RELACIONAMIENTO ENTRE ELLOS	\$157.043.254,00	1 UN Documento que contenga un conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento en el departamento del Cauca	Documentos metodológicos
ACTIVIDAD 2. CARACTERIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS REDES ESTRATÉGICAS REGIONALES UEES QUE SE VAN A INTERVENIR	\$ 85.527.961,00		
ACTIVIDAD 3. IDENTIFICAR OFERTA TECNOLÓGICA PERTINENTE CON LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS CARACTERIZADAS EN LAS REDES ESTRATEGICAS REGIONALES A INTERVENIR	\$ 65.281.374,00		
ACTIVIDAD 4. GESTIÓN DE LAS REDES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO	\$1.128.709.182,00		
ACTIVIDAD 5. ESTABLECER ESTRATEGIAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE USO DEL CONOCIMIENTO EN LAS EXPERIENCIAS DEFINIDAS DE CADA RED	\$ 562.505.123,00		
ACTIVIDAD 6. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	\$ 240.268.988,00		
ACTIVIDAD 7. INTERVENTORIA	\$ 200.000.000,00		
ACTIVIDAD 8. ANALIZAR EL ESTADO DE LA POLÍTICA DE CTel EN EL CAUCA FRENTE A LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES	\$ 158.413.500,00	1 UN Documento que contenga una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca	Documento de planeación
ACTIVIDAD 9. DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS ACTORES INSTITUCIONALES UEES EN LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA CTel	\$ 801.159.322,00		
ACTIVIDAD 10. CREAR UN TANQUE DE PENSAMIENTO (THINK TANK) QUE REALICE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PUBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CTel	\$ 203.956.902,00		
ACTIVIDAD 11. DEFINIR INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS QUE SOPORTEN LA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA	\$ 246.584.544,00		
ACTIVIDAD 12. DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA LA GOBERNANZA DE LA CTel	\$ 388.063.302,00		
ACTIVIDAD 13. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	\$ 238.268.988,00		

ACTIVIDAD 14. INTERVENTORIA	\$ 200.000.000,00		
ACTIVIDAD 15. DISEÑAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUYENTES PARA GENERAR EN LOS CIUDADANOS LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 423.006.207,00	1 UN Documento que contenga una Estrategia para fomentar la valoración del conocimiento	Documento de lineamiento técnico
ACTIVIDAD 16. DEFINIR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL PARA "CAUCA REGIÓN DE CONOCIMIENTO	\$ 461.251.190,00		
ACTIVIDAD 17. GENERAR UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN CTel	\$ 403.295.684,00		
ACTIVIDAD 18. SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	\$ 258.901.482,00		
ACTIVIDAD 19. DESPLEGAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL PROYECTO	\$ 290.540.282,00		
ACTIVIDAD 20. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	\$ 238.268.988,00		
ACTIVIDAD 21. INTERVENTORIA	\$ 200.000.000,00		

4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA

Tabla 4. Tabla rubro y porcentaje de avance.

RUBROS	TOTAL	EJECUTADO
01. Talento humano	\$ 4.646.009.750,00	0%
02. Equipos y software	\$ 36.686.451,00	0%
03. Capacitación y participación en eventos	\$ 352.729.500,00	0%
04. Servicios tecnológicos y pruebas	\$ -	-
05. Materiales, insumos y documentación	\$ 31.567.094,00	0%
06. Protección de conocimiento y divulgación	\$ 130.259.940,00	0%
07. Gastos de viaje	\$ 432.191.556,00	0%
08. Infraestructura	\$ -	-
09. Administrativos	\$ 714.806.963,00	0%
10. Interventoría	\$ 600.000.000,00	0%
11. Otros	\$ 6.795.000,00	0%
TOTAL	\$ 6.951.046.254,00	0%

4.1.5 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS.

- Acta de inicio digitalizada 10 de diciembre 2020
- Acta de reunión del día 07 de diciembre a las 03:20 p.m. casa de la moneda y con soporte fotográfico.
- Envío acta de inicio
- Reunión ejecutora, interventoría y supervisión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. sede vicerrectoría de investigaciones Unicauca- Popayán – cauca
- Acta de reunión 15/12/2020
- Acta de inicio firman las partes.
- Solicitud de información ejecutor Unicauca 10/12/2020
- Cronograma interventoría 23/12/2020
- Convocatoria digitalizada a reunión sobre socialización de plan de trabajo, radicado cauecosis-003-2020 con soporte fotográfico.

Se resalta que, a la fecha de corte del presente informe, el ejecutor UNIVERSIDAD DEL CAUCA presenta EJECUCIÓN FINANCIERA correspondiente al **1,56%** del proyecto; sin avances en la EJECUCIÓN FÍSICA del mismo. Se ha realizado seguimiento a las plataformas de GESPROY Y SUIFP. SIRECI.

4.1.6 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

A la fecha se tiene soportado el acta de inicio con fecha de 10 de diciembre, contrataciones no se tiene al momento ya que el proyecto apenas está en su etapa de inicio y preparación según lo menciona el cronograma.



4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA

4.2.5 TALENTO HUMANO

Tabla 5. Ejecución administrativa de la Interventoría.

ITEM	CARGO	PROYECTADO	DEDICACIÓN	NÚMERO DE MESES	EJECUTADO
TALENTO HUMANO	Director Interventoría	\$162.972.160	16HORAS/ SEMANA	40	2,5%
	Profesional Administrativo	\$125.875.200	20HORAS/ SEMANA	40	2,5%
	Profesional Aspectos Técnico	\$125.875.200	20HORAS/ SEMANA	40	2,5%
	Técnico Administrativo-Financiero	\$82.809.600	40HORAS/ SEMANA	40	2,5%
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 8.199.871	-	-	2%
EQUIPOS DE IMPRESIÓN		\$ 4.564.058	-	-	4%
PAPELERIA E INSUMOS		\$ 883.430	-	-	3%
DOTACIÓN MOBILIARIO		\$ 59.152.640	-	40	3%
GASTOS DE VIAJE		\$ 29.667.840	-	-	0%
TOTAL		\$ 600.000.000	-	40	2,5%



Tabla 6. Relación de los perfiles de acuerdo a la Interventoría.

1. Talento Humano	Mano de Obra Calificada	NOMBRE
		JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ
		JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ
		DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR
		ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

CARGO	CONTRATO	VALOR	COMPROBANTE EGRESO	No. PLANILLA PAGO APORTES 12/20	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Director Interventoría	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA009/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 4.074.304,00 m. cte. Mensual	020	9414921002	2,5 %
Profesional Administrativo	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA006/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 3.146.800,00 m. cte. Mensual	019	19475998	2,5 %
Profesional Aspectos Técnico	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA003/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 3.146.800,00 m. cte. Mensual	018	9417350525	2,5 %

Técnico Administrativo-Financiero	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA001/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 2.070.240,00 m. cte. Mensual	017	8610837457	2,5 %
-----------------------------------	--	---------------------------------	-----	------------	-------

4.2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 7. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la papelería e impresión.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Guía clasificadora 1al 31	POS1 1319	\$ 12.500	\$ 25.000,00
1	Recargas x 500g MPC 2503	0111	\$168.000	\$ 168.000,00
				\$ 193.000,00

Tabla 8. Ejecución financiera de la Interventoría en relación con dispositivos tecnológicos.

TECNOLOGIA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
2	MANTENIMIENTO 2 COMPUTADOS	1948 Y 1949	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00
1	MANTENIMIENTO PC MARCA HP	1684	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
1	MOUSE MJR 013	2637	\$ 34.000,00	\$ 34.000,00
TOTAL				\$ 184.000,00

Tabla 9. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la dotación mobiliaria.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arriendo oficina Calle 3 No 5-69	019	\$ 1.478.816	\$ 1.478.816

4.2.7 GASTOS DE TRANSPORTE

Tabla 9. Ejecución financiera de la Interventoría en relación con gastos de transporte.

GASTOS DE TRANSPORTE				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
-	-	-	-	-
				\$ 0

5 CONCLUSIONES


- Se acordó en los consejos técnicos realizados entre las partes correspondientes el manejo concertado de los anticipos para evitar conflicto de intereses.
- Se trabajará sobre el ajuste informado del tiempo paralelo según el cronograma de actividades.
- Se validará todos los mecanismos para realizar el ajuste de tiempo en la plataforma SUIFP con el fin de evitar alertas.
- Se concluye que a la fecha el proyecto aún no inicia su etapa de contratación de personal.
- Se solicita hacer esta contratación con la mayor premura posible, acorde a la apertura del sistema del SGR, para poder expedir CDP y RPs.
- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico/científico.

6 RECOMENDACIONES

- Falta que el operador allegue el plan de acción acorde al cronograma de actividades planeado a ejecutar. (Tiempo, Modo, Lugar con exactitud de las actividades a ejecutar)
- Se debe empezar a caracterizar ya el Ecosistemas de CTel del Cauca.

- Solicitar a UNICAUCA el detalle del cronograma de ejecución de las actividades técnicas y administrativas, sin modificar los términos presupuestales que fueron aprobados inicialmente para el proyecto.
- Se solicitarán las hojas de vida del personal a contratar por parte de UNICAUCA una vez surtido el proceso de convocatoria y previa selección final. Todo acorde a los perfiles indicados y requeridos para el buen desarrollo del proyecto.
- Se recomienda, previo a la compra de insumos, materiales y aprobación de gastos de viaje en los que se incurra en el proyecto (UNICAUCA y ALIADOS) deben ser reportados previo a Interventoría.
- Toda solicitud que se deba hacer ante MinCiencias, OCAD, DNP y SGR se debe emitir por parte del representante legal de Unicauca. (Rector).
- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico.

Popayán, 27 de enero de 2020





JOSE AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com



7 ANEXOS

7.1 Acta de inicio digitalizada 10 de diciembre 2020

 Gobernación del Cauca		ACTA DE INICIO		Código: F-AB-06
				Versión: 1.0
				Página: 1 de 1
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
No. DE CONTRATO	No. 2570-2020			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$600.000.000), INCLUYENDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.			
PLAZO DEL CONTRATO	CUARENTA (40) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.			
CONTRATISTA	MEDIMARKETING LTDA			
NIT	830112020-1			
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ			
No. DE IDENTIFICACIÓN	7.166.728	EXPEDIDA EN:	Tunja	
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO			
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
OBJETO DEL CONTRATO				
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".				
En Popayán, el diez (10) del mes de Diciembre de 2020, se reunieron: El (a) señor (a) MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO, Profesional Universitario de la secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Cauca, en su calidad de supervisor (a) del contrato 2570-2020 y el (a) señor (a) JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ en su calidad de representante legal de MEDIMARKETING LTDA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.				
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:				
FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA CONTRATISTA		
				

Revisó, Diana Patricia Guerrero M. contratista Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Proyecto: Subvención - contratista Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Carrera 5 con Calle 224 - Edificio de Obras Públicas, Segundo piso-Popayán-Cauca
Teléfono: (057+ 3) 8203843
secomp@cauca.gov.co
www.cauca.gov.co


para avanzar



Medimarketing

7.2 Acta de reunión del día 07 de diciembre a las 03:20 p.m. casa de la moneda y con soporte fotográfico.

ACTA DE INICIO		Código: F-A	Versión: 1.0	Página: 1 de 1
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
Nº. DE CONTRATO	Nº. 2570-2020			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$600.000.000), INCLUYENDO IVA, DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.			
PLAZO DEL CONTRATO	CUARENTA (40) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIAMENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO.			
CONTRATISTA	MEDIMARKETING LTDA			
NIT	830112020-1			
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ			
Nº. DE IDENTIFICACIÓN	7.165.728	EXPEDIDA EN	Tunja	
INTERVENIR y/o SUPERVISAR	MARIO FERNANDO ORDÓÑEZ DORADO			
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
OBJETO DEL CONTRATO				
REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".				
En Popayán, el día 10 del mes de Diciembre de 2020, se reunieron: El (a) señor (a) MARIO FERNANDO ORDÓÑEZ DORADO, Profesional Universitario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Cauca, en su calidad de supervisor (a) del contrato 2570-2020 y el (a) señor (a) JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ en su calidad de representante legal de MEDIMARKETING LTDA, con el fin de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se inician las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.				
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:				
FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA CONTRATISTA		
Número de contrato:		Innovación - Quincea		Fecha
contratista		Medimarketing		Hora de inicio y finalización
Lugar:		Casa de la Moneda.		
Nombre y apellidos	entidad	Correo electrónico	Número de contacto	
Juan Carlos Barbo	Interventoría	interventoria@cauca.gov.co	313163330	
Mario F. Ordóñez D.	Sec. D.E. y C.	mario.ordonez@cauca.gov.co	981.00	
JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ	Medimarketing	medimarketing@cauca.gov.co	271401286	

7.3 Envío acta de inicio



52 de muchas

acta de inicio proceso 07-2020 innovación Recibidos x



Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad <sccompetitividad@cauca.gov.co>
para mí ▾
cordel saudo

 Jue, 10 dic 2020 12:37

por medio del presente me permito adjuntar acta de inicio del proceso 07-2020 para su revisión y firma, por favor una vez tenga el documento listo enviarlo por este medio


gracias

...

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Cauca
sccompetitividad@cauca.gov.co



7.4 Reunión ejecutora, interventoría y supervisión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. sede vicerrectoría de investigaciones Unicauca- Popayán – cauca




 <p>Popayán, 10 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 002-2020</p> <p>Ing: FRANCISCO FUENTES CONCHA. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co , scompetitividad@cauca.gov.co ING. HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO Vicerrector de Investigaciones Unicauca Email: villada@unicauca.edu.co Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ Supervisor Cto 2398 de 2020 Email: mordonez@cauca.gov.co Mario.ordonez@cauca.gov.co Gobernación del Cauca. E. S. D.</p> <p>ASUNTO. Convocatoria a la reunión de firma de acta de inicio en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° . 2570-2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".</p> <p>Respetados Srs.</p> <p>De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito invitarlos a la reunión que se llevara el día 15 de Diciembre de 2020 a las 2: 45 PM en las instalaciones de la VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES de la UNICAUCA, en la dirección carrera 2 N° 1A -25 2 piso Museo de Historia Natural, con el fin de darle firma al acta de inicio con el operador en marco de la ejecución del precitado proyecto con la UNIVERSIDAD DEL CAUCA esto, acorde a las obligaciones adquiridas dentro del contrato Interventor.</p> <p>Agradezco su presencia y atención,</p>  <p>JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ Director de Interventoría medimarketingcauca@gmail.com C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ____ 001 __ FOLIOS). Archivo Ejecución Cto.</p>	<p>Se procedió a realizar una reunión de manera conjunta con el Contratante, Apoyo a la Supervisión, el Ejecutor Unicauca; y se extendió la invitación al nuevo integrante del componente de CTEI de La secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, el Ing Adolfo Plazas, hace la presentación del proyecto aprobado por el Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se aprobó e n la Sesión del OCAD No 66 del 5 de noviembre de 2019 el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" protocolizado con el Acuerdo No 83 del 12 de noviembre de 2019. Así mismo, designó como ejecutora y responsable técnico del proyecto a la Universidad del Cauca, y al profesor Adolfo León Plazas Tenorio como su Director.</p>
---	--



30 de 66

7.6 Acta de inicio firman las partes.

  		  	
ACTA DE INICIO			
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA		
NIT:			
REPRESENTANTE	HECTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO-VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES		
Nº DE IDENTIFICACION	7.551.810	EXPEDIDA EN:	Armenia
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$5.676.031.519)		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso será de Cuarenta Meses (40) meses de conformidad con lo establecido en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA", los cuales se contarán a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
INTERVENTOR	MEDIMARKETING LTDA		
NIT:	830112020-1		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AUGUSTO SOSSA		
Nº DE IDENTIFICACION	7.166.728	EXPEDIDA EN:	Tunja
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	MARIO FERNANDO ORDÓÑEZ DORADO		
NIVEL PROFESIONAL:	PROFESIONAL	DESPACHO	SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
OBJETO DEL CONTRATO			
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".			
En Popayán, a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2.020, se reunieron: El señor JOSE AUGUSTO SOSSA Interventor, El Dr. MARIO FERNANDO ORDÓÑEZ DORADO supervisor por parte del Departamento- Secretaria De Desarrollo y competitividad y el Ing. HECTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO por parte de UNICAUCA Como ejecutor, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del ejecutor e interventor se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato 2570 de 2020 para el caso del interventor tales como:			
PÓLIZA No. 61-44-101036378 y 61-40-101013667			
1. Certificación de Aprobación de Póliza 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 16720 del 26-09-2020 3. Registro Presupuestal de Compromisos 26920 del 09-12-2020			
Para Constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.			

ACTA DE INICIO		
FIRMA SUPERVISOR	FIRMA EJECUTOR	FIRMA INTERVENTOR
 MARIO FERNANDO ORDÓÑEZ Supervisor	 HECTOR SAMUEL VILLADA Unicauca	 JOSE AUGUSTO SOSSA Interventor

7.7 Solicitud de información ejecutor Unicauca 10/12/2020

<div data-bbox="290 436 365 493" data-label="Image"></div> <div data-bbox="365 441 872 483" data-label="Text"> <h2>Medimarketing</h2> </div> <p>Popayán, 10 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 003-2020</p> <p>ING. HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO Vicerrector de Investigaciones Unicauca Email: villada@unicauca.edu.co Ciudad</p> <p>ASUNTO: Solicitud de información dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría N° 2570/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".</p> <p>Respetado Ing.</p> <p>De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta dentro de un plazo de (5) Cinco días hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, me permito solicitarle la siguiente información de conformidad a la cláusula segunda del Contrato suscrito con el Operador "Garantizar el recurso humano"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hojas de vida con sus respectivos soportes del grupo profesional propuesto acorde al proyecto aprobado por el Ocad para la ejecución del Proceso de "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" IDENTIFICADO CON EL REGISTRO BPIN 2012000100170, en mención por parte de ustedes. 2. Copia del plan de trabajo y del cronograma de trabajo a ejecutar, incluyendo fechas, horarios, personal a ser susceptible de contratar acorde a los perfiles exigidos en el proyecto, tanto a nivel, profesional, logístico y administrativo. 3. Relación de personal administrativo y de dirección y coordinación con correos electrónicos, Teléfonos con el que cuenta la Unicauca para ejecutar el proceso en mención, enunciar la persona que dirigirá localmente el proyecto con el fin de que las labores se ejecuten eficientemente. 4. Relación de cuenta en la que se manejarán los recursos del Contrato, la cual debe ser independiente al resto de operaciones financieras de Unicauca del Cauca, personas autorizadas a firmar e información de contacto del Contador o profesional pagador del convenio en mención. <p>Calle 3 N° 5-69 POPAYÁN - CAUCA TEL: 312-4052860 www.medimarketing.com.co Email: medimarketingltda41@gmail.com</p>	<div data-bbox="928 424 980 483" data-label="Image"></div> <div data-bbox="980 432 1377 480" data-label="Text"> <h2>Medimarketing</h2> </div> <p>5. Dirección física y electrónica de operación del proyecto en la ciudad de Popayán y de radicación de correspondencia.</p> <p>Para lo anterior de la manera más atenta solicito que dicha información debe ser enviada a Medimarketing Ltda en un término de máximo (03) Tres días hábiles al recibido de la presente solicitud en medio físico a la calle 3 N° 5-69 Centro de la ciudad de Popayán o digital, via correo electrónico a las siguientes direcciones: medimarketingltda41@gmail.com y medimarketingcauca@gmail.com o interventoriaquinua@gmail.com</p> <p>Atento a cualquier inquietud.</p> <p> JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ Coordinador de Interventoría. Cto N° 2398 de 2020. medimarketingltda41@gmail.com</p> <p>C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN 02 FOLIOS). C.c Ing. Francisco Fuentes C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co, Scompetitividad@cauca.gov.co C.c. Dr. Mario Ordoñez Coordinador de CTel Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Mario.ordonez@cauca.gov.co C.C. Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. C.C Archivo Ejecución Cto. JAS KMA</p> <p> 15/12/2020</p>
--	--

7.8 Cronograma interventoría 23/12/2020


Medimarketing

Popayán, 23 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 004-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
 Supervisor Cto. 2570 de 2020
 Email: mordonez@cauca.gov.co Mario.ordonez@cauca.gov.co
 Gobernación del Cauca.
 E. S. D.

ASUNTO. Remisión del cronograma de actividades en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2570 -2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA". Y REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito remitir el cronograma de actividades de la ejecución del contrato referido.

Agradezco su atención,


JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
 Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com
 C.c. **Consenso Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ____01 ARCHIVOS EN EXCELL).**
 Archivo Ejecución Cto.
 C.c. **Ing. Francisco Fuentes C.** Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co, fcompetitividad@cauca.gov.co
 C.C. **Dra. RITA VILLATE** Coordinación a la Supervisión de los Proyectos CtoI Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
 C.C. Ing **Eliana Andrea Muñoz** Apoyo Supervisión Cto 2570 de 2020
 Email: elianaandreamunoz@gmail.com

COMPONENTE 1			AÑO 1											
Actividades Generales	Detalle de Actividades Generales	Productos	Duración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Preparación para inicio de proyecto (Componente 1)	Ajustar la planificación para el componente 1 a las condiciones de entorno de arranque del proyecto considerando la adopción de protocolos de bioseguridad	*Plan ejecutado con protocolos de bioseguridad	1 mes											
a) Levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el Ecosistema Regional de CTI y el estado del relacionamiento entre ellos.	Haciendo uso de herramientas como el mapeo de actores se identificarán las instituciones del sector académico, empresarial, estatal y social que actualmente conforman el Ecosistema Regional de CTI del Cauca, y se hará énfasis en el mapeo de las redes que se encuentran enmarcadas en las líneas productivas e innovadoras. Como las agrícolas, agroindustria y TIC para el desarrollo. Asimismo, se establecerán las relaciones entre estos actores y se fortalecerá de las mismas teniendo en cuenta el número de conexiones entre los actores y la densidad de la red. Para desarrollar esta actividad se hará uso de la Metodología de Actores Claves (Tapelo, 2007) que se describe a continuación y que se desarrollará a través de talleres coordinados por los responsables de la actividad y con la participación de actores del Ecosistema.	*Documento metodológico *Mapa del Ecosistema Regional de CTI	7 meses											
Paso 1: Propuesta inicial de clasificación de actores	Mediante la conformación de pequeños grupos de informantes y lluvia de ideas se identificarán los actores que actualmente conforman el sistema regional de CTI del Cauca y se clasificarán de acuerdo a los subsistemas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Subsistema tecnológico, productivo, científico, facilitador y financiero		3 mes											
Paso 2: Identificación de funciones y roles de cada actor	Se determinará las funciones que cada actor juega en el subsistema al que pertenece, el rol que desempeñará para los objetivos del proyecto y sus intereses con respecto al mismo		4 meses											
Paso 3: Análisis de los actores del ecosistema mapeado	Se realiza el análisis de las relaciones predominantes de los actores y el nivel de poder o influencia sobre otros actores		2 meses											



Medimarketing

7.9 Convocatoria digitalizada a reunión sobre socialización de plan de trabajo, radicado cauecosis-003-2020 con soporte fotográfico.



Medimarketing

Popayán, 22 de Diciembre de 2020.

CAUECOSIS - 003-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto 2398 y 2570 de 2020

Email: mordonez@cauca.gov.co Mario.ordonez@cauca.gov.co

Gobernación del Cauca.

E. S. D.

ASUNTO. Convocatoria a la reunión en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N°. 2570 y 2398-2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA". Y REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito invitarlos a la reunión que se llevara el día 23 de Diciembre de 2020 a las 2: 30 PM en las instalaciones de la INTERVENTORIA, en la dirección carrera 3 N° 5 -69, con el fin de socializarles el plan de trabajo de la Interventoría que adjunto a la presente; esto, acorde a las obligaciones adquiridas dentro del contrato Interventor.

Agradezco su presencia y atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingcauca@gmail.com

C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __ 001 __ FOLIOS).

Archivo Ejecución Cto.

C.c Ing. **Francisco Fuentes** C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co, Scompetitividad@cauca.gov.co

C.C Dra. **RITA VILLATE** Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

C.C Ing **Elana Andrea Muñoz** Apoyo Supervisión Cto2398 elianaandreamunozr@gmail.com



Medimarketing

7.10 Remisión plan de trabajo



Medimarketing

1

Popayán, 28 de Diciembre de 2020.

CAUECOSIS - 005-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ

Supervisor Cto. 2570 de 2020

Email: mordonez@cauca.gov.co, Mario.ordonez@cauca.gov.co

Gobernación del Cauca.

E. S. D.

ASUNTO. Remisión del Plan de Trabajo en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2570 -2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA"**.

Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito remitir el plan de trabajo de la ejecución del referido contrato.

Agradezco su atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingcauca@gmail.com

C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __ 095FOLIOS EN PDF).

Archivo Ejecución Cto.

C.c **Ing. Francisco Fuentes** C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co, Scompetitividad@cauca.gov.co

C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. Email: ritavillate@hotmail.com

C.C Ing **Ellana Andrea Muñoz** Apoyo Supervisión Cto 2570 de 2020

Email: ellanaandreamunozr@gmail.com



Medimarketing

7.11 Solicitudes varias



Medimarketing

Papayán, 28 de Diciembre de 2020.

CAUECOSIS - 805-2020

Dra. VIVIANA DIAGO
Apoyo Supervisión Cto. 2570 de 2020
Email: hivi73diago@hotmail.com
Gobernación del Cauca
E. S. D.

ASUNTO: Contestación solicitud en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2570 -2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA"**.

Respetada Dra.

Acorde a su solicitud, me permito precisar, estas consideraciones:

El cargue de información al App Gesproy se realiza en planeación Departamental.

El conducto regular es que sea remitida la información desde la supervisión (cargue de programación inicial, reprogramaciones, contratación, reporte de ejecuciones, contrapartidas, registro audiovisual, metas e indicadores, etc).

Para los proyectos en que la gobernación es ejecutora, caso interventoría como contratante, que es la Gobernación.

El reporte Sireci se realiza de igual forma, el supervisor debe enviar dentro de los tiempos programados por la Contraloría General de la República.

Para los proyectos de CTeI donde se tiene la interventoría, la contratista encargada en Planeación es Carolina Mora. Los apoyos a la supervisión deben gestionar igual al cargue de información.

Contacto Gob- Planeación:

Carolina Mora Girón

Apoyo SMSCE - SOR Cauca Oficina Asesora de Planeación

Gobernación del Cauca Tel: 8244515 extensión: 414

APCOYO-SOR Carolina Mora cmora@cauca.gov.co

En espera de haber contribuido en su solicitud.

Agradezco su atención.

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingproca@gmail.com

C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ____ 01 FOLIOS).

Archivo Ejecución Cto.

C.C Dr. **MARIO FERNANDO ORDOÑEZ** Supervisor Cto. 2570 de 2020

Email: mordonez@cauca.gov.co, Mario.ordonez@cauca.gov.co



medimarketing

7.12

RTA solicitud de aval de hojas de vida ejecutor Unicauca.

Medimarketing		CAUCEO - 2017-2020																						
<p>Popayán, 14 de enero de 2021.</p> <p>Ingeniero Ing. ADOLFO PLAZAS Director de Proyecto Email: gsossalo@medimarketing.com.co Universidad del Cauca C. S. D.</p> <p>ASUNTO: Requesta de aval de algunos perfiles profesionales dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría N° 2570-2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACION Y ARTICULACION DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL CAUCA".</p> <p>Respetado Ing.</p> <p>De conformidad a nuestras OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA 2.1 OBLIGACIONES GENERALES: Además de las obligaciones generales establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 1712 de 2014, las siguientes: 1. Realizar la interventoría al proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACION Y ARTICULACION DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL CAUCA".</p> <p>A) OBLIGACIONES TECNICAS: 1. Verificar y velar que el proyecto y las actividades se ejecuten de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Metodología General Autónoma - MGA del proyecto "IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACION Y ARTICULACION DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL CAUCA" IDENTIFICADO CON SIPN 20160000041. 2. Prever en la ejecución del contrato interventoría, verificar los documentos precontractuales y formular las observaciones técnicas que considere necesarias y convenientes, teniendo en cuenta las normas técnicas y reglamentarias vigentes. 3. Verificar que los contratistas y/o grupos de intervención, empleen personal capacitado para la ejecución de los trabajos, y solicitar el cambio del personal que, a su juicio y a juicio de la entidad designada por el CCAO del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Reglas, como ejecutores del proyecto en mención y a la Gobernación del Cauca específicamente a la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, demuestre ser adecuada, competente y capaz para las actividades solicitadas para los intereses del Proyecto.</p> <p>B) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS: 2. Realizar seguimiento a las fechas de vencimiento de los contratos, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción de eventuales adiciones, prórroga o terminación del mismo. 4. Llevar a la entidad ejecutora del proyecto la permanencia real y efectiva del personal, así como de los equipos necesarios en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión. 10. Llevar la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del ejecutor del proyecto de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con los documentos del proyecto y demás documentos aplicables en la ejecución de este. 17. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propósito de evitar que la ejecución exceda el valor pactado en el contrato interventoría. El interventor no puede autorizar la ejecución de actividades que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal. 22. Vigilar el cumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes a los sistemas de seguridad social integral (Salud, pensiones y riesgos laborales), aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar CCBF y SENAF) y demás obligaciones contractuales y legales.</p> <p>C) OBLIGACIONES JURIDICAS: 1. La revisión de contratación del proyecto. 2. Verificación de pago de seguridad social. 3. Cumplimiento de obligaciones fiscales. 4. Verificación y seguimiento del cumplimiento de actividades del proyecto. 5. En general, verificar y seguimiento de procesos administrativos de contenido jurídico. Las demás actividades que se requieran de acuerdo con el objeto contractual.</p> <p>y acorde a la solicitud hecha por su despacho para el aval de los siguientes perfiles:</p> <ol style="list-style-type: none">Líder de la promoción de gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el Departamento del Cauca.Líder del componente de Fomento de la cultura de innovación entre los actores UDES del departamento del Cauca.Líder de los procesos uso del conocimiento y la gestión de redes UDES en la línea estratégica de TIC para el desarrollo.Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones.Profesional en contaduría o administración de empresas (ADMINISTRACION).		<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Perfil</th><th>Cargo</th><th>Formación Académica</th><th>Experiencia</th><th>Funciones</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Manuel Francisco Peláez</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)</td><td>Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.</td><td>Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.</td><td></td></tr><tr><td>Manuel Francisco Peláez</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)</td><td>Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.</td><td>Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Perfil	Cargo	Formación Académica	Experiencia	Funciones	Observaciones	Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.		Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.	
Nombre	Perfil	Cargo	Formación Académica	Experiencia	Funciones	Observaciones																		
Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.																			
Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.																			

Medimarketing		CAUCEO - 2017-2020																						
<p>Una vez revisadas las anteriores hojas de vida acorde a los perfiles solicitados en el proyecto y presentados para el respectivo aval, damos cumplimiento al análisis en lo expuesto en el talento humano.</p>		<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Perfil</th><th>Cargo</th><th>Formación Académica</th><th>Experiencia</th><th>Funciones</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Manuel Francisco Peláez</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)</td><td>Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.</td><td>Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.</td><td></td></tr><tr><td>Manuel Francisco Peláez</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)</td><td>Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.</td><td>Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Perfil	Cargo	Formación Académica	Experiencia	Funciones	Observaciones	Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.		Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.	
Nombre	Perfil	Cargo	Formación Académica	Experiencia	Funciones	Observaciones																		
Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.																			
Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.																			

Medimarketing		CAUCEO - 2017-2020																						
<p>Se le solicita a su señoría que, una vez sean subsanadas las observaciones por parte de este interventor a los perfiles descritos anteriormente sean enviados de nuevo, en caso tal de igual manera los perfiles avalados se envíen una vez realizados los contratos y las respectivas afiliaciones a Seguridad Social, se alleguen a esta Interventoría de la manera más expedita.</p> <p>Agradezco su atención,</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>JOSE AUGUSTO SOSSA LÓPEZ Director de Interventoría medimarketing@cauca.gov.co C.C. Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN 004 FOLIOS). Archivo Ejecución Cto. C.C. Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTeI Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Email: rivillate@cauca.gov.co C.C. Dra. Laura Rivera Apoyo Supervisión de CTeI Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Email: lvillate@cauca.gov.co C.C. Ing. FRANCISCO FUENTES CONCHA. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno del Cauca. Email: ffuentes@cauca.gov.co Dr. MARIO FERNANDO ORDÓÑEZ Supervisor Cto 2570 de 2020. Email: mordonez@cauca.gov.co</p>		<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Perfil</th><th>Cargo</th><th>Formación Académica</th><th>Experiencia</th><th>Funciones</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Manuel Francisco Peláez</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)</td><td>Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.</td><td>Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.</td><td></td></tr><tr><td>Manuel Francisco Peláez</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones</td><td>Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)</td><td>Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.</td><td>Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Perfil	Cargo	Formación Académica	Experiencia	Funciones	Observaciones	Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.		Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.	
Nombre	Perfil	Cargo	Formación Académica	Experiencia	Funciones	Observaciones																		
Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.																			
Manuel Francisco Peláez	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Graduado en Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca (2015)	Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.	Desarrollar y mantener aplicaciones web y móviles.																			



Medimarketing

7.13 Invitación reunión comité 15/01/21.



Medimarketing

Popayán, 14 de Enero de 2021.

CAUECOSIS - 006-2020

Ing:

Ing. ADOLFO PLAZAS

Director de Proyecto

Email: ecosistemactei@unicauca.edu.co

Gobernación del Cauca.

ING. HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO

Vicerrector de Investigaciones Unicauca

Email: villada@unicauca.edu.co

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ

Supervisor Cto 2570 de 2020

Email: mordonez@cauca.gov.co, Mario.ordonez@cauca.gov.co

E. S. D.

ASUNTO. Convocatoria a la reunión de Comité Mensual de seguimiento en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N°. 2570-2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA"**.

Respetados Srs.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito invitarlos a la reunión que se llevara el día 15 de Enero de 2021 a las 8: 00 AM en las instalaciones de la VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES de la UNICAUCA, en la dirección carrera 2 N° 1A -25 2 piso Museo de Historia Natural, En cumplimiento de CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA. 2.1 OBLIGACIONES GENERALES 4. Realizar reuniones con el supervisor del contrato y director del proyecto tanto al inicio como durante la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será quincenal, con el fin de verificar el desarrollo del proyecto y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. en marco de la ejecución del precitado proyecto con la UNIVERSIDAD DEL CAUCA esto, acorde a las obligaciones adquiridas dentro del contrato Interventor.

Agradezco su presencia y atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingcauca@gmail.com

C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __ 001__ FOLIOS).

Archivo Ejecución Cto.

C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaría de Desarrollo Económico y

Competitividad. Email: ritavillate@hotmail.com

C.C Dra. Laura Rivera Apoyo Supervisión de CTelSecretaría de Desarrollo Económico y

Competitividad. laura_riverasalazar@hotmail.es

C.C Ing: FRANCISCO FUENTES CONCHA.

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad

Gobernación del Cauca

Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co, scompetitividad@cauca.gov.co



7.14

Acta de reunión 15/01/202

[illegible]

7.15 Remisión corrección H.V. Omaria Calvo Giraldo ejecutor Unicauca 15/01/2021.

Remisión de Documentos corregidos de la Hoja de Vida de Omaira Calvo Giraldo

Recibidos x



ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

para medimarketingcauca, mi, Adolfo, Héctor, Lina ▾

vie, 15 ene 15:39 (hace 2 días)



Señor

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Coordinador de Interventoría.

Cto N° 2398 de 2020.

medimarketingtda41@gmail.com

Respetado señor,

Atendiendo sus recomendaciones, nuevamente le hago entrega de la Hoja de Vida con soportes de la investigadora Omaira Calvo Giraldo en el formato FOR46 para que se proceda con la autorización y demás trámites que permitan su contratación para poder dar inicio cabal a la ejecución del componente bajo su cargo.

Como equipo ejecutor, estaremos muy atentos a atender sus observaciones y a complementar la información que se requiera para dar inicio real a las acciones allí contempladas para asegurar el cabal desarrollo de este proyecto. El correo oficial del proyecto es ecosistemactel@unicauca.edu.co y la dirección física es Vicerrectoría de Investigaciones - Unicauca - Cra 2 No 1N-15 - Edificio Museo de Historia Natural.

Agradecemos su atención,

Adolfo Plazas Tenorio

Director

Proyecto Ecosistema CTel del Cauca



7.16 SOPORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

7.16.1 ESTUDIOS ACADÉMICOS

1. PREGRADO – MEDICO VETERINARIO



2. PREGRADO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional



La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Ley 52 de 1981, Ley 396 de 1997 y Decreto 2770 de 2006

Teniendo en cuenta que

Jhensus Elías Carvajal Gómez

C.C. No. 74321069 de Socha

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución,
de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, le otorga el título de

Administrador de Empresas

Registro M.E.N. 1688

Dado en Bogotá, D.C., el día 16 del mes de Diciembre de 2011

[Signature]
Rector

[Signature]
Decano Escuela

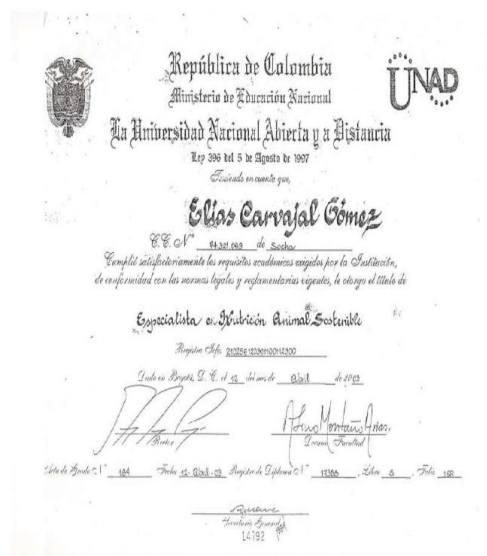
Acta de Grado N° 3199 Fecha 16-12-2011 Registro de Diploma N° 54066, Libro 14, Folio 184

[Signature]
Secretario General

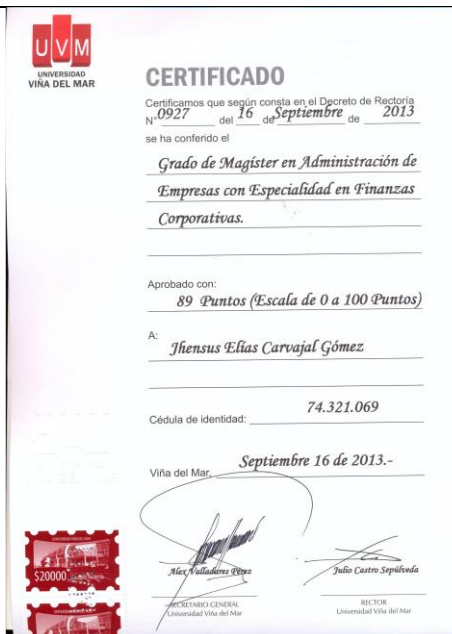
58674



ESPECIALIZACION EN NUTRICION ANIMAL SOSTENIBLE



MAGISTER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



DOCTOR EN CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS



Medimarketing



UCIMEXICO
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL MÉXICO

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL MÉXICO



Otorga a:

Jhensus Elias Carvajal Gomez
El Grado de:

Doctor en

Ciencias Económicas Administrativas

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios,
otorgado por la Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Quintana Roo, según acuerdo No.201143DCEA
de fecha 24 de noviembre de 2011, en atención a que
terminó los estudios correspondientes, de acuerdo a los
planes y programas de estudio vigentes.

Firma del alumno
(a)

Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos a 15 de
junio de 2017

Israel Abraham Mejía Aguilar
Rector de la Universidad para la Cooperación
Internacional México



7.16.2 EXPERIENCIA

Experiencia profesional

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia - Uptc - Sede Tunja
Dedicación: 6 horas Semanales Febrero de 2010 Diciembre de 2016

- Actividades de docencia
 - Pregrado - Nombre del curso: Farmacia Veterinaria, 20 Enero 2013 Diciembre 2016
 - Pregrado - Nombre del curso: Profundización en Finanzas, 20 Enero 2012 Diciembre 2016
 - Pregrado - Nombre del curso: Producción Equina, 22 Febrero 2010 Diciembre 2011

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

- Dedicación: 44 horas Semanales Enero de 2008 Diciembre de 2017

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

- Dedicación: horas Semanales Enero de 2007 Diciembre de 2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

- Dedicación: 44 horas Semanales Octubre de 2004 Diciembre de 2007

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

- Dedicación: 12 horas Semanales Enero de 1998 Diciembre de 2010

NOMBRE: JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ				PROFESION: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS		CARGO PROPUESTO: DIRECTOR DE INTERVENTO	
No.	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO N°	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	JUAN D ECASTELLANOS		14 ENERO DE 2008 13 ENERO DE 2009 14 ENERO DE 2010 01 ENERO DE 2011 01 ENERO DE 2012 25 ENERO DE 2016 21 ABRIL DE 2015		PN,C,UT PN	14 ENERO DE 2008 13 ENERO DE 2009 14 ENERO DE 2010 01 ENERO DE 2011 01 ENERO DE 2012 25 ENERO DE 2016 21 ABRIL DE 2015	15 DICIEMBRE DE 2008 13 DICIEMBRE DE 2009 31 DICIEMBRE DE 2010 31 DICIEMBRE DE 2011 20 ABRIL 2015 18 DICIEMBRE DE 2016 20 ABRIL DE 2018
	FUNDIGS	CPSP-022-11	21 MAYO DE 2012	DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SECTOR AGRICOLA DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO ZONAL DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA	PN	21 MAYO DE 2012	02 SEPTIEMBRE DE 2020

7.16.3 CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.



CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ la suma de cuatro millones setenta y cuatro mil trescientos cuatro pesos (\$ 4.074.304) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA010/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes pago en efectivo.

Atentamente,



JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ
CC. No. 74321069

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905



Medimarketing



Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 020

CIUDAD POPAYÁN

FECHA 14 DE ENERO DE 2021

VALOR \$ 4.074.304

PAGADO A: JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

CONTABILIZACION

CHEQUE No.

BANCO: BANCOLOMBIA

CODIGO P. U. C.

CUENTAS

DEBITOS

CREDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO
BENEFICIARIO

C. C. X NIT: No. 74321069

FECHA DE RECIBIDO 14 DE ENERO DE 2021

AOROBADO

JOSE AUGUSTO SOSSA

CONTABILIZADO

KAROL MOSQUERA



Certificado de Aportes

Se certifica que JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ identificado(a) con CC 74321069 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.


APORTANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS NI 800116217																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	dis	tan	tdp	tap	vap	cor	ret	dis	tpg	lims	vac	exp	ret	di	vgr
9414921002	854344807	E	2021-01-07	EPS	EP0005	SANTAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2021-01	13		X															
9414921002	854344807	E	2021-01-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-12	13		X															
9414921002	854344807	E	2021-01-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-12	13		X															
9414921002	854344807	E	2021-01-07	COF	COF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-12	13		X															
9414921002	854344807	E	2021-01-07	SENA	PASENA	SENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-12	13		X															
9414921002	854344807	E	2021-01-07	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-12	13		X															
9413691418	821168484	E	2020-12-04	EPS	EP0005	SANTAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-12	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-11	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-11	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	COF	COF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-11	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-11	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-11	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	30																	
9413691418	821168484	E	2020-12-04	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	30																	

Este certificado se expide el día 2021-03-01 a las 12:03.

7.17 SOPORTES PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

7.17.1 ESTUDIOS ACADÉMICOS

PREGRADO - ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



1. ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



2. ESPECIALIZACION EN AUDITORIA DE SALUD

República de Colombia




LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

José Augusto Sossa López
C.C. 7.186.728 Guajira

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias
legales y reglamentarias, le confiere el Título de

**Especialista
en Auditoría de Salud**

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 15 días del mes de Diciembre de 2011

El Rector General  El Rector Seccional 

El Decano de Facultad  El Secretario Seccional 

Registro Interno No. _____
Libro _____ Folio _____

3. ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS




UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
José Augusto Sossa López
C.C. No. 7.186.728

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

en testimonio se firma y sella este diploma

El Consejo de Fundadores  El Rector General 

El Rector UNIP  El Secretario General 



República de Colombia
Escuela Superior de Administración y Finanzas

Bogotá, D.C. 15 de Diciembre de 2011
No. 92321

7.17.2 EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: MEDIMARKETING INICIO: 02/09/02 CONTRATO: TERMINO INDEFINIDO
MEDIMARKETING LTDA CARGO Gerente Nacional De interventorías DURACIÓN Inicio: 02 de septiembre de 2002 Terminación: Actualmente FUNCIONES Asignación de funciones a los coordinadores locales y de campo interlocalidades, coordinar las actividades requeridas para la ejecución de los diferentes contratos, hacer seguimiento a la ejecución de contratos, presentar documentos de la evaluación de ejecución, verificar la organización y funcionamiento de la red prestadora de servicios.
MEDIMARKETING CARGO Gerente Nacional, Coordinador Analista Financiero y Contable de las interventorías que ejerce esta firma DURACIÓN Inicio: 02 de septiembre de 2002 Terminación: 30 de diciembre de 2017 FUNCIONES Supervisar diferentes contratos y dentro de sus funciones tiene a su cargo el análisis, levantamiento de información, recolección y verificación de información financiera y contable.
MEDIWIN UT CARGO Gerente Representante Legal del proyecto del contrato N°918 DURACIÓN Inicio: 26 de diciembre de 2008 Terminación: 31 de diciembre de 2010 FUNCIONES Ejecución de la Interventoría en el periodo 2008-2010a los cuatro (4) contratos que se suscriban para realizar durante esas vigencias las auditorías de la información de matrícula (oficial, subsidiada y privada), del personal docente, directivo



Medimarketing

MEDIMARKETING

CARGO

Experto operativo de campo proyecto de educación Boyacá

DURACIÓN

Inicio: 21 de octubre de 2010

Terminación: 11 de Diciembre de 2011

FUNCIONES

Ejecución e Intervenir de los modelos educativos en educación de jóvenes y adultos: transformemos, Ser ITEDRIS, Alianza educativa por Colombia y si puedo seguir, ITAEC-SAT y supervisión CEDEBOY

MEDIMARKETING

CARGO

Gerente de SALUDCOOP

DURACIÓN

02 de Julio de 2002

FUNCIONES

Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor, guardar absoluta reserva, salvo la autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su

SUSALUD

CARGO

Asesor corporativo empresas Vip

DURACIÓN

Inicio: 25 de junio de 2002

Terminación: 05 de noviembre de 2002

FUNCIONES

Contratar masivos del régimen contributivo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

CARGO

Asesor

DURACIÓN

Inicio: julio 2002

Terminación: Diciembre 2002

FUNCIONES

Desarrolló el proceso de recopilación, procesamiento y verificación de la información en el área urbana y rural de los usuarios Sisbenizados con el fin de establecer su perfil epidemiológico.

**EPS HUMANAVIVIR****CARGO**

Coordinador de Mercadeo

DURACIÓN

Inicio: 16 de febrero de 2000

Terminación: 16 de mayo de 2001

FUNCIONES

Actualizando información de cada usuario carnetizado en las distintas localidades de Bogotá D.C

COLSANITAS**CARGO**

Profesional de Mercadeo

DURACIÓN

Inicio: 02 de enero de 1999

Terminación: 30 de junio de 1999

FUNCIONES**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA****CARGO**

Supernumerario

DURACIÓN

Inicio: 26 de junio de 1998

Terminación: 02 de agosto de 1998

FUNCIONES

Actividades de apoyo a los profesionales de la entidad

7.17.3 CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL



Medimarketing

CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ la suma de tres millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos pesos (\$ 3.146.800) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA006/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes realizar la consignación a la cuenta de ahorros No. 197096639 del Banco CONFIAR.

Atentamente,


JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ
C.C. No. 7166728
CONTRATISTA MEDIMARKETING LTDA

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 019

CIUDAD POPAYÁN

FECHA 14 DE ENERO DE 2021

VALOR \$ 3.146.800

PAGADO A: JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTABILIZACION

CHEQUE No.

BANCO: BANCOLOMBIA

CODIGO P. U. C.

CUENTAS

DEBITOS

CREDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO

BENEFICIARIO

AOROBADO

JOSE AUGUSTO SOSA

CONTABILIZADO

KAROL MOSQUERA

C. C. X NIT: No. 7.166.728

FECHA DE RECIBIDO 14 DE FEBRERO DE 2021

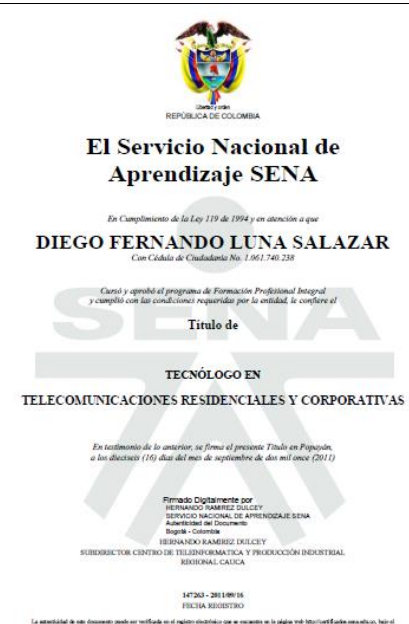


RAZON SOCIAL :	MEDIMARKETING LTDA
IDENTIFICACION:	NI-8301120202
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-05
FECHA DE PAGO:	2020-12-29
ENTIDAD DE PAGO:	CONFIAR
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19475998
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19475998
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003984	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
Subtotal Salud			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
230201	800029739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
Subtotal Pension			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
14-4	800002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
CCP14	891000182	COMPACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
Subtotal CCP			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.500	\$ 215.500

7.18 SOPORTES PROFESIONAL ASPECTOS TÉCNICOS

7.18.1 ESTUDIOS ACADEMICOS


BACHILLER ACADEMICO	TECNOLOGO EN TELECOMUNICACIONES
 <p>BACHILLER ACADEMICO</p> <p>Real Colegio "San Francisco de Asís"</p> <p>Popayán, Cauca</p> <p>Autentizado por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 0903 del 22 de Enero de 1968</p> <p>Confiere a:</p> <p>Diego Fernando Luna Salazar</p> <p>Identificado con C.E. No. 91000601201 Popayán, Cauca</p> <p>El Título de</p> <p>Bachiller Académico</p> <p>Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educación Media, según los planes y programas vigentes y el Proyecto Educativo Institucional.</p> <p>Dado en Popayán, Cauca, a los 4 días del mes de julio del año 2009</p> <p>Por el Rector, <i>[Signature]</i> Rector</p> <p>Por el Secretario General, <i>[Signature]</i> Secretario General</p> <p>Delegado de la Fundación Universitaria de Popayán, C.E. No. 91000601201 Popayán, Cauca</p>	 <p>TECNOLOGO EN TELECOMUNICACIONES</p> <p>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA</p> <p>En cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que</p> <p>DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR</p> <p>Con Cédula de Ciudadanía No. 1.061.740.238</p> <p>Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el</p> <p>Título de</p> <p>TECNOLOGO EN</p> <p>TELECOMUNICACIONES RESIDENCIALES Y CORPORATIVAS</p> <p>En testimonio de lo anterior, se firma el presente Título en Popayán, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil once (2011)</p> <p>Firmado Digitalmente por</p> <p>HERNANDO RAMIREZ DULCEY</p> <p>SERVIDOR NACIONAL DEL APRENDIZAJE SENA</p> <p>Autenticidad del Documento</p> <p>Popayán - Cauca</p> <p>HERNANDO RAMIREZ DULCEY</p> <p>SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL</p> <p>REGIONAL CAUCA</p> <p>147263 - 20110919</p> <p>FOLIO REGISTRO</p> <p>La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web: http://verifichat.fundupopayan.edu.co, bajo el número REGISTRO/20110919/000</p>
INGENIERO INDUSTRIAL	
 <p>La Fundación Universitaria de Popayán</p> <p>en nombre de la</p> <p>República de Colombia</p> <p>y por autorización del Ministerio de Educación Nacional en atención a que</p> <p>Diego Fernando Luna Salazar</p> <p>C.E. 1.061.740.238 de Popayán</p> <p>Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.</p> <p>En testimonio de ello le otorga el título de</p> <p>Ingeniero Industrial</p> <p>Con todos los derechos, privilegios y dignidades que le facultan para el ejercicio profesional.</p> <p>Dado en Popayán, Cauca, a los 4 días del mes de julio del año 2009</p> <p>Por el Rector, <i>[Signature]</i> Rector</p> <p>Por el Secretario General, <i>[Signature]</i> Secretario General</p> <p>Delegado de la Fundación Universitaria de Popayán, C.E. No. 91000601201 Popayán, Cauca</p> <p>Folio No. 005 del libro de Registro No. 045</p> <p>Este documento se otorga el día 05 de Septiembre de 2009</p> <p>Registra No. 009</p>	



7.18.2 EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENCIA LABORAL	
<p>ASOCIACIÓN FAMILIA VIVA – ASFAVI</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Asesorías y desarrollo profesional en el marco operativo y de acuerdo al objeto de la asociación. (DESDE 30 JUL 2018 HASTA 31 JUL 2020)➤ Adicional a ello, en la asociación también me desempeñé como COORDINADOR DE PROYECTOS (O.P.S.) desde el proceso licitatorio hasta la culminación y feliz término de las partes involucradas. Los proyectos los menciono a detalle a continuación. <p>Asociación familia viva, ASFAVI.</p> <p>Fecha de inicio: 05 OCT 2017 Fecha de expiración: 30 DIC 2017</p> <p>Coordinar y gestionar el proyecto "Incremento de los niveles de participación social, política, electoral y comunitaria para la construcción de la paz territorial en el departamento del Cauca". Convenio ASFAVI- Gobernación del Cauca, con carta de aceptación No. 1681-2017. Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.</p> <p>Asociación familia viva, ASFAVI.</p> <p>Fecha de inicio: 07 DIC 2016 Fecha de expiración: 30 DIC 2016</p> <p>Tipo de contrato: Suministro Brindar el apoyo logístico (Alimentación, hospedaje, alquiler de auditorios, sonido y papelería) Para el desarrollo de talleres y encuentros comunitarios e institucionales en el marco de ejecución de actividades del proyecto "fortalecimiento local institucional y social para la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz en el departamento del cauca". Convenio ASFAVI- Gobernación del Cauca, con carta de aceptación No. 1798-2016. Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.</p>	<p>Asociación familia viva, ASFAVI.</p> <p>Fecha de inicio: 18 DIC 2014 Fecha de expiración: 31 DIC 2014</p> <p>Coordinar y gestionar la ejecución e implementación del proyecto carnaval de los derechos humanos, la vida y la paz, a realizarse en Popayán con estamentos de los sectores educativos y/o comunitarios focalizados para tal fin. Convenio ASFAVI- Gobernación del Cauca, con carta de aceptación No. 1489-2014. Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.</p> <p>Asociación familia viva, ASFAVI.</p> <p>Fecha de inicio: 25 SEPT 2013 Fecha de expiración: 30 ENE 2014</p> <p>Administración e implementación de las actividades del proyecto denominado "Carnaval de los Derechos Humanos, la Vida y la Paz, 2014" Convenio ASFAVI - Programa de las naciones Unidas, PNUD No. 23191. Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.</p> <p>FUNDACIÓN DIA (Desarrollo Integral Armónico):</p> <ul style="list-style-type: none">➤ AUXILIAR CONTABLE. DESDE 04 AGO 2009 HASTA 04 AGO 2011➤ FACILITADOR EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIVAS EN DESARROLLO SOLIDARIO. DESDE 04 JUL 2018 HASTA LA FECHA <p>EDIFICIO DE APARTAMENTOS Y APARTAEstudios</p> <p>CARRERA 6 # 7-67 Centro de Popayán</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SUPERVISOR DEL TENDIDO DE LA RED DE ABONADO EN COBRE (ELECTRICO, TELEVISION Y TELEFONICO) DESDE 04 ABR 2011 HASTA 05 SEPT 2011
<p>GRUPO ASD POPAYÁN, CAUCA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Receptor para la elección democrática para el congreso de la república y el parlamento andino (2014) En el municipio de Popayán, Colombia.➤ Receptor para la elección de 2da vuelta de presidentes (2014), En el municipio de Popayán, Colombia➤ Receptor para la elección regionales de alcaldes y gobernadores (2015), En el municipio de Popayán, Colombia➤ Transmisor para la jornada de consulta popular para el proceso de paz (2016), En el municipio de Popayán, Colombia➤ Transmisor en la consulta popular del partido liberal para la elección del candidato presidencial (2017), En el municipio de Popayán, Colombia➤ Receptor para la elección democrática para el congreso de la república y el parlamento andino (2018), En el municipio de Popayán, Colombia➤ Soporte técnico en el municipio de SOTARÁ (PAISPAMBA), CAUCA en la elección de presidente de la Republica de Colombia 2018 (1ra vuelta)➤ Soporte técnico en el municipio de SOTARÁ (PAISPAMBA), CAUCA en la elección de presidente de la Republica de Colombia 2018 (2da vuelta)➤ Soporte técnico en el municipio de SOTARÁ (PAISPAMBA), CAUCA en la consulta anticorrupción agosto 2018. <p>REGISTRADURIA NACIONAL CIVIL DEL ESTADO</p> <p>POPAYÁN, CAUCA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA, PASANTE UNIVERSITARIO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO. (DESDE 01 FEB 2019 HASTA 01 JUN 2019) <p>POPAYÁN, CAUCA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dactiloscopista en el proceso de admisiones de la universidad del cauca (2016-I) (2016-II) (2017-I) (2017-II). <p>PADILLA, CAUCA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Auxiliar de servicios generales 5335-01 (RESOLUCIÓN 0326 DE 2019)➤ Registrador Municipal (E) (12, 14, 15 Y 16 AGOSTO 2019)	

7.18.3 CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL




CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR la suma de tres millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos pesos (\$ 3.146.800) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA009/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes realizar la consignación a la cuenta de ahorros No. 570436063 del Banco BBVA.

Atentamente,


DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR
C.C. No. 1061740238

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905



No 018

VALOR \$ 3.146.800

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

BANCO:

EFFECTIVO

NIT: No. 1061740238

FECHA DE RECIBIDO 14 DE FEBRERO DE 2021

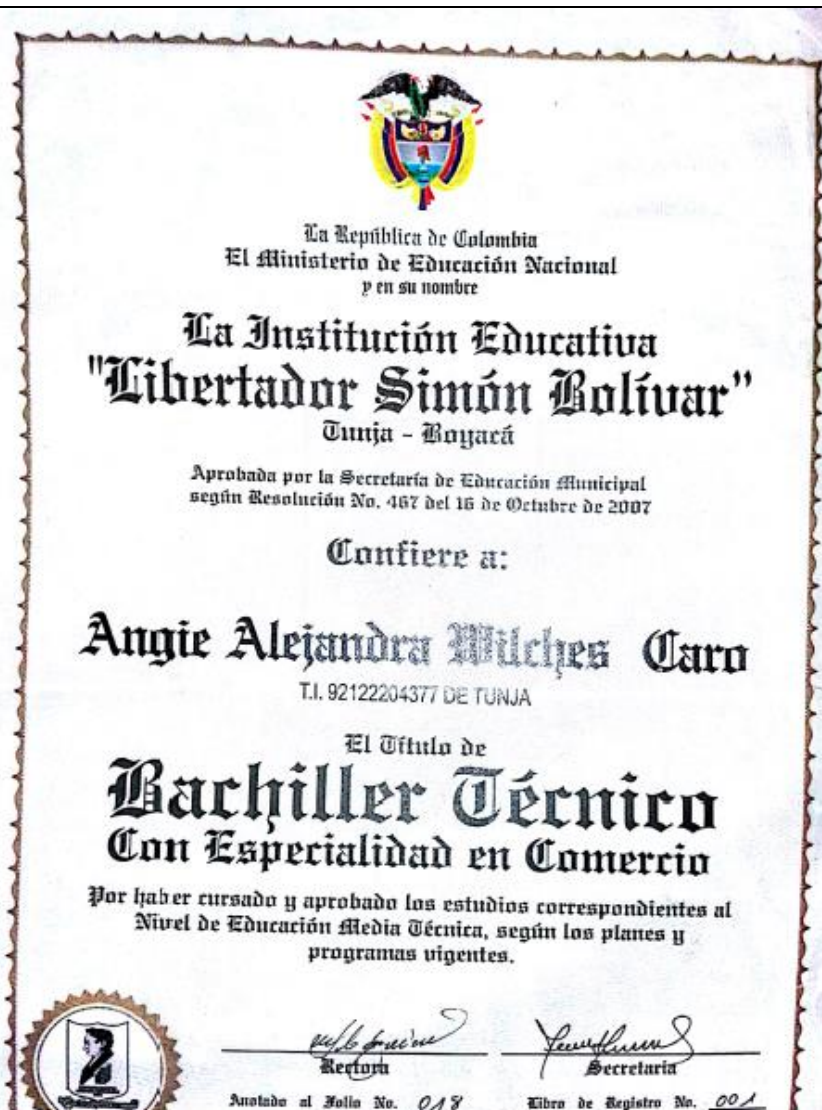
KAROL MOSQUERA



7.19 SOPORTES TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

7.19.1 ESTUDIOS ACADÉMICOS

BACHILLER ACADEMICO



TECNOLOGO EN GESTION BANCARIA



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO
Con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.632.455

*Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el*

Título de

**TECNÓLOGO EN
GESTIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS**

*En testimonio de lo anterior, se firma el presente Título en Tunja,
a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016)*

7.19.2 EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA PLASCOL

CARGO: Vendedora Mostrador

FUNCIONES: Venta de desechables, papelería, encargada de bodega

JEFE INMEDIATO: Ivan Rodrigo Carrero Diaz

21 de Marzo de 2012 - 30 de Mayo de 2012.

NOMBRE DE LA EMPRESA: MELTEC DE ORIENTE LTDA

CARGO: Asesora

FUNCIONES: venta de planes postpago, equipos de telefonía celular,
sim card, atención al usuario

JEFE INMEDIATO: Julian Gracia

TELÉFONO: 3125888754-3102176502

11 de Junio de 2012 - 25 de Agosto de 2013.



NOMBRE DE LA EMPRESA: Chilco Distribuidora Gas Y Energía S.A.S E.S.P

CARGO: Telemercaderista

FUNCIONES: Atención al cliente, despacho de pedidos, manejo base de datos de la empresa, paquete contable (SIESA), archivo

JEFE INMEDIATO: Leonel Baez

TELÉFONO: 3124506872

22 de julio de 2015 - 21 de abril de 2016. (practica-SENA).

NOMBRE DE LA EMPRESA: FALCON FARMS DE COLOMBIA S.A.

CARGO: Auxiliar Operativo

FUNCIONES: empaque y selección de rosas

JEFE INMEDIATO: Janeth

TELÉFONO: 3105691265

05 de diciembre de 2016 - 07 de marzo de 2017.

NOMBRE DE LA EMPRESA: BEST COMUNICACIONES S.A.S

CARGO: Agente Comercial

FUNCIONES: atención al usuario, venta de servicios móviles y fijos

JEFE INMEDIATO: Adriana Gaona

TELÉFONO: 3115993195

03 de junio de 2017 - 25 de julio de 2017.

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDIFICIO MARQUES DE SAN LUIS

CARGO: Guarda de Seguridad

FUNCIONES: monitoreo de cámaras e ingreso de visitantes

JEFE INMEDIATO: Miguel Arias

TELÉFONO: 3002051840

02 de octubre de 2017 - 31 diciembre de 2017



Medimarketing

NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CARGO: Técnico Administrativo y Financiero

FUNCIONES: gestión contractual y financiera en sector público

JEFE INMEDIATO: Leidy Pacheco

TELÉFONO: 300 637 19 30

04 de enero de 2018 - 04 de enero de 2020

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEDIMARKETING LTDA

CARGO: Auxiliar para el seguimiento y apoyo de las actividades de la interventoría.


FUNCIONES: seguimiento y apoyo de las actividades de la interventoría.

JEFE INMEDIATO: JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ

TELÉFONO: 312 405 28 60

06 de enero de 2020 - hasta la fecha

7.19.3 CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL



Medimarketing

CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO la suma de dos millones setenta mil doscientos cuarenta pesos (\$ 2.070.240) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA001/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes realizar la consignación a la cuenta de ahorros No. 176070540925 del Banco DAVIVIENDA.

Atentamente,



ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO
C.C. No. 1049632455
CONTRATISTA- MEDIMARKETING LTDA

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905



Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO
No 017
CIUDAD POPAYÁN

FECHA 14 DE ENERO DE 2021


VALOR \$ 2.070.240

PAGADO A: ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTABILIZACION

CHEQUE No.
BANCO:
CODIGO P. U. C.
CUENTAS
DEBITOS
CREDITOS
SUCURSAL
EFFECTIVO
FIRMA Y SELLO
BENEFICIARIO

AOROSADO
JOSE AUGUSTO SOSA
CONTABILIZADO
KAROL MOSQUERA
C. C. X
NIT:
No.

1049632455

FECHA DE RECIBIDO

14 DE ENERO DE 2021

ASOPAGOS



S.a.

Se certifica que la empresa FUNDIGZ, identificada con NI-901333021 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2020-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Periodo salud: 2020-12	EP5005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.: 8610837457 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante: B	CCF56	860303093	COMFENALCO VALLE	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción: 2020-12-23	PASENA	869999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO AGRARIO	PAICBF	869999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	PAESAP	869999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	869999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 215.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2020-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Periodo salud: 2021-01	EP5005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.: 8611717294 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante: B	CCF14	861500182	COMFACAUCA	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción: 2021-02-10	PASENA	869999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	869999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	PAESAP	869999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	869999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 215.500

7.20 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

DOTACIÓN MOBILIARIA									
					COMPROBANTE DE EGRESO No. 019				
CIUDAD: POPAYÁN		FECHA: 10 DE ENERO DE 2021		VALOR \$ 1.478.816					
CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA					NIT: 891501766-6				
CONTRATISTA: MEDIMARKETING LTDA					NIT: 830112020-1				
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO OFICINA CALLE 3 No. 5-69									
LA SUMA DE: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIEIS PESOS MITE									
CONTABILIZACION					CHEQUE No.		BANCO:		
CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO ☒				
				FIRMA Y SELLO					
				BENEFICIARIO					
 AGRUPADO JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ		 CONTABILIZADO KAROL MOSQUERA		C.C. Y NIT: No. 4208492					
				FECHA DE RECIBIDO					

PAPELERIA E INSUMO									
PAPELERIA POPAYAN Niazio Carta 600036262-5 CL 5 # 5-81 B/ CENTRO TEL: 8387436 - 8391742 PRINCIPAL: CALLE 5 N 5-85 POPAYAN					FACTURA DE VENTA No. POS1 1319 FECHA DE EXPEDICION 11 diciembre 2020				
NOMBRE: MEDIMARQUETING DIRECCION: CALLE 3 N 5-63 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA CODIGO CANT: 2937					C.C. y NIT: 830112020-1 TELEFONO: 3124052860 DESCRIPCION: 2 Guia clasificadora 1al31				
HOJA 1 DE 1 FORMULA DE PAGO: Pago en Efectivo VENCIMIENTO: 11 diciembre					V. UN. FIN: 12.500 VR. TOTAL: 25.000 NO A. 19 %				
OBSERVACION: Recibí Conforme:					SUBTOTAL \$ 21.008 DESCUENTO \$ 0 SUBT/DESC \$ 21.008 Imp.Con. \$ 0 IVA \$ 3.992 TOTAL \$ 25.000				
CC/NIT:					VENDEDOR: VENTAS VENTAS				

Resolución DIAN N° 18764001041724 de 2020-07-21 Numeración Autorizada del POS1 1 AL 20000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

IMP. Cobres UPUNE 2017 © Cobres Team SAS NIT-900.803.244-1 www.cobres.com.co



Medimarketing

RICOH del Cauca
JHONATAN VALDEZ
NIT 1.050.598.045-3 Régimen Simplificado
PBX 8230367 Cel: 3162070100
Calle 1N y 13-10 9 / Caidital

IMPORTADOR MAYORISTA
FOTOCOPIADORAS B/N -COLOR
VENTA, ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
INSUMOS, REPUESTOS, TONER
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

SEÑOR(ES): Medimarketing
NIT/CC: 830112020-1 TEL: 3124052860

DIRECCIÓN: Reconocido x 5009 NIPC 2503

FACTURA DE VENTA		FECHA
CANT	DETALLE	V.R UNIT
1	Reconocido x 5009 NIPC 2503	168.000

RECIBI: Esta factura de venta se constituye como título valor, según ley 1231 de 17 de julio de 2008, que modifica el Art del Código de Comercio.

SUBTOTAL \$ 168.000
FLETE \$ 0
TOTAL \$ 168.000

TECNOLOGIA

SYSTEM STORE
COMPUTADORES SOFTWARE
DIEGO FELIPE AMADO AVILA - NIT. 76.326.799-2
Carrera 6A 3N-45 Centro Comercial La Estación
Local 105-103 - Teléfax: 830 3088
8300 205 3602 - 315 585 1852
Popayán - Cauca

RECIBO DE REPARACIÓN
Nº 1948

Recibido de: José Sosa Tel: 3124052860
Equipo: Lenovo Marca: HP
Modelo: 30-C018LA Serial: 800643061
Estado: Lenovo - se recalienta

REPORTE
ADAPTADOR ☒ NO BATERIA ☒ NO CABLES ☒ OTROS Payan

Trabajo Efectuado: Payan

Materiales Utilizados: 10.000

Técnico: Jesús Valor \$: 10.000

Recibido 201 Aceptado 201

GARANTÍA: MESES. No se dará garantía por daños causados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de software de la máquina, humedad, virus o por levantar los sellos de seguridad.

NOTA IMPORTANTE
*No se responderá por artículos, pasados 90 días.
*Se cobrará el 3% de bodega por el tiempo que se demore el reclamar el artículo dentro de los primeros 180 días, pasados 180 días el artículo no ha sido retirado, este será subastado. Art. 1189 de la Cámara de Comercio.

systemstore@hotmail.com

MAGNETI COMPUTADORES STORE
RAÚL ANDRÉS RUIZ MUÑOZ
NIT. 76.320.541-2 - Régimen Simplificado

Venta de computadores, accesorios, servicio técnico y papelería en general
Carrera 6A No. 3N-45 - Centro Comercial La Estación
Local 105 - 108 Tel.: 823 5349 - Cel.: 311 628 35 72
Popayán - Cauca
ranrm@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 2637

SEÑOR(ES): Medimarketing NIT. 830112020-1
Dirección: Reconocido x 5009 NIPC 2503 Tel.: 3124052860

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mouse JYR MUR 013	34.000	34.000

3 meses garantía

MAGNETI COMPUTADORES
Raul Andrés Ruiz Muñoz
NIT 76.320.541-2 - Reg. Simplificado

CANCELADO

Esta factura de venta se constituye como Título Valor, según ley 1231 de 17 de julio de 2008, que modifica el artículo 774 del código de comercio.

NO SE DA GARANTÍA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO POR VIRUS, DESCARGA, NI POR EL EMPLEO DEL SELLO.

Recibi a satisfacción

TOTAL \$ 34.000



Medimarketing

SYSTEM STORE
COMPUTADORES SOFTWARE
DIEGO FELIPE AMADO AVILA - NIT. 76.326.799-2
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Carrera 6A 3N-45 Centro Comercial La Estación
Local 100-103 - Telefax: 632 3086
5200 205 3602 - 315 589 1852
Popayán - Cauca

COMPUTADORES - PERIFERIALES - ACCESORIOS - TONER
DESARROLLO DE SOFTWARE - ASISTENCIA EN SISTEMAS
RECIBO DE REPARACIÓN
Nº **1684**
FECHA
DÍA MES AÑO
17 11 20

Recibido de: Jose Sossa Tel: 3124052864
Equipo: Todo en uno Marca: H.P.
Modelo: 24-r0281a Serial: 900821069F
Estado: Windows 10 - Sacar Infección
Local D - Copia Seguridad
1 Toshiba s/n TOSHIBA SCG
ADAPTADOR ☒ (NO) BATERIA ☒ (NO) CABLES ☒ (SI) OTROS Paypas
Trabajo Ejecutado: Antivirus + Reinicio en
Seguridad la maquina
Materiales Utilizados: _____
Valor \$: 70000
Técnico: Jesús
Recibido _____ Aceptado _____
ENTREGA
DÍA MES AÑO

GARANÍA: _____ MESES. No se dará garantía por daños causados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de software de la máquina, humedad, virus o por levantar los sellos de seguridad.
NOTA IMPORTANTE
*No se responderá por artículos, pasados 90 días.
*Se cobrará el 3% de bodega por el tiempo que se demore el reclamar el artículo dentro de los primeros 180 días, pasados 180 días el artículo no ha sido retirado, este será subastado. Art. 1189 de la Cámara de Comercio.
systemstore@hotmail.com

Popayán, 27 de enero de 2020

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingcauca@gmail.com
