

Informes de Gestión No. 11
Contrato de Adhesión No. 4 Municipio de Villanueva
Período del 01 al 31 de octubre del 2021

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Octubre 31 de 2021



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	5
1.1 Informe Administrativo	5
1.2 Informe Financiero	5
2 Informe Jurídico	6
3 Informe Técnico	6
3.1 Informe Convocatoria.....	6
3.2 Informe Acreditación	7
3.3 Informe Evaluación.....	8
3.4 Informe de Puesta en Marcha	10
3.5 Informe de Interventoría.....	11
3.6 Atención al Emprendedor	11
CONCLUSIONES Y RETOS.....	12
LISTA DE ANEXOS	14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 4; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de octubre de 2021, del contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado del Municipio de Villanueva, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de octubre de 2021, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

El sistema de gestión de calidad en las entidades públicas fue planteado inicialmente en el 2003, año donde el Congreso colombiano aprobó la Ley 872, que decreta la creación del Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el artículo 1° de esta ley, las entidades

públicas “adoptarán un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente” (Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestión de calidad debe ser desarrollado de manera integral e intrínseca, así como confiable, económica, técnica y particular en cada organización, garantizando la satisfacción de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de gestión de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de gestión de calidad debe permitir la detección y corrección oportuna de las desviaciones negativas y control de los procesos, registro de cifras y estadísticas, fácil acceso a la información y ajustes a los procedimientos, metodologías y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre gestión de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempeño de los servicios ofrecidos por las entidades públicas, en el marco de esta ley se definió la expedición de una norma técnica de calidad en la gestión pública considerando normas técnicas internacionales (NTC GP 1000: 2004).


Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector público colombiano, promoviendo así el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas implicadas en el proceso, las cuáles son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el control continuo “... sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como su combinación e interacción”. Además, el enfoque por procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, típicamente son definidos cuatro procesos dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

- **Procesos estratégicos:** Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- **Procesos misionales:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de apoyo:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de evaluación:** Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, están comprometidos en su gestión misional con un enfoque basado en procesos y prestación de servicios con alta calidad. Así, dentro de las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente permitiendo la generación de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un sistema de gestión de calidad que responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustración 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

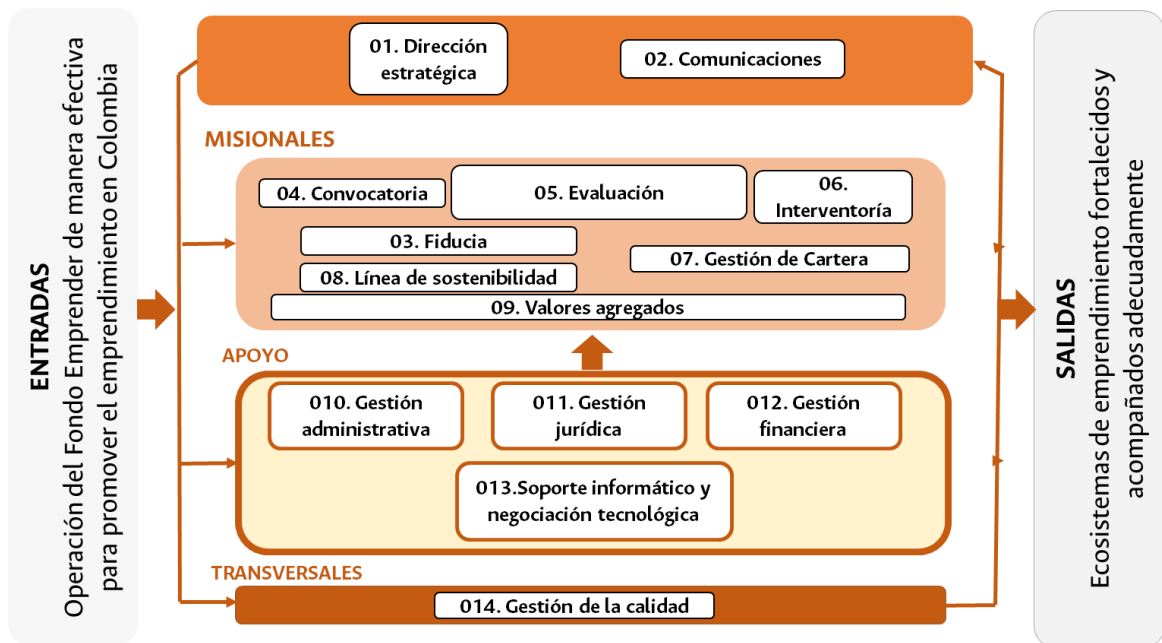

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 1 al 31 de octubre del año 2021.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Adhesión	04	Fecha de Inicio	29/10/2020	Entidad Adherente	Municipio de Villanueva, Casanare.
Duración	Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.				
Valor Total del Contrato	\$900.000.000				
Valor Aporte SENA	\$600.000.000				
Valor Aporte Aliado	\$300.000.000				
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA				
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No designado a la fecha				
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Rocío del Pilar Barrios Calderón				
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico del Municipio de Villanueva				
Número Telefónico o Celular	(+57) 8 6241204	Correo Electrónico	Umata@villanueva-casanare.gov.co		
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co		

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2021, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 4.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_8933 OCTUBRE 2021).

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Cuenta de Ahorros No.	0077-0086-8933	Banco	DAVIVIENDA
CDP	746 747	Valor	\$300.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$300.000.000
Valor de Desembolso	\$300.000.000	Fecha del Desembolso	18/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUIDEZ No. (ver anexo 2. Extracto octubre de 2021 Fondo de Inversión Convocatoria No. 169)	70083603664	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$30.284.200	Fecha del Traslado.	16/09/2021
Saldo Total en Fiducia	\$91.015.725	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	(\$200.286)

Valor Total de Convocatoria	\$900.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$300.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$813.236.692	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$271.078.897
Valor planes con desistimiento	\$123.569.643	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$41.189.881
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$210.332.951	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$70.110.984
Valor Total valor comprometido	\$801.415.747	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$267.138.582
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$0	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$0
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Período)	\$22.946	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$257.704
Valor Reintegro Aliado.		Fecha de Reintegro	
Concepto			

A 31 de octubre de 2021 la convocatoria No. 169 presentó ejecución. (Ver Anexo 3. Ejecución por Emprendimiento)

2 Informe Jurídico

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2021, no se presentaron novedades de índole jurídico.

Tabla 3. Información de gestión jurídica del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Número de adhesión	Ente aliado	Fecha recepción de la solicitud	Fecha de elaboración de minuta	Fecha de recepción de firma minuta ente territorial	Fecha recepción de firma Minuta UNAL	Fecha suscripción del contrato
4	Villanueva	31/8/20	21/9/20	15/10/20	28/10/20	29/10/20

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender.

Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 169 específica para el municipio de Villanueva, Casanare, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1692020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 4. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Convocatoria			169		
Fecha de Lanzamiento	29/10/2020	Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	05/03/2021
Número Estimado de Planes de Negocio Esperados a Financiar (75% del Valor máximo)	10	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000		
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021		
Fecha de cierre Corte No. 3	30/06/2021	Fecha de cierre Corte No. 4	03/09/2021		
Fecha de cierre Corte No. 5	02/11/2021				

Durante el mes de octubre de 2021 se tuvo lugar la publicación de la 5 adenda a la CV 169, en la cual se modifica el calendario de la convocatoria con apertura de quinto cierre previsto para realizarse el 2 de noviembre de 2021

Fecha	Descripción	Soporte (En caso que aplique)
4 de octubre de 2021	Adenda No 5 Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de 5 cierre	Anexo 4. ADENDA No. 5 CONV. 169 (5C) VILLANUEVA - FE

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de octubre no se llevaron a cabo actividades asociadas al proceso de acreditación en consideración a que el quinto cierre de la convocatoria está previsto para el mes de noviembre de 2021. Para efectos de trazabilidad del proceso a continuación se muestra el consolidado general de los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 169 - Villanueva en los cuatro cierres desarrollados a la fecha.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Convocatoria		169					
Corte No. 1	Fecha de Apertura	09/12/2020		Fecha de Cierre Corte	10/01/2021		
Fecha de Publicación Parcial	14/01/21	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

Acreditación							
Fecha de Publicación Final Acreditación	20/01/21	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%
Corte No. 2	Fecha Apertura	11/01/2021		Fecha de Cierre Corte	05/03/2021		
Fecha de Publicación Parcial Acreditación	11/03/21	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	4	% de Acreditación	100%
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	4	% de Acreditación	100%
Corte No. 3	Fecha Apertura	06/03/2021		Fecha de Cierre Corte	30/06/2021		
Fecha de Publicación Parcial Acreditación	07/07/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	75%
Fecha de Publicación Final Acreditación	14/07/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	75%
Corte No. 4	Fecha Apertura	05/08/2021		Fecha de Cierre Corte	03/09/2021		
Fecha de Publicación Parcial Acreditación	09/09/21	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

El primer cierre de la convocatoria fue evaluado en el mes febrero de 2021, el segundo cierre en el mes de marzo de 2021, el tercer cierre en el mes de agosto de 2021 y el cuarto cierre tuvo lugar en el mes de septiembre de 2021.

Durante el mes de octubre se realizó la publicación de los resultados definitivos de evaluación del cuarto cierre de la convocatoria, así mismo se llevó a cabo la presentación de resultados del proceso de evaluación del cuarto cierre Comisión Técnica del Fondo Emprender en al cual se recomendó para financiamiento un plan de negocios. Se espera que los resultados de este cuarto cierre sean aprobados ante el Consejo Directivo del Sena en el mes de noviembre de 2021.

Tabla 6. Actividades asociadas al proceso de evaluación.

Fecha	Descripción	Soporte (En caso que aplique)
1 /10/2021	Entrega de resultados informe final de evaluación para la Convocatoria Fondo Emprender 169 C4	Anexo 5. Comunicación con radicado

		B.FI.1 [T]-1299-639-21 Informe final evaluación CV 169 C4.xlsx RESPUESTA A OBJECIONES CV 169 C4.xlsx
14/10/2021	Entrega de resultados proceso de acreditación y evaluación de siete (7) convocatorias Fondo Emprender para Comisión técnica del mes de octubre 2021.	Anexo 6. Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-660-21 Ficha Técnica Convocatoria 169 C4.xlsx
22/10/2021	Presentación de resultados Comisión técnica Fondo Emprender	Informe Conv. 169 C4.docx Comisión Técnica Octubre Versión Final 2021.pdf

A continuación, en la tabla No. 7 se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la convocatoria 169 - municipio de Villanueva,

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Convocatoria				169			
Corte No. 1	Fecha Apertura	09/12/2020			Fecha de Cierre Corte	10/01/2021	
Fecha de Publicación Parcial Evaluación	02/02/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	50%
Fecha de Publicación Final Evaluación	09/02/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	50%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	10/02/21	Fecha de Consejo Directivo	17/2/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$123.569.643
Corte No. 2	Fecha Apertura	11/01/2021			Fecha de Cierre Corte	05/03/2021	
Fecha de Publicación Parcial Evaluación	30/03/21	Número de Planes Evaluados	4	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	25%
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	4	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	25%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/5/21	Fecha de Consejo Directivo	13/5/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$90.852.600
Corte No. 3	Fecha Apertura	06/03/2021			Fecha de Cierre Corte	30/06/2021	
Fecha de Publicación Parcial Evaluación	23/07/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	83%

Fecha de Publicación Final Evaluación	02/08/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	83%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Septiembre de 2021	Fecha de Consejo Directivo	Septiembre de 2021	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$598.814.449
Corte No. 4	Fecha Apertura	05/08/2021			Fecha de Cierre Corte	03/09/2021	
Fecha de Publicación Parcial Evaluación	27/09/21	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	Octubre 2021	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$111.748.698

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período entre el 01 al 31 de octubre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades:

Con respecto al Corte No. 4, se informa que se encuentran 5 planes de negocio surtiendo el proceso de suscripción de contratos de cooperación empresarial a la fecha de cierre del presente informe. A continuación, se presenta la relación de planes recomendados para ser financiados.

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la Conv. 169 4C

No.	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre SubSector	Valor Recomendado \$	Observaciones
1	74338	CONEXIÓN MEDIOS SAS	SECCIÓN R (4AC 2020)-Actividades Artísticas, De Entretenimiento Y Recreación	Creación audiovisual	\$123.089.536	En proceso de firma de anexos y contrato de cooperación empresarial.
2	74412	GRANJA AVICOLA YUMBO	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cría de aves de corral	\$119.417.574	En proceso de firma de anexos y contrato de cooperación empresarial.
3	74426	INVERSIONES AGRICOLAS VILLANUEVA	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	\$109.023.120	En proceso de firma de anexos y contrato de cooperación empresarial.

4	75522	FITOCANNA GRANOS Y SEMILLAS SAS	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Elaboración de productos de molinería	\$123.376.750	En proceso de firma de anexos y contrato de cooperación empresarial.
5	75530	POLINIZADOS SAS	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cría de otros animales n.c.p.	\$123.907.469	En proceso de firma de anexos y contrato de cooperación empresarial.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia. Su gestión iniciará una vez se hayan suscrito los primeros contratos de cooperación empresarial, derivados de la convocatoria No. 169.

Para el período entre el 01 al 31 de octubre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades:

Para el plan de negocio correspondiente a la Conv. 169 1C, se tienen los siguientes resultados.

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Conv. 169 1C.

No.	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre SubSector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
1	74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cría de aves de corral	\$123.569.643	Renuncio a los recursos del Fondo Emprender.

Para el plan de negocio correspondiente a la Conv. 169 2C, se tienen los siguientes resultados.

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Conv. 169 2C.

No.	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre SubSector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
1	74396	MASTRANTO BIOTECH SAS	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)	\$90.852.600	El plan de negocios se encuentra vigente.

3.6 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2021, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 169, la cual, se presentará completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo para la respectiva asignación de los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.

Tabla 11. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Recursos de la Convocatoria	\$ 900.000.000
Corte No. 1	
Cierre Corte No. 1	10/01/2021
Publicación Final de Resultados Corte No. 1	Febrero 2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 1	2
Planes de Negocio Acreditados Corte No. 1	2
Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 1	0
Planes de Negocio Evaluados Corte No. 1	2
Planes de Negocio Viables Corte No. 1	1
Planes de Negocio Financiados Corte No. 1	1
Valor de planes de negocios financiados Corte No. 1	\$ 123.569.643
Corte No. 2	
Cierre Corte No. 2	05/03/2021
Publicación Final de Resultados Corte No. 2	06/04/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 2	4
Planes de Negocio Acreditados Corte No. 2	4
Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 2	0
Planes de Negocio Evaluados Corte No. 2	4
Planes de Negocio Viables Corte No. 2	1
Planes de Negocio financiados Corte No. 2	1
Valor planes de negocio financiados corte No. 2	\$ 90.852.600
Corte No. 3	
Cierre Corte No. 3	30/06/2021
Publicación Final de Resultados Corte No. 3	02/08/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 3	8
Planes de Negocio Acreditados Corte No. 3	6
Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 3	2
Planes de Negocio Evaluados Corte No. 3	6
Planes de Negocio Viables Corte No. 3	5
Planes de Negocio financiados Corte No. 3	5
Valor planes de negocio financiados corte No. 3	\$598.814.449
Corte No. 4	
Cierre Corte No. 4	03/09/2021
Publicación Final de Resultados Corte No. 4	01/10/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 4	1
Planes de Negocio Acreditados Corte No. 4	1
Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 4	0
Planes de Negocio Evaluados Corte No. 4	1
Planes de Negocio Viables Corte No. 4	1
Planes de Negocio financiados Corte No. 4	1
Valor planes de negocio financiados corte No. 4	\$111.748.698
Número Total de Planes de Negocios Financiados	8 (cortes 1-4)

Valor total de planes de negocio financiables	\$924.985.390 (cortes 1-4)
No. de planes con desistimiento	1
Valor de desistimientos	\$123.569.643
Valor Total comprometido	\$801.415.747 (cortes 1-4)
Porcentaje de Financiación vs Planes Formalizados.	53.3% (Corte 1-4)
Porcentaje de Financiación vs Planes Acreditados.	61% (Corte 1-4)
Porcentaje de Financiación vs Planes Viabilizados.	100% (Corte 1-4)
Saldo por comprometer	\$98.584.253

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2021, podemos encontrar:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el municipio de Villanueva, Casanare, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los trámites respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA – Fondo Emprender, como del aliado adherente, en este caso el municipio de Villanueva, Casanare, se encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean seleccionados en la Convocatoria Fondo Emprender – 169.
3. La Convocatoria 169 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, se encuentra abierta, el día 10/01/2021 tuvo su primer cierre, donde se formalizaron 2 planes de negocio, mientras que el día 05/03/2021, tuvo su segundo corte, donde se formalizaron 4 planes de negocio, tuvo el cierre del Corte No. 3 el 30/06/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El cuarto cierre de la convocatoria se realizó el 03/09/2021 en donde se formalizó un plan de negocios.
4. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 169 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 2 de los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 169 – Fondo Emprender, viabilizó 1 de los 2 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 50% de viabilidad.
5. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria 169 – Villanueva se aprobó el financiamiento de un plan de negocios por valor de \$123.569.643, apropiando el 13.66 % de los recursos disponibles.
6. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 169 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 4 de los 4 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 169 – Fondo Emprender, viabilizó 1 de los 4 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 25% de viabilidad.
7. Como resultado del proceso de evaluación del segundo cierre de la convocatoria 169 – Villanueva se aprobó el financiamiento de un plan de negocios por valor de \$90.852.600, apropiando el 10.09% de los recursos disponibles.
8. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 169 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 6 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 75% de acreditación.
9. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 169 viabilizó 5 de los 6 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 83.33% de viabilidad, los planes de negocios viabilizados para este cierre suman un total de recursos de \$598.814.449.
10. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la convocatoria 169 Fondo Emprender, acreditó 1 plan de negocios teniendo un desempeño del 100% de acuerdo con el número de planes formalizados.
11. El proceso de evaluación del corte No. 4 de la Convocatoria 169 viabilizó 1 el plan de negocio acreditado, para un desempeño del 100% de viabilidad, el plan de negocio tiene recomendación de financiamiento por valor de \$111.748.698.

12. El plan de negocios identificado con ID 74224 – Huevos el Rancho viabilizado en el corte No. 1 de la convocatoria 169 por valor de \$123.569.643 desistió de suscribir y ejecutar el plan de negocios respectivo.
13. A la fecha los planes de negocios aprobados en el tercer cierre se encuentran en proceso de firma de contratos de cooperación empresarial y puesta en marcha.
14. Con corte al 31 de octubre de 2021, los planes de negocios financiados presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$0.
15. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2021.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_8933 OCTUBRE 2021
Anexo 2.	Extracto octubre de 2021 Fondo de Inversión Convocatoria No. 169
Anexo 3.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 4.	ADENDA No. 5 CONV. 169 (5C) VILLANUEVA - FE
Anexo 5.	INFORME FINAL EVALUACIÓN CV 169 C4 • Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-639-21 • Informe final evaluación CV 169 C4.xlsx • RESPUESTA A OBJECIONES CV 169 C4.xlsx
Anexo 6.	COMISION TECNICA 22 DE OCTUBRE 2021 • Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-660-21 • Ficha Técnica Convocatoria 169 C4.xlsx • Informe Conv. 169 C4.docx • Comisión Técnica Octubre Versión Final 2021.pdf
