

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 de 2021
(Período del 01 al 30 de junio del 2021)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2021.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Administrativa y Jurídica
3. Gestión Técnica operativos
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: \$ 12.472.044.482,07
- Recursos de capital semilla: \$ 88.000.000.000,00
- GMF: \$ 401.888.177,93
- Cuota de Gerencia: \$ 8.061.257.340,00

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este periodo no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 30 de abril propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 12 de mayo de 2021. Con base en lo anterior, se presenta el avance del



El empleo
es de todos

Mintrabajo

plan operativo:

Tabla No. 13 - Plan Operativo V3 Aprobado Junta Administradora 12 de mayo 2021

Costos Operación	Descripción	Plan operativo V3 12/05/2021	Valor comprometido a 30/06/2021	Valor ejecutado a 30/06/2021
RECURSOS PARA CONVOCATORIA NACIONALES	Convocatoria nacional 77 – Multisectorial	\$ 11.918.038.045	\$ 11.918.038.045	\$ 1.011.718.808
	Convocatoria nacional 78 – Naranja	\$ 9.723.838.959	\$ 9.599.838.959	\$ 1.084.964.153
	Convocatorias cerradas	\$ 21.864.487.693	\$ 21.864.487.693	\$ 0
	Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
	Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
PROCESO DE EVALUACIÓN	Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396	\$ 656.883.396	\$ 613.045.057
	Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000		
	Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)	\$ 183.000.000	\$ 160.250.000	\$ 130.250.000
PROCESO DE INTERVENTORÍA	Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 4.848.768.000	\$ 4.848.768.000	\$ 727.315.200
PÓLIZA	Póliza de deudor	\$ 108.900.000	\$ 108.900.000	\$ 0
FIDUCIA	Fiduciaria	\$ 96.891.764	\$ 96.891.764	\$ 96.891.764
OPERACIÓN LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303
	Firmas digitales	\$ 14.616.924	\$ 14.616.924	\$ 14.616.924
	Red de Emprendedores	\$ 487.399.992	\$ 487.399.992	\$ 194.959.997
	Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 175.238.255,88	\$ 0	\$ 0
	Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 24.400.000	\$ 0	\$ 0
OTROS	Cobro de Cartera	\$ 68.320.000	\$ 0	\$ 0
GMF	GMF	\$ 386.579.132	111.566.348	15.495.048
	Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 50.044.305.424	\$ 4.065.921.254

Con el plan operativo, es importante mencionar que, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA está en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros.

1. 1.2.4 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, el supervisor realizó el seguimiento a la contratación de tres (3) evaluadores por valor de \$7.500.000 más el valor correspondiente al GMF para la evaluación de los planes de negocio de las convocatorias del fondo emprender.

Tabla No. 14 - Estado Financiero OSE 1261

Tercero	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 615.497.237	\$ 44.013.693
Total	\$ 659.510.930	\$ 615.497.237	\$ 44.013.693

Tabla No. 15 - Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 160.891.000	\$ 130.771.000	\$ 30.120.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORÍA	\$ 4.868.163.072	\$ 730.224.461	\$ 4.137.938.611
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 0	\$ 109.335.600
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 489.349.592	\$ 195.739.837	\$ 293.609.755
Total	\$ 5.916.358.290	\$ 1.345.354.324	\$ 4.571.003.966

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 6.575.869.220	\$ 1.960.851.561	\$ 4.615.017.659
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Fuente UNAL

a) SALDOS

La supervisión encuentra que ha corte de junio de 2021, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a \$ 20.002.951.234,22, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados en el mes de junio de 2021 y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas:

Tabla No. 16 Saldo cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6322 – VALOR DEL CONTRATO	Cuenta de Ahorros 220-150-18540-3	\$ 96.207.726,27
6323 – CUENTA DE REINTEGROS	Cuenta de Ahorros 220-150-18576-7	\$ 0,00
6324 - CONVOCATORIA 77	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 77 N° 70083603456	\$ 10.968.545.445,82
6325 - CONVOCATORIA 78	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 78 N° 70083603455	\$ 8.938.198.062,13

Es de mencionar que por concepto de reintegro de retenciones causadas a la sociedad fiduciaria; desde la convocatoria N° 77 se desembolsó \$11.084,29 con su respectivo GMF de \$44,34 y desde la convocatoria N° 78 \$280.863,34 más el GMF de \$1.123,45.

a) SALDOS

A corte de junio de 2021, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a \$ 20.002.951.234,22, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados en el mes de junio de 2021 y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas:

Tabla No. 16 Saldo cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6322 – VALOR DEL CONTRATO	Cuenta de Ahorros 220-150-18540-3	\$ 96.207.726,27
6323 – CUENTA DE REINTEGROS	Cuenta de Ahorros 220-150-18576-7	\$ 0,00
6324 - CONVOCATORIA 77	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 77 N° 70083603456	\$ 10.968.545.445,82
6325 - CONVOCATORIA 78	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 78 N° 70083603455	\$ 8.938.198.062,13

Es de mencionar que por concepto de reintegro de retenciones causadas a la sociedad fiduciaria; desde la convocatoria N° 77 se desembolsó \$11.084,29 con su respectivo GMF de \$44,34 y desde la convocatoria N° 78 \$280.863,34 más el GMF de \$1.123,45.

ESTADOS FINANCIEROS:

Cuentas por Pagar: Para la subcuenta 6324 correspondiente a la convocatoria N° 77, se presenta un saldo de cuentas por pagar por concepto de retenciones por valor de \$37.464.842,51. Por otro lado, la Subcuenta 6325 correspondiente a la convocatoria N° 78, presenta un saldo de cuentas por pagar por concepto de retenciones de \$28.147.992,50.

Cuentas de Inversiones: En el saldo de la cuenta de Inversiones (1302) para los estados financieros de la convocatoria 78, se encuentra incluido el reintegro del pago rechazado de la solicitud N° 292624 del mes de mayo de 2021 por valor de \$700.000,00 con su respectivo GMF de \$2.800,00.

Cuenta Efectivo: El saldo de la cuenta de Efectivo (1115) de los estados financieros de cada una de las subcuentas, no presentan partidas conciliatorias con respecto a los extractos.

INDICADORES FINANCIEROS

Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Rango (Crítico, medio, adecuado)
Porcentaje de recursos recibidos ejecutados		92%	Adecuado

- ✓ A junio de 2021 se han firmado 20 convenios de adhesión, el indicador de recursos recibidos da como resultado el 92%, encontrándose en un rango adecuado. Se está a la espera de la firma de los convenios con los municipios de Acacias y Riohacha.

Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Rango (Crítico, medio, adecuado)
Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos	Presupuesto Cuota de Gerencia	60%	Adecuado

- ✓ A junio de 2021 nos encontramos en el mes 14 de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299, el indicador de ejecución presupuestal de ingresos da como resultado el 60%, encontrándose en un rango adecuado de acuerdo con la cláusula segunda - forma de pago del anexo 3 al contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.

Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Rango (Crítico, medio, adecuado)
----------------------	--------------------------	-----------	----------------------------------

Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos	Presupuesto Cuota de Gerencia	17%	Medio
Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos	Presupuesto Contratación Derivada	16%	Medio

- ✓ A junio de 2021 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 17%, encontrándose en un rango medio. A la fecha, el proyecto se encuentra al día con todas las obligaciones del personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
- ✓ A junio de 2021 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 16%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todos los pagos a los proveedores para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V3 aprobado por la Junta Administradora el 12 de mayo de 2021.

Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Rango (Crítico, medio, adecuado)
Porcentaje de compromisos presupuestales de gastos	Presupuesto Cuota de Gerencia	53%	Medio
Porcentaje de compromisos presupuestales de gastos	Presupuesto Contratación Derivada	53%	Medio

- ✓ A junio de 2021 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 53%, encontrándose en un rango medio. Se han realizado los compromisos presupuestales teniendo en cuenta el personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
- ✓ A junio de 2021 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 53%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todas las contrataciones necesarias para desarrollar el contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V3 aprobado por la Junta Administradora el 12 de mayo de 2021.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones administrativas presentadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del SENA.

1.1.1 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 30 de junio, los documentos soportes de 25 entidades territoriales relacionadas a continuación. La gestión administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros en el sistema QUIPU de la Universidad. Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión.

Tabla No. 5 - Información de avance de los Contratos de Adhesión



El empleo
es de todos

Mintrabajo

No .	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
4	Municipio de Yarumal,	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Firma de Acta de Liquidación Anticipada 25-may-21
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$ 600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	3-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Bugalagrande,	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
14	Municipio de Carmen de Viboral,	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	1-oct-20	\$500.000.000	\$877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	5-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20 22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico

No .	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	8-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21 08-feb-21 15-mar-21	Ver informe Financiero y Jurídico
18	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20 29-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$ 746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
20	Ministerio del Interior	2-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	Pendiente	Ver informe Financiero y Jurídico
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$273.000.000	\$546.000.000	24-may-21	Pendiente	Ver informe Financiero y Jurídico
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$800.000.000	\$800.000.000	3-may-21	28-may-21	Ver informe Financiero y Jurídico
25	Municipio de Acacias, Meta	23-abr-21	\$600.000.000	\$900.000.000	Pendiente	Pendiente	En proceso de elaboración Ver Informe Jurídico
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$300.000.000	\$600.000.000	Pendiente	Pendiente	En proceso de elaboración Ver Informe Jurídico
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$650.000.000	\$900.000.000	9-jun-21	Pendiente	Ver informe Financiero y Jurídico

Durante el mes de junio de 2021 se elaboraron y enviaron 20 informes individuales, correspondientes al periodo de ejecución, mayo 2021. Los cuales fueron entregados en tres paquetes así: (Ver Anexo 2)

Otra Gestión administrativa realizada:

- Gestión de contratos:**

En el mes de junio realizaron la firma del contrato No. 00101 correspondiente al Plan de Negocios ID 71515, también se avanza en el proceso de derogación del RAG 1049 destinado a la adquisición de los registros de garantías mobiliarias, dado que Confecámaras indicó que la factura debe salir a nombre de SENA, aspecto no aprobado por la Universidad Nacional de Colombia por lo cual se dará en el siguiente periodo reuniones entre los interesados para lograr enfocar el proceso en pro de cumplir el requerimiento por todas las partes.

• Gestión Documental:

En relación con este tema, la supervisión verifico que se están siguiendo los lineamientos de gestión documental establecidos por la Universidad Nacional de Colombia. En este sentido, se han realizado las siguientes actividades:

- Se ha venido realizando toda la gestión documental del proyecto siguiendo los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD de la Universidad Nacional de Colombia para la organización, almacenamiento y custodia de este.
- El día 15 de junio del 2021, se envía comunicado con consecutivo No. B.FI.1 [T]-1299-379-21 al SENA, indicando como es el sistema de gestión documental que está manejando el proyecto actualmente. A lo cual, se recibe respuesta por parte del SENA el día 23 de junio del año en curso, con consecutivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-487-21, indicando que estos procesos sean estandarizados en los dos (2) equipos del operador Universidad Nacional siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos de radicación establecidos por el SENA – Fondo Emprender. Ver Anexos 8. Gestión Documental.

GESTIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA

Como parte de la gestión adelantada con los entes territoriales con los cuales se han suscrito contratos de adhesión, en el mes de junio algunas convocatorias tuvieron cierres para la recepción de nuevos proyectos, a continuación, se relacionan el número de planes formalizados por cada convocatoria

Tabla No. 35 - Convocatorias cerradas durante el mes de junio

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
Cv 182 C2 Barrancabermeja	31/05/2021	36	Ver Anexo. 19.1 Evaluación Formalizados CV 182 C2
Cv 176 C3 Planadas	10/06/2021	8	Ver Anexo. 19.1 Evaluación Formalizados CV 176 C3
Cv 169 C3 Villanueva	30/06/2021	8	Ver Anexo. 19.1 Evaluación Formalizados CV 169 C3
Cv 171 C2 San Juan de Urabá	30/06/2021	7	Ver Anexo. 19.1 Evaluación Formalizados CV 171 C2
Cv 183 C3 Pastoral Social	30/06/2021	8	Ver Anexo. 19.1 Evaluación Formalizados CV 183 C3

De igual manera, en el mes de junio se realizaron adendas a las convocatorias relacionadas a continuación

Tabla No. 36 - Adenda de las convocatorias

Convocatoria	No de adenda	Motivo de adenda
185 - Gramalote	2	Modificación de cronograma de la convocatoria, apertura de tercer cierre. Ver Anexo. 19.2 Evaluación Adendas

ACREDITACIÓN

Para los meses de mayo (31) y junio de 2021 se dieron los cierres de las convocatorias 182 - Barrancabermeja C2, 176 - Planadas C3, 169 - Villanueva C3, 171 - San Juan de Urabá C2 y 183 - Pastoral Social C2.

Es necesario señalar que para la convocatoria 182 - Barrancabermeja segundo cierre, se hizo entrega de resultados parciales el día 4 de junio y el 9 de junio. Lo anterior debido a que en la página del Fondo Emprender se publicaron dos adendas # 2 con fechas de entregas parciales y finales diferentes

EVALUACIÓN


Durante el mes de junio de 2021 se llevó a cabo el proceso de entrega de informes finales de evaluación para ocho convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entes territoriales siendo estas: 177 – Caldas C3, 178 - Carmen de Viboral C2, 179 - Planeta Rica C2, 184 - Quebradona C2, 185 - Gramalote C2 y 186 – Samaniego C3, los informes fueron publicados los días 7 y 8 de junio respectivamente; de igual manera para este grupo de convocatorias se recibieron y prepararon respuesta a las observaciones recibidas sobre los resultados de evaluación preliminares .

Para el caso de la convocatoria 178 Carmen de Viboral (*) durante el mes de junio de recibió comunicación de desistimiento a los recursos de financiamiento por parte del emprendedor del plan de negocios identificado con el ID 74183- Productos Kora, financiado en el primer cierre de esta convocatoria, razón por la cual el monto disponible de recursos de financiamiento para el segundo cierre se aumenta y es posible el financiamiento de un plan de negocios adicional a los informados en el mes de mayo de 2021.

Interventoría:

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 *Obligaciones de Gestión de Interventoría*. Se contemplan cuatro (4) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja , 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquia).

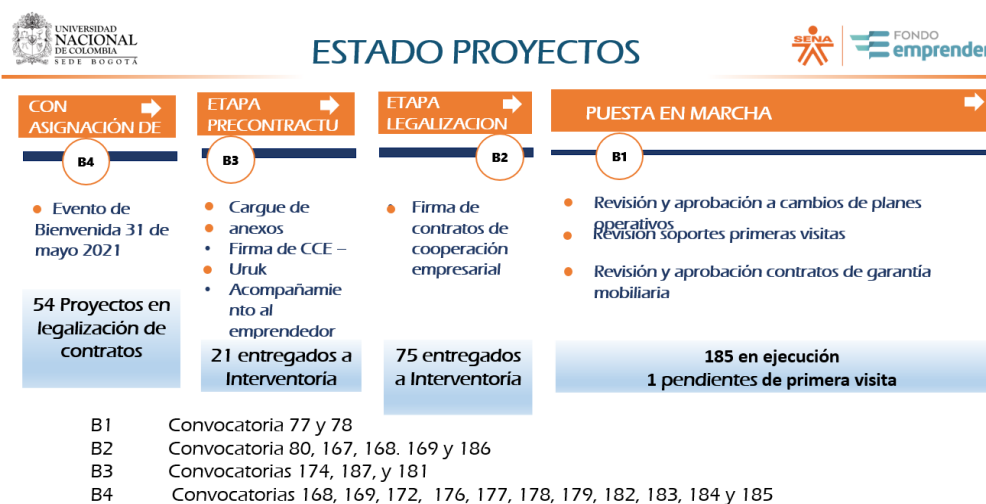



Las actividades descritas a continuación relacionan el trabajo adelantado por la Universidad Nacional como operador de recursos, así como la entidad interventora, la Universidad de Antioquia.

Valores Agregados:

Como hito del proceso de valores agregados, el día 24 de junio se realizó la sesión integral de retroalimentación al proceso. En dicha sesión se contó con la participación de los líderes misionales del equipo 2020 con el fin de identificar oportunidades de mejora a las actividades realizadas a la fecha. Los comentarios serán tenidos en consideración para el desarrollo de entregables y documentos que fortalezcan al Fondo Emprender, documentos que se relacionarán en próximos informes de gestión.

En este sentido, el alcance principal del encuentro fue dar a conocer los avances desarrollados a la fecha, metodología de trabajo, y proyección para cada uno de los valores agregados. La información presentada en los valores agregados de capacitación certificada, mejora en la ruta de atención al emprendedor, modelo 4K, internacionalización, modernización de instrumentos tecnológicos y centros de pensamiento

Se firma en Bogotá D.C. a los 26 días del mes de julio de 2021

CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato 1-0168 de 2019
