



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 1 de 12

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 De 17

LAPSO: 1 al 30 de abril de 2022

CONTRATO No.	:	002-ARC-JOLA-2021
CONTRATISTA	:	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL -COTECMAR-
OBJETO DEL CONTRATO	:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACIÓN, CALIBRACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FÁBRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO; PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL"
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	31 DE AGOSTO DE 2022.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CONTRATO PRINCIPAL: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$ 37.982.974.231,00) exento de IVA. PRIMERA ADICIÓN: MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.511.555.752,60) MCTE. SEGUNDA ADICIÓN: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$16.618.700.990,00) MCTE. TOTAL CONTRATADO: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$56.113.230.973,60) MCTE exento de IVA.
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 17321 de fecha 8 de enero 2021. CRP No. 246921 de fecha 25 de mayo 2021. CDP No. 8522 de fecha 4 de enero 2022. CRP No. 4122 de fecha 4 de enero 2022.
SUPERVISOR	:	Capitán de Navío RICARDO JOSÉ FARFÁN GÓMEZ.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022), en calidad de Supervisor del Contrato No. 002-ARC-JOLA-2021 suscrito con la CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL -COTECMAR- NIT. 806.008.873-3, representada legalmente por la señora Capitán de Navío MARGARITA ROCÍO CARREÑO BENAVIDES como Vicepresidente Ejecutiva Encargada de las Funciones de Presidente de COTECMAR, identificada con cédula de ciudadanía N° 31.982.291 de Cali y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las"



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 12

50°, 51°, 52°, 53°², 56°, Ley 1474 de 2011³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014⁴, la Directiva 12 del 21 de septiembre de 2020⁵ y la Resolución No. 0068 del 11 de enero 2022⁶, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"La prestación de servicios de mantenimiento a todo costo, que incluyen trabajos de adecuación, calibración, dotación de equipos, mano de obra, suministro de repuestos y/o partes, herramienta especializada, asistencia técnica, capacitación, pruebas de fábrica, pruebas de mar y pruebas de puerto; para cada uno de los grupos constructivos que integran las unidades a flote de la Armada Nacional"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN	27/12/2021	Adición de recursos	N/A	\$ 1.511.555.752,60
SEGUNDA MODIFICACIÓN	08/04/2022	Segunda adición de recursos, Primera prórroga en tiempo y Modificación anexo económico	MODIFICACION ANEXO "B" PROUESTA ECONOMICA - ACEROS CASCO	\$16.618.700.990,00

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 0068 del 11 de enero de 2021, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 1897 del 29 de junio 2021, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 3 de 12

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 56.113.230.973,60	\$ 56.113.230.973,60	N/A	N/A	N/A	\$ 56.113.230.973,60

4. GARANTIAS

CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 25-05-2021
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
26-05-2021

PRIMERA ADICIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 28-12-2021
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
30-12-2021

SEGUNDA ADICIÓN

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 75-44-101113236 DE FECHA 08-04-2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
12-04-2022

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DE LA EL	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		x	N/A		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		26-05-2021		12-04-2022
CALIDAD DEL SERVICIO	X		26-05-2021		12-04-2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		26-05-2021		12-04-2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		26-05-2021		12-04-2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	X		26-05-2021		12-04-2022
TODO RIESGO		X			
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO		
	DESDE	HASTA			

-APLICACIÓN CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 4 de 12

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACIÓN (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO PARCIAL	2021	\$ 24.786.862.312	377621	2021-07-13-	172962121	2021-07-15	\$ 776.186.220	\$ 24.010.676.092	100%
			541621	2021-08-24	261510021	2021-09-17	\$ 3.051.557.590	\$ 20.959.118.502	
			545621	2021-09-10	261537021	2021-09-21	\$ 2.021.311.172	\$ 18.937.807.330	
			649421	2021-10-19	291227121	2021-10-25	\$ 5.658.495.308	\$ 13.279.312.022	
			673521	2021-10-28	298637021	2021-11-02	\$ 3.066.535.953	\$ 10.212.776.069	
			718421	2021-11-18	317850621	2021-05-25	\$ 1.839.721.171	\$ 8.373.054.898	
			749121	2021-11-25	329400821	2021-05-25	\$ 341.297.290	\$ 8.031.757.608	
			793621	2021-12-13	356076621	2021-12-13	\$ 1.354.074.603	\$ 6.677.683.005	
			841921	2021-12-21	372784421	2021-12-21	\$ 1.430.660.674	\$ 5.247.022.331	
			868521	2021-12-27	385568821	2021-12-27	\$ 3.956.373.180	\$ 1.290.649.151	
			868821	2021-12-27	386980621	2021-12-27	\$ 1.290.649.151	\$ 0,00	
PAGO PARCIAL	2022	\$ 31.326.368.661,60	154122	2022-03-23	76670922	2022-03-23	\$ 3.727.907.441	\$ 27.598.461.220,60	19,3%
			214622	2022-04-21	102213622	2022-01-04	\$ 2.314.888.299	\$ 25.283.572.921,60	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	NO SE HAN PRESENTADO CESIONES A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O MÁLAGA)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (Indicar soporte, No. Y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CTO PRINCIPAL	2021	17321 - 2021-01-08	\$ 24.786.862.312	N/A	N/A	N/A	246921 -2020-05-25	\$ 24.786.862.312	N/A
	2022	8522 - 2022-01-04	\$ 14.707.667.671,60	N/A	N/A	N/A	4122 - 2022-01-04	\$ 14.707.667.671,60	N/A





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 12

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPU ESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
1	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC 7 DE AGOSTO	\$ 353.990.000	BGD 16146 12.04.2022	\$ 121.077.454	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 121.077.454	1001724611 27.04.2022	\$ 121.077.454	34% FACTURADO
2	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC 20 DE JULIO	\$ 1.995.693.680	BGD 16149 25.04.2022	\$ 436.408.040	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 436.408.040	1001724613 27.04.2022	\$ 436.408.040	84% FACTURADO
3	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC CALDAS	\$ 145.094.880	BGD 16150 25.04.2022	\$ 31.908.210	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 31.908.210	1001724615 27.04.2022	\$ 31.908.210	34% FACTURADO
4	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 99.240.000	BGD 16151 25.04.2022	\$ 99.240.000	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 99.240.000	1001724617 27.04.2022	\$ 99.240.000	100% FACTURADO
5	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 17.975.100	BGD 16152 25.04.2022	\$ 5.999.200	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 5.999.200	1001724620 27.04.2022	\$ 5.999.200	33% FACTURADO
6	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GLORIA	\$ 80.148.300	BGD 16153 25.04.2022	\$ 80.148.300	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 80.148.300	1001724624 27.04.2022	\$ 80.148.300	100% FACTURADO
7	2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GOLFO DE URABA	\$ 159.610.213	BGD 16154 25.04.2022	\$ 159.610.213	ACTA No 14 27.04.2022	\$ 159.610.213	1001724627 27.04.2022	\$ 159.610.213	100% FACTURADO

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACIÓN, CALIBRACION, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FÁBRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO; PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL"	78,45%	\$ 56.113.230.973,60



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones


Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 12

RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

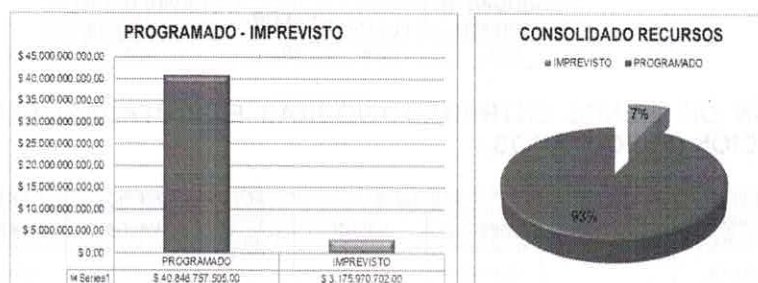

Gráfica No 1: Consolidado Recursos Mantenimientos Programados – Imprevistos. Con referencia valor asignado a la fecha.



Gráfica No 2: Distribución recursos por componentes con referencia valor asignado a la fecha.

OBSERVACIONES:

- La situación de la facturación a fecha del presente informe se encuentra de la siguiente manera acuerdo recursos de cada vigencia, así:

VIGENCIA 2021	
FACTURADO	PEND. FACTURAR
\$ 24.786.862.312,00	\$ 0,00
100,0%	0,0%
VIGENCIA 2022	
FACTURADO	PEND. FACTURAR
\$ 6.977.187.157,00	\$ 24.349.181.504,60
22,3%	77,7%

En la facturación global del contrato, se encuentra en un 56,61% conforme al valor total contratado.

- A fecha de corte del presente informe de supervisión conforme a la recepción total y parcial de las actividades objeto del contrato, se encuentra en **86,30%** de ejecución con relación a los recursos autorizados a la fecha (\$ 44.022.728.207,00).



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 7 de 12

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Con fecha 8 de abril de 2022, se firmó la segunda modificación al contrato No 002 ARC-JOLA-2021, que consistió en la segunda adición de recursos por un valor de \$ 16.618.700.990,00, Primera prórroga en tiempo hasta el 31 de agosto de 2021 y Modificación anexo "B" Propuesta Económica – "Aceros Casco" reajuste a las tarifas en cuatro (04) ítems.
- Teniendo en cuenta la situación que ha generado la pandemia del COVID-19, se están realizando los aislamientos preventivos del personal técnico de COTECMAR de acuerdo con los protocolos actuales establecidos por ARC y COTECMAR en el marco de prevención y propagación de la pandemia COVID-19.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, no encontrando ninguna novedad.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de abril de 2022, suscrito por el Revisor Fiscal Vanesa Karina Taborda Jiménez, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha entre el 1 al 31 de marzo de 2022, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos (Tabla Matriz anexa) del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que NO HAY materialización de estos.


No	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le	Tratamiento/controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
										Periodicidad monitoreo / Cuando?

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL			
	Proceso: Adquisiciones			Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07		Rige a partir de: 07/05/2020	Página 8 de 12

5	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación
7	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	Entidad	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	indeterminado
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación negocial.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	Entidad	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no pérdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	semanal
9	General	Externo	Planeación	Social o político	Crisis económica producto de una pandemia	Consecuencias en cumplimiento de las obligaciones del contratista, variación en los precios de los bienes y servicios contratados	contratista	Realizar seguimiento a las leyes normas presidenciales	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	semanal

Lo anterior se verifica semanalmente a través de videoconferencia donde participan el Gerente de Proyecto, Supervisor General, supervisores técnicos, contratista, verificando las obligaciones y compromisos específicos pactados semanalmente.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

ARC "JUAN RICARDO OYOLA VERA" – Trabajos de mantenimiento.	
	
Aplicación Sanblasting casco	Aplicación capa pintura anticorrosiva casco



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 9 de 12




Aplicación capa pintura anticorrosiva casco




Instalación Ánodos de sacrificio

ARC GOLFO DE URABA– Trabajos de mantenimiento.

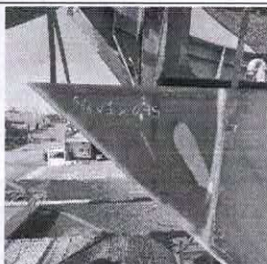

Mantenimiento Rampa – cambio de acero

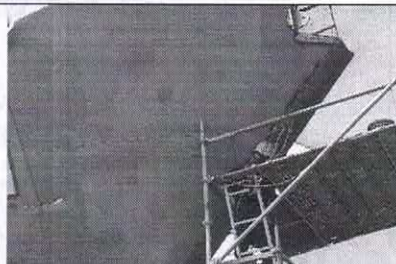

Mantenimiento Rampa – cambio de acero



Mantenimiento Rampa – Pintura



Mantenimiento Rampa – Cambio Bujes



Mantenimiento Rampa – Cambio Bujes



Mantenimiento Rampa - Instalación



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL



Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA


Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 10 de 12

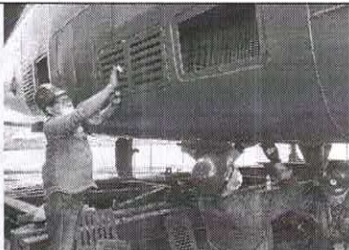	
Mantenimiento rejillas cajas de mar	Rutina y preparación de superficie cubierta de carga
	
Aplicación piso antideslizante cubierta de carga	Aplicación piso antideslizante cubierta de carga
	
Aplicación piso antideslizante cubierta de carga	Aplicación piso antideslizante cubierta de carga

ARC "7 DE AGOSTO" – Trabajos de mantenimiento.

	
Maniobra de Varada	Maniobra de Varada

Q



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 11 de 12




Limpieza casco




Limpieza casco



Desmonte Hélices



Desmonte Hélices



Desmonte Ejes de propulsión



Desmonte Ejes de propulsión



Desmonte Ejes de propulsión



Desmonte Ejes de propulsión

ARC "NARIÑO" – Trabajos de mantenimiento.



Mantenimiento Motores Propulsores



Mantenimiento Motores Propulsores



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 12 de 12



Mantenimiento Motores Propulsores

ARC "MANACACIAS" – Trabajos de mantenimiento.



Maniobra de varada



Maniobra de varada

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

Atentamente,

CNEIN Ricardo José Farfán Gómez
C.C. N°. 7.919.033 de Cartagena.
Celular No 312 3057396
Ricardo.farfan@armada.mil.co

23	FNC	ACC. INDEPENDIENTE	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	11/01/2021	PM	\$ 161,201,320	10 de junio de 2021	22 de agosto de 2021	100%	\$ 161,201,320	\$ 0	100%	\$ 161,201,320.00
24	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	REPARACIÓN DE UNDA DE CALDO DE LABORATORIO 2 CALDO CALDO	10/05/2018	MM	\$ 11,399,400	10 de junio de 2021	2 de julio de 2021	100%	\$ 11,399,400	\$ 0	100%	\$ 11,399,400.00
25	FNC	ACC. INDEPENDIENTE	MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	11/01/2021	PM	\$ 1,641,171,700	11 de junio de 2021	20 de octubre de 2021	100%	\$ 1,641,171,700	\$ 0	100%	\$ 1,641,171,700.00
26	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	MM	\$ 1,320,400	11 de junio de 2021	20 de octubre de 2021	100%	\$ 1,320,400	\$ 0	100%	\$ 1,320,400.00
27	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	EVALUACIÓN MOTORES Y PROPIEDADES ACC. VALLE DEL CAUCA	10/05/2018	PM	\$ 1,320,400	11 de junio de 2021	2 de julio de 2021	100%	\$ 1,320,400	\$ 0	100%	\$ 1,320,400.00
28	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	SISTEMAS ALUMINOS	10/05/2018	PM	\$ 308,759,400	15 de junio de 2021	12 de noviembre de 2021	100%	\$ 308,759,400	\$ 0	100%	\$ 308,759,400.00
29	COMAC	BR. ASES	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA CASOS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CORRIENTE	10/05/2018	PM	\$ 320,575,300	16 de junio de 2021	10 de diciembre de 2021	100%	\$ 320,575,300	\$ 0	100%	\$ 320,575,300.00
30	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 689,200,100	20 de junio de 2021	13 de octubre de 2021	100%	\$ 689,200,100	\$ 0	100%	\$ 689,200,100.00
31	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
32	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
33	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
34	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
35	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
36	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
37	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
38	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
39	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
40	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00
41	FNC	ACC. CALDO DE LABORATORIO	UNDA DE SERVO MANTENIMIENTO 8000 CASAS MOTOR PROPIEDAD DE ACC. INDEPENDIENTE	10/05/2018	PM	\$ 637,550,512	20 de junio de 2021	21 de octubre de 2021	100%	\$ 637,550,512	\$ 0	100%	\$ 637,550,512.00

SE	FINC	ARC TENDINA	DESCRIPCION	ITEM	VALOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROG.	VALOR	PROG.	VALOR
98	FINC	ARC TENDINA	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROPULSION - BALANCEO DINAMICO HELICE	10000867		11 de febrero de 2022	26 de marzo de 2022	100%	\$ 23 150.000	100%	\$ 23 150.000.00
			MANTENIMIENTO RED ELECTRICA 440VAC 220VAC 10MAC-10AC	10000868							
			MANTENIMIENTO SISTEMA DE VADO SANITARIOS	10000869							
			MANTENIMIENTO RECOMENDADO CUBIERTAS INTERIORES	10000870							
			MANTENIMIENTO COMPACTADOR DE BASURA	10000871							
			MANTENIMIENTO RECOMENDADO CUBIERTAS EXTERIORES	10000872							
			RENTAS DE ARRANQUE SENSORICA	10000873							
			MANTENIMIENTO EXAMENES REDUCTORES	10000874							
			MANTENIMIENTO GRUPO	10000875							
			MANTENIMIENTO BOMBA SALVAVIDAS	10000876							
99	FINC	ARC 2016 JULIO	MANTENIMIENTO BOMBA SALVAVIDAS POLARES	10000877	\$ 2 000.000.000	11 de febrero de 2022	31 de marzo de 2022	80%	\$ 1 600.000.000	84%	\$ 1 600.000.000.00
			MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE COMPRIMIDO	10000878							
			MANTENIMIENTO PLANTA DESALZADORA	10000879							
			MANTENIMIENTO TUBERIAS SISTEMAS AGUAS DRESSES	10000880							
			ACORDADO AGUA POTABLE	10000881							
			MANTENIMIENTO PLANTA FROGRIFICA	10000882							
			MANTENIMIENTO CUARTO COMPRESOR ALUMINAR PRIA	10000883							
			MANTENIMIENTO SISTEMA DE GOBIERNO	10000884							
			MANTENIMIENTO SISTEMA DE GOBIERNO	10000885							
			MANTENIMIENTO CONSERVADOR PLANTA AIRE	10000886							
100	FINC	ARC 7 DE AGOSTO	SECCION DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) MOTORES	10000887		27 de febrero de 2022	10 de junio de 2022	50%	\$ 12 077.64	34%	\$ 353.960.000.00
			ASISTENCIA TECNICA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	10000888							
			PROXIMA HAT Y SAT	10000889							
			MITO DE TURBOCOMPRESOR (MANO DE OBRA)	10000890							
			INSPECCION SUBESTACIONES Y MANO DE OBRA	10000891							
			INDICACIONES BARRIDO RELATIVO	10000892							
			FASE DDE I	10000893							
			PRUEBA DE VIBRACIONES ANTES DE LA SUBIDA Y DESPUES DE LA BAJADA	10000894							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000895							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000896							
101	FINC	ARC RICHARDO OYOLA	RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000897	\$ 1 000.000.000	27 de febrero de 2022	30 de junio de 2022	40%	\$ 800.000.000	19%	\$ 1 077.232.720.00
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000898							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000899							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000900							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000901							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000902							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000903							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000904							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000905							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000906							
102	FINC	ARC RICHARDO OYOLA	RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000907	\$ 1 000.000.000	27 de febrero de 2022	30 de junio de 2022	40%	\$ 800.000.000	5%	\$ 851.637.960.00
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000908							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000909							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000910							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000911							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000912							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000913							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000914							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000915							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000916							
103	FINC	ARC RICHARDO OYOLA	RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000917	\$ 1 000.000.000	27 de febrero de 2022	30 de junio de 2022	40%	\$ 800.000.000	100%	\$ 1 077.232.720.00
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000918							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000919							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000920							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000921							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000922							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000923							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000924							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000925							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000926							
104	FINC	ARC RICHARDO OYOLA	RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000927	\$ 1 000.000.000	27 de febrero de 2022	30 de junio de 2022	40%	\$ 800.000.000	100%	\$ 1 077.232.720.00
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000928							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000929							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000930							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000931							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000932							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000933							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000934							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000935							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000936							
105	FINC	ARC RICHARDO OYOLA	RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000937	\$ 1 000.000.000	27 de febrero de 2022	30 de junio de 2022	40%	\$ 800.000.000	100%	\$ 1 077.232.720.00
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000938							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000939							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000940							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000941							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000942							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000943							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000944							
			RENTAS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CURVA BAO TUDO Y ESTRUCTURAL	10000945							
			ADICION DE AREAS PARA EL CAMBIO DE ACEROS	10000946							

121	FIP	ARC 7 DE AGOSTO	10112143 10112151 10112153 10112168	PM	\$ 533 351 420	11 de marzo de 2022	30 de junio de 2022	81%	\$ 20 699 500	\$ 533 371 420.00	4%	
122	FND	ARC JAMACACAS	10112664	PM	\$ 470 703 000	11 de marzo de 2022	30 de junio de 2022	47%		\$ 470 703 000.00	5%	
123	FIS	ARC MIGUEL SILVA	10103008	PM	\$ 24 778 700	14 de marzo de 2022	30 de junio de 2022	50%		\$ 24 778 700.00	0%	
124	FIP	ARC 7 DE AGOSTO	10112749	PM	\$ 33 889 200	23 de marzo de 2022	15 de mayo de 2022	0%		\$ 33 889 200.00	0%	
125	FIP	ARC JAMARU	10107916	PM	\$ 140 462 500	13 de abril de 2022	21 de junio de 2022	25%		\$ 140 462 500.00	0%	
126	FIP	ARC BAHIA MALAGA	10112826 10112828 10112829 10112830 10112831 10112832 10112833 10112834 10112835 10112836 10112837 10112838 10112839 10112840 10112841 10112842 10112843 10112844 10112845 10112846 10112847 10112848 10112849 10112850 10112851 10112852 10112853 10112854 10112855 10112856 10112857 10112858 10112859 10112860 10112861 10112862 10112863 10112864 10112865 10112866 10112867 10112868 10112869 10112870 10112871 10112872 10112873 10112874 10112875 10112876 10112877 10112878 10112879 10112880 10112881 10112882 10112883 10112884 10112885 10112886 10112887 10112888 10112889 10112890 10112891 10112892 10112893 10112894 10112895 10112896 10112897 10112898 10112899 10112900 10112901 10112902 10112903 10112904 10112905 10112906 10112907 10112908 10112909 10112910 10112911 10112912 10112913 10112914 10112915 10112916 10112917 10112918 10112919 10112920 10112921 10112922 10112923 10112924 10112925 10112926 10112927 10112928 10112929 10112930 10112931 10112932 10112933 10112934 10112935 10112936 10112937 10112938 10112939 10112940 10112941 10112942 10112943 10112944 10112945 10112946 10112947 10112948 10112949 10112950 10112951 10112952 10112953 10112954 10112955 10112956 10112957 10112958 10112959 10112960 10112961 10112962 10112963 10112964 10112965 10112966 10112967 10112968 10112969 10112970 10112971 10112972 10112973 10112974 10112975 10112976 10112977 10112978 10112979 10112980 10112981 10112982 10112983 10112984 10112985 10112986 10112987 10112988 10112989 10112990 10112991 10112992 10112993 10112994 10112995 10112996 10112997 10112998 10112999 10113000	PM	\$ 415 612 000	13 de abril de 2022	15 de junio de 2022	21%	\$ 415 612 000.00	0%	\$ 415 612 000.00	
127	FIC	ARC ALBANYE PAOLLA	10113007 10113008 10113009 10113010 10113011 10113012 10113013 10113014 10113015 10113016 10113017 10113018 10113019 10113020 10113021 10113022 10113023 10113024 10113025 10113026 10113027 10113028 10113029 10113030 10113031 10113032 10113033 10113034 10113035 10113036 10113037 10113038 10113039 10113040 10113041 10113042 10113043 10113044 10113045 10113046 10113047 10113048 10113049 10113050 10113051 10113052 10113053 10113054 10113055 10113056 10113057 10113058 10113059 10113060 10113061 10113062 10113063 10113064 10113065 10113066 10113067 10113068 10113069 10113070 10113071 10113072 10113073 10113074 10113075 10113076 10113077 10113078 10113079 10113080 10113081 10113082 10113083 10113084 10113085 10113086 10113087 10113088 10113089 10113090 10113091 10113092 10113093 10113094 10113095 10113096 10113097 10113098 10113099 10113100 10113101 10113102 10113103 10113104 10113105 10113106 10113107 10113108 10113109 10113110 10113111 10113112 10113113 10113114 10113115 10113116 10113117 10113118 10113119 10113120 10113121 10113122 10113123 10113124 10113125 10113126 10113127 10113128 10113129 10113130 10113131 10113132 10113133 10113134 10113135 10113136 10113137 10113138 10113139 10113140 10113141 10113142 10113143 10113144 10113145 10113146 10113147 10113148 10113149 10113150 10113151 10113152 10113153 10113154 10113155 10113156 10113157 10113158 10113159 10113160 10113161 10113162 10113163 10113164 10113165 10113166 10113167 10113168 10113169 10113170 10113171 10113172 10113173 10113174 10113175 10113176 10113177 10113178 10113179 10113180 10113181 10113182 10113183 10113184 10113185 10113186 10113187 10113188 10113189 10113190 10113191 10113192 10113193 10113194 10113195 10113196 10113197 10113198 10113199 10113200	PM	\$ 1 522 461 500	13 de abril de 2022	28 de julio de 2022	54%	\$ 1 522 461 500.00	0%	\$ 1 522 461 500.00	
128	FIC	ARC GOLFO DE URBIA	10112726	PM	\$ 15 910 710	13 de abril de 2022	2 de mayo de 2022	100%	\$ 15 910 710	\$ 15 910 710.00	100%	\$ 15 910 710.00
129	FIS	ARC PMP 331 HONDERAFT	10001962	PM	\$ 66 946 400	13 de abril de 2022	20 de mayo de 2022	52%		\$ 66 946 400.00	0%	\$ 66 946 400.00
130	FIS	ARC PMP 333 HONDERAFT	10001961	PM	\$ 74 873 900	13 de abril de 2022	20 de mayo de 2022	5%		\$ 74 873 900.00	0%	\$ 74 873 900.00
131	FIP	ARC 7 DE AGOSTO	10112771	PM	\$ 152 433 300	13 de abril de 2022	11 de julio de 2022	2%		\$ 152 433 300.00	0%	\$ 152 433 300.00
132	FIS	ARC TECN ELEC CRISTIAN REYES HOLZUN	10001918	PM	\$ 85 712 200	13 de abril de 2022	20 de mayo de 2022	65%		\$ 85 712 200.00	0%	\$ 85 712 200.00
133	FIS	ARC OPM FILIZOHO HOMARI	10113207	PM	\$ 53 959 800	13 de abril de 2022	15 de mayo de 2022	14%		\$ 53 959 800.00	0%	\$ 53 959 800.00
134	FIP	ARC CN MEDARDO MONZON CORONADO	10112953 10112954 10112955 10112956 10112957 10112958 10112959 10112960 10112961 10112962 10112963 10112964 10112965 10112966 10112967 10112968 10112969 10112970 10112971 10112972 10112973 10112974 10112975 10112976 10112977 10112978 10112979 10112980 10112981 10112982 10112983 10112984 10112985 10112986 10112987 10112988 10112989 10112990 10112991 10112992 10112993 10112994 10112995 10112996 10112997 10112998 10112999 10113000	PM	\$ 1 179 859 800	13 de abril de 2022	31 de agosto de 2022	2%	\$ 1 179 859 800.00	0%	\$ 1 179 859 800.00	
135	FND	ARC RIO ORRICO	10112963	PM	\$ 24 236 700	13 de abril de 2022	2 de mayo de 2022	30%		\$ 24 236 700.00	0%	\$ 24 236 700.00
136	FIC	ARC GOLFO DE URBIA	10112999	PM	\$ 53 805 100	13 de abril de 2022	20 de mayo de 2022	27%		\$ 53 805 100.00	0%	\$ 53 805 100.00
137	FIC	ARC ROZEPERENTE	10001742	PM	\$ 118 813 900	13 de abril de 2022	1 de julio de 2022	1%		\$ 118 813 900.00	0%	\$ 118 813 900.00
138	FND	ARC PUERTO LOPEZ	10110384	PM	\$ 64 620 100	13 de abril de 2022	2 de agosto de 2022	31%		\$ 64 620 100.00	0%	\$ 64 620 100.00
139					\$ 4 451 407 557.00			86.5%	\$ 37 764 044 460.00	\$ 12 558 078 738.00		\$ 44 022 728 207.00

CONSOLIDADO RECURSOS ASIGNADOS		TOTAL EJECUTADO	
FECHA	ASIGNADO	DETERMINACIONES	TOTAL EJECUTADO
10/01/2022	\$ 2 201 693 524.00		\$ 2 201 693 524.00
10/02/2022	\$ 1 500 000 000.00		\$ 3 701 693 524.00
10/03/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 4 901 693 524.00
10/04/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 6 101 693 524.00
10/05/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 7 301 693 524.00
10/06/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 8 501 693 524.00
10/07/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 9 701 693 524.00
10/08/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 10 901 693 524.00
10/09/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 12 101 693 524.00
10/10/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 13 301 693 524.00
10/11/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 14 501 693 524.00
10/12/2022	\$ 1 200 000 000.00		\$ 15 701 693 524.00
TOTAL	\$ 14 451 407 557.00		\$ 14 451 407 557.00


 JUAN GOMEZ
 002-ARC-JUL-A-2021

