

**Informe de Gestión No. 19**  
**Contrato de Adhesión No. 15 Municipio de Planeta Rica**  
**Período del 01 al 30 de junio del 2022**

**Elaborado por:**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**  
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**  
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Junio 30 de 2022**



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1 Informe Administrativo y Financiero .....</b>    | <b>3</b>  |
| 1.1 Informe Administrativo .....                      | 3         |
| 1.2 Informe Financiero .....                          | 3         |
| <b>2 Informe Jurídico .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3 Informe Técnico.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 3.1 Informe Convocatoria .....                        | 5         |
| 3.2 Informe Acreditación .....                        | 5         |
| 3.3 Informe Evaluación.....                           | 6         |
| 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación..... | 7         |
| 3.5 Informe de Interventoría .....                    | 7         |
| <b>4 Atención al Emprendedor.....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RETOS .....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                    | <b>12</b> |

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 15; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de junio de 2022, del contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de junio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de junio del año 2022.

## 1 Informe Administrativo y Financiero

### 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de Adhesión</b>                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Entidad Adherente</b>  | Municipio de Planeta Rica                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                                                    | 15/12/2020                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Duración</b>                                                                           | Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor Total del Contrato</b>                                                           | \$1.377.803.000                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor Aporte SENA</b>                                                                  | \$877.803.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor Aporte Aliado</b>                                                                | \$500.000.000                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del Supervisor por parte del SENA</b>                                           | Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada</b>                               | No Designado a la fecha                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del Contacto en Entidad Aliada</b>                                              | Roger Hernández Dávila                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cargo del Contacto en Entidad Aliada</b>                                               | Secretario de Infraestructura y Planeación del municipio de Planeta Rica                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Número Telefónico o Celular</b>                                                        | 3006162420                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co">infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co</a><br><a href="mailto:rogerhernandezd@gmail.com">rogerhernandezd@gmail.com</a> |
| <b>Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia</b> | Carlos Rosado                                                                                                                                                                                                                               | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:crosado@unal.edu.co">crosado@unal.edu.co</a>                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional</b>                               | Alirio Rodríguez                                                                                                                                                                                                                            | <b>Correo Electrónico</b> | <a href="mailto:alrodriguezi@unal.edu.co">alrodriguezi@unal.edu.co</a>                                                                                                                                       |

Durante el período del 01 al 30 de junio del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 15.

### 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO\_DAV\_9089\_JUNIO\_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.


|                                         |                                     |                                                        |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cuenta de Ahorros No</b>             | 0077-0086-9089                      | <b>Banco</b>                                           | DAVIVIENDA               |
| <b>CDP</b>                              | 318                                 | <b>Valor</b>                                           | \$500.000.000            |
| <b>RP</b>                               | Sin Información                     | <b>Valor</b>                                           | \$500.000.000            |
| <b>Valor de Desembolso</b>              | \$500.000.000                       | <b>Fecha del Desembolso</b>                            | 29/12/2020               |
| <b>Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No</b> | 70083603669<br>70083603708          | <b>Fiduciaria</b>                                      | Popular                  |
| <b>Valor Trasladado a la Fiducia</b>    | \$327.131.891,5<br>\$166.624.881,00 | <b>Fecha del Traslado</b>                              | 16/09/2021<br>25/10/2021 |
| <b>Saldo Total en Fiducia</b>           | \$ 506.430.810                      | <b>Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia</b> | \$ 11.352.513            |

|                                                                |                  |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Valor Total de Convocatoria                                    | \$ 1.377.803.000 | Valor Aporte Aliado a la Convocatoria                                                    | \$ 500.000.000 |
| Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN                         | \$ 1.360.599.124 | Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado                       | \$ 493.756.772 |
| Valor planes con desistimiento                                 | \$ 115.493.460   | Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado                               | \$ 41.912.182  |
| TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN   | \$ 132.697.336   | TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado | \$ 48.155.410  |
| Valor Total valor comprometido                                 | \$ 1.366.791.200 | Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado                               | \$ 496.003.855 |
| Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio                      | \$ 870.982.065   | Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio                                        | \$ 316.076.415 |
| Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo) | \$ 543           | Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)                        | \$ 378.460     |
| Valor Reintegro Aliado                                         |                  | Fecha de Reintegro                                                                       |                |
| Concepto                                                       |                  |                                                                                          |                |

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 179 perteneciente al municipio de Planeta Rica - Córdoba al 30 de junio de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.245.105.664 equivalente al 90.37%, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento y los resultados del proceso de evaluación del tercer cierre dejando un saldo por comprometer de \$11.011.800.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$870.982.065, equivalentes al 63.72% de los recursos comprometidos y 63.22% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 15 -municipio de Planeta Rica, Córdoba.

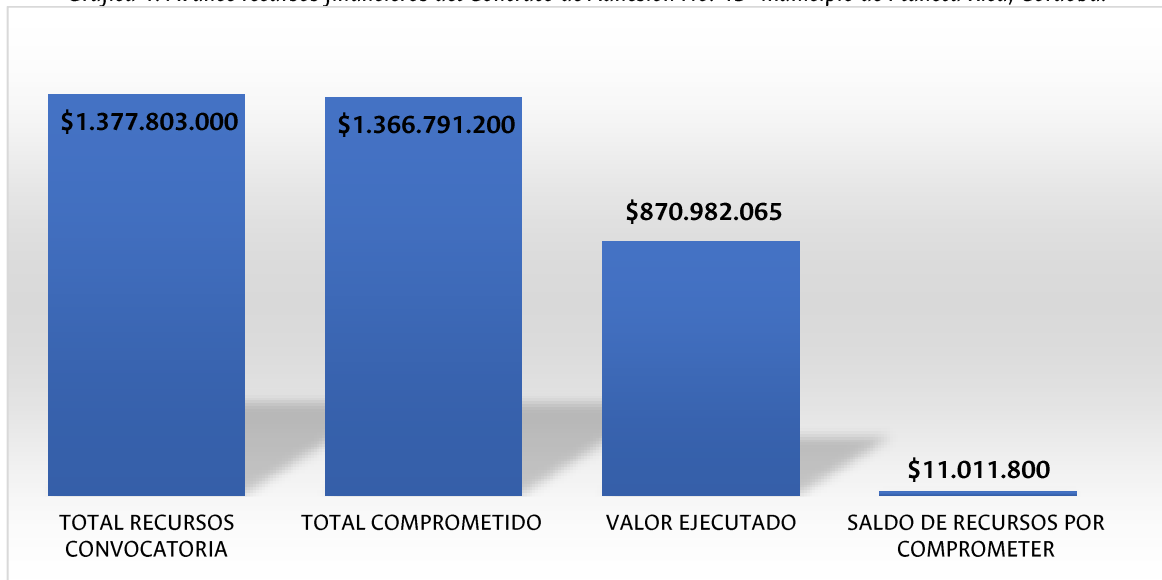

## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de junio del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

### 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

#### 3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 específica para el municipio de Planeta Rica, Córdoba, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

|                             |            |                                   |               |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| Número de Convocatoria      | 179        |                                   |               |
| Fecha de Lanzamiento        | 22/12/2020 | Monto Máximo a Financiar por Plan | \$124.000.000 |
| Fecha de Apertura           | 22/12/2021 | Fecha de Cierre                   | 03/05/2021    |
| Fecha de Cierre Corte No. 1 | 28/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2       | 03/05/2021    |
| Fecha de Cierre Corte No. 3 | 06/06/2022 |                                   |               |

Durante este período del mes de junio de 2022 tuvo lugar el tercer cierre de la convocatoria 179, corte en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios de acuerdo con el informe de planes formalizados (ver anexo 3).

#### 3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de junio de 2022 se llevó a cabo el proceso de acreditación del tercer cierre de la convocatoria 179, como resultado del proceso de acreditación se tiene que 2 plan de negocio de los 2 planes de negocio formalizados fueron acreditados. Los informes de acreditación parcial y final se entregaron de acuerdo con el cronograma de la convocatoria. A continuación, se relacionan los informes y fechas de entrega.

| Fecha      | Actividad                                                | Soportes |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 09/06/2022 | Publicación de informe parcial de acreditación CV 179 3C | Anexo 4  |
| 13/06/2022 | Publicación de informe final de acreditación CV 179 3C   | Anexo 5  |

Para efectos de trazabilidad del informe se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No.179 Planeta Rica, para el caso del primer cierre los informes fueron entregados y publicados en el mes de marzo de 2021, en el caso del segundo cierre los informes se publicaron en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

| Número de Convocatoria                  |                |                               |            | 179                          |                 |                   |            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Corte No. 1                             | Fecha Apertura |                               | 22/12/2020 |                              | Fecha de Cierre |                   | 28/02/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 15/03/21       | Número de Planes Formalizados | 17         | Número de Planes Acreditados | 15              | % de Acreditación | 88%        |
| Corte No. 2                             | Fecha Apertura |                               | 01/03/2021 |                              | Fecha de Cierre |                   | 03/05/2021 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 17/05/21       | Número de Planes Formalizados | 8          | Número de Planes Acreditados | 8               | % de Acreditación | 100%       |
| Corte No. 3                             | Fecha Apertura |                               |            |                              | Fecha de Cierre |                   | 06/06/2022 |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 13/06/22       | Número de Planes Formalizados | 2          | Número de Planes Acreditados | 2               | % de Acreditación | 100%       |

### 3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período correspondiente al mes de junio de 2022 se llevó a cabo el proceso de evaluación de los planes de negocio acreditados en el tercer cierre de la convocatoria 179, así mismo, se realizó la publicación del informe preliminar de evaluación de acuerdo con el cronograma de la convocatoria. Se tiene previsto que la publicación del informe final de evaluación se realice el día 01 de julio de 2022. De igual manera se prevé que los resultados del proceso de evaluación sean presentados para su recomendación ante la Comisión Técnica del Fondo Emprender en el mes de julio de 2022 para su posterior aprobación en el Consejo Directivo Nacional del SENA.

| Fecha      | Actividad                                          | Soportes |
|------------|----------------------------------------------------|----------|
| 23/06/2022 | Publicación Primer informe de evaluación CV 179 C3 | Anexo 6  |

A continuación, se presentan los resultados del proceso de evaluación de la convocatoria No. 179 municipio de Planeta Rica, Córdoba realizado para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

| Número de Convocatoria                |                |                            |            | 179                           |                 |                    |            |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Corte No. 1                           | Fecha Apertura |                            | 22/12/2020 |                               | Fecha de Cierre |                    | 28/02/2021 |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/04/21       | Número de Planes Evaluados | 15         | Número de Planes Viabilizados | 8               | % de Viabilización | 53%        |

|                                       |                       |                            |                   |                               |                        |                          |                   |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 06/05/21              | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21          | Número de Planes a Financiar  | 8                      | Valor Planes a Financiar | \$901.446.603     |
| <b>Corte No. 2</b>                    | <b>Fecha Apertura</b> |                            | <b>01/03/2021</b> |                               | <b>Fecha de Cierre</b> |                          | <b>03/05/2021</b> |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 08/06/21              | Número de Planes Evaluados | 8                 | Número de Planes Viabilizados | 5                      | % de Viabilización       | 62%               |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | 21/07/21              | Fecha de Consejo Directivo | 03/08/21          | Número de Planes a Financiar  | 4                      | Valor Planes a Financiar | \$459.152.521     |
| <b>Corte No. 3</b>                    | <b>Fecha Apertura</b> |                            |                   |                               | <b>Fecha de Cierre</b> |                          |                   |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 01/07/22              | Número de Planes Evaluados | 2                 | Número de Planes Viabilizados | 2                      | % de Viabilización       | 100%              |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación  | Julio 2022            | Fecha de Consejo Directivo | Julio 2022        | Número de Planes a Financiar  | 1                      | Valor Planes a Financiar | \$121.685.536     |

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 30 de junio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

### 3.5 Informe de Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de junio de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor detalle ver anexo 7. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179


## Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios     | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO  |
|----|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 74041               | 323-179-2021 | PRONTA MODA                 | 31/08/2021      | 31/08/2022  | \$106.038.734      | 140,00%              | 0,00%                 | 100,00%                     | 77,99%                              | VIGENTE |
| 2  | 74042               | 324-179-2021 | PORCICOLA LA CANDELARIA SAS | 8/09/2021       | 8/09/2022   | \$123.809.688      | 0,00%                | 0,00%                 | 125,00%                     | 97,41%                              | VIGENTE |
| 3  | 74045               | 325-179-2021 | TRANSENVIOS                 | 26/08/2021      | 26/08/2022  | \$112.822.133      | 0,00%                | 11,11%                | 87,50%                      | 33,82%                              | VIGENTE |
| 4  | 74047               | 326-179-2021 | GRANJA APICOLA LA FORTUNA   | 26/08/2021      | 26/08/2022  | \$123.540.550      | 0,00%                | 0,00%                 | 62,50%                      | 77,52%                              | VIGENTE |
| 5  | 74049               | 327-179-2021 | ZIRBOX S.A.S                | 15/09/2021      | 15/09/2022  | \$109.696.552      | 40,00%               | 0,00%                 | 28,57%                      | 66,92%                              | VIGENTE |
| 6  | 74050               | 328-179-2021 | MIRANDA                     | 10/09/2021      | 10/09/2022  | \$100.477.519      | 50,00%               | 25,00%                | 100,00%                     | 75,20%                              | VIGENTE |
| 7  | 74051               | 329-179-2021 | CODEFRUT SAS                | 1/09/2021       | 1/09/2022   | \$101.228.639      | 20,00%               | 22,22%                | 0,00%                       | 80,64%                              | VIGENTE |
| 8  | 74060               | 330-179-2021 | AQUAZUL                     | 30/08/2021      | 30/08/2022  | \$123.832.788      | 16,67%               | 0,00%                 | 100,00%                     | 81,43%                              | VIGENTE |

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador requerido para la convocatoria de recursos mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 7. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 1C.

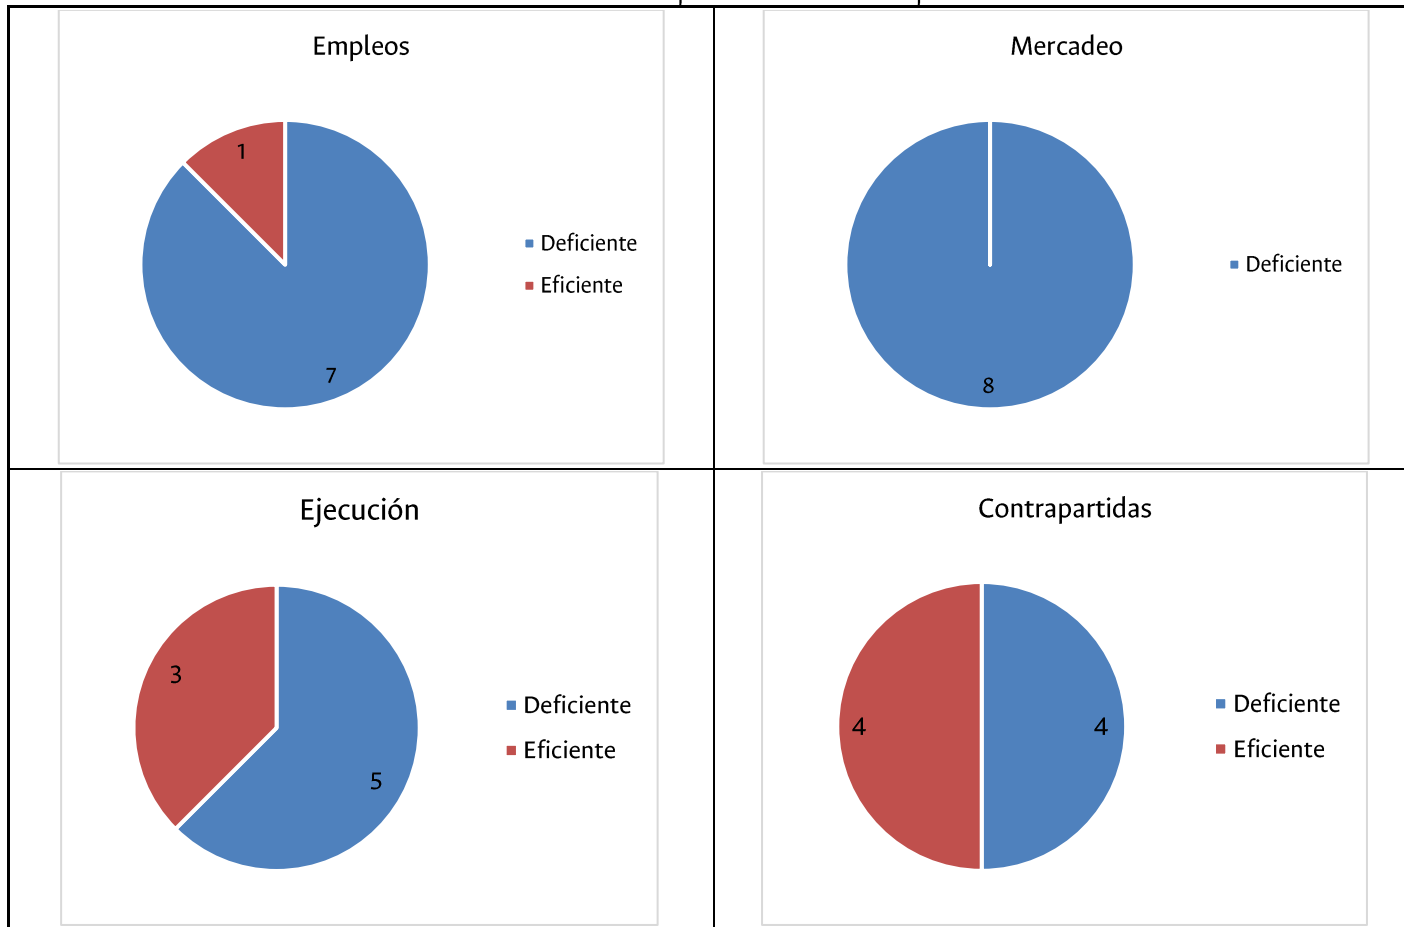


## Planes de negocio segundo cierre


Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios       | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO   |
|----|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1  | 74012               | 375-179-2021 | STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ    | 9/11/2021       | 9/11/2022   | \$115.493.460      | 0,00%                | 0,00%                 | 25,00%                      | 0,00%                               | RENUNCIA |
| 2  | 74044               | 376-179-2021 | PESCADERIA EL DIAMANTE        | 8/11/2021       | 8/11/2022   | \$123.800.666      | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                       | 66,26%                              | VIGENTE  |
| 3  | 74217               | 377-179-2021 | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S | 29/10/2021      | 29/10/2022  | \$113.090.846      | 0,00%                | 0,00%                 | 62,50%                      | 80,21%                              | VIGENTE  |
| 4  | 74323               | 378-179-2021 | YERITAS SNACK S.A.S           | 29/10/2021      | 29/10/2022  | \$106.767.549      | 0,00%                | 11,11%                | 71,43%                      | 27,71%                              | VIGENTE  |

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 9. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 2C

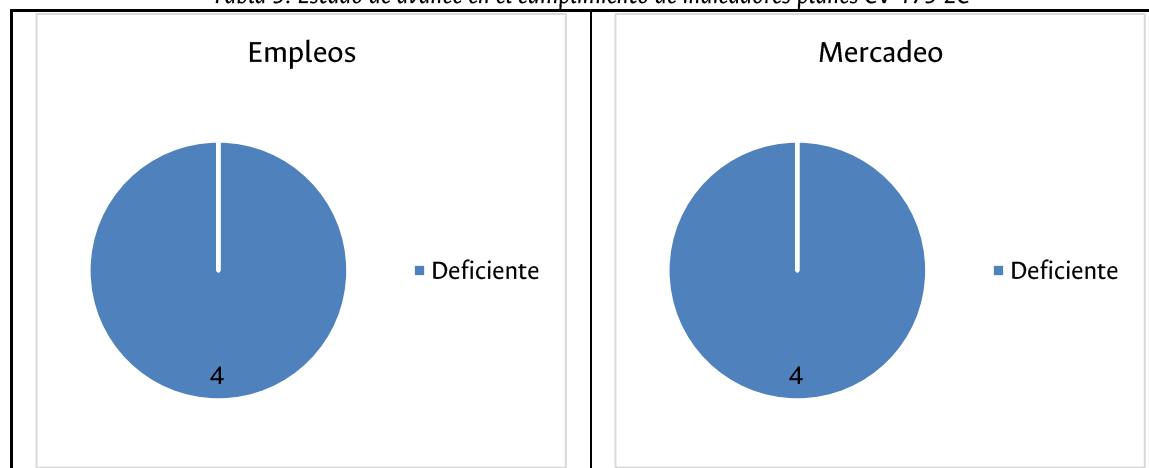

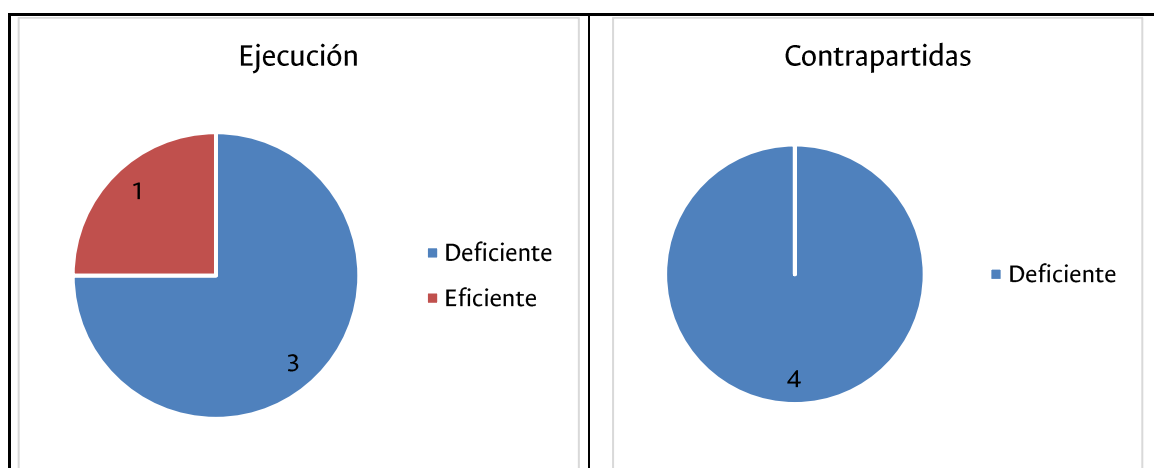

#### 4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de junio de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

#### CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Córdoba.

| Consolidado General Convocatoria                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Total recursos de la convocatoria                  | \$ 1.377.803.000 |
| Número total de planes formalizados                | 27               |
| Número total de planes acreditados                 | 25               |
| Número total de planes viables                     | 15               |
| Número de planes financiados                       | 13               |
| Número de planes aprobados en CDN                  | 12               |
| Total recursos aprobados en CDN                    | \$ 1.360.599.124 |
| Número de planes de negocios con desistimientos    | 1                |
| Total recursos planes con desistimientos (-)       | \$ 115.493.460   |
| Planes pendientes de aprobación CDN                | 1                |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN | \$ 121.685.536   |
| Planes de negocios con contrato vigente            | 11               |
| Total recursos comprometidos                       | \$ 1.366.791.200 |
| Saldo de recursos por comprometer                  | \$ 11.011.800    |
| Ejecución acumulada de recursos                    | \$ 870.982.065   |

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 30 de junio de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 179 –tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acreditó 15 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.

2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizó 8 de los 15 planes de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiación en el primer corte de la Convocatoria 179, suman un valor total de \$901.446.603.
3. El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 179, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 –se aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de \$459.152.521.
5. El tercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación se acreditaron los 2 planes de negocio formalizados.
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizó los dos planes de negocios acreditados para un desempeño del 100% de viabilidad. Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos el cierre de la convocatoria se tiene recomendación de financiamiento para un plan de negocios por valor de \$121.685.536. Se espera que los resultados del proceso de evaluación del cuarto cierre sean presentados para recomendación en la Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación del Consejo Directivo del Sena en el mes de julio de 2022.
7. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$115.493.460, correspondiente al plan de negocios ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.
8. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento del proceso de Interventoría.
9. A la fecha los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$ 870.982.065

## PROYECCIONES A JULIO 31 DE 2022

Se espera que los 12 planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 179 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha de sus planes de negocios sin novedades.

Así mismo, se espera que los resultados del proceso de evaluación del tercer cierre sean presentados para recomendación en la Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación del Consejo Directivo del Sena en el mes de julio de 2022

## ANEXOS

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Anexo 1. | EXTRACTO_DAV_9089_JUNIO_2022                         |
| Anexo 2. | Ejecución por Emprendimiento                         |
| Anexo 3. | Informe de Planes formalizados CV 179 C3             |
| Anexo 4. | Informe parcial de acreditación CV 179 C3            |
| Anexo 5. | Informe final de acreditación CV 179 C3              |
| Anexo 6. | Primer preliminar de evaluación CV 179 C3            |
| Anexo 7. | Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179 |

## **ANEXO 1. EXTRACTO\_DAV\_9089\_ JUNIO\_2022**



# DAVIVIENDA



H.78

## CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9089

INFORME DEL MES: JUNIO /2022

Apreciado Cliente

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

TESORERIA\_SAI@UNAL.EDU.CO

|                |                |
|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | \$6,621,144.23 |
| Más Créditos   | \$542.93       |
| Menos Débitos  | \$0.00         |
| Nuevo Saldo    | \$6,621,687.16 |
| Saldo Promedio | \$6,621,144.23 |

| Fecha | Valor      | Doc. | Clase de Movimiento       | Oficina |
|-------|------------|------|---------------------------|---------|
| 30 06 | \$ 542.93+ | 0000 | Rendimientos Financieros. |         |



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:

defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Junio 30

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO               | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO  | TOTAL APORTES     | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO   | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 74041       | PRONTA MODA                   | 179             | \$ 106.038.734,00             | \$ 424.154,94 | \$ 106.462.888,94 | \$ 82.695.523,00   | \$ 330.782,09          | \$ 83.026.305,09  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 23.436.583,84   |
| 74042       | PORCICOLA LA CANDELARIA SAS   | 179             | \$ 123.809.688,00             | \$ 495.238,75 | \$ 124.304.926,75 | \$ 120.597.628,00  | \$ 482.390,51          | \$ 121.080.018,51 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 3.224.908,24    |
| 74045       | TRANSENVIOS                   | 179             | \$ 112.822.133,00             | \$ 451.288,53 | \$ 113.273.421,53 | \$ 38.154.854,50   | \$ 152.619,42          | \$ 38.307.473,92  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 74.965.947,61   |
| 74047       | GRANJA APICOLA LA FORTUNA     | 179             | \$ 123.540.550,00             | \$ 494.162,20 | \$ 124.034.712,20 | \$ 95.765.800,00   | \$ 383.063,20          | \$ 96.148.863,20  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 27.885.849,00   |
| 74049       | ZIRBOX S.A.S                  | 179             | \$ 109.696.552,00             | \$ 438.786,21 | \$ 110.135.338,21 | \$ 73.404.854,00   | \$ 293.619,42          | \$ 73.698.473,42  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 36.436.864,79   |
| 74050       | MIRANDA                       | 179             | \$ 100.477.519,00             | \$ 401.910,08 | \$ 100.879.429,08 | \$ 75.563.050,00   | \$ 302.252,20          | \$ 75.865.302,20  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 25.014.126,88   |
| 74051       | CODEFRUT SAS                  | 179             | \$ 101.228.639,00             | \$ 404.914,56 | \$ 101.633.553,56 | \$ 81.632.009,52   | \$ 326.528,04          | \$ 81.958.537,56  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 19.675.016,00   |
| 74060       | AQUAZUL                       | 179             | \$ 123.832.788,00             | \$ 495.331,15 | \$ 124.328.119,15 | \$ 100.840.069,00  | \$ 403.360,28          | \$ 101.243.429,28 | \$ -                             | \$ -                  | \$ 23.084.689,88   |
| 74012       | STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ    | 179-2           | \$ 115.493.460,00             | \$ 461.973,84 | \$ 115.955.433,84 | \$ -               | \$ -                   | \$ -              | \$ -                             | \$ -                  | \$ 115.955.433,84  |
| 74044       | PESCADERIA EL DIAMANTE        | 179-2           | \$ 123.800.666,00             | \$ 495.202,66 | \$ 124.295.868,66 | \$ 82.028.935,00   | \$ 328.115,74          | \$ 82.357.050,74  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 41.938.817,92   |
| 74217       | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S | 179-2           | \$ 113.090.846,00             | \$ 452.363,38 | \$ 113.543.209,38 | \$ 90.714.834,00   | \$ 362.859,34          | \$ 91.077.693,34  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 22.465.516,05   |
| 74323       | YERITAS SNACK S.A.S           | 179-2           | \$ 106.767.549,00             | \$ 427.070,20 | \$ 107.194.619,20 | \$ 29.584.508,00   | \$ 118.338,03          | \$ 29.702.846,03  | \$ -                             | \$ -                  | \$ 77.491.773,16   |
| TOTAL       |                               |                 | \$ 1.360.599.124              | \$ 5.442.396  | \$ 1.366.041.520  | \$ 870.982.065     | \$ 3.483.928           | \$ 874.465.993    | \$ -                             | \$ -                  | \$ 491.575.527     |

**ANEXO 3. INFORME DE PLANES FORMALIZADOS CV 179 C3**

**Fondo Emprender**

**CONVOCATORIA CERRADA No. 179 MUNICIPIO DE PLANETA RICA Tercer Corte**

**Presupuesto: 1,377,803,000.00**

**Fecha de cierre: 6/6/2022 11:59:00 PM**

| ID    | Nombre               | Ciudad       | Departamento | Institución    | Unidad                                             | Recursos Solicitados (SMLV) | Recursos solicitados \$ | Fecha Formalización | Sector                                                                  | Subsector                                                                                    |
|-------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74058 | CONTADORES ASOCIADOS | Planeta Rica | Córdoba      | SENA - Córdoba | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba | 122                         | 107,091,966.00          | 6/6/2022            | SECCIÓN M (4AC 2020)- Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria |
| 81696 | FRUTYCAMP            | Planeta Rica | Córdoba      | SENA - Córdoba | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba | 119                         | 104,458,557.00          | 6/6/2022            | SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufactureras                         | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos                   |

## **Anexo 4. Informe Parcial de Acreditación Cv 179 C3**

Bogotá D.C., 09 de junio de 2022

**B.FI.1-[T]-1299-334-22**

Doctora

**LEIDY JHOANNA SIERRA**

Supervisora

Contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299

La ciudad

**Asunto:** Entrega de informe parcial de acreditación las convocatorias 176 – Planadas, cuarto cierre, 177 – Caldas, quinto cierre, 179 – Planeta Rica, tercer cierre

Respetada doctora Leidy, reciba un cordial saludo.

De conformidad con el contrato CO.1.PCCNTR.1471299, en la *Clausula 1.3.1 ACREDITACIÓN: a) Adelantar el proceso de acreditación para cada cierre de las convocatorias abiertas y remitir al SENA el informe respectivo una vez culmina el proceso*, nos permitimos remitir el informe parcial de acreditación relacionado con las convocatorias 176 – Planadas, cuarto cierre, 177 – Caldas, quinto cierre y 179 – Planeta Rica tercer cierre, para su revisión y publicación en la página del Fondo Emprender el día **09 de junio de 2022 antes de las 11:59 P.M.**

La revisión del proceso de acreditación se realizó de acuerdo con los lineamientos técnicos expresados en los términos de referencia de cada una de las convocatorias relacionadas. En este sentido, el siguiente es el estado de acreditación parcial:

| Convocatoria | Número de planes formalizados | Número de planes acreditados |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 176 4C       | 2                             | 1                            |
| 177 5C       | 2                             | 2                            |
| 179 3C       | 2                             | 2                            |

Tabla 1. Acreditación parcial

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



**ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ**

Director y/o Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020\_fibog@unal.edu.co

Revisó: Nelsy Edith Cely A. Coordinadora Operativa

Anexos:

Informe Parcial de Acreditación Conv 176 4CTE.xlsx

Informe Parcial de Acreditación Conv 177 5CTE.xlsx

Informe Parcial de Acreditación Conv 179 3CTE.xlsx

| Consecutivo | ID Plan de Negocio | Nombre Plan de Negocio | Concepto   | Detalle |
|-------------|--------------------|------------------------|------------|---------|
| 1           | 74058              | CONTADORES ASOCIADOS   | ACREDITADO |         |
| 2           | 81696              | FRUTYCAMP              | ACREDITADO |         |

## **Anexo 5. Informe Final de Acreditación Conv 179 C3**

Bogotá D.C., 13 de junio de 2022

**B.FI.1-[T]-1299-339-22**

Doctora

**LEIDY JHOANNA SIERRA**

Supervisora

Contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299

La ciudad

**Asunto:** Entrega de informes finales de acreditación convocatorias 176 Planadas cuarto cierre, 177 Caldas quinto cierre, 179 Planeta Rica Tercer cierre y 182 – Barrancabermeja tercer cierre.

Respetada doctora Leidy, reciba un cordial saludo.

De conformidad con el contrato CO.1.PCCNTR.1471299, en la *Clausula 1.3.1 ACREDITACIÓN: a) Adelantar el proceso de acreditación para cada cierre de las convocatorias abiertas y remitir al SENA el informe respectivo una vez culmina el proceso*, nos permitimos remitir el informe final de acreditación relacionado con las convocatorias 176 Planadas cuarto cierre, 177 Caldas quinto cierre, 179 Planeta Rica Tercer cierre y 182 – Barrancabermeja tercer cierre, para su revisión y publicación en la página del Fondo Emprender el día **13 de junio de 2022 antes de las 11:59 P.M.**

La revisión del proceso de acreditación se realizó de acuerdo con los lineamientos técnicos expresados en los términos de referencia de las convocatorias relacionadas. Así mismo le informamos que no se recibieron observaciones sobre los informes de acreditación preliminar publicados el pasado 9 de junio de 2022.

En este sentido, el siguiente es el estado de acreditación final:

| Convocatoria | Número de planes formalizados | Número de planes acreditados |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 176 - 4C     | 2                             | 1                            |
| 177 - 5C     | 2                             | 2                            |
| 179 - 3C     | 2                             | 2                            |
| 182 – 3C     | 2                             | 2                            |

Tabla 1. Acreditación final

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



**ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ**

Director y/o Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020\_fibog@unal.edu.co

Revisó: Nelsy Edith Cely A. Coordinadora Operativa

Anexos:

Informe final de Acreditación Conv 176 4CTE.xlsx

Informe final de Acreditación Conv 177 5CTE.xlsx

Informe final de Acreditación Conv 179 3CTE.xlsx

Informe final de Acreditación Conv 182 3CTE.xlsx

| Consecutivo | ID Plan de Negocio | Nombre Plan de Negocio | Concepto   | Detalle | Observación | Respuesta a observaciones |
|-------------|--------------------|------------------------|------------|---------|-------------|---------------------------|
| 1           | 74058              | CONTADORES ASOCIADOS   | ACREDITADO |         | N.A         | N.A                       |
| 2           | 81696              | FRUTYCAMP              | ACREDITADO |         | N.A         | N.A                       |

## **Anexo 6. Informe Preliminar de Evaluación CV 179 C3**

Bogotá D.C., 23 de junio de 2022.

**B.FI.1 [T]-1299-365-22**

Doctor  
CARLOS GAMBA  
Supervisor  
Contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299  
La ciudad

Asunto: Alcance a Entrega de resultados informe preliminar de evaluación para las convocatorias Fondo Emprender 176-C4 Planadas, 177 – C5 Caldas, 179-C3 Planeta Rica y 182-C3 Barrancabermeja.

Estimado Dr. Gamba, un cordial saludo

Conforme a las obligaciones del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.14.71299 entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA y atendiendo los lineamientos técnicos expresados en los términos de referencia de las convocatorias Fondo 176-C4 Planadas, 177–C5 Caldas, 179-C3 Planeta Rica y 182-C3 Barrancabermeja, y los definidos en el Acuerdo 10 de 2019, se realiza la entrega del informe preliminar de evaluación.

Se entregan resultados para un total de 8 planes de negocios distribuidos de la siguiente manera:

| Convocatoria           | Planes no acreditados | Planes viables | Planes no viables | Total planes | Anexos con Resultados para publicación en página web    |
|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 176-C4 Planadas        | 1                     | 1              | 0                 | 2            | Primer informe Conv 176 C4<br>1 conceptos de evaluación |
| 177–C5 Caldas          | 0                     | 1              | 1                 | 2            | Primer informe Conv 177 C5<br>2 conceptos de evaluación |
| 179–C3 Planeta Rica    | 0                     | 0              | 0                 | 2            | Primer informe Conv 179 C3<br>2 conceptos de evaluación |
| 182–C3 Barrancabermeja | 0                     | 2              | 0                 | 2            | Primer informe Conv 182 C3<br>2 conceptos de evaluación |

Los conceptos de evaluación e informes para publicación de resultados se remiten en archivo zip, de igual manera están disponibles para consulta y descarga en la siguiente dirección:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ZKP2A\\_kZJvNgHa7-2aYK7dZ6PaqbBF3h?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1ZKP2A_kZJvNgHa7-2aYK7dZ6PaqbBF3h?usp=sharing)

Finalmente, se solicita una vez revisados los informes de resultados de evaluación preliminar adjuntos a la presente comunicación en formato Microsoft Office - Excel, sean publicados en la página web del Fondo Emprender el 23 de junio de 2022 atendiendo el cronograma de las convocatorias antes relacionadas, así mismo se solicita que los conceptos de evaluación en formato PDF sean cargados en los anexos de cada plan de negocios en la plataforma de Fondo Emprender.

Cordialmente,



**ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ**

Director y/o Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°

CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020\_fibog@unal.edu.co

Reviso: Nelsy Cely – Coordinadora Operativa

FONDO EMPRENDER  
CONVOCATORIA 179 PLANETA RICA -TERCER CIERRE  
VALOR DISPONIBLE: \$1.377.803.000  
INFORME INICIAL DE EVALUACIÓN  
FECHA: 23 DE JUNIO DE 2022

| Consec | Id Plan de Negocios | Nombre Plan de Negocios | Nombre Ciudad | Departamento | Nombre Institución | Nombre Unidad                                      | Recursos Solicitados en modelo financiero | No de Empleos | Fecha Formalizacion | Nombre Sector                                                          | Nombre SubSector                                                                             | Conclusion Final                                                        | Valor Recomendado (en pesos colombianos) | Viable (Si/No) |
|--------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 1      | 74058               | CONTADORES ASOCIADOS    | Planeta Rica  | Córdoba      | SENA - Córdoba     | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba | \$ 121.685.536                            | 5             | 6/06/2022           | SECCIÓN M (4AC 2020)-Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | VER CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN LA PESTAÑA DE ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS | \$121.685.536                            | VIABLE         |
| 2      | 81696               | FRUTYCAMP               | Planeta Rica  | Córdoba      | SENA - Córdoba     | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba | \$ 118.297.000                            | 4             | 6/06/2022           | SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras                         | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos                   | VER CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN LA PESTAÑA DE ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS | \$118.297.000                            | VIABLE         |

## **Anexo 7. Estado de avance emprendimientos CV 179**

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74041                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PRONTA MODA                                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ                         |
| <b>Cedula</b>            | 1.067.867.221                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 323-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$106.038.734, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razon social</b> | DUOMODA SAS   |
| <b>Nit</b>          | 901.512.015-6 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/31/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/31/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/28/2021                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/31/2022                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |                   |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 7                 | 140%     | 6                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |                   |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 7                 | 100%     | 880                    | 341              | 39%      |
| VENTAS            |                   |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado        | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$131.740.000, 00 | \$167.778.400, 00 | 127,36%  | \$106.038.734, 00      | \$82.695.523, 00 | 77,99%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74042                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PORCICOLA LA CANDELARIA SAS                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | RAFAEL MORENO SALGADO                                |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.745.247                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 324-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.809.688, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Razon social</b> | PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.516.830-0                  |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                   |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                        |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/8/2021                    |
| <b>Segunda visita</b>     | 9/8/2021                    |
| <b>Tercera visita</b>     | 1/26/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/8/2022                    |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 8                      | 0                 | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 10         | 125%     | 32010                  | 0                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$190.459.500, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.809.688, 00      | \$120.597.628, 00 | 97,41%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74045                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | TRANSENVIOS                                          |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO                       |
| <b>Cedula</b>            | 15.675.354                                           |
| <b>No. Contrato</b>      | 325-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$112.822.133, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Razon social</b> | TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.501.608-6              |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica               |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                    |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/26/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/26/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/30/2021                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/26/2022                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 9                      | 1                | 11%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 7          | 88%      | 14723                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$140.080.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$112.822.133, 00      | \$38.154.854,500 | 33,82%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74047                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | GRANJA APICOLA LA FORTUNA                            |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | LUIS JOSE RAMOS GUERRERO                             |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.748.967                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 326-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.540.550, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Razon social</b> | GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.503.007-9                   |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                    |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                         |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/26/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/26/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/30/2021                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/26/2022                   |

| INDICADORES      |            |          |                        |                  |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS          |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                | 0          | 0,0%     | 8                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                | 5          | 63%      | 5100                   | 0                | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$96.140.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.540.550, 00      | \$95.765.800, 00 | 77,52%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74049                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | ZIRBOX S.A.S                                         |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR                           |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.743.188                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 327-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$109.696.552, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razon social</b> | ZIRBOX S.A.S  |
| <b>Nit</b>          | 901.519.561-8 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/15/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 9/15/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 1/27/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/15/2022                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS          |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                | 2          | 40%      | 7                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                | 2          | 29%      | 880                    | 0                | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$70.400.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$109.696.552, 00      | \$73.404.854, 00 | 66,92%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74050                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | MIRANDA                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ALBA LUCIA MIRANDA TOBÍO                             |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.740.131                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 328-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$100.477.519, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razon social</b> | MIRANDA T SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.513.895-5 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/10/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 9/10/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 1/28/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/10/2022                   |

| INDICADORES       |                 |          |                        |                  |          |
|-------------------|-----------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |                 |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 4                 | 2               | 50%      | 8                      | 2                | 25%      |
| CONTRAPARTIDAS    |                 |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 7               | 100%     | 3074                   | 54               | 2%       |
| VENTAS            |                 |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado      | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$168.553.070, 00 | \$1.265.728, 00 | 0,75%    | \$100.477.519, 00      | \$75.563.050, 00 | 75,2%    |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74051                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | CODEFRUT SAS                                         |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DANIELA OROZCO SUAREZ                                |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.749.976                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 329-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$101.228.639, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Razon social</b> | CODEFRUT SAS  |
| <b>Nit</b>          | 901.515.231-4 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 9/1/2021                    |
| <b>Segunda visita</b>     | 9/1/2021                    |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/16/2021                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 9/1/2022                    |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 1          | 20%      | 9                      | 2                | 22%      |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                 | 0          | 0,0%     | 210278                 | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$254.600.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$101.228.639, 00      | \$81.632.009,520 | 80,64%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74060                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | AQUAZUL                                              |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | YINA MARCELA PORTO ELJACH                            |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.744.315                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 330-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.832.788, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Razon social</b> | EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.514.141-5                         |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                          |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                               |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 8/30/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 8/30/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 12/22/2021                  |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 8/30/2022                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                   |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 6                 | 1          | 17%      | 8                      | 0                 | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| 8                 | 8          | 100%     | 799915                 | 0                 | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado        | % Avance |
| \$153.640.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.832.788, 00      | \$100.840.069, 00 | 81,43%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74012                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ                           |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ                         |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.726.002                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 375-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$115.493.460, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | RENUNCIA                                             |

### EMPRESA

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Razon social</b> | ODONT3D SJ SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.537.637-5  |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica   |
| <b>Departamento</b> | Cordoba        |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/9/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 11/9/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     |                             |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/9/2022                   |

| INDICADORES       |            |          |                        |            |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 4                 | 0          | 0,0%     | 4                      | 0          | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| 8                 | 2          | 25%      | 850                    | 0          | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |            |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado | % Avance |
| \$112.732.940, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$115.493.460, 00      | \$ ,000    | 0,0%     |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74044                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | PESCADERIA EL DIAMANTE                               |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | DINA LUZ OYOLA PORTO                                 |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.742.731                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 376-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$123.800.666, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Razon social</b> | PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS |
| <b>Nit</b>          | 901.537.162-9                |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                 |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                      |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 11/8/2021                   |
| <b>Segunda visita</b>     | 11/8/2021                   |
| <b>Tercera visita</b>     | 2/28/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 11/8/2022                   |

### INDICADORES

| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 6                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 0          | 0,0%     | 19800                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$128.700.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$123.800.666, 00      | \$82.028.935, 00 | 66,26%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74217                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S                        |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ                          |
| <b>Cedula</b>            | 1.067.882.542                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 377-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$113.090.846, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Razon social</b> | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.525.701-7                 |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica                  |
| <b>Departamento</b> | Cordoba                       |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 10/29/2021                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 10/29/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 2/24/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 10/29/2022                  |

| INDICADORES       |            |          |                        |                  |          |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| EMPLEOS           |            |          | MERCADEO               |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                 | 0          | 0,0%     | 7                      | 0                | 0,0%     |
| CONTRAPARTIDAS    |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 8                 | 5          | 63%      | 190                    | 0                | 0,0%     |
| VENTAS            |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta              | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$351.500.000, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$113.090.846, 00      | \$90.714.834, 00 | 80,21%   |

## CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

### INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID Plan:</b>          | 74323                                                |
| <b>Plan de Negocios:</b> | YERITAS SNACK S.A.S                                  |
| <b>Convocatoria</b>      | 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre |
| <b>Beneficiario</b>      | ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE               |
| <b>Cedula</b>            | 1.066.726.444                                        |
| <b>No. Contrato</b>      | 378-179-2021                                         |
| <b>Valor Contrato</b>    | \$106.767.549, 00                                    |
| <b>Estado</b>            | VIGENTE                                              |

### EMPRESA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Razon social</b> | YERITAS SNACK S.A.S |
| <b>Nit</b>          | 901.528.388-8       |
| <b>Ciudad</b>       | Planeta Rica        |
| <b>Departamento</b> | Cordoba             |

### INTERVENTORÍA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Interventor(a)</b>     | SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA |
| <b>Fecha de Inicio</b>    | 10/29/2021                  |
| <b>Segunda visita</b>     | 10/29/2021                  |
| <b>Tercera visita</b>     | 2/25/2022                   |
| <b>Cuarta visita</b>      |                             |
| <b>Prorroga</b>           |                             |
| <b>Fecha finalización</b> | 10/29/2022                  |

### INDICADORES

| EMPLEOS          |            |          | MERCADEO               |                  |          |
|------------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------|
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 5                | 0          | 0,0%     | 9                      | 1                | 11%      |
| CONTRAPARTIDAS   |            |          | PRODUCCIÓN             |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| 7                | 5          | 71%      | 50976                  | 0                | 0,0%     |
| VENTAS           |            |          | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                  |          |
| Meta             | Verificado | % Avance | Meta                   | Verificado       | % Avance |
| \$70.104.624, 00 | \$ ,000    | 0,0%     | \$106.767.549, 00      | \$29.584.508, 00 | 27,71%   |
