

La Estrella, 14 de Diciembre de 2022

SEÑORES
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
Secretario Movilidad
Sr. WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO
Cali



No. 2022-4152010-007930-2

Asunto: AMPLIACIÓN PLAZO DE
EJECUCIÓN

Fecha Radicado 15/12/2022 02:37:42

Usuario Radicador: ADRIANA URREGO Folios:
Destino: SECRETARIA DE MOVILIDAD
Remitente (EMP): ACCEQUIP- ACCESORIOS Y ID: 800042522
Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaid a. Linea 195



202241520100079302

Asunto: Ampliación plazo de ejecución

Cordial Saludo;

De acuerdo al contrato No. 4152.010.26.1.689.2022 celebrado entre las partes SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE MOVILIDAD Y ACCESORIOS Y SISTEMAS SA. el cual tiene por objeto *"Adquirir vehículos utilitarios (tipo carro canasta y tipo grúa de planchón de 6 toneladas y de pluma de 20 toneladas) operativos con elevadores hidráulicos, para atender las actividades misionales de la Secretaría de Movilidad."* referimos la CLÁUSULA SEXTA: correspondiente al PLAZO solicitamos la ampliación del mismo, teniendo en cuenta a las siguientes circunstancias:

Como es de su conocimiento el equipo hidráulico a instalar sobre los chasis tanto la GRÚA PLANCHÓN como la GRÚA TIPO PLUMA es fabricado por nuestro proveedor MILLER INDUSTRIES en Estados Unidos; recientemente nuestro fabricante nos notificó que ambas unidades tienen retraso en los tiempos de fabricación por circunstancias asociadas a la escasez de partes como el acero y algunos dispositivos hidráulicos. *(Ver adjunta comunicación de MILLER INDUSTRIES Ver adjuntas imágenes construcción de los equipos).*


De acuerdo a estas circunstancias de fabricación las grúas estarían disponibles para su importación a finales de enero de 2023, estimando una llegada a puerto colombiano a finales de febrero de 2023, momento en el que comienzan los trámites de nacionalización y traslado hasta La Estrella – Antioquia.

Los chasis para las dos grúas TIPO PLANCHON Y TIPO PLUMA a ensamblar en CHEVROLET NRR Y FRR se encuentran en nuestra planta listos para el ensamble del equipo hidráulico *(Ver imágenes adjuntas)*, por otra parte, la unidad CARRO CANASTA ensamblada en la camioneta CHEVROLET COLORADO que también hace parte del contrato se encuentra en proceso de ensamble para hacer la entrega a SECRETARIA DE CALI el 23 de diciembre de 2022.


Somos conscientes que dicha situación impacta los tiempos de entrega y el cumplimiento establecido en el plazo inicial del contrato; siendo esto un caso fortuito y de acuerdo a las razones expuestas requerimos la ampliación en el tiempo de ejecución; contemplando la entrega de la grúa planchón y la grúa pluma el **15 de marzo de 2023**.

Es nuestro ideal el cumplir con los estándares de calidad y buen servicio que pactamos desde el inicio del proyecto y sobretodo el hacerlo dentro de los tiempos deseados, sin embargo, hay situaciones ajenas que nos impiden ajustarnos a lo inicialmente propuesto.

Agradecemos su atención y contamos con su positiva respuesta.


María Doris Mesa Betancur
Representante Legal


CHASIS NRR

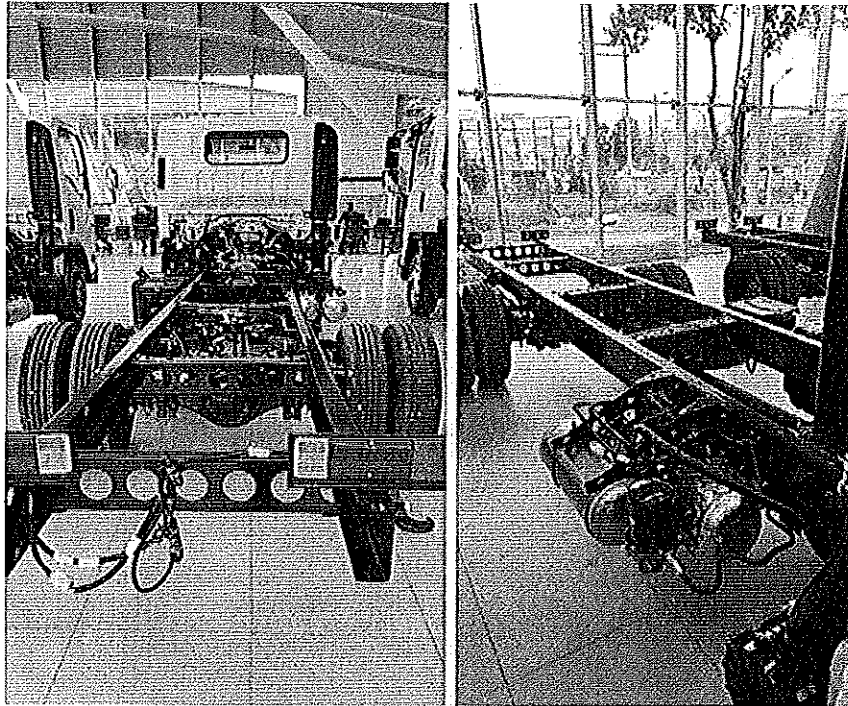

CHASIS FRR



IMÁGENES EQUIPO MILLER

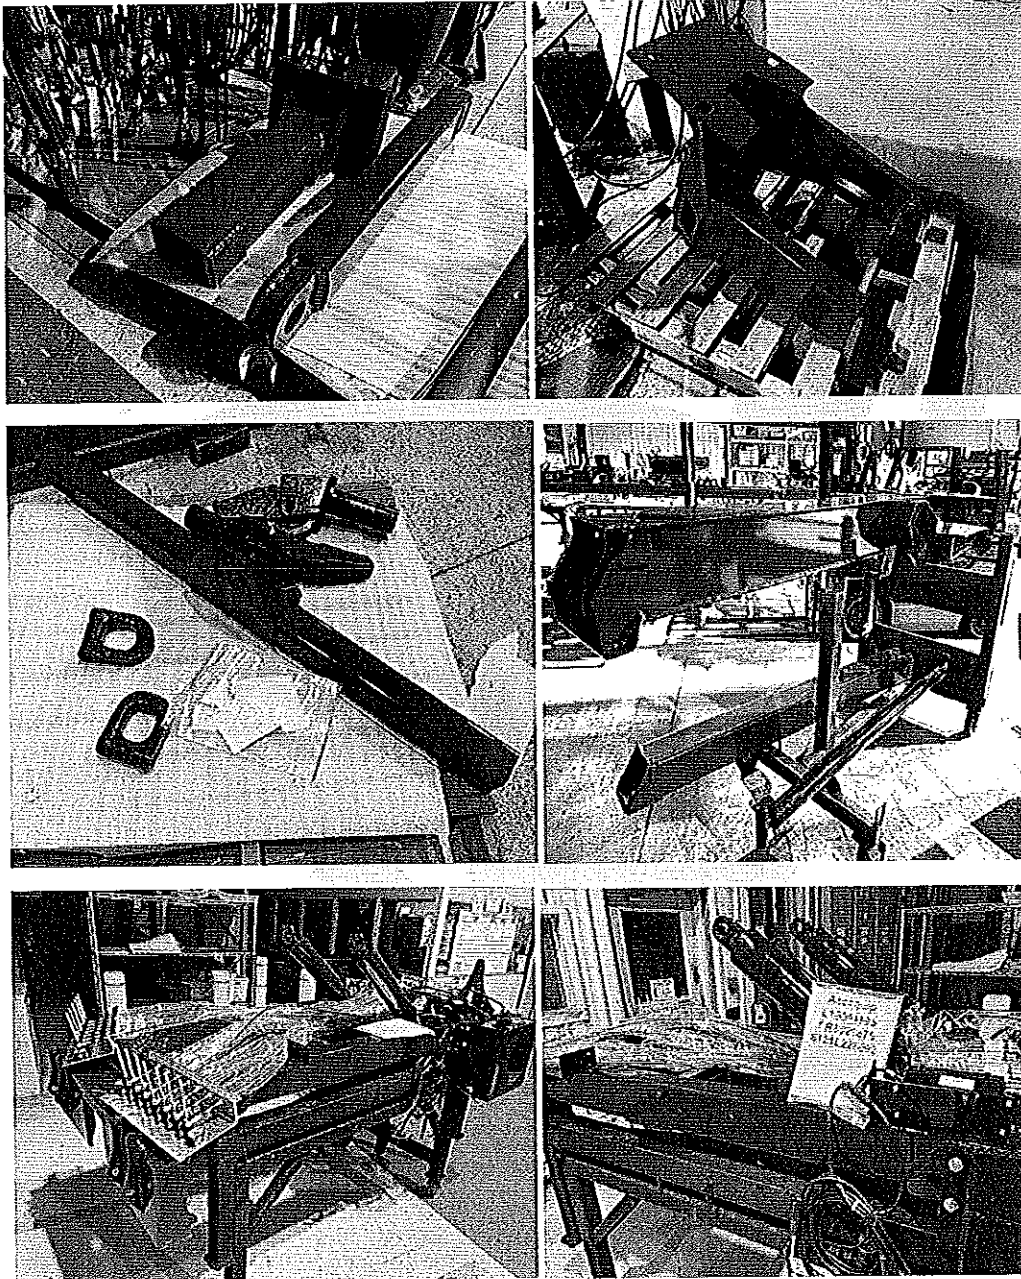



8503 Hilltop Drive, Ooltewah, TN 37363
423.238.4171 | millerind.com

A quien corresponda en TRANSITO DE CALI:

Miller Industries Equipos de Remolque de acuerdo a las OC# 4509, OC# 4510 y OC# 4522 recibidas de Accesorios y Sistemas Sa. - Accequip correspondientes a 2 unidades CARRIER SERIE 8, y 1 unidad CENTURY 612 es nuestro deber informarles que la fecha de entrega de las unidades se realizará en enero de 2023.

Como fabricantes enfrentamos el desafío de escases de material de los cilindros y del acero, requeridos para la construcción de las unidades afectando la construcción de estos y otros equipos, estamos trabajando fuertemente para entregarles las unidades en este tiempo.

Stephen Black
International & Export Sales
Miller Industries Towing Equipment Inc.
sblack@millerind.com
423-774-2029

CENTURY

Miller

INTERNATIONAL

WILLAMETTE

WILLAMETTE

WILLAMETTE

WILLAMETTE

