

Informe de Gestión No. 26
Contrato de Adhesión No. 16 Distrito de Barrancabermeja
Período del 01 al 31 de enero del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Enero 31 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS.....	14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 16; se presenta a continuación el informe con corte al 31 enero de 2023, del contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Distrito de Barrancabermeja, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Número de Adhesión	16	Entidad Adherente	Distrito de Barrancabermeja
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.500.000.000		
Valor Aporte SENA	\$750.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$750.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No Designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Carmenza Santiago Ospino		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico y Social del Distrito de Barrancabermeja		
Número Telefónico o Celular	(+57)7 6115555	Correo Electrónico	Lachiqui.santiago@barrancabermeja.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Diana Cortés	Correo Electrónico	dmcortesr@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 16.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8982_ENERO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

No. Convocatoria	182
Recursos SENA	\$ 750.000.000
Recursos Adherente	\$ 750.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.500.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.652.859.985
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 296.560.668
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 143.700.683
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.356.299.317
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$160.000.000,00
	\$546.449.066,00
Valor devuelto por la Fiducia a la UN	\$ 28.299.407
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.121.262.107
Saldo Total en Fiducia por ejecutar	\$ 240.106.789,98
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 34.978.444,16


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8982
Saldo Total en Bancos	\$ 72.523.399,45
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 673.057,45

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 182 perteneciente al Distrito de Barrancabermeja Santander, al 31 de enero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.356.299.317 equivalente al 90.42% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$143.700.683 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.121.262.107, equivalentes al 82.67% de los recursos comprometidos y 74.75% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 16 - Distrito de Barrancabermeja, Santander.

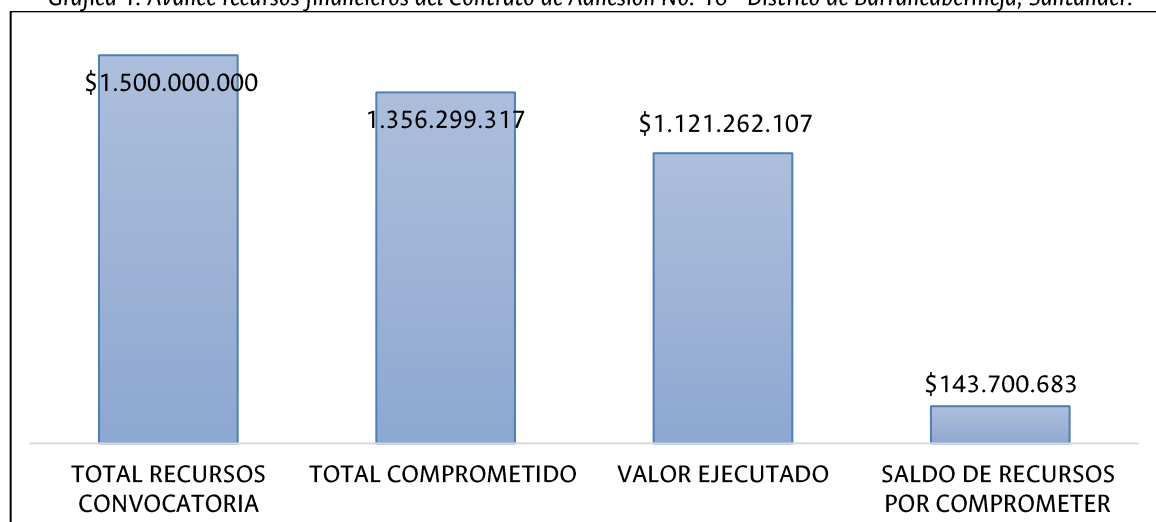

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”

(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 182 específica para el Distrito de Barrancabermeja, Santander, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1822020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Número de Convocatoria	182		
Fecha de Lanzamiento	26/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	02/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	31/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	06/06/2022		

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad a continuación se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 182.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander

Número de Convocatoria				182			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/03/21	Número de Planes Formalizados	15	Número de Planes Acreditados	12	% de Acreditación	80%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		31/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	14/06/21	Número de Planes Formalizados	36	Número de Planes Acreditados	33	% de Acreditación	92%
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		06/06/2022



Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%
---	----------	-------------------------------	---	------------------------------	---	-------------------	------

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria No.182 – Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Número de Convocatoria				182			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre Corte		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	12	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	42%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$399.991.824
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre Corte		31/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	02/07/21	Número de Planes Evaluados	33	Número de Planes Viabilizados	27	Número de Planes Viabilizados	82%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	14	Número de Planes a Financiar	\$1.098.107.966
Corte No. 3	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre corte		06/06/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	Número de Planes Viabilizados	2
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/22	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	2	Número de Planes a Financiar	\$159.970.030

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2023 se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la firma de contratos de cooperación:

Para el caso de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la Sesión No. 1597 del 29 de septiembre de 2022 se informa que:

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 3C.

No	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado	Observaciones
1	74371	SUEROS ISLA DE MOMPOS	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Elaboración de productos lácteos	\$79.970.030	De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos encontramos adelantando la actualización de formatos y responsables de firmas, para que puedan adelantar la legalización de su contrato sin ningún inconveniente
2	74589	DRONES UNIVERSAL SAS	SECCIÓN J (4AC 2020)-Información Y Comunicaciones	Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos	\$80.000.000	De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos encontramos adelantando la actualización de formatos y responsables de firmas, para que puedan adelantar la legalización de su contrato sin ningún inconveniente

Para cada uno de los planes de negocio anteriormente relacionados, han existido plazos demasiado extensos para la legalización de los contratos de cooperación empresarial y anexos, debido a los traumatismos que se presentaron por el cambio de gobierno y el nombramiento de los responsables por parte del SENA, lo que ha impedido la creación de los certificados digitales y por ende retrasos en la creación de los flujos de firma en la plataforma diseñada para tal fin.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 182, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 1C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72970	333-182-2021	EL MOLINO DE AGUA			\$79.991.824	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	68100	331-182-2021	SEBOS EL CAIRO SAS	20/10/2021	20/02/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	66,41%	VIGENTE
3	71304	332-182-2021	QRUMBA SEGURA S.A.S	27/08/2021	27/08/2022	\$80.000.000	120,00%	150,00%	116,67%	92,29%	TERMINADO
4	74292	334-182-2021	HELADOS EL REY	12/08/2021	12/08/2022	\$80.000.000	100,00%	133,33%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74376	335-182-2021	INNATUS	20/08/2021	20/12/2022	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Durante el mes de enero de 2023 a fin de realizar seguimiento a los planes de negocios relacionados a continuación:

- 68100 SEBOS EL CAIRO, a través del oficio B.FI.1 [T]-1299-008-23 (Anexo 4)
- 74360 COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36 a través del oficio B.FI.1 [T]-1299-009-23 (Anexo 5)

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 1C.

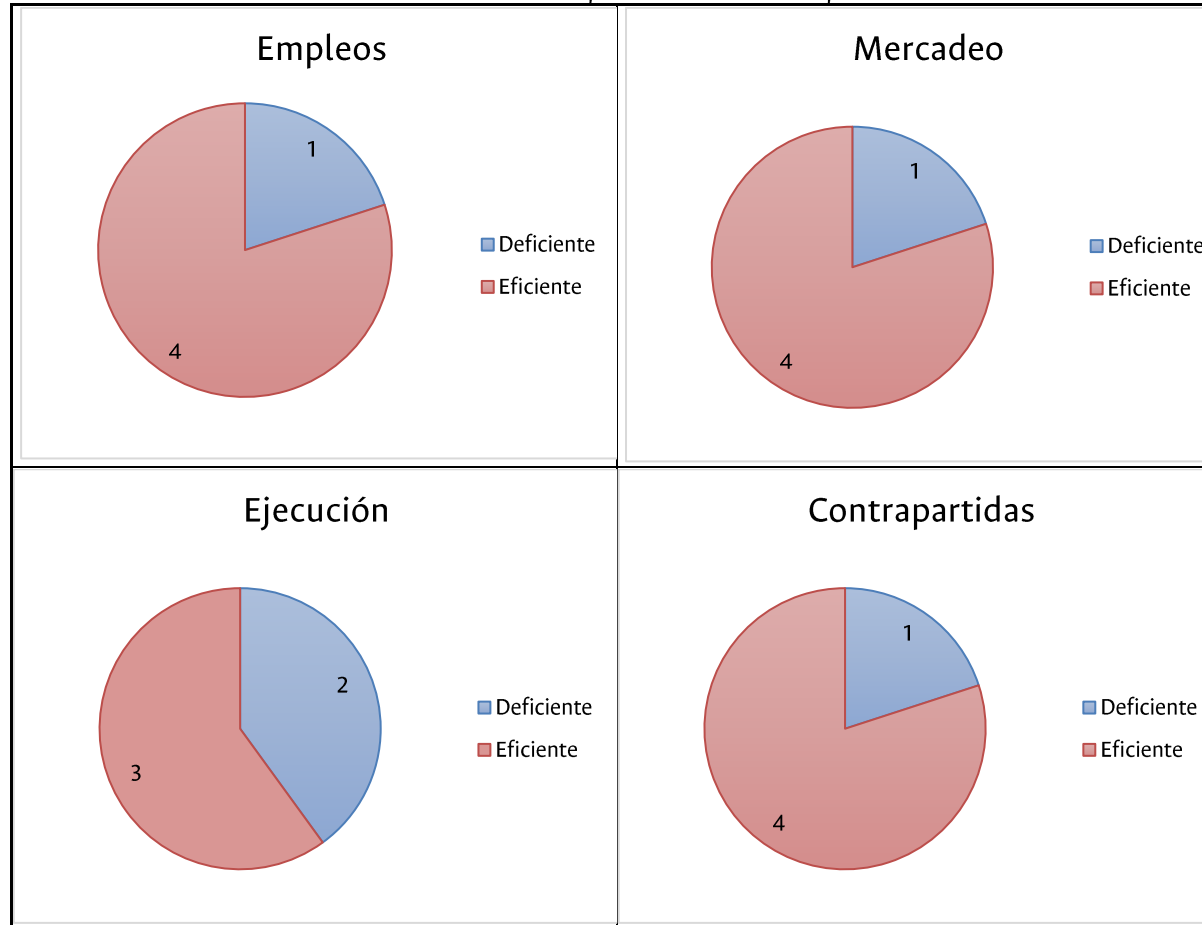


Planes de negocio segundo cierre

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74358	385-182-2021	MERCAFACIL	11/02/2022	11/02/2023	\$56.624.611	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74604	390-182-2021	POIESIS CONTINUA	8/11/2021	8/11/2022	\$79.945.033	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	74360	386-182-2021	COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36	5/11/2021	5/03/2023	\$79.996.000	40,00%	25,00%	100,00%	50,68%	VIGENTE
4	65850	379-182-2021	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA	16/11/2021	16/11/2022	\$79.999.200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
5	71704	380-182-2021	3DIDÁCTICOS TECHNOLOGY SAS	5/11/2021	5/11/2022	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%	TERMINADO
6	72966	381-182-2021	LA MOYA	8/11/2021	8/11/2022	\$79.430.191	100,00%	100,00%	100,00%	98,10%	TERMINADO
7	74303	382-182-2021	ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS	11/11/2021	11/11/2022	\$77.033.480	100,00%	100,00%	100,00%	98,69%	TERMINADO
8	74333	383-182-2021	ECOFRIENDLY	12/11/2021	12/11/2022	\$80.000.000	100,00%	133,33%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	74344	384-182-2021	SARON NUTRICION CAPILAR	17/11/2021	17/01/2023	\$79.999.250	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	74378	387-182-2021	CREACIONES ARAKE	2/11/2021	2/11/2022	\$79.914.210	100,00%	137,50%	116,67%	100,00%	TERMINADO
11	74386	388-182-2021	PRANATEL	18/11/2021	18/11/2022	\$79.973.560	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	TERMINADO
12	74557	389-182-2021	AGUA VIVA DEL CIELO	4/11/2021	4/11/2022	\$80.000.000	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
13	74661	391-182-2021	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO	9/11/2021	9/11/2022	\$80.000.000	100,00%	109,09%	100,00%	100,00%	TERMINADO
14	74849	392-182-2021	IGUANARTE	12/11/2021	12/11/2022	\$79.982.596	100,00%	112,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, en la tabla 12 se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2.

Tabla 12. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 2C.

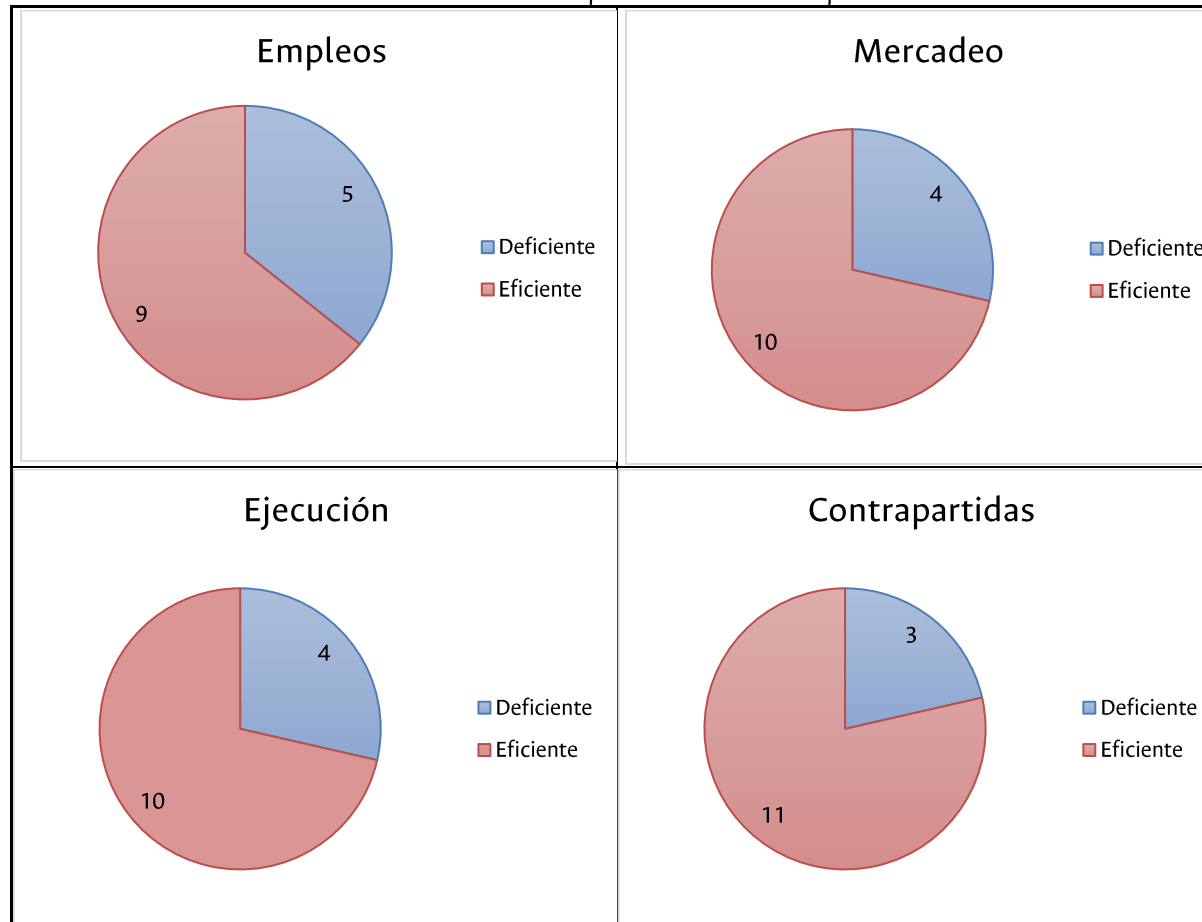

Cierre planes de negocio

Al 31 de enero de 2023, se encuentran 1 plan de negocio terminado y entregado a SENA para aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la convocatoria 182 – Barrancabermeja.

Tabla 13. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación
1	74292	HELADOS EL REY	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la programación de sesión de Comisión Técnica de Fondo Emprender para la presentación de resultados de condonación para su recomendación y aprobación de condonación para continuar el proceso de cierre de contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período correspondiente al mes de enero de 2023, se atendieron las solicitudes de los emprendedores, las cuales se relacionan a continuación:

- La emprendedora JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA, a través de las comunicaciones con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-043-23 (anexo 6) Y B.FI.1 [T]-CR-1299-048-23 (anexo 7) del 13 y 16 de enero de 2023 respectivamente, solicitó prórroga por periodo de 2 meses para el desarrollo del plan de negocios ID- 68100 – SEBOS EL CAIRO SAS, financiado bajo el contrato de cooperación empresarial 331-182-2021. Actualmente la solicitud de prórroga está en análisis por parte del SENA.


CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 14 se relaciona el consolidado general de la convocatoria 182, el cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 14. Consolidado de resultados convocatoria No. 182 Distrito de Barrancabermeja, Santander

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.500.000.000
Número total de planes formalizados	53
Número total de planes acreditados	47
Número total de planes viables	34
Número de planes financiables	21
Número de planes aprobados en CDN	21
Total recursos aprobados en CDN	\$1.652.859.985
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	4
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 296.560.668
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.356.299.317
Saldo de recursos por comprometer	\$ 143.700.683
Ejecución acumulada de recursos	\$1.121.262.107

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 182 – Distrito de Barrancabermeja, Santander.

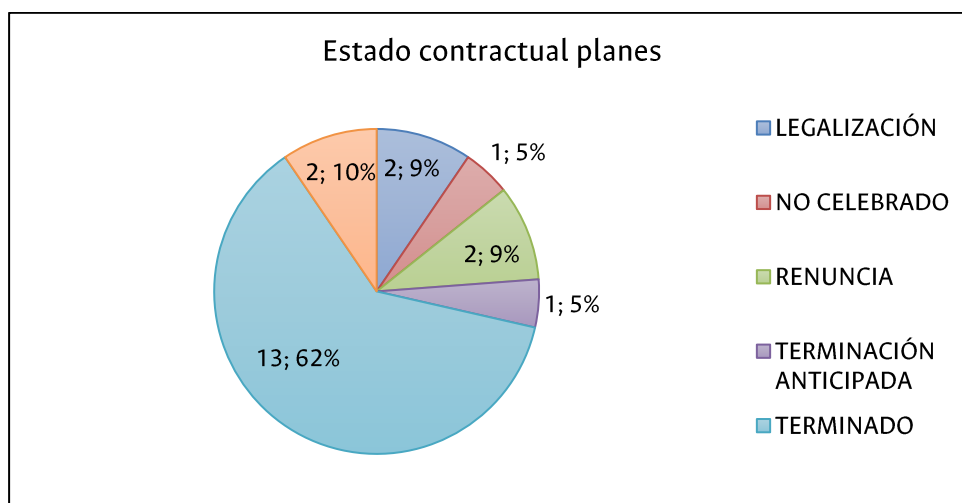

Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 182 asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 182 – acreditó 12 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 80% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 182 viabilizó 5 de los 12 planes de negocio acreditados. En el primer cierre de la Convocatoria 182 se aprobó el financiamiento de 5 planes de negocio por un valor total de \$399.991.824.
3. El segundo cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 31/05/2021, donde se formalizaron 36 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 182, acreditó 33 de los 36 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 92% de acreditación.
4. El proceso de evaluación segundo cierre de la Convocatoria 182 viabilizó 27 de los 33 planes de negocio acreditados. Se aprobaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 182, 14 planes de negocio, por valor de \$1.092.868.131.
5. El tercer cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 06/06/2022, donde se formalizaron 2 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 182, acreditó los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre de la convocatoria 182 se aprobó el financiamiento de dos planes de negocios por valor de \$159.970.030.
7. A la fecha se presentan cuatro (4) desistimientos a los recursos de financiamiento por valor de \$296.560.668 correspondientes a los planes de negocios: I) 72970 - EL MOLINO DE AGUA por valor de \$79.991.824 aprobado en el primer cierre, II) ID 74604 - POIESIS CONTINUA por valor de \$79.945.033 aprobado en el segundo cierre, III) ID 74358 – MERCAFACIL, aprobado en el segundo cierre y IV) ID 74358 – FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA aprobado en el segundo cierre.
8. Al 31 de enero de 2023 (13) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 182 se encuentran terminados.
9. A la fecha los planes de negocio aprobados y financiados que se encuentran vigentes presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.121.262.107.
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del

emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.

11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 182 se ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 21 pagos rechazados de los cuales el 3% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 1% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 6% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
12. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 53 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (17), otras solicitudes operativas (10), informes y conceptos (10), agenda especial (5), dedicación parcial (4), terminación anticipada (3), renunciaciones (3) y aplazamiento de visitas (1) para la convocatoria 182 - Barrancabermeja.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023

Se prevé que los planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 182 que no presentan novedades continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha de sus planes de negocios.

Para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados y aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 182 se continúe realizando y presentando al SENA el informe final de interventoría para determinación de condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados por el Fondo Emprender.

Los planes de negocio aprobados para financiación en el tercer cierre de la convocatoria 182, se encuentran en proceso de legalización, que se espera finalizar en el mes de febrero de 2023.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_8982_ENERO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182
Anexo 4	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-008-23
Anexo 5	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-009-23
Anexo 6	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-043-23
Anexo 7	Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-048-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8982_ENERO_2023



DAVIVIENDA



H.68

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8982

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 16 SENA-BARRANCABERMEJA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$72,517,235.49
Más Créditos	\$6,163.96
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$72,523,399.45
Saldo Promedio	\$72,517,235.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 6,163.96+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento enero 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
68100	SEBOS EL CAIRO SAS	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 53.131.188,00	\$ 212.524,75	\$ 53.343.712,75	\$ -	\$ -	\$ 26.976.287,25
71304	ORUMBA SEGURA S.A.S	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 73.830.063,00	\$ 295.320,25	\$ 74.125.383,25	\$ -	\$ -	\$ 6.194.616,75
74292	HELADOS EL REY	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74376	INNATUS	182	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.999,86	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,86	\$ -	\$ -	\$ 0,14
65850	FABRICA DE PRODUCTOS A	182-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71704	3DIDÁCTICOS TECHNOLOGY	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.958.001,01	\$ 319.832,00	\$ 80.277.833,01	\$ -	\$ -	\$ 42.166,99
72966	LA MOYA	182-2	\$ 79.430.191,00	\$ 317.720,76	\$ 79.747.911,76	\$ 77.923.498,00	\$ 311.693,99	\$ 78.235.191,99	\$ -	\$ -	\$ 1.512.719,77
74303	ESCUELA DE ARTES LAS TAB	182-2	\$ 77.033.480,00	\$ 308.133,92	\$ 77.341.613,92	\$ 76.026.840,00	\$ 304.107,36	\$ 76.330.947,36	\$ -	\$ -	\$ 1.010.666,56
74333	ECOFRIENDLY	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74344	SARON NUTRICION CAPILA	182-2	\$ 79.999.250,00	\$ 319.997,00	\$ 80.319.247,00	\$ 79.999.250,00	\$ 319.997,00	\$ 80.319.247,00	\$ -	\$ -	\$ -
74358	MERCAFACIL	182-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74360	COMERCIALIZADORA SAN R	182-2	\$ 79.996.000,00	\$ 319.984,00	\$ 80.315.984,00	\$ 40.545.584,00	\$ 162.182,34	\$ 40.707.766,34	\$ -	\$ -	\$ 39.608.217,66
74378	CREACIONES ARAKE	182-2	\$ 79.914.210,00	\$ 319.656,84	\$ 80.233.866,84	\$ 79.914.209,36	\$ 319.656,84	\$ 80.233.866,20	\$ -	\$ -	\$ 0,64
74386	PRANATEL	182-2	\$ 79.973.560,00	\$ 319.894,24	\$ 80.293.454,24	\$ 79.951.880,00	\$ 319.807,52	\$ 80.271.687,52	\$ -	\$ -	\$ 21.766,72
74557	AGUA VIVA DEL CIELO	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.998,03	\$ 319.999,99	\$ 80.319.998,02	\$ -	\$ -	\$ 1,98
74604	POIESIS CONTINUA	182-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74661	LA GALLINITA DE LOS HUEV	182-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.000,00	\$ 319.996,00	\$ 80.318.996,00	\$ -	\$ -	\$ 1.004,00
74849	IGUANARTE	182-2	\$ 79.982.596,00	\$ 319.930,38	\$ 80.302.526,38	\$ 79.982.596,00	\$ 319.930,38	\$ 80.302.526,38	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74371	SUEROS ISLA DE MOMPOS	182-3	\$ 79.970.030,00	\$ 319.880,12	\$ 80.289.910,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.289.910,12
74589	DRONES UNIVERSAL SAS	182-3	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000,00
TOTAL			\$ 1.356.299.317,00	\$ 5.425.197,26	\$ 1.361.724.514,26	\$ 1.121.262.107,26	\$ 4.485.048,43	\$ 1.125.747.155,69	\$ -	\$ -	\$ 235.977.358,57

Anexo3_Estado de avance emprendimientos CV 182

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	68100
Plan de Negocios:	SEBOS EL CAIRO SAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	JULY ADELAINY PEÑA PUERTA
Cedula	1096184639
No. Contrato	331-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS
Nit	901.511.684-9
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	10/20/2021
Segunda visita	2/9/2022
Tercera visita	7/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	2/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	152736	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$210.044.600, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$53.131.188, 00	66,41%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71304
Plan de Negocios:	QRUMBA SEGURA S.A.S
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	ALVARO RAUL MENDOZA SAAD
Cedula	91289592
No. Contrato	332-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	QRUMBA SEGURA SAS
Nit	901.510.828-8
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/17/2021
Tercera visita	4/25/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	2	3	150%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	7	117%	970	12	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$246.000.000, 00	\$18.051.260, 00	7,34%	\$80.000.000, 00	\$73.830.063, 00	92,29%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72970
Plan de Negocios:	EL MOLINO DE AGUA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS
Cedula	1096222884
No. Contrato	333-182-2021
Valor Contrato	\$79.991.824, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4		0,0%			0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
		0,0%			0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
		0,0%	\$79.991.824, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74292
Plan de Negocios:	HELADOS EL REY
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	YERLIN ELIBETH ZARATE MEJIA
Cedula	1096190487
No. Contrato	334-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FABRICA DE HELADOS EL REY DE BARRANCABERMEJA SAS
Nit	901.505.366-7
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	8/12/2021
Segunda visita	12/2/2021
Tercera visita	4/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6	8	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	530000	175980	33%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$231.000.000, 00	\$73.763.476, 00	31,93%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74376
Plan de Negocios:	INNATUS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario	OLGER ANDRES GOMEZ MENDOZA
Cedula	13854209
No. Contrato	335-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INNATUS DE ORIGEN NATURAL S.A.S
Nit	901.511.531-0
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	8/20/2021
Segunda visita	12/15/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	1/20/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	12/20/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6600	140	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$183.084.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$79.999.999,86 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	65850
Plan de Negocios:	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	ANDRES ALBERTO PULGARIN MENDOZA
Cedula	13865186
No. Contrato	379-182-2021
Valor Contrato	\$79.999.200, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA S.A.S
Nit	901.522.379-4
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/11/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/16/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	108000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$147.960.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.999.200, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71704
Plan de Negocios:	3DIDÁCTICOS TECHNOLOGY SAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	MIGUEL ANGEL RUEDA PALENCIA
Cedula	1096251019
No. Contrato	380-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	3DIDACTICOS TECHNOLOGY SAS
Nit	901.511.767-1
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	2/23/2022
Tercera visita	6/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	80	12	15%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$149.000.000, 00	\$27.300.000, 00	18,32%	\$80.000.000, 00	\$79.958.001,010	99,95%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72966
Plan de Negocios:	LA MOYA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	SERGIO ANGARITA ORTIZ
Cedula	1096185146
No. Contrato	381-182-2021
Valor Contrato	\$79.430.191, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA MOYA SAS
Nit	901.534.194-0
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	3/4/2022
Tercera visita	6/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	32250	535	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$126.828.000, 00	\$2.176.000, 00	1,72%	\$79.430.191, 00	\$77.923.498, 00	98,1%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74303
Plan de Negocios:	ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	WILLIAM EGEA SANCHEZ
Cedula	91424080
No. Contrato	382-182-2021
Valor Contrato	\$77.033.480, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ESCUELA DE CULTURA Y ARTE LAS TABLAS S.A.S
Nit	901.534.956-6
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/8/2022
Tercera visita	7/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	245	30	12%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$58.500.000, 00	\$191.627.473, 00	327,57%	\$77.033.480, 00	\$76.026.840, 00	98,69%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74333
Plan de Negocios:	ECOFRIENDLY
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	MARIA ELVIRA PULIDO MOREA
Cedula	1096231861
No. Contrato	383-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ECOFRIENDLY MVD SAS
Nit	901.533.982-3
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio	11/12/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	7/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/12/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	8	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	66500	18269	27%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$175.250.000, 00	\$65.060.320, 00	37,12%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74344
Plan de Negocios:	SARON NUTRICION CAPILAR
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Cedula	1096211952
No. Contrato	384-182-2021
Valor Contrato	\$79.999.250, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRUPO VANYA S.A.S
Nit	901.539.081-1
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/17/2021
Segunda visita	3/17/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	9100	250	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$159.615.360, 00	\$,000	0,0%	\$79.999.250, 00	\$79.999.250, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74358
Plan de Negocios:	MERCAFACIL
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	CRISTIAN DAVID SANCHEZ BUENO
Cedula	1096232266
No. Contrato	385-182-2021
Valor Contrato	\$56.624.611, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	SUPERFACILEXPRESS S.A.S
Nit	901.557.085-5
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	2/11/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	2/11/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	9	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	40867	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$81.433.750, 00	\$,000	0,0%	\$56.624.611, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74360
Plan de Negocios:	COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ
Cedula	28483858
No. Contrato	386-182-2021
Valor Contrato	\$79.996.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA GRANJA EXPRESS S.A.S.
Nit	901.534.914-7
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/23/2022
Tercera visita	7/8/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	3/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	8	2	25%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	44000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$374.000.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.996.000, 00	\$40.545.584, 00	50,68%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74378
Plan de Negocios:	CREACIONES ARAKE
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	DANIEL ARAQUE GUALDRON
Cedula	1096222329
No. Contrato	387-182-2021
Valor Contrato	\$79.914.210, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGENCIA CREACIONES ARAKE S.A.S
Nit	901.534.473-0
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	3/7/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	11	138%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	7	117%	249	144	58%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$126.600.000, 00	\$11.083.272, 00	8,75%	\$79.914.210, 00	\$79.914.209,40 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74386
Plan de Negocios:	PRANATEL
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	LUIS ENRIQUE CALVACHI MUÑOZ
Cedula	13882215
No. Contrato	388-182-2021
Valor Contrato	\$79.973.560, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PROMOTORA Y PRODUCTORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS NATURALES E INTEGRALES PRANAT-EL SAS
Nit	901.539.651-8
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/18/2021
Segunda visita	3/18/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	111260	3990	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$104.820.000, 00	\$13.713.000, 00	13,08%	\$79.973.560, 00	\$79.951.880, 00	99,97%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74557
Plan de Negocios:	AGUA VIVA DEL CIELO
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	SANDRA PATRICIA CASTILLO GONZALEZ
Cedula	63471526
No. Contrato	389-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	REFRESCOS AGUA VIVA DEL CIELO SAS
Nit	901.511.926-6
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/4/2021
Segunda visita	3/15/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/4/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	40500	32447	80%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$252.000.000, 00	\$152.156.900, 00	60,38%	\$80.000.000, 00	\$79.999.998,03 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74604
Plan de Negocios:	POIESIS CONTINUA
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	NATALIA MORALES GOMEZ
Cedula	63555033
No. Contrato	390-182-2021
Valor Contrato	\$79.945.033, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	POIESIS CONTINUA S.A.S
Nit	901.535.962-5
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	3150	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$73.250.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.945.033, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74661
Plan de Negocios:	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	GINA ZULEMA SAJONERO VILLALOBOS
Cedula	37578646
No. Contrato	391-182-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO SAS
Nit	901.522.816-1
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	12	109%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	15200	5936	39%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$145.920.000, 00	\$72.780.000, 00	49,88%	\$80.000.000, 00	\$79.999.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74849
Plan de Negocios:	IGUANARTE
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario	SANDRA PATRICIA LAGUNA MORATO
Cedula	37442121
No. Contrato	392-182-2021
Valor Contrato	\$79.982.596, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	IGUANARTE TIENDA ARTESANAL S.A.S
Nit	901.534.490-6
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HERRERA SOTO VÍCTOR HUGO
Fecha de Inicio	11/12/2021
Segunda visita	3/14/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/12/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6820	7426	109%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$104.500.000, 00	\$31.041.051, 00	29,7%	\$79.982.596, 00	\$79.982.596, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74371
Plan de Negocios:	SUEROS ISLA DE MOMPOS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre
Beneficiario	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ DIAZ
Cedula	3982937
No. Contrato	560-182-2022
Valor Contrato	\$79.970.030, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.970.030, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74589
Plan de Negocios:	DRONES UNIVERSAL SAS
Convocatoria	182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre
Beneficiario	ANGELMIRO QUIROZ PARRA
Cedula	13569926
No. Contrato	561-182-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Barrancabermeja
Departamento	Santander

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicacion B.F.I. [T] _1299_008_23

Bogotá D.C., 11 de enero de 2023.

B.FI.1 [T]-1299-008-23

Doctora

LUZ DANA LEAL RUIZ

Supervisora

Contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299

La ciudad

Asunto: Solicitud Agenda Especial Plan de negocios ID 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS, CCE 331-182-2021

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos de Fondo Emprender, realiza un estudio del caso particular del plan de negocios con ID 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS, cuya beneficiaria es la emprendedora JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA, a la fecha el plan presenta retraso en ejecución debido a inconvenientes en la compra de un tanque, entre otras, como se evidenció en el plan por plan. Cabe mencionar que el plan fue prorrogado por periodo de 4 meses y finaliza su ejecución el día 20 de febrero de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa necesario llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin que la emprendedora aclare la situación del retraso en la ejecución en su plan de negocios.

La misma se programó para el viernes 13 de enero a las 4:00 pm, como resultado de la revisión de plan por plan llevada a cabo durante la última semana del mes de diciembre de 2022.

Quedamos atentos de sus recomendaciones.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°

CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Revisó: Diana Cortés, Líder interventoría

Anexo: Borrador de acta de agenda especial

**Universidad
Nacional
de Colombia**

Copias:

carolinajt@sena.edu.co

yamile.gonzalez.udea@gmail.com

lnsoler@sena.edu.co

mdrrodriguez@sen.edu.co

interventoriafe2020@udea.edu.co

mauricio.alcarazu@udea@gmail.com

Anexo 5_Comunicacion B.F.I. [T] _1299_009_23



Bogotá, D.C. 11 de enero de 2023

B.FI.1 [T]-1299-009-23

Doctora
LUZ DANA LEAL RUIZ
Dirección de Empleo y Trabajo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.1471299
SENA – FONDO EMPRENDER
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Agenda Especial Plan de negocios 74360 COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36, CCE 386-182-2021

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos de Fondo Emprender, realiza un estudio del caso particular del plan de negocios con ID 74360 COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36, del cual es beneficiaria la emprendedora OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ. A la fecha el plan presenta retraso en su ejecución debido a dificultades en compra de congeladores por problemas con el proveedor, entre otras, como se evidenció en el plan por plan. Cabe mencionar que el plan cuenta con prórroga por período de 4 meses y finaliza su ejecución el día 5 de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que participen todas las partes, con el fin que la emprendedora aclare la situación del retraso en la ejecución en su plan de negocios.

La misma se programó para el viernes 13 de enero a las 3:00 pm, como resultado de la revisión de plan por plan llevada a cabo durante la última semana del mes de diciembre de 2022.

Quedamos atentos de sus recomendaciones.

Cordialmente,

ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N.º
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Revisó: Diana Cortés, Líder interventoría

Anexo: Borrador de agenda especial

Copias:

carolinajt@sena.edu.co

yamile.gonzalez.udea@gmail.com

lnsoler@sena.edu.co

mrosa.quintero@udea.edu.co

mdrrodriguez@sena.edu.co

**Universidad
Nacional
de Colombia**

Anexo 6_Comunicacion B.F.I. [T] _CR_1299_043_23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Prorroga 2 meses

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

13 de enero de 2023,
15:57

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetada Diana reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de la emprendedora Jully Adelainy Peña Puerta, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Prorroga 2 meses

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-043-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: [Jully Peña <jullyadela19@hotmail.com>](mailto:jullyadela19@hotmail.com)

Date: vie, 13 ene 2023 a las 15:40

Subject: Prorroga 2 meses

To: Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Cc: Gloria Adelina Chipagra Rincon <gchipagra@sena.edu.co>

Buenas tardes respetados interventores, envío solicitud de prorroga por dos meses con la siguiente documentación para su estudio, puesto que hubo el atraso con el proveedor del tanque que aún no se ha solucionado nada por ese lado, se decidió contratar con otra empresa que ya está en proceso de la fabricación. el 27 de diciembre se firmó el nuevo contrato con dinero propio y los documentos ya están aprobados por el interventor Mauricio.

Agradezco su atención prestada y colaboración en todo este asunto que ha sido bastante desgastante para mi, sin embargo, se ha decidido continuar porque lo que falta es poco.

Atentamente,
Jully Peña

6 adjuntos



Comunicacion suscrita por el lider.pdf

268K



Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión .pdf

36K



PLAN DE TRABAJO GRASAS Y HARINAS EL CAIRO ENERO 13.pdf

565K



Proyeccion de cumplimiento contractuales.pdf

91K



Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial.pdf

199K



Solicitud de Proirroga Emprendedor 2 meses .pdf

125K

Barrancabermeja, 13 de enero de 2023

DIRIGIDO A:

DR. OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 331182-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	SEBOS EL CAIRO
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS 901511684-9
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	SBCD- SENA BARRANCABERMEJA
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	68100
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	331-182-2021
FECHA DE INICIO	20-10-2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	Jullyadela19@hotmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

El motivo de los retrasos del desarrollo del plan de negocios Sebos El Cairo se debió a que la empresa Grobfuhrer, contratante del tanque de procesamiento el cual se iba a empezar a producir, y con esto cumplir con los indicadores producción y ventas, resultó ser una empresa Estafadora, con múltiples denuncias ante la Fiscalía y con muchas quejas de empresarios a los cuales no les entregaron sus equipos y maquinarias y no se responsabilizan por sus hechos. Los documentos de la empresa Grobfuhrer SAS con Nit 901.480.520-5, se encontraban limpios y su representante legal también, sin embargo, su Ingeniero de Proyectos Edgar Raúl Peña Bobadilla, CC. 80.174.918 y quien se encarga actualmente del diseño y las negociaciones, es el antiguo representante legal de la antigua empresa que se llamaban SOSPRO, pero actúan bajo

el mismo modus operandi. Reciben los dineros de los anticipos, y luego se retrasan en las entregas y nunca entregan los equipos.

El 12 de septiembre se adelantó una demanda en la Fiscalía donde se expuso el caso, sin embargo fue inactiva porque “no había más demandas” sobre los estafadores, sin embargo, investigué y si hay 3 demandas más, entonces la fiscal del caso la va a volver a activar.

Por otro lado adelanté una conciliación con la cámara de comercio de Bogotá la cual no resultó positiva porque los estafadores no quieren conciliar, entonces procederé a pasarlo a la parte civil.

La aseguradora aceptó que hay incumplimiento sin embargo dice que el solo incumplimiento no es motivo para indemnizar, y se debe comprobar que hubo daño. Nos asesoramos con un abogado quien nos ha dado indicaciones de cómo efectuar el proceso.

Mientras se lleva a cabo, lo de la fiscalía, la aseguradora que llevará tiempo se estuvo gestionando los recursos nuevamente para la compra del tanque de procesamiento con otra empresa llamada NASA INDUSTRIAL, la cual ya ha contratado con el Fondo emprender. Se firmó contrato, se hizo el primer anticipo y se espera la entrega 45 días después de la firma del contrato.

SOLICITUD:

(De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes se debe indicar el tiempo (meses) de la prórroga y la proyección de cumplimiento de los indicadores y otras obligaciones contractuales pendiente a la fecha.

La prórroga se solicita por 2 meses, para poder dar cumplimiento a la adquisición de los equipos y puesta en marcha y permisos de la CAS, bomberos, sanidad y el ICA que no se han podido llevar a cabo precisamente por carecer del cooker donde se procesara la materia prima y donde sufrirá la transformación; de esta manera poder cumplir con la producción de SEBO PROCESADO y Harina de hueso, que por carecer de este equipo, no se ha podido cumplir con los indicadores de producción y ventas y proyectamos que el 20 de febrero de 2023 que se cumplen los primeros 4 meses de prórroga, en las condiciones actuales no se alcanza a cumplir con dichos indicadores., por eso se requieren 2 meses mas para poder cumplir con el plana trazado.

Considerando que llevar a cabo este plan de negocios ha tenido múltiples inconveniente originados por factores externos y dado que la emprendedora se ha mantenido firme e incluso ha tenido que conseguir recursos por el doble de lo aportado

por Fondo emprender para poder cumplir; considero que se debe dar la prorroga de dos meses adicionales dado que esta contemplando en el acuerdo Fondo Emprender 010 y que amerita que se apoye la gestión y esfuerzo de una excelente emprendedora para constituir y poner en marcha una empresa de gran beneficio para el medio ambiente, la generación de empleo y el incremento de la productividad de la región.

Agradezco su atención prestada y quedo atenta a la respuesta,



Gloria Adelina Chipagra Rincon

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico -
Profesional G02

gchipagra@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:73674

Carrera 28 No. 56 - 10 Barrio Galan,
Barrancabermeja

Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión.

INDICADORES	META	EJECUCIÓN	% ESTADO ACTUAL	RESUMEN
EMPLEO	5 EMPLEOS	5 EMPLEOS	100%	Se cumplieron el 26 de octubre los 3 empleos que faltaban.
MERCADEO	3 EVENTOS	3 EVENTOS	100%	Van 3 eventos de mercadeo, (tarjetas, pendón y pagina web).
VENTAS	\$210.044.600	\$0	0%	Este indicador se encuentra en 0%, porque aún no se ha empezado a procesar.
PRODUCCIÓN	152.736 Kg	0 kg	0%	Este indicador se encuentra en 0%, porque aún no se ha empezado a procesar.
CONTRAPARTIDAS	6 eventos	6 eventos	100%	Ya se cumplió con el 100% de este indicador que eran, 6 eventos.

Plan de Trabajo: Plan de negocio ID 68100 – Sebos el Cairo 13 de enero de 2022

Se evidencia el plan de trabajo de la empresa Grasas y Harinas El Cairo, (Plan de Negocio Sebos el Cairo ID 68100), como respuesta a la solicitud hecha por la ***Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA***, de evidenciar de forma concreta, plan de trabajo, para sustentar los 2 meses más de prórroga.

Acciones por realizar

- Encontrar el predio idóneo para actividad. Ejecutado.
- Gestionar el concepto de uso de suelos con Planeación. Ejecutado.
- Firmar el contrato de arrendamiento del predio. Ejecutado.
- Realizar adecuaciones en el predio. Avance 95%
- Evidencia de equipos requeridos que aporta la emprendedora.
- Actualizar cotizaciones de maquinaria/equipos.
- Compra de maquinaria/equipos.
- Gestionar permisos y licencias con las entidades encargadas, sanidad, bomberos, CAS, ICA.
- Realizar contrapartidas. Ejecutado.
- Iniciar ejecución.
- Contratar los empleos faltantes. Ejecutado.
- Empezar la producción. Marzo
- Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Marzo
- Iniciar ventas con licencias. Marzo-abril
- Realizar el plan de mercadeo. Ejecutado.

PLAN DE TRABAJO, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES HASTA EL 20 DE ABRIL 2023

Se realiza un cronograma desde el 20 de octubre de 2022 hasta el 20 de febrero 2023, indicando mediante el sombreado de celdas, el tiempo que tomará concluir cada una de las tareas las cuales están programadas en el plan operativo adjunto a este documento, el cual se adjunta para la firma del Interventor.

Verde: actividad programada.

PLAN DE TRABAJO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Actualizar cotizaciones							
Compra maquinaria y equipos							
Instalaciones de sistema Eléctrico 220 y 110							
Instalación de gas							
Terminación de las Adecuaciones							
Indicador de Empleo al 100%							
Evidencia de equipos requeridos que aporta la emprendedora.							
Entrega de Maquinaria y Equipos							
Realización de funcionamientos de Equipos en Planta							
Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo							
OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE ICA, CAS, SANIDAD Y BOMBEROS							
Producción					15273,6 Kg	30547,2 Kg	45820,8 Kg
Ventas					\$25.000.000 millones	\$42.008.920 millones	\$59.017.840 millones

Objetivos generales y específicos

- Cumplir etapa pre-operativa.
- Adquirir lo equipos faltantes en el mes de diciembre e iniciar producción en el mes febrero de 2023.
- Cumplir con el 100% de empleos. Se cumplió el 26 de octubre de 2022
- Realizar los requerimientos contables estipulados.
- Cumplir parcialmente de las ventas.
- Cumplir con mínimo de la producción.

Resumen:

INDICADORES	META	EJECUCIÓN	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	% PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO
EMPLEO	5 EMPLEOS	1 EMPLEO	80%	100%	5 empleos
MERCADEO	3 EVENTOS	0 EVENTOS	100%	100%	3 eventos
VENTAS	\$210.044.600	\$0	55%	60%	\$126.026.760
PRODUCCIÓN	152.736 Kg	0 Kg	60%	60%	91.641 Kg
CONTRAPARTIDAS	6 eventos	2 eventos	100%	100%	6 eventos

Responsables de las acciones

<i>Acciones por realizar</i>	<i>Responsable</i>	<i>Puesto</i>	<i>Firma</i>
Actualizar cotizaciones	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Compra maquinaria y equipos	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Instalaciones de sistema Eléctrico 220 y 110	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Instalación de gas	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Adecuaciones	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Indicador de Empleo al 100%	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Entrega de Maquinaria y Equipos	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Pruebas	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA

Licencias ICA, CAS, SANIDAD Y BOMBEROS	Jully Peña	Gerente emprendedora	<i>JULLY PEÑA</i>
Producción	Jully Peña	Gerente emprendedora	<i>JULLY PEÑA</i>
Ventas	Jully Peña	Gerente emprendedora	<i>JULLY PEÑA</i>

OBSERVACIONES: finalmente la contratista Grobfuhrer sas, no concilio con la cámara de comercio, el 25 de noviembre, nos obliga a iniciar demanda comercial, referente a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, se adelantó la reclamación y recibiendo respuesta el 13 de diciembre, que se hacía necesario cuantificar las perdidas para continuar con el trámite, se procede a cotizar nuevamente con diferentes empresas, y la empresa NASA INDUSTRIAL fue la más cercana al presupuesto y tiene referencias por parte de anteriores emprendedores, se está adelantando la contratación.

Responsable:

JULLY PEÑA
Jully Adelainy Peña Puerta

Emprendedora

Gloria Adelina

Gloria Adelina Chipagra Rincón

Profesional de emprendimiento

Orientadora Operativa

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR CUMPLIR DE GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS		
OBLIGACIÓN	ESTADO DE LA OBLIGACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Uso de suelos	Cumplido	Junio 2022
Firma de contrato y legalización de contrato de arrendamiento	Cumplido	Junio 2022
Aporte del Emprendedor	Cumplido	Junio 2022
Construcción de la empresa (13 bodegas y un perímetro de 651 m2, construidos)	Cumplido	Agosto 2022
Contrapartidas	Cumplido	Agosto 2022
Gestión de mercadeo	Cumplido	Septiembre 2022
Compra de maquinaria y equipos	En proceso	Noviembre 2022
Trámite y pago de licencias ica, cas, bomberos y sanidad	En tramite	Diciembre 2022
Empleos	Cumplido	Octubre 2022
Ventas	Sin cumplir	Febrero 2022
Producción	Sin cumplir	Febrero 2022

Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial

La empresa Grasas y Harinas el Cairo SAS, ha estado comercializando la materia prima la cual se recolecta en los expendios cárnicos (cebo y hueso, que no llegan al planto del consumidor), desde agosto de 2021, para cuando se empiece a procesar, ya existan proveedores fidelizados y se encuentre asegurada la materia prima.

La comercialización de materia prima alrededor de un año se puede tomar como **referente de las ventas**, puesto que se está comercializando materia prima por un valor entre 27 y 33 millones de ventas mensuales, esto indica que como mínimo esa sería la venta esperada para poder cumplir con el porcentaje proyectado de ventas.

Nota: la materia prima se compra por un valor normal es decir al mismo precio que se compraría cuando se inicie a procesar, y se vende a un precio que deja un poco de utilidad con el que se paga el transporte, los insumos y la nómina de los 3 operadores. Mientras que cuando se empiece a procesar, el valor de venta será de producto terminado y por ende dejará una mayor utilidad.

- Se cumplió con el indicador de empleo el 26 de octubre.
- El indicador de Mercadeo está cumplido al 100% con 3 eventos.
- El indicador de ventas se proyecta cumplir en su totalidad en el tiempo de prórroga, porque con los contratiempos que hubo de lluvias, el contratista encargado de la obra civil no pudo entregar a tiempo la construcción, no se contaba con el invierno tan terrible que hubo, incluso el día de la 3ra visita de interventoría hubo lluvia.

Adelantamos el nuevo contrato con el nuevo proveedor del tanque el 27 de diciembre para contratar la fabricación del tanque el cual llevará un periodo de tiempo 45 días y pago inicial del 50% y 50% a la entrega.

- El indicador de producción se proyecta cumplir en el tiempo de la nueva prórroga, puesto que el proveedor del tanque de procesamiento, se atrasó por la estafa que ocurrió con la “empresa” Grobfuhrer.

- El indicador de contrapartidas se encuentra realizado en su totalidad.

A continuación se muestra un cuadro de la proyección de cumplimiento de los indicadores de gestión de poder contar con el tiempo de prórroga.

INDICADORES	META	EJECUCIÓN	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	% PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO
EMPLEO	5 EMPLEOS	5 EMPLEOS	80%	100%	5 empleos
MERCADEO	3 EVENTOS	3 EVENTOS	100%	100%	3 eventos
VENTAS	\$210.044.600	\$0	55%	60%	\$126.026.760
PRODUCCIÓN	152.736 Kg	0 Kg	60%	60%	91.641 Kg
CONTRAPARTIDAS	6 eventos	6 eventos	100%	100%	6 eventos

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN					
PRODUCTOS	ENERO Kg	FEBRERO Kg	MARZO Kg	ABRIL Kg	Total por producto
Sebo Tipo I	0	5091,2	10182,4	15273,6	30547,2
Harina de hueso	0	5091,2	10182,4	15273,6	30547,2
Harina de carne	0	5091,2	10182,4	15273,6	30547,2
TOTAL PRODUCCION					91641,6

PROYECCIÓN DE VENTAS					
PRODUCTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total por producto
Sebo Tipo I	\$ 0	\$ 8.333.33,333	\$ 14.002.973	\$ 19.672.613,33	\$ 42.008.919,33
Harina de hueso	\$ 0	\$ 8.333.33,333	\$ 14.002.973	\$ 19.672.613,33	\$ 42.008.919,33
Harina de carne	\$ 0	\$ 8.333.33,333	\$ 14.002.973	\$ 19.672.613,33	\$ 42.008.919,33
TOTAL VENTAS					\$ 126.026.757

JULLY PEÑA
Jully Adelany Peña Puerta
C.C. 1.096.184.639

Barrancabermeja, 13 de enero de 2023

DIRIGIDO A:

DR. OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 331182-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	SEBOS EL CAIRO
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS 901511684-9
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	SBCD- SENA BARRANCABERMEJA
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	68100
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	331-182-2021
FECHA DE INICIO	20-10-2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	Jullyadela19@hotmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

(Se debe describir brevemente el motivo de los retrasos del desarrollo del plan de negocios, que dan como resultado la solicitud de prórroga e incluir soportes si aplica). Tener presente que los motivos de retraso deben obedecer a causas de fuerza mayor, es decir, aspectos no imputables a la falta de gestión del Emprendedor.

El motivo de los retrasos del desarrollo del plan de negocios Sebos El Cairo se debió a que la empresa Grobfuhrer, contratante del tanque de procesamiento el cual se iba a empezar a producir, y con esto cumplir con los indicadores producción y ventas, resultó ser una empresa Estafadora, con multiplex denuncias ante la Fiscalía y con muchas quejas de empresarios a los cuales no les entregaron sus equipos y maquinarias y no se responsabilizan por sus hechos. Los documentos de la empresa Grobfuhrer SAS con nit 901.480.520-5, se encontraban limpios y su representante legal también, sin embargo su Ingeniero de Proyectos Edgar Raúl Peña Bobadilla, CC. 80.174.918 y quien se encarga actualmente del diseño y las negociaciones, es el antiguo representante

legal de la antigua empresa que se llamaban SOSPRO, pero actúan bajo el mismo modus operandi. Reciben los dineros de los anticipos, y luego se retrasan en las entregas y nunca entregan los equipos.

El 12 de septiembre se adelantó una demanda en la Fiscalía donde se expuso el caso, sin embargo fue inactiva porque “no había más demandas” sobre los estafadores, sin embargo, investigué y si hay 3 demandas más, entonces la fiscal del caso la va a volver a activar.

Por otro lado adelanté una conciliación con la cámara de comercio de Bogotá la cual no resultó positiva porque los estafadores no quieren conciliar, entonces procederé a pasarlo a la parte civil.

La aseguradora aceptó que hay incumplimiento sin embargo dice que el solo incumplimiento no es motivo para indemnizar, y se debe comprobar que hubo daño. Nos asesoramos con un abogado quien nos ha dado indicaciones de cómo efectuar el proceso.

Mientras se lleva a cabo, lo de la fiscalía, la aseguradora que llevará tiempo se estuvo gestionando los recursos nuevamente para la compra del tanque de procesamiento con otra empresa llamada NASA INDUSTRIAL, la cual ya ha contratado con el Fondo emprender. Se firmó contrato, se hizo el primer anticipo y se espera la entrega 45 días después de la firma del contrato.

SOLICITUD:

(De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes se debe indicar el tiempo (meses) de la prórroga y la proyección de cumplimiento de los indicadores y otras obligaciones contractuales pendiente a la fecha.

La prórroga se solicita por 2 meses, porque no se ha podido cumplir con los indicadores de producción y ventas y proyectamos que el 20 de febrero de 2023 que se cumplen los 4 meses de prórroga, aún no se alcanza a cumplir con dichos indicadores.

Agradezco su atención prestada y quedo atenta a la respuesta,

ANEXOS:

- 1- Carta de la solicitud.
- 2- Comunicación suscrita por el Líder de Red o Líder de la unidad de emprendimiento en la que se señale un análisis de la justificación expuesta por el emprendedor y una recomendación frente a la solicitud del emprendedor.
- 3- Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión.
- 4- Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial.
- 5- Proyección de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 6- Plan de Trabajo



FIRMA DEL(OS) EMPRENDEDOR(ES)

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA

C.C.: 1.096.184.639

NO. DE CONTRATO: 331-182-2021

ID DEL PROYECTO: 68100

Anexo 7_Comunicacion B.F.I. [T] _CR_1299_048_23



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Solicitud de prórroga por dos meses más

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

16 de enero de 2023,
9:17

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: Diana Maribel Cortes Rojas <dmcortesr@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Carlos Jose Rosado Gamboa <crosado@unal.edu.co>, Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Respetada Diana reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de la emprendedora Jully Adelainy Peña Puerta, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Solicitud de prórroga por dos meses más

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-048-23**

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

----- Forwarded message -----

De: [Jully Peña <jullyadela19@hotmail.com>](mailto:jullyadela19@hotmail.com)

Date: vie, 13 ene 2023 a las 18:49

Subject: Solicitud de prorroga por dos meses más

To: Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia <senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Cc: Mauricio Alcaraz <mauricio.alcarazudea@gmail.com>, Gloria Adelina Chipagra Rincon <gchipagra@sena.edu.co>

Buenas tardes respetados interventores, envío solicitud de prorroga por dos meses con la siguiente documentación para su estudio, (con un leve cambio, se le añadió las opciones para el presupuesto que hay de equipos), puesto que hubo el atraso con el proveedor del tanque que aún no se ha solucionado nada por ese lado, se decidió contratar con otra empresa que ya está en proceso de la fabricación. el 27 de diciembre se firmó el nuevo contrato con dinero propio y los documentos ya están aprobados por el interventor Mauricio.

Agradezco su atención prestada y colaboración en todo este asunto que ha sido bastante desgastante para mi, sin embargo, se ha decidido continuar porque lo que falta es poco.

Habían dado este radicado, no sé si se deja el mismo o se cambia No. B.FI.1 [T]-CR-1299-043-23.

Atentamente,

Jully Peña

6 adjuntos



Comunicacion suscrita por el lider de emprendimiento.pdf

103K



Diagnostico o estado actual de los indicadores de gestion.pdf

36K



PLAN DE TRABAJO GRASAS Y HARINAS EL CAIRO ENERO 13.pdf

565K



Proyeccion de cumplimiento contractuales.pdf

91K



Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial.pdf

199K



Solicitud de Prorroga Emprendedor.pdf

127K

Barrancabermeja, 13 de enero de 2023

DIRIGIDO A:

DR. OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA.

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 331182-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	SEBOS EL CAIRO
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS 901511684-9
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	SBCD- SENA BARRANCABERMEJA
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	68100
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	331-182-2021
FECHA DE INICIO	20-10-2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	Jullyadela19@hotmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

El motivo de los retrasos del desarrollo del plan de negocios Sebos El Cairo se debió a que la empresa Grobfuhrer, contratante del tanque de procesamiento el cual se iba a empezar a producir, y con esto cumplir con los indicadores producción y ventas, resultó ser una empresa Estafadora, con múltiples denuncias ante la Fiscalía y con muchas quejas de empresarios a los cuales no les entregaron sus equipos y maquinarias y no se responsabilizan por sus hechos. Los documentos de la empresa Grobfuhrer SAS con Nit 901.480.520-5, se encontraban limpios y su representante legal también, sin embargo, su Ingeniero de Proyectos Edgar Raúl Peña Bobadilla, CC. 80.174.918 y quien se encarga actualmente del diseño y las negociaciones, es el antiguo representante legal de la antigua empresa que se llamaban SOSPRO, pero actúan bajo el mismo modus operandi. Reciben los dineros de los anticipos, y luego se retrasan en las entregas y nunca entregan los equipos.

El 12 de septiembre se adelantó una demanda en la Fiscalía donde se expuso el caso, sin embargo fue inactiva porque “no había más demandas” sobre los estafadores, sin embargo, investigué y si hay 3 demandas más, entonces la fiscal del caso la va a volver a activar.

Por otro lado, adelanté una conciliación con la cámara de comercio de Bogotá la cual no resultó positiva porque los estafadores no quieren conciliar, entonces procederé a pasarlo a la parte civil.

La aseguradora aceptó que hay incumplimiento sin embargo dice que el solo incumplimiento no es motivo para indemnizar, y se debe comprobar que hubo daño. Nos asesoramos con un abogado quien nos ha dado indicaciones de cómo efectuar el proceso. Mientras se lleva a cabo, lo de la fiscalía, la aseguradora que llevará tiempo se estuvo gestionando los recursos nuevamente para la compra del tanque de procesamiento con otra empresa llamada NASA INDUSTRIAL, la cual ya ha contratado con el Fondo emprender. Se firmó contrato, se hizo el primer anticipo y se espera la entrega 45 días después de la firma del contrato.

SOLICITUD:

(De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes se debe indicar el tiempo (meses) de la prórroga y la proyección de cumplimiento de los indicadores y otras obligaciones contractuales pendiente a la fecha. La prórroga se solicita por 2 meses, para poder dar cumplimiento a la adquisición de los equipos y puesta en marcha y permisos de la CAS, bomberos, sanidad y el ICA que no se han podido llevar a cabo precisamente por carecer del cooker donde se procesara la materia prima y donde sufrirá la transformación; de esta manera poder cumplir con la producción de SEBO PROCESADO y Harina de hueso, que por carecer de este equipo, no se ha podido cumplir con los indicadores de producción y ventas y proyectamos que el 20 de febrero de 2023 que se cumplen los primeros 4 meses de prórroga, en las condiciones actuales no se alcanza a cumplir con dichos indicadores., por eso se requieren 2 meses mas para poder cumplir con el plana trazado.

En tal sentido y considerando que se requieren los recursos destinados a compra de equipos que se deben liberar para lo cual la emprendedora viene cumpliendo con los requisitos del debido proceso, se apoya las propuestas realizadas por la emprendedora así:

Mientras se lleva a cabo, lo de la fiscalía, la aseguradora que llevará tiempo se estuvo gestionando los recursos nuevamente para la compra del tanque de procesamiento con otra empresa llamada NASA INDUSTRIAL, la cual ya ha contratado con el Fondo emprender. Se firmó contrato, se hizo el primer anticipo de \$24.887.538 con recursos propios y se espera la entrega 45 días después de la firma del contrato.

Se hace necesario que la fiduciaria de una respuesta pronta para que pueda liberar los recursos en una cuantía de \$21.280.952 para destinarlos al segundo pago de la empresa NASA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS.

Una segunda opción en caso de que la fiduciaria no de una respuesta oportuna de cierre de caso para liberar los recursos disponibles, destinados al segundo pago de Grobfuhrer, es que yo pueda pagar la totalidad del valor del tanque a la empresa NASA, de acuerdo al contrato formalizado en el cual se hizo un primer pago del 50%, quedando pendiente un valor de \$24.887.538; pero los recursos disponibles Fondo Emprender se puedan destinar a la construcción de un horno refractario industrial para calcinación de hueso, totalmente necesario para el fin misional de la empresa Grasas y Harinas el Cairo. Considerando que llevar a cabo este plan de negocios ha tenido múltiples inconveniente originados por factores externos y dado que la emprendedora se ha mantenido firme e incluso ha tenido que conseguir recursos por el doble de lo aportado por Fondo emprender para poder cumplir;

considero que se debe dar la prórroga de dos meses adicionales dado que está contemplando en el acuerdo Fondo Emprender 010 y que amerita que se apoye la gestión y esfuerzo de una excelente emprendedora para constituir y poner en marcha una empresa de gran beneficio para el medio ambiente, la generación de empleo y el incremento de la productividad de la región.

Agradezco su atención prestada y quedo atenta a la respuesta,

Gloria Adelina Chipagra Rincon

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico -
Profesional G02

gchipagra@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:73674

Carrera 28 No. 56 - 10 Barrio Galan,
Barrancabermeja

Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión.

INDICADORES	META	EJECUCIÓN	% ESTADO ACTUAL	RESUMEN
EMPLEO	5 EMPLEOS	5 EMPLEOS	100%	Se cumplieron el 26 de octubre los 3 empleos que faltaban.
MERCADEO	3 EVENTOS	3 EVENTOS	100%	Van 3 eventos de mercadeo, (tarjetas, pendón y pagina web).
VENTAS	\$210.044.600	\$0	0%	Este indicador se encuentra en 0%, porque aún no se ha empezado a procesar.
PRODUCCIÓN	152.736 Kg	0 kg	0%	Este indicador se encuentra en 0%, porque aún no se ha empezado a procesar.
CONTRAPARTIDAS	6 eventos	6 eventos	100%	Ya se cumplió con el 100% de este indicador que eran, 6 eventos.

Plan de Trabajo: Plan de negocio ID 68100 – Sebos el Cairo 13 de enero de 2022

Se evidencia el plan de trabajo de la empresa Grasas y Harinas El Cairo, (Plan de Negocio Sebos el Cairo ID 68100), como respuesta a la solicitud hecha por la ***Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender – SENA***, de evidenciar de forma concreta, plan de trabajo, para sustentar los 2 meses más de prórroga.

Acciones por realizar

- Encontrar el predio idóneo para actividad. Ejecutado.
- Gestionar el concepto de uso de suelos con Planeación. Ejecutado.
- Firmar el contrato de arrendamiento del predio. Ejecutado.
- Realizar adecuaciones en el predio. Avance 95%
- Evidencia de equipos requeridos que aporta la emprendedora.
- Actualizar cotizaciones de maquinaria/equipos.
- Compra de maquinaria/equipos.
- Gestionar permisos y licencias con las entidades encargadas, sanidad, bomberos, CAS, ICA.
- Realizar contrapartidas. Ejecutado.
- Iniciar ejecución.
- Contratar los empleos faltantes. Ejecutado.
- Empezar la producción. Marzo
- Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Marzo
- Iniciar ventas con licencias. Marzo-abril
- Realizar el plan de mercadeo. Ejecutado.

PLAN DE TRABAJO, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES HASTA EL 20 DE ABRIL 2023

Se realiza un cronograma desde el 20 de octubre de 2022 hasta el 20 de febrero 2023, indicando mediante el sombreado de celdas, el tiempo que tomará concluir cada una de las tareas las cuales están programadas en el plan operativo adjunto a este documento, el cual se adjunta para la firma del Interventor.

Verde: actividad programada.

PLAN DE TRABAJO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Actualizar cotizaciones							
Compra maquinaria y equipos							
Instalaciones de sistema Eléctrico 220 y 110							
Instalación de gas							
Terminación de las Adecuaciones							
Indicador de Empleo al 100%							
Evidencia de equipos requeridos que aporta la emprendedora.							
Entrega de Maquinaria y Equipos							
Realización de funcionamientos de Equipos en Planta							
Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo							
OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE ICA, CAS, SANIDAD Y BOMBEROS							
Producción					15273,6 Kg	30547,2 Kg	45820,8 Kg
Ventas					\$25.000.000 millones	\$42.008.920 millones	\$59.017.840 millones

Objetivos generales y específicos

- Cumplir etapa pre-operativa.
- Adquirir lo equipos faltantes en el mes de diciembre e iniciar producción en el mes febrero de 2023.
- Cumplir con el 100% de empleos. Se cumplió el 26 de octubre de 2022
- Realizar los requerimientos contables estipulados.
- Cumplir parcialmente de las ventas.
- Cumplir con mínimo de la producción.

Resumen:

INDICADORES	META	EJECUCIÓN	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	% PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO
EMPLEO	5 EMPLEOS	1 EMPLEO	80%	100%	5 empleos
MERCADEO	3 EVENTOS	0 EVENTOS	100%	100%	3 eventos
VENTAS	\$210.044.600	\$0	55%	60%	\$126.026.760
PRODUCCIÓN	152.736 Kg	0 Kg	60%	60%	91.641 Kg
CONTRAPARTIDAS	6 eventos	2 eventos	100%	100%	6 eventos

Responsables de las acciones

<i>Acciones por realizar</i>	<i>Responsable</i>	<i>Puesto</i>	<i>Firma</i>
Actualizar cotizaciones	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Compra maquinaria y equipos	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Instalaciones de sistema Eléctrico 220 y 110	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Instalación de gas	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Adecuaciones	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Indicador de Empleo al 100%	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Entrega de Maquinaria y Equipos	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Pruebas	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA
Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo	Jully Peña	Gerente emprendedora	JULLY PEÑA

Licencias ICA, CAS, SANIDAD Y BOMBEROS	Jully Peña	Gerente emprendedora	<i>JULLY PEÑA</i>
Producción	Jully Peña	Gerente emprendedora	<i>JULLY PEÑA</i>
Ventas	Jully Peña	Gerente emprendedora	<i>JULLY PEÑA</i>

OBSERVACIONES: finalmente la contratista Grobfuhrer sas, no concilio con la cámara de comercio, el 25 de noviembre, nos obliga a iniciar demanda comercial, referente a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, se adelantó la reclamación y recibiendo respuesta el 13 de diciembre, que se hacía necesario cuantificar las perdidas para continuar con el trámite, se procede a cotizar nuevamente con diferentes empresas, y la empresa NASA INDUSTRIAL fue la más cercana al presupuesto y tiene referencias por parte de anteriores emprendedores, se está adelantando la contratación.

Responsable:

JULLY PEÑA
Jully Adelainy Peña Puerta

Emprendedora

Gloria Adelina

Gloria Adelina Chipagra Rincón

Profesional de emprendimiento

Orientadora Operativa

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR CUMPLIR DE GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS		
OBLIGACIÓN	ESTADO DE LA OBLIGACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Uso de suelos	Cumplido	Junio 2022
Firma de contrato y legalización de contrato de arrendamiento	Cumplido	Junio 2022
Aporte del Emprendedor	Cumplido	Junio 2022
Construcción de la empresa (13 bodegas y un perímetro de 651 m2, construidos)	Cumplido	Agosto 2022
Contrapartidas	Cumplido	Agosto 2022
Gestión de mercadeo	Cumplido	Septiembre 2022
Compra de maquinaria y equipos	En proceso	Noviembre 2022
Trámite y pago de licencias ica, cas, bomberos y sanidad	En tramite	Diciembre 2022
Empleos	Cumplido	Octubre 2022
Ventas	Sin cumplir	Febrero 2022
Producción	Sin cumplir	Febrero 2022

Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial

La empresa Grasas y Harinas el Cairo SAS, ha estado comercializando la materia prima la cual se recolecta en los expendios cárnicos (cebo y hueso, que no llegan al planto del consumidor), desde agosto de 2021, para cuando se empiece a procesar, ya existan proveedores fidelizados y se encuentre asegurada la materia prima.

La comercialización de materia prima alrededor de un año se puede tomar como **referente de las ventas**, puesto que se está comercializando materia prima por un valor entre 27 y 33 millones de ventas mensuales, esto indica que como mínimo esa sería la venta esperada para poder cumplir con el porcentaje proyectado de ventas.

Nota: la materia prima se compra por un valor normal es decir al mismo precio que se compraría cuando se inicie a procesar, y se vende a un precio que deja un poco de utilidad con el que se paga el transporte, los insumos y la nómina de los 3 operadores. Mientras que cuando se empiece a procesar, el valor de venta será de producto terminado y por ende dejará una mayor utilidad.

- Se cumplió con el indicador de empleo el 26 de octubre.
- El indicador de Mercadeo está cumplido al 100% con 3 eventos.
- El indicador de ventas se proyecta cumplir en su totalidad en el tiempo de prórroga, porque con los contratiempos que hubo de lluvias, el contratista encargado de la obra civil no pudo entregar a tiempo la construcción, no se contaba con el invierno tan terrible que hubo, incluso el día de la 3ra visita de interventoría hubo lluvia.

Adelantamos el nuevo contrato con el nuevo proveedor del tanque el 27 de diciembre para contratar la fabricación del tanque el cual llevará un periodo de tiempo 45 días y pago inicial del 50% y 50% a la entrega.

- El indicador de producción se proyecta cumplir en el tiempo de la nueva prórroga, puesto que el proveedor del tanque de procesamiento, se atrasó por la estafa que ocurrió con la “empresa” Grobfuhrer.

- El indicador de contrapartidas se encuentra realizado en su totalidad.

A continuación se muestra un cuadro de la proyección de cumplimiento de los indicadores de gestión de poder contar con el tiempo de prórroga.

INDICADORES	META	EJECUCIÓN	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	% PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTADO DE CUMPLIMIENTO
EMPLEO	5 EMPLEOS	5 EMPLEOS	80%	100%	5 empleos
MERCADEO	3 EVENTOS	3 EVENTOS	100%	100%	3 eventos
VENTAS	\$210.044.600	\$0	55%	60%	\$126.026.760
PRODUCCIÓN	152.736 Kg	0 Kg	60%	60%	91.641 Kg
CONTRAPARTIDAS	6 eventos	6 eventos	100%	100%	6 eventos

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN					
PRODUCTOS	ENERO Kg	FEBRERO Kg	MARZO Kg	ABRIL Kg	Total por producto
Sebo Tipo I	0	5091,2	10182,4	15273,6	30547,2
Harina de hueso	0	5091,2	10182,4	15273,6	30547,2
Harina de carne	0	5091,2	10182,4	15273,6	30547,2
TOTAL PRODUCCION					91641,6

PROYECCIÓN DE VENTAS					
PRODUCTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total por producto
Sebo Tipo I	\$ 0	\$ 8.333.33,333	\$ 14.002.973	\$ 19.672.613,33	\$ 42.008.919,33
Harina de hueso	\$ 0	\$ 8.333.33,333	\$ 14.002.973	\$ 19.672.613,33	\$ 42.008.919,33
Harina de carne	\$ 0	\$ 8.333.33,333	\$ 14.002.973	\$ 19.672.613,33	\$ 42.008.919,33
TOTAL VENTAS					\$ 126.026.757

JULLY PEÑA
Jully Adelany Peña Puerta
C.C. 1.096.184.639

Barrancabermeja, 13 de enero de 2023

DIRIGIDO A:

DR. OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 331182-2021

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS	SEBOS EL CAIRO
NOMBRE DE LA EMPRESA	GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS 901511684-9
NOMBRE DE EMPRENDEDOR (ES)	JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	SBCE- SENA BARRANCABERMEJA
ID O NUMERO DE PLAN DE NEGOCIO	68100
NO. DE CONTRATO DE COOPERACIÓN	331-182-2021
FECHA DE INICIO	20-10-2021
TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADO – NUMERO DE MESES (Números enteros)	2
CORREO ELECTRONICO ACTUALIZADO DONDE SE RECIBIRÁ LA MINUTA	Jullyadela19@hotmail.com

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD (Razones y/o argumentos):

(Se debe describir brevemente el motivo de los retrasos del desarrollo del plan de negocios, que dan como resultado la solicitud de prórroga e incluir soportes si aplica). Tener presente que los motivos de retraso deben obedecer a causas de fuerza mayor, es decir, aspectos no imputables a la falta de gestión del Emprendedor.

El motivo de los retrasos del desarrollo del plan de negocios Sebos El Cairo se debió a que la empresa Grobfuhrer, contratante del tanque de procesamiento el cual se iba a empezar a producir, y con esto cumplir con los indicadores producción y ventas, resultó ser una empresa Estafadora, con multiplex denuncias ante la Fiscalía y con muchas quejas de empresarios a los cuales no les entregaron sus equipos y maquinarias y no se responsabilizan por sus hechos. Los documentos de la empresa Grobfuhrer SAS con nit 901.480.520-5, se encontraban limpios y su representante legal también, sin embargo su Ingeniero de Proyectos Edgar Raúl Peña Bobadilla, CC. 80.174.918 y quien se encarga actualmente del diseño y las negociaciones, es el antiguo representante legal de la antigua empresa que se llamaban SOSPRO, pero actúan bajo el mismo modus operandi. Reciben los dineros de los anticipos, y luego se retrasan en las entregas y nunca entregan los equipos.

El 12 de septiembre se adelantó una demanda en la Fiscalía donde se expuso el caso, sin embargo fue inactiva porque “no había más demandas” sobre los estafadores, sin embargo, investigué y si hay 3 demandas más, entonces la fiscal del caso la va a volver a activar.

Por otro lado adelanté una conciliación con la cámara de comercio de Bogotá la cual no resultó positiva porque los estafadores no quieren conciliar, entonces procederé a pasarlo a la parte civil.

La aseguradora aceptó que hay incumplimiento sin embargo dice que el solo incumplimiento no es motivo para indemnizar, y se debe comprobar que hubo daño. Nos asesoramos con un abogado quien nos ha dado indicaciones de cómo efectuar el proceso.

Mientras se lleva a cabo, lo de la fiscalía, la aseguradora que llevará tiempo se estuvo gestionando los recursos nuevamente para la compra del tanque de procesamiento con otra empresa llamada NASA INDUSTRIAL, la cual ya ha contratado con el Fondo emprender. Se firmó contrato, se hizo el primer anticipo de \$24.887.538 con recursos propios y se espera la entrega 45 días después de la firma del contrato.

Se hace necesario que la fiduciaria de una respuesta pronta para que pueda liberar los recursos en una cuantía de \$21.280.952 para destinarlos al segundo pago de la empresa NASA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS.

Una segunda opción en caso de que la fiduciaria no de una respuesta oportuna de cierre de caso para liberar los recursos disponibles, destinados al segundo pago de Grobfuhrer, es que yo pueda pagar la totalidad del valor del tanque a la empresa NASA, de acuerdo al contrato formalizado en el cual se hizo un primer pago del 50%, quedando pendiente un valor de \$24.887.538; pero los recursos disponibles Fondo Emprender se puedan destinar a la construcción de un horno refractario industrial para calcinación de hueso, totalmente necesario para el fin misional de la empresa Grasas y Harinas el Cairo.

SOLICITUD:


(De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes se debe indicar el tiempo (meses) de la prórroga y la proyección de cumplimiento de los indicadores y otras obligaciones contractuales pendiente a la fecha.

La prórroga se solicita por 2 meses, porque no se ha podido cumplir con los indicadores de producción y ventas y proyectamos que el 20 de febrero de 2023 que se cumplen los 4 meses de prórroga, aún no se alcanza a cumplir con dichos indicadores.

Agradezco su atención prestada y quedo atenta a la respuesta,

ANEXOS:

- 1- Carta de la solicitud.
- 2- Comunicación suscrita por el Líder de Red o Líder de la unidad de emprendimiento en la que se señale un análisis de la justificación expuesta por el emprendedor y una recomendación frente a la solicitud del emprendedor.
- 3- Diagnóstico o estado actual de los indicadores de gestión.
- 4- Proyección de cumplimiento de indicadores de gestión y resultados y efectividad empresarial.
- 5- Proyección de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 6- Plan de Trabajo



FIRMA DEL(OS) EMPRENDEDOR(ES)

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR: JULLY ADELAINY PEÑA PUERTA

C.C.: 1.096.184.639

NO. DE CONTRATO: 331-182-2021

ID DEL PROYECTO: 68100
