

Informe de Gestión No. 27
Contrato de Adhesión No. 20 Ministerio del Interior
Período del 01 al 30 de abril del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Abril 30 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
4 Atención al Emprendedor.....	10
CONCLUSIONES Y RETOS	10
ANEXOS.....	12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 20; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Ministerio del Interior, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de abril del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Adhesión	20	Entidad Adherente	Ministerio del Interior
Fecha de Inicio	15/02/2021		
Duración	Desde el 15/02/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$2.000.000.000		
Valor Aporte SENA	\$1.000.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$1.000.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Hilda Gutiérrez. Directora para la democracia y participación ciudadana y la acción comunal. Judith Salazar. Directora de asuntos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Hilda Gutiérrez.		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Directora para la democracia y participación ciudadana y la acción comunal.		
Número Telefónico o Celular	3138281247 2427400 Ext. 3808	Correo Electrónico	hilda.gutierrez@mininterior.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 20.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9733_ABRIL_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

No. Convocatoria	187
Recursos SENA	\$ 1.000.000.000
Recursos Adherente	\$ 1.000.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 2.000.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.978.885.733

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 0
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 21.114.267
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.978.885.733
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Valor Trasladado a la SENA	\$ 989.442.867
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 989.442.867
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.978.885.733
Ejecución recursos SENA	\$ 973.864.754
Ejecución recursos Adherente	\$ 973.864.754
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.947.729.508


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9733
Saldo Total en Bancos	\$ 11.447.018,18
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 889.883,18
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 187 perteneciente al Ministerio del Interior, al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.978.885.733 equivalente al 98.94% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$21.114.267 a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.947.729.508 equivalente al 98.43% de los recursos comprometidos y al 97.39% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

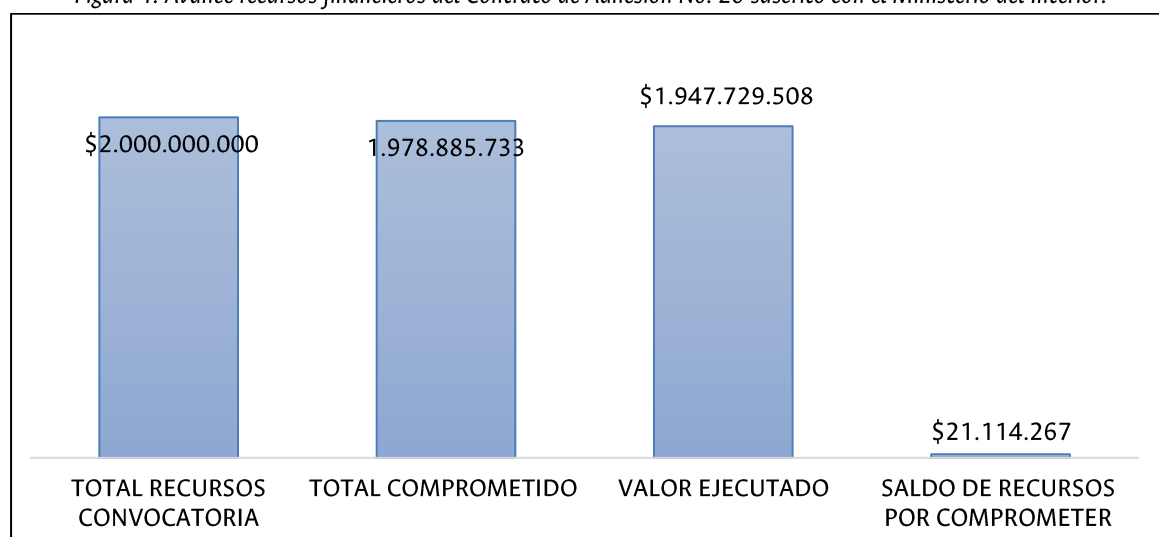

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 187 Ministerio de Interior, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en el enlace <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1872020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Convocatoria	187		
Fecha de Lanzamiento	16/04/2021	Fecha de Cierre	04/07/2021
Fecha de Apertura	16/04/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$120.000.000
Fecha de Cierre Corte No. 1	04/07/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/09/2021

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se presentan las

generalidades con respecto al proceso de acreditación de la convocatoria No. 187 perteneciente al Ministerio del Interior.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Convocatoria				187			
Corte No. 1	Fecha Apertura		16/04/2021		Fecha de Cierre		04/07/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/07/21	Número de Planes Formalizados	20	Número de Planes Acreditados	19	% de Acreditación	95%
Corte No. 2	Fecha Apertura		05/08/2021		Fecha de Cierre		03/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100 %

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 187 – Ministerio del Interior.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Número de Convocatoria				187			
Corte No 1	Fecha Apertura		16/04/2021		Fecha de Cierre		04/07/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	02/08/21	Número de Planes Evaluados	19	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	63%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	12	Valor Planes a Financiar	\$1.380.534.746
Corte No 2	Fecha Apertura		05/08/2021		Fecha de Cierre		03/09/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	Nov. 2021	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$598.565.852

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de abril de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 187, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187.

Planes de negocio primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 187 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72277	435-187-2021	LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER	28/01/2022	28/01/2023	\$119.925.432	80,00%	112,50%	100,00%	99,68%	TERMINADO
2	73850	436-187-2021	BITE ME DESSERTS	17/01/2022	17/01/2023	\$119.925.432	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74802	437-187-2021	FITNESS EVOLUTION	18/01/2022	18/01/2023	\$89.415.860	100,00%	142,86%	100,00%	98,43%	TERMINADO
4	74868	438-187-2021	COCOSHELL	18/01/2022	18/01/2023	\$119.016.906	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	75364	439-187-2021	RUBIOH	19/01/2022	19/01/2023	\$101.719.704	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	75433	440-187-2021	INTEGRADORES INGENIERÍA	17/01/2022	17/01/2023	\$119.925.432	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	75436	441-187-2021	A3P BY ANDREA TRESPALACIOS	20/01/2022	20/01/2023	\$119.925.432	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	75513	442-187-2021	QUALIA	20/01/2022	20/01/2023	\$118.632.415	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	75563	443-187-2021	HAPPY WAFFY	24/01/2022	24/01/2023	\$119.925.432	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	76627	444-187-2021	CHEESE FINGGA	24/01/2022	24/01/2023	\$119.540.045	80,00%	100,00%	100,00%	92,15%	TERMINADO
11	76628	445-187-2021	THE FOOD LAB	27/01/2022	27/01/2023	\$112.657.224	80,00%	120,00%	100,00%	97,32%	TERMINADO
12	76647	446-187-2021	MAR Y ARENA	27/01/2022	27/01/2023	\$119.925.432	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO


Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 187 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74869	467-187-2021	3... 2... 1... ¡Surprise!	17/03/2022	17/05/2023	\$119.016.906	100,00%	40,00%	87,50%	93,40%	VIGENTE
2	73901	465-187-2021	Bali	17/03/2022	17/03/2023	\$119.710.567	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74798	466-187-2021	Providence Natural Roots	18/03/2022	18/03/2023	\$119.772.650	100,00%	100,00%	112,50%	92,39%	TERMINADO
4	74877	468-187-2021	Fantastic Beauty Spa	24/03/2022	24/03/2023	\$119.925.432	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74879	469-187-2021	Howart'S	16/03/2022	16/03/2023	\$119.925.432	75,00%	100,00%	75,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador, mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 187 2C.

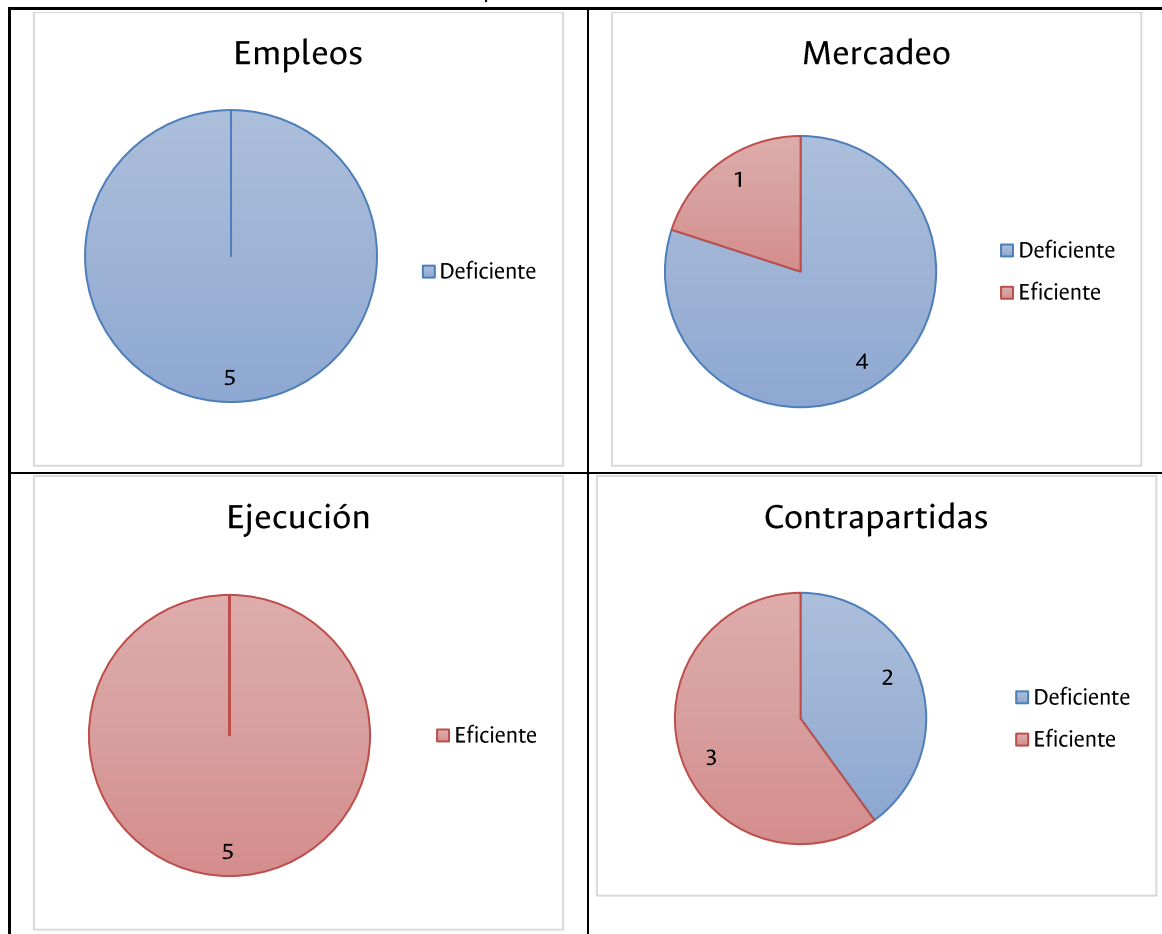

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 187, se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.


Tabla 11. Ficha técnica de la convocatoria 187.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$2.000.000.000
Número total de planes formalizados	28
Número total de planes acreditados	27
Número total de planes viables	20
Número de planes financiados	17
Número de planes aprobados en CDN	17
Total recursos aprobados en CDN	\$1.978.885.733
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.978.885.733
Saldo de recursos por comprometer	\$ 21.114.267
Ejecución acumulada de recursos	\$1.947.729.508

A continuación, se presenta de manera gráfica el estado de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 184– Ministerio del Interior.

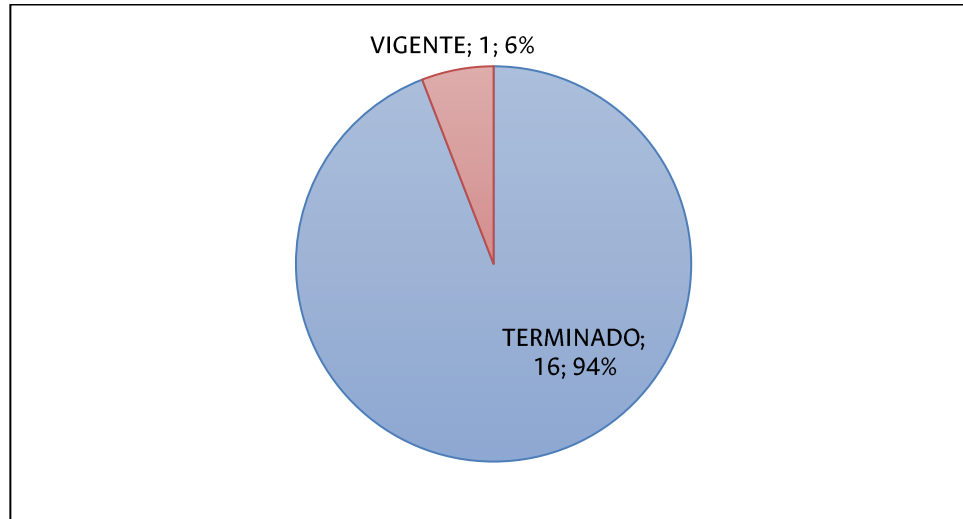

Conclusiones generales del período del 01 al 30 de abril de 2023:

1. La Convocatoria 187 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 04/07/2021, donde se formalizaron 20 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 19 de los 20 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 95% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, viabilizó 12 planes de los 19 acreditados para una efectividad del 63%. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria se aprobó el financiamiento por parte del Consejo Directivo Nacional de 12 planes de negocios por valor de \$1.380.534.746, equivalentes al 69% de los recursos disponibles de la convocatoria 187 - Ministerio de Interior.
3. El segundo cierre de la convocatoria 187 tuvo lugar el día 03/09/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 187 acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 187 – Fondo Emprender, viabilizó 8 planes de los 8 acreditados para una efectividad del 100%.
5. Atendiendo los recursos disponibles para el segundo cierre de la convocatoria 5 planes de negocios de los 8 viables tienen recomendación de financiamiento, por valor de \$598.565.852.

6. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 5 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (3), otras solicitudes operativas (2) para la convocatoria 187 - Min Interior, solicitudes resueltas oportunamente.
7. Actualmente se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.978.885.733, quedando un saldo por comprometer de \$21.114.267.
8. Al 30 de abril de 2023 (16) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 187 se encuentran terminados.
9. Con corte a la fecha los planes de negocio presentan una ejecución acumulada de \$1.947.729.508.
10. En lo corrido del año 2023 en el proceso de interventoría se han recibido 7 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 2 cerradas), agenda especial (0 abiertas y 2 cerradas), informes y conceptos 0 abiertas y 3 cerradas), otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas) y reintegro (0 abiertas y 0 cerradas).
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 187 no se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un acumulado de 38 pagos rechazados de los cuales el 45% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 37% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 18% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Se espera que el plan de negocio vigente y aprobado en el segundo cierre de la convocatoria No. 187 continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 187, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 187 por valor total de \$ 21.114.267,00 por el SENA (\$ 10.557.133,50) y el ente adherente (\$ 10.557.133,50), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 889.883,18, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9733_ABRIL_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 187

Anexo1_EXTRACTO_DAV_9733_ABRIL_2023



DAVIVIENDA



H.81

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9733

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$11,374,833.49
Más Créditos	\$72,184.69
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$11,447,018.18
Saldo Promedio	\$11,374,833.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 72,184.69+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Abril 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72277	LINGUA SHAPERS - TRAININ	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.538.000,00	\$ 478.152,00	\$ 120.016.152,00	\$ -	\$ -	\$ 388.981,73
73850	BITE ME DESSERTS	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74802	FITNESS EVOLUTION	187	\$ 89.415.860,00	\$ 357.663,44	\$ 89.773.523,44	\$ 88.015.201,00	\$ 352.060,80	\$ 88.367.261,80	\$ -	\$ -	\$ 1.406.261,64
74868	COCOSHELL	187	\$ 119.016.906,00	\$ 476.067,62	\$ 119.492.973,62	\$ 119.016.906,00	\$ 476.067,62	\$ 119.492.973,62	\$ -	\$ -	-\$ 0,00
75364	RUBIOH	187	\$ 101.719.704,00	\$ 406.878,82	\$ 102.126.582,82	\$ 101.719.704,00	\$ 406.878,82	\$ 102.126.582,82	\$ -	\$ -	\$ 0,00
75433	INTEGRADORES INGENIERÍA	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.431,92	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,65	\$ -	\$ -	\$ 0,08
75436	A3P BY ANDREA TRESPALAC	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
75513	QUALIA	187	\$ 118.632.415,00	\$ 474.529,66	\$ 119.106.944,66	\$ 120.114.415,00	\$ 480.457,66	\$ 120.594.872,66	\$ 1.482.000,00	\$ 5.928,00	\$ -
75563	HAPPY WAFFY	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
76627	CHEESE FINGGA	187	\$ 119.540.045,00	\$ 478.160,18	\$ 120.018.205,18	\$ 110.159.070,00	\$ 440.636,28	\$ 110.599.706,28	\$ -	\$ -	\$ 9.418.498,90
76628	THE FOOD LAB	187	\$ 112.657.224,00	\$ 450.628,90	\$ 113.107.852,90	\$ 109.635.200,00	\$ 438.540,80	\$ 110.073.740,80	\$ -	\$ -	\$ 3.034.112,10
76647	MAR Y ARENA	187	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
73901	BALI	187-2	\$ 119.710.567,00	\$ 478.842,27	\$ 120.189.409,27	\$ 119.710.567,00	\$ 478.842,27	\$ 120.189.409,27	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74798	PROVIDENCE NATURAL ROC	187-2	\$ 119.772.650,00	\$ 479.090,60	\$ 120.251.740,60	\$ 110.659.422,00	\$ 442.637,69	\$ 111.102.059,69	\$ -	\$ -	\$ 9.149.680,91
74869	3... 2... 1... ¡SURPRISE!	187-2	\$ 119.016.906,00	\$ 476.067,62	\$ 119.492.973,62	\$ 111.165.000,00	\$ 444.660,00	\$ 111.609.660,00	\$ -	\$ -	\$ 7.883.313,62
74877	FANTASTIC BEAUTY SPA	187-2	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.431,55	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,28	\$ -	\$ -	\$ 0,45
74879	HOWART'S	187-2	\$ 119.925.432,00	\$ 479.701,73	\$ 120.405.133,73	\$ 119.925.431,17	\$ 479.701,72	\$ 120.405.132,89	\$ -	\$ -	\$ 0,84
TOTAL			\$ 1.978.885.733,00	\$ 7.915.542,95	\$ 1.986.801.275,95	\$ 1.949.211.507,64	\$ 7.796.846,03	\$ 1.957.008.353,67	\$ 1.482.000,00	\$ 5.928,00	\$ 31.280.850,28

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 187

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72277
Plan de Negocios:	LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	JULIE PIRAQUIVE NUÑEZ
Cedula	53052104
No. Contrato	435-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EDUCACION 21 CONSULTORES S.A.S.
Nit	901.541.916-0
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipelago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/28/2022
Segunda visita	5/23/2022
Tercera visita	9/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	980	14	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.600.000, 00	\$56.370.000, 00	28,38%	\$119.925.432, 00	\$119.538.000, 00	99,68%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73850
Plan de Negocios:	BITE ME DESSERTS
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA LUCIA OSORIO GARCIA
Cedula	1078367753
No. Contrato	436-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BITE ME DESSERTS S.A.S.
Nit	901.528.970-5
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/17/2022
Segunda visita	6/1/2022
Tercera visita	9/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	8335	1246	15%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$250.970.000, 00	\$11.477.863, 00	4,57%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74802
Plan de Negocios:	FITNESS EVOLUTION
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	ANDREA CAROLINA WARD LOPEZ
Cedula	1120980939
No. Contrato	437-187-2021
Valor Contrato	\$89.415.860, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NO PAIN NO GAIN, FITNESS EVOLUTION S.A.S
Nit	901.556.258-8
Ciudad	Providencia
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/19/2022
Tercera visita	9/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	10	143%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	10800	2171	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$127.400.000, 00	\$42.245.980, 00	33,16%	\$89.415.860, 00	\$88.015.201, 00	98,43%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74868
Plan de Negocios:	COCOSHELL
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	SASHA JULIETH ROBINSON BROWN
Cedula	1045680806
No. Contrato	438-187-2021
Valor Contrato	\$119.016.906, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COCOSHELL S.A.S. BIC
Nit	901.557.174-2
Ciudad	Providencia
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/20/2022
Tercera visita	9/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4410	5855	133%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$181.260.000, 00	\$344.601.882, 00	190,11%	\$119.016.906, 00	\$119.016.906, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75364
Plan de Negocios:	RUBIOH
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	STEPHANY PAOLA RUBIO MOLINA
Cedula	39175484
No. Contrato	439-187-2021
Valor Contrato	\$101.719.704, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	RUBI -OH S.A.S.
Nit	901.531.273-0
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/19/2022
Segunda visita	5/25/2022
Tercera visita	9/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/19/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	2095	171	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$214.050.000, 00	\$14.580.000, 00	6,81%	\$101.719.704, 00	\$101.719.704, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75433
Plan de Negocios:	INTEGRADORES INGENIERÍA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	GISELLE MANSANG CALVO
Cedula	1123621240
No. Contrato	440-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INTEGRADORES INGENIERIA GAHO S.A.S.
Nit	901.176.666-9
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/17/2022
Segunda visita	5/26/2022
Tercera visita	9/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	14	14	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	123	535	435%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$251.600.000, 00	\$80.227.509, 00	31,89%	\$119.925.432, 00	\$119.925.431,9 20	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75436
Plan de Negocios:	A3P BY ANDREA TRESPALACIOS
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	ANDREA CAROLINA TRESPALACIOS FRANCIS
Cedula	1152453240
No. Contrato	441-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	A3P BY ANDREA TRESPALACIOS S.A.S.
Nit	901.535.094-7
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/24/2022
Tercera visita	9/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	13	13	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	4105	91	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$263.705.000, 00	\$6.029.750, 00	2,29%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75513
Plan de Negocios:	QUALIA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA CAMILA DIAZ MARRIAGA
Cedula	1123637085
No. Contrato	442-187-2021
Valor Contrato	\$118.632.415, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	QUALIA BY CAMILA DIAZ S.A.S.
Nit	901.528.461-8
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/18/2022
Tercera visita	9/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2200	312	14%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$241.450.000, 00	\$18.373.550, 00	7,61%	\$118.632.415, 00	\$118.632.415, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75563
Plan de Negocios:	HAPPY WAFFY
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	ISABELA FANDIÑO GOMEZ
Cedula	1123633109
No. Contrato	443-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HAPPY WAFFY SAI S.A.S.
Nit	901.534.833-9
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipelago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/24/2022
Segunda visita	5/31/2022
Tercera visita	9/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	10720	508	5%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$233.090.000, 00	\$10.428.000, 00	4,47%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76627
Plan de Negocios:	CHEESE FINGGA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	GIPSSY MARY BALDONADO REYES
Cedula	1140821049
No. Contrato	444-187-2021
Valor Contrato	\$119.540.045, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CHESSE FINGGA S.A.S
Nit	901.557.674-3
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/24/2022
Segunda visita	5/27/2022
Tercera visita	9/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	22025	864	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$231.685.000, 00	\$1.124.000, 00	0,49%	\$119.540.045, 00	\$110.159.070, 00	92,15%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76628
Plan de Negocios:	THE FOOD LAB
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	NADIA YEPES BRUN
Cedula	1026564344
No. Contrato	445-187-2021
Valor Contrato	\$112.657.224, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	THE FOOD LAB S.A.S
Nit	901.537.432-2
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	6/3/2022
Tercera visita	9/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	5	6	120%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	9360	3557	38%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$252.610.000, 00	\$8.162.150, 00	3,23%	\$112.657.224, 00	\$109.635.200, 00	97,32%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76647
Plan de Negocios:	MAR Y ARENA
Convocatoria	187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario	KATHRIN PAOLA CORONADO ALVAREZ
Cedula	1123628908
No. Contrato	446-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MAR Y ARENA SAI SAS
Nit	901.558.404-6
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	6/2/2022
Tercera visita	9/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2196	106	5%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$209.670.000, 00	\$12.740.000, 00	6,08%	\$119.925.432, 00	\$119.925.432, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73901
Plan de Negocios:	Bali
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	CATHERINE ABELLO ESCOBAR
Cedula	1128060680
No. Contrato	465-187-2021
Valor Contrato	\$119.710.567, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BALI SMOOTHIES & JUICES S.A.S
Nit	901.575.850-1
Ciudad	San Andres
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	7/11/2022
Tercera visita	11/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	18290	4173	23%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$237.890.000, 00	\$119.794.732, 00	50,36%	\$119.710.567, 00	\$119.710.567, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74798
Plan de Negocios:	Providence Natural Roots
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	LESVIA HERNANDEZ MERCADO
Cedula	22727278
No. Contrato	466-187-2021
Valor Contrato	\$119.772.650, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PROVIDENCE NATURAL ROOTS S.A.S
Nit	901.563.870-5
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	7/14/2022
Tercera visita	11/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	11520	110	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$164.790.000, 00	\$507.500, 00	0,31%	\$119.772.650, 00	\$110.659.422, 00	92,39%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74869
Plan de Negocios:	3... 2... 1... ¡Surprise!
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	SHANITH PATRICIA CASTRILLO TORRES
Cedula	1124044905
No. Contrato	467-187-2021
Valor Contrato	\$119.016.906, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	3...2...1... ¡SURPRISE! S.A.S BIC
Nit	901.564.288-2
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/17/2022
Segunda visita	7/13/2022
Tercera visita	11/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	5/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	4	40%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	7	88%	460	179	39%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.150.000, 00	\$45.634.875, 00	31,88%	\$119.016.906, 00	\$111.165.000, 00	93,4%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74877
Plan de Negocios:	Fantastic Beauty Spa
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	CHARLINE ZULAY DUFFIS O'NEILL
Cedula	40993930
No. Contrato	468-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FANTASTIC BEAUTY SPA SAS BIC
Nit	901.557.705-3
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	7/15/2022
Tercera visita	11/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	1373	244	18%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$166.540.000, 00	\$25.234.375, 00	15,15%	\$119.925.432, 00	\$119.925.431,5 50	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74879
Plan de Negocios:	Howart'S
Convocatoria	187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario	CARLA ANDREA HOWARD PALACIO
Cedula	40993611
No. Contrato	469-187-2021
Valor Contrato	\$119.925.432, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HOWARTS SAS BIC
Nit	901.564.290-8
Ciudad	Providencia y Santa Catalina
Departamento	Archipiélago de San Andres

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA MORENO MARÍA ISABEL
Fecha de Inicio	3/16/2022
Segunda visita	7/12/2022
Tercera visita	11/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/16/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	6	75%	5179	1746	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$166.182.000, 00	\$4.791.450, 00	2,88%	\$119.925.432, 00	\$119.925.431,1 70	100%
