

Informe de Gestión No. 30
Contrato de Adhesión No. 10 Municipio de Planadas
Período del 01 al 31 de mayo del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Mayo 31 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero.....	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico.....	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación	7
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	8
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS.....	15

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 10; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2023, del contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planadas, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de mayo del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Adhesión	10	Entidad Adherente	Municipio de Planadas
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$924.000.000		
Valor Aporte SENA	\$616.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$308.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Elisa Dayan Henao Rivera		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Elisa Dayan Henao Rivera		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Jefe de Oficina Asesora de Planeación municipio de Planadas		
Número Telefónico o Celular	(+57)8 2265126	Correo Electrónico	oficinaplaneacion@planadas-tolima.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Diego Gutiérrez	Correo Electrónico	digutierrezb@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de mayo del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo del convenio de adhesión No. 10.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo 1. EXTRACTO_DAV_8966_MAYO_2023.

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 10 suscrito con el Municipio de Planadas, Tolima.

No. Convocatoria	176
Recursos SENA	\$ 616.000.000
Recursos Adherente	\$ 308.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 924.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.172.729.580

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 251.475.486
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 2.745.906
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 921.254.094
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 10 suscrito con el Municipio de Planadas, Tolima.


Valor Trasladado al SENA	\$ 614.169.396
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 307.084.698
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 921.254.094
Ejecución recursos SENA	\$ 446.502.582
Ejecución recursos Adherente	\$ 223.251.291
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 669.753.873

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 10 suscrito con el Municipio de Planadas, Tolima.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8966
Saldo Total en Bancos	\$ 1.298.109,42
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 382.806,75
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 176 perteneciente al municipio de Planadas, Tolima al 31 de mayo de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$921.254.094 equivalentes al 99.70% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$2.745.906 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

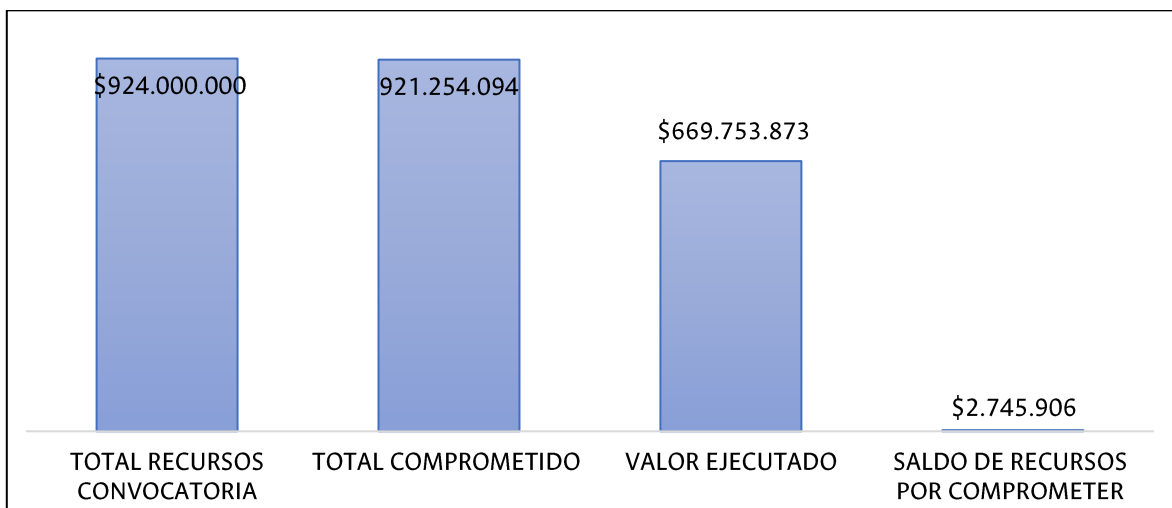

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$669.753.873, equivalentes al 72.70% de los recursos comprometidos y 72.48% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de mayo del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Empezar, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Empezar. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Empezar.

Para el caso de la convocatoria No. 176 específica para el municipio de Planadas, Tolima, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoempezar.com/SitePages/FondoEmpezarConv1762020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Empezar, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria	176		
Fecha de Lanzamiento	19/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$84.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	31/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	10/06/2021	Fecha de Cierre Corte No. 4	06/06/2022
Fecha de Cierre Corte No. 5	12/09/2022	Fecha de Cierre Corte No. 6	18/10/2022

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de mayo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación se muestra el consolidado general de los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria 176 – Planadas, cuyos resultados se entregaron de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria				176			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/02/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21 05/04/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	75%
Corte No. 3	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/06/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	88%
Corte No. 4	Fecha Apertura		Mayo 2022		Fecha de Cierre		06/06/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	50%
Corte No. 5	Fecha Apertura		Agosto 2022		Fecha de Cierre		12/09/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	20/09/22	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%
Corte No. 6	Fecha Apertura		Octubre 2022		Fecha de Cierre		18/10/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	26/10/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de mayo de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria 176 – Planadas.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Número de Convocatoria					176		
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/03/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	24/03/21	Fecha de Consejo Directivo	06/04/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	83%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$418.663.618
Corte No. 3	Fecha Apertura		06/03/2021		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	12/07/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	6	Valor Planes a Financiar	\$502.511.318
Corte No. 4	Fecha Apertura		Mayo 2022		Fecha de Cierre		10/06/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/22	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%

Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/22	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$83.802.744
Corte No. 5	Fecha Apertura		Agosto 2022		Fecha de Cierre		12/09/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	03/10/22	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	18/10/22	Fecha de Consejo Directivo	08/11/22	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$84.000.000
Corte No. 6	Fecha Apertura		Octubre 2022		Fecha de Cierre		12/09/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	04/11/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Dic 2022	Fecha de Consejo Directivo	Dic 2022	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$83.751.900

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2023, se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 176, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 176.

Planes de negocio segundo corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74293	303-176-2021	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR	8/10/2021	8/10/2022	\$84.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74340	305-176-2021	AGROTURISMO SANTA LUCIA	30/08/2021	30/08/2022	\$83.881.048	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
3	74279	302-176-2021	DYNASTY GUTIERREZ COFFE	27/08/2021	27/08/2022	\$84.000.000	157,14%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74335	304-176-2021	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS	30/08/2021	30/08/2022	\$83.391.285	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74393	306-176-2021	INSPIRACION, AVES Y CAFE	31/08/2021	31/08/2022	\$83.391.285	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio tercer corte

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74452	361-176-2021	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN			\$83.594.438	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74226	358-176-2021	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE	16/11/2021	16/02/2023	\$84.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74363	359-176-2021	ROMA STATE COFFEE	11/11/2021	11/11/2022	\$82.995.194	100,00%	100,00%	100,00%	99,64%	TERMINADO
4	74397	360-176-2021	EBANISTERÍA EL OSO	6/12/2021	6/12/2022	\$83.977.314	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
5	75015	362-176-2021	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS	18/11/2021	18/11/2022	\$83.995.770	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	75020	363-176-2021	VICAPE 83	19/11/2021	19/11/2022	\$83.948.602	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio cuarto corte

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	81871	556-176-2022	COFFEE SCADA SAS			\$83.802.744	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LEGALIZACIÓN

Planes de negocio quinto corte

Tabla 12. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 5C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	82045	563-176-2022	COFFEENEY SPECIALITY	10/04/2023	10/04/2024	\$84.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	VIGENTE

Planes de negocio sexto corte

Tabla 13. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 6C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	81913	568-176-2022	MULTILAMINAS PLANADAS	9/05/2023	9/05/2024	\$83.751.900	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

El plan de negocio aprobado y financiado en el corte 4, se está en preparación de la primera visita por parte de la interventoría para iniciar el proceso de ejecución.

Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentra 1 informe final de interventoría que fue entregado al SENA para aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la condonación de recursos para la convocatoria 176 – Planadas. Mayor detalle a continuación:

Tabla 14. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

N o	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	74393	INSPIRACION, AVES Y CAFE	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN	0	0	\$ -

La Universidad Nacional de Colombia, en próxima Comisión Técnica, presentará la recomendación de condonación de este plan de negocio.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de mayo de 2023, se presentaron las observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor, mencionadas a continuación.

- La Universidad Nacional de Colombia a través del comunicado con radicado de salida B.FI.1 [T]-1299-182-23 (anexo 4) del día 04 de mayo de 2023 recomienda al SENA dar por terminada la relación del contrato de cooperación empresarial No. 556-176-2022, suscrito entre el SENA, la Universidad Nacional de Colombia y el emprendedor JHON FREDY CHARRY CORTES teniendo en cuenta que no hubo acta de inicio para el plan de negocio ID 81871 y por ende no se inició la ejecución del contrato de cooperación empresarial.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 176, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 15. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 924.000.000
Número total de planes formalizados	21
Número total de planes acreditados	17
Número total de planes viables	16
Número de planes financiados	14
Número de planes aprobados en CDN	14
Total recursos aprobados en CDN	\$1.172.729.580
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	3
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 251.475.486
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$ 921.254.094
Saldo de recursos por comprometer	\$ 2.745.906
Ejecución acumulada de recursos	\$ 669.753.873

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 176.

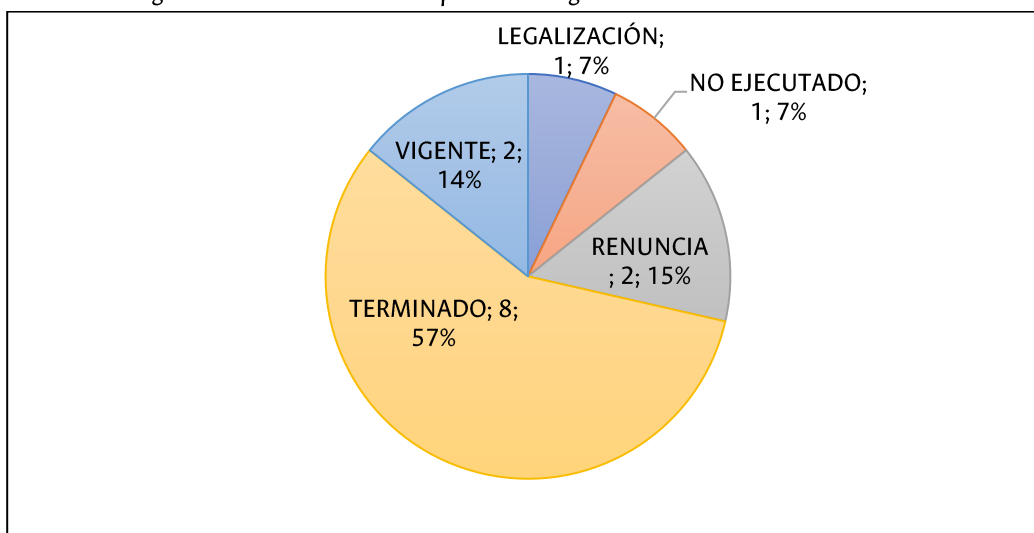

Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de mayo de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 176 tuvo su primer cierre el día 31/01/2021, donde no se formalizaron planes de negocio, por lo tanto, los informes de los procesos de acreditación y evaluación para este cierre se realizaron mediante la publicación en blanco de los informes respectivos.
2. El día 05/03/2021 tuvo lugar el segundo cierre de la convocatoria 176 donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 176 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 6 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 75% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 176, viabiliza 5 de los 6 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 83% de viabilidad.
4. En el segundo cierre de la convocatoria se recomendó la financiación de 5 planes de negocio, por valor de \$418.663.618.
5. El tercer cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 10/06/2021, en el cual se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 176, acreditó 7 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 176, viabiliza 7 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 100% de viabilidad. Así mismo se aprobó la financiación de 6 planes de negocio, por valor de \$502.513.318, esto en consideración a la disponibilidad de recursos existentes.
7. El cuarto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la Convocatoria 176, acreditó 1 de los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 50% de acreditación.
8. El proceso de evaluación del corte No. 4 de la Convocatoria 176, viabiliza y aprobó para financiamiento un plan de negocios por valor de \$83.802.744.

9. El quinto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 12/09/2022, en el cual se formalizó un plan de negocio. El proceso de acreditación del quinto corte de la Convocatoria 176, acreditó el plan de negocios formalizado, para un desempeño del 100% de acreditación.
10. El proceso de evaluación del corte No.5 de la Convocatoria 176, aprobó el financiamiento de un plan de negocio por valor de \$84.000.000. El sexto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 18/10/2022, en el cual se formalizaron dos planes de negocio. El proceso de acreditación del sexto corte de la Convocatoria 176, acreditó dos planes de negocios formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
11. El proceso de evaluación del corte No.6 de la Convocatoria 176, viabiliza dos planes de negocios acreditados, sin embargo, atendiendo la disponibilidad se aprobó el financiamiento de un plan de negocios por valor de \$83.751.900, en el Consejo Directiva Nacional desarrollado en el mes de diciembre de 2022
12. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 13 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (5), prórrogas (3), otras solicitudes operativas (2), terminaciones anticipadas (2) y renunciaciones (1) para la convocatoria 176 - Planadas, solicitudes resueltas oportunamente.
13. A la fecha 3 planes de negocio han presentado desistimientos de la convocatoria 176, los cuales se identifican así: I) ID 74452 - SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN por valor de \$83.594.438. II) ID 74340 - AGROTURISMO SANTA LUCIA, por valor de \$83.881.048 y III) ID 74293 - CEGI BROTHER`S RESTAURANTE BAR S.A.S por valor de \$84.000.000. Estos planes no presentaron ejecución de recursos.
14. Con corte al presente informe, 8 planes de negocio han culminado la ejecución del contrato de cooperación suscrito con el SENA Fondo Emprender.
15. Al 31 de mayo de 2023 los planes de negocio financiados presentan una ejecución acumulada de \$669.753.873.
16. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma, se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
17. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 0 PQRS por parte de los emprendedores.
18. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 176 se ha presentado un pago exitoso en el periodo de estudio, al cierre de mayo de 2023 se tiene un acumulado de 8 pagos rechazados de los cuales el 38% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 50% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 13% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2023

Para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados y aprobados en el segundo y tercer cierre de la convocatoria No. 176 se espera la elaboración del informe final de interventoría con el fin de ser presentados al SENA, con la recomendación de condonación o no condonación de acuerdo con su ejecución.

La Universidad Nacional se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 176 por valor total de \$2745906 por el SENA (\$1830604) y el ente adherente (\$915302), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$382806,75, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_8966_MAYO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 176
Anexo 4	Comunicado B.FI.1 [T]-1299-182-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8966_MAYO_2023



DAVIVIENDA



H.73

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8966

INFORME DEL MES: MAYO /2023

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 10 SENA-PLANADAS-TOLIMA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$1,289,651.89
Más Créditos	\$8,457.53
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,298,109.42
Saldo Promedio	\$1,289,651.89

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	\$ 8,457.53+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**
OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensor@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74279	DYNASTY GUTIERREZ COFFEE	176	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 83.999.322,00	\$ 335.997,29	\$ 84.335.319,29	\$ -	\$ -	\$ 680,71
74293	CEGI BROTHERS RESTAURANTE	176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 887.451,00	\$ 3.549,80	\$ 891.000,80	\$ 887.451,00	\$ 3.549,80	-\$ 0,00
74335	PLANTA DE FERTILIZANTES	176	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ 83.391.274,00	\$ 333.565,10	\$ 83.724.839,10	\$ -	\$ -	\$ 11,04
74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74393	INSPIRACION, AVES Y CAFE	176	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ 83.391.285,00	\$ 333.565,14	\$ 83.724.850,14	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74226	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE	176-2	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
74363	ROMA STATE COFFEE	176-2	\$ 82.995.194,00	\$ 331.980,78	\$ 83.327.174,78	\$ 82.700.306,00	\$ 330.801,22	\$ 83.031.107,22	\$ -	\$ -	\$ 296.067,56
74397	EBANISTERÍA EL OSO	176-2	\$ 83.977.314,00	\$ 335.909,26	\$ 84.313.223,26	\$ 83.977.314,00	\$ 335.909,26	\$ 84.313.223,26	\$ -	\$ -	\$ 0,00
74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISION	176-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
75015	TRADICIÓN CAMPESINA ZONA	176-2	\$ 83.995.770,00	\$ 335.983,08	\$ 84.331.753,08	\$ 83.995.770,00	\$ 335.983,08	\$ 84.331.753,08	\$ -	\$ -	\$ -
75020	VICAFE 83	176-2	\$ 83.948.602,00	\$ 335.794,41	\$ 84.284.396,41	\$ 83.948.602,00	\$ 335.794,41	\$ 84.284.396,41	\$ -	\$ -	\$ 0,00
81871	COFFEE SCADA SAS	176-4	\$ 83.802.744,00	\$ 335.210,98	\$ 84.137.954,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.137.954,98
82045	COFFEENEY SPECIALITY	176-5	\$ 84.000.000,00	\$ 336.000,00	\$ 84.336.000,00	\$ 350.000,00	\$ 1.400,00	\$ 351.400,00	\$ -	\$ -	\$ 83.984.600,00
81913	MULTILAMINAS PLANADAS	176-6	\$ 83.751.900,00	\$ 335.007,60	\$ 84.086.907,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.086.907,60
TOTAL			\$ 921.254.094,00	\$ 3.685.016,39	\$ 924.939.110,39	\$ 670.641.324,00	\$ 2.682.565,30	\$ 673.323.889,30	\$ 887.451,00	\$ 3.549,80	\$ 252.506.221,89

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 176

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74279
Plan de Negocios:	DYNASTY GUTIERREZ COFFE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	WILLINGTON GUTIERREZ COLLAZOS
Cedula	14193184
No. Contrato	302-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DYNASTY GUTIERREZ COFFEE SAS ZOMAC
Nit	901.511.757-8
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/20/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	11	157%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	3900	7935	203%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$195.000.000, 00	\$239.916.400, 00	123,03%	\$84.000.000, 00	\$83.999.322, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74293
Plan de Negocios:	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	FREDY CESPEDES GIL
Cedula	14193010
No. Contrato	303-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	CEGI BROTHER`S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC
Nit	901.525.954-3
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	10/8/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	18340	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$164.859.092, 00	\$,000	0,0%	\$84.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74335
Plan de Negocios:	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	JULIO HERNAN FRACICA GUZMAN
Cedula	1110459695
No. Contrato	304-176-2021
Valor Contrato	\$83.391.285, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA SAS ZOMAC
Nit	901.511.091-1
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/22/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	4690	1000	21%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$214.170.000, 00	\$10.000.000, 00	4,67%	\$83.391.285, 00	\$83.391.274, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74340
Plan de Negocios:	AGROTURISMO SANTA LUCIA
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	JORGE MANUEL REPISO OROZCO
Cedula	80146762
No. Contrato	305-176-2021
Valor Contrato	\$83.881.048, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	AGROTURISMO SANTA LUCÍA S.A.S. ZOMAC
Nit	901.514.875-2
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	1368	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$150.290.856, 00	\$,000	0,0%	\$83.881.048, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74393
Plan de Negocios:	INSPIRACION, AVES Y CAFE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario	MARCELA ALEXANDRA OLAYA PRIETO
Cedula	1006027598
No. Contrato	306-176-2021
Valor Contrato	\$83.391.285, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INSPIRACION AVES Y CAFE SAS ZOMAC
Nit	901.514.003-7
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	8/31/2021
Segunda visita	12/28/2021
Tercera visita	4/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/31/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	1294	67	5%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.800.000, 00	\$5.883.000, 00	5,84%	\$83.391.285, 00	\$83.391.285, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74226
Plan de Negocios:	COLOMBIAN SPECIAL COFFEE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	YEISON MORENO GUARNIZO
Cedula	1024543932
No. Contrato	358-176-2021
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COLOMBIAN SPECIALTY COFFEE SAS ZOMAC
Nit	901.498.759-7
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/16/2021
Segunda visita	3/16/2022
Tercera visita	7/12/2022
Cuarta visita	44999
Prorroga	3
Fecha finalización	2/16/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	8077	210	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$219.019.017, 00	\$4.806.946, 00	2,19%	\$84.000.000, 00	\$84.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74363
Plan de Negocios:	ROMA STATE COFFEE
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	EMMANUEL ENCISO VILLADA
Cedula	1109413863
No. Contrato	359-176-2021
Valor Contrato	\$82.995.194, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ROMA STATE COFFEE SAS - ZOMAC
Nit	901.526.411-0
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/17/2022
Tercera visita	7/13/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	81	57	70%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.080.000, 00	\$194.495.000, 00	142,93%	\$82.995.194, 00	\$82.700.306, 00	99,64%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74397
Plan de Negocios:	EBANISTERÍA EL OSO
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	EDINSON LEYTON TORRES
Cedula	4372991
No. Contrato	360-176-2021
Valor Contrato	\$83.977.314, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EBANISTERIA EL OSO 2.0
Nit	901.545.728-0
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	12/6/2021
Segunda visita	4/6/2022
Tercera visita	8/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	12/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	954	86	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$120.929.006, 00	\$13.942.024, 00	11,53%	\$83.977.314, 00	\$83.977.314, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75015
Plan de Negocios:	TRADICIÓN CAMPESINA ZOMAC SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	LUIS FELIPE ESLAVA RUEDA
Cedula	1007790371
No. Contrato	362-176-2021
Valor Contrato	\$83.995.770, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TRADICION CAMPESINA SAS ZOMAC
Nit	901.521.382-2
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/18/2021
Segunda visita	3/18/2022
Tercera visita	7/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/18/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	8550	2090	24%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.355.200, 00	\$15.622.650, 00	14,03%	\$83.995.770, 00	\$83.995.770, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75020
Plan de Negocios:	VICAPE 83
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	VICTOR HUGO GUTIERREZ AVILES
Cedula	9847745
No. Contrato	363-176-2021
Valor Contrato	\$83.948.602, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	VICAPE83 S.A.S - ZOMAC
Nit	901.532.249-8
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	11/19/2021
Segunda visita	3/22/2022
Tercera visita	7/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/19/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	7313	21958	300%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.228.569, 00	\$518.592.404, 00	261,61%	\$83.948.602, 00	\$83.948.602, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74452
Plan de Negocios:	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario	OLVER ANDRES LASSO MEDINA
Cedula	1109414035
No. Contrato	361-176-2021
Valor Contrato	\$83.594.438, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$83.594.438, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	81871
Plan de Negocios:	COFFEE SCADA SAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre
Beneficiario	JHON FREDY CHARRY CORTES
Cedula	1109416790
No. Contrato	556-176-2022
Valor Contrato	\$83.802.744, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$83.802.744, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -5 Cierre - 5

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	82045
Plan de Negocios:	COFFEENEY SPECIALITY
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -5 Cierre
Beneficiario	DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO
Cedula	14193747
No. Contrato	563-176-2022
Valor Contrato	\$84.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	4/10/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/10/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	149570000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$5.535, 00	\$,000	0,0%	\$84.000.000, 00	\$350.000, 00	0,42%

CONTRATO DE ADHESIÓN 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -6 Cierre - 6

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	81913
Plan de Negocios:	MULTILAMINAS PLANADAS
Convocatoria	176 - Municipio de Planadas (Tolima) -6 Cierre
Beneficiario	JORGE WILLIAM MOLANO PERDOMO
Cedula	1075262446
No. Contrato	568-176-2022
Valor Contrato	\$83.751.900, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Planadas
Departamento	Tolima

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio	5/9/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/9/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	1815	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$187.230.000, 00	\$,000	0,0%	\$83.751.900, 00	\$,000	0,0%

Anexo 4_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-182-23

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2023

B.FI.1 [T]-1299-182-23

Doctora

LUZ DANA LEAL RUIZ

Directora de Empleo y Trabajo

SENA

Doctora

LEIDY JHOANNA SIERRA

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Dirección de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: No inicio contrato de cooperación Empresarial No. 556-176-2022, Plan de Negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS

Respetadas doctoras reciban un cordial saludo,

La Universidad Nacional de Colombia, cumpliendo con las actividades previstas en el "Protocolo novedades contractuales" del Fondo Emprender, remite las conclusiones y las recomendaciones del análisis realizado al plan de negocio identificado con el ID 81871 - COFFEE SCADA SAS.

HECHOS

1. Que el emprendedor Jhon Fredy Charry Cortes participó en la Convocatoria cerrada No. 176 Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre.
2. Que el emprendedor celebró el contrato de cooperación empresarial No. 556-176-2022 suscrito el 10 de marzo de 2023.
3. Que el objeto del contrato consistió en: *"Financiar la iniciativa empresarial contenida en el Plan de Negocios No. 81871 - COFFEE SCADA SAS, Regional SENA - Tolima presentado por EL (LOS) BENEFICIARIO(S) JHON FREDY CHARRY CORTES y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, mediante la sesión indicada en los considerandos, en los términos y condiciones en los cuales fue evaluado y viabilizado por el administrador de los recursos LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, así como lo estipulado en el presente documento y sus anexos, los cuales hacen parte integral de este contrato."*
4. Que, el 30 de marzo de 2023, el emprendedor fue citado a reunión de alistamiento por parte de la interventoría, a la cual no asistió y remitió correo en los siguientes términos:

- a. "El motivo de este mensaje es informarle mi intención de no continuar con el proceso de Fondo Emprender, debido a una razón principalmente:
5. Revisando el plan de negocios presentado a la convocaría, se identifica un aumento en los costos de inversión del proyecto por alrededor de 40 millones de pesos, costos adicionales que no puedo asumir y que no pueden ser cubiertos así se ajuste la versión inicial del plan de negocios, ya que los equipos que se deben implementar para la puesta en marcha de la empresa han tenido un incremento de su valor en un 100% o mas (...)"
 6. Que, el 25 de abril de 2023, la interventoría emite al operador el certificado de no inicio en donde informa que, no se suscribió el acta de inicio, ni el acta No. 1 de la primera visita de interventoría.
 7. Que la Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender solicitó el 03 de mayo de 2023, a la Fiduciaria Popular el certificado de ejecución de recursos del plan de negocio denominado ID 81871 - COFFEE SCADA SAS. El certificado se adjunta a la presente comunicación.

CONCLUSIONES

1. El emprendedor Jhon Fredy Charry Cortes participó en la Convocatoria cerrada No. 176 Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre con plan de negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS y celebró el contrato de cooperación empresarial No. 556-76-2022 suscrito el 10 de marzo de 2023, no asistió a reunión de alistamiento y manifestó su renuncia a través de correo electrónico.
2. La interventoría en su Certificado de no inicio del 25 de abril de 2022, informó al operador que, no se suscribió acta de inicio, ni el acta N° 1 de la primera visita de interventoría.
3. La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender solicitó el 03 de mayo de 2023, a la Fiduciaria Popular S.A., el certificado de ejecución de recursos, en dicho certificado se evidencia la no ejecución presupuestal del Plan de Negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS.

RECOMENDACIÓN

Derivado de lo expuesto con anterioridad y teniendo en cuenta que no hubo acta de inicio, y por ende no se inició la ejecución del contrato de cooperación empresarial, no es aplicable el protocolo de novedades contractuales y se recomienda dar por terminada la relación del contrato de cooperación empresarial No. 556-176-2022, suscrito entre el SENA, la Universidad Nacional de Colombia y el emprendedor.

Quedamos atentos a sus recomendaciones.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
GERENTE DEL PROYECTO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copias

carolinajtr@sena.edu.co
cmhoyos@sena.edu.co
lnsoler@sena.edu.co
clcontreras@sena.edu.co
earodriguez@sena.edu.co
alrodriguez@unal.edu.co
interventoriafe2020@udea.edu.co

Anexo:

Informe de Interventoría- No inicio
Certificado de no ejecución de recursos de la fiducia.

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.
ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL ENCARGO FIDUCIARIO 396321 - FONDO EMPRENDER**

CERTIFICA:

Que en desarrollo del contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 2 de la Facultad de Ingeniería celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y Fiduciaria Popular S.A. en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299, de manera atenta, nos permitimos certificar:

1. Que, para la ejecución del Plan de Negocio COFFEE SCADA S.A.S. No. 81871 de la Convocatoria No. 176-4, le fueron asignados recursos por valor de \$83.802.744,00 correspondiente a capital semilla.
2. Que, al corte de la presente certificación, no se han ejecutado pagos con cargos a los recursos del Plan de Negocio COFFEE SCADA S.A.S. No. 81871 de la Convocatoria No. 176-4.
3. Que con corte al 02 de mayo de 2023 el Plan de Negocio COFFEE SCADA S.A.S. No. 81871 de la Convocatoria No. 176-4, presenta un saldo total pendiente por ejecutar de \$83.802.744,00

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de mayo de 2023, en atención a la solicitud del Fideicomitente.

Cordialmente,

RUBEN
DARIO MORA
CARDENAS
RUBEN DARIO MORA CARDENAS
Coordinador de Negocios Fiduciarios

Firmado digitalmente
por RUBEN DARIO
MORA CARDENAS
Fecha: 2023.05.03
18:43:49 -05'00'

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER	INF-001
	CERTIFICACIÓN DE NO INICIO	Versión: 01 / 05-2020

CERTIFICACION DE NO INICIO

Contrato interventoría:	CON 3 de 2020	Fecha certificación:	24/04/2023
Líder de Interventoría:	Alirio Antonio Rodríguez Isidro	Fecha de firma:	25/04/2023

Detalle de Actividades:

A continuación, se informa la situación por la cual no se dará inicio a la ejecución del plan de negocios, para ello se deja constancia que para este contrato de cooperación no se suscribió acta de inicio.

ID	NOMBRE PROYECTO	CONTRATO MARCO	CONTRATO COOPERAC.	INFORMACION PROYECTO
81871	COFFEE SCADA SAS	CO1.PCCNT.1471299 DE 2020	556-176-2022	El emprendedor Jhon Fredy Charry Cortes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.109.416.790 beneficiario con el plan de negocio N° 81871 - COFFEE SCADA SAS en la convocatoria 176 cuarto corte, fue citado a reunión de alistamiento. El 30 de marzo de 2023 mediante correo electrónico remite comunicación¹ en la que informa lo siguiente: <i>"El motivo de este mensaje es informarle mi intención de no continuar con el proceso de Fondo Emprender, debido a una razón principalmente:</i> <i>- Revisando el plan de negocios presentado a la convocaría, se identifica un aumento en los costos de inversión del proyecto por alrededor de 40 millones de pesos, costos adicionales que no puedo asumir y que no pueden ser cubiertos así se ajuste la versión inicial del plan de negocios, ya que los equipos que se deben implementar para la puesta en marcha de la empresa han tenido un incremento de su valor en un 100% o mas (...).</i> Por lo anterior, no se suscribió el acta de inicio como requisito de ejecución del contrato de cooperación empresarial No. 556-176-2022.

Firma:


Lina María Muñoz Osorio
Directora de Interventoría

¹ Anexo #1 - Comunicación desistimiento del contrato



81871 Anexo #1 - Comunicación desistimiento del contrato

herminsul florez <herminsul.florezudea@gmail.com>

Desistimiento proceso Contrato Fondo Emprender

2 mensajes

jhon fredy charry <jhonfredycharry@yahoo.es>

30 de marzo de 2023, 10:52

Para: "herminsul.florezudea@gmail.com" <herminsul.florezudea@gmail.com>

Cc: Raúl Antonio Sánchez Alfonso <rasanchezal@sena.edu.co>

Buen día Interventor Herminsul,

El motivo de este mensaje es informarle mi intención de no continuar con el proceso de Fondo Emprender, debido a una razon principalmente:

- Revisando el plan de negocios presentado a la convocaría, se identifica un aumento en los costos de inversión del proyecto por alrededor de 40 millones de pesos, costos adicionales que no puedo asumir y que no pueden ser cubiertos así se ajuste la versión inicial del plan de negocios, ya que los equipos que se deben implementar para la puesta en marcha de la empresa han tenido un incremento de su valor en un 100% o mas.

Por lo anterior solicito se me indique cual sería el proceso para no continuar.

Cordialmente,
Jhon Fredy Charry Cortes
Emprendedor
Coffee Scada

herminsul florez <herminsul.florezudea@gmail.com>

30 de marzo de 2023, 11:24

Para: jhon fredy charry <jhonfredycharry@yahoo.es>

Cc: Raúl Antonio Sánchez Alfonso <rasanchezal@sena.edu.co>

Buenos días señor JHON FREDDY CHARRY

Acuso recibo.

Continuaré con el proceso.

Buen dpias.

HERMINSUL FLÓREZ DÍAZ

Interventor Líder

Universidad de Antioquía

Teléfono Móvil: 3113937252

19/4/23, 9:16

Gmail - Desistimiento proceso Contrato Fondo Emprender

[El texto citado está oculto]



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

No inicio contrato de cooperación Empresarial No. 556-176-2022, Plan de Negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

5 de mayo de 2023,
9:53

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: LDLEALR@sena.edu.co, Leidy Jhoanna Sierra <LJSIERRA@sena.edu.co>, Servicio al Ciudadano
<servicioalciudadano@sena.edu.co>

Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <Insoler@sena.edu.co>, Claudia Liliana Contreras Gutierrez <clcontreras@sena.edu.co>, Efrain Andrés Rodríguez Ovalle <earodriguez@sena.edu.co>, Interventoria Proyectos UNAL Universidad de Antioquia <interventoriafe2020@udea.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Lida Yasmith Gonzalez Saavedra <liygonzalezsa@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Doctora

LUZ DANA LEAL RUIZ

Directora de Empleo y Trabajo

SENA

Doctora

LEIDY JHOANNA SIERRA

Coordinación Nacional de Emprendimiento

Dirección de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.1471299

SENA

Asunto: No inicio contrato de cooperación Empresarial No. 556-176-2022, Plan de Negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS

Respetadas doctoras reciban un cordial saludo,

La Universidad Nacional de Colombia, cumpliendo con las actividades previstas en el “Protocolo novedades contractuales” del Fondo Emprender, remite las conclusiones y las recomendaciones del análisis realizado al plan de negocio identificado con el ID 81871 - COFFEE SCADA SAS.

HECHOS

1. Que el emprendedor Jhon Fredy Charry Cortes participó en la Convocatoria cerrada No. 176 Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre.
2. Que el emprendedor celebró el contrato de cooperación empresarial No. 556-176-2022 suscrito el 10 de marzo de 2023.
3. Que el objeto del contrato consistió en: *“Financiar la iniciativa empresarial contenida en el Plan de Negocios No. 81871 - COFFEE SCADA SAS, Regional SENA - Tolima presentado por EL (LOS) BENEFICIARIO(S) JHON FREDY CHARRY CORTES y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, mediante la sesión indicada en los considerandos, en los términos y condiciones en los cuales fue evaluado y viabilizado por el administrador de los recursos LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA, así como lo estipulado en el presente documento y sus anexos, los cuales hacen parte integral de este contrato.”*
4. Que, el 30 de marzo de 2023, el emprendedor fue citado a reunión de alistamiento por parte de la interventoría, a la cual no asistió y remitió correo en los siguientes términos:
 - a. *“El motivo de este mensaje es informarle mi intención de no continuar con el proceso de Fondo Emprender, debido a una razón principalmente:*
 5. *Revisando el plan de negocios presentado a la convocaría, se identifica un aumento en los costos de inversión del proyecto por alrededor de 40 millones de pesos, costos adicionales que no puedo asumir y que no pueden ser cubiertos así se ajuste la versión inicial del plan de negocios, ya que los equipos que se deben implementar para la puesta en marcha de la empresa han tenido un incremento de su valor en un 100% o mas (...).”*
6. Que, el 25 de abril de 2023, la interventoría emite al operador el certificado de no inicio en donde informa que, no se suscribió el acta de inicio, ni el acta No. 1 de la primera visita de interventoría.
7. Que la Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender solicitó el 03 de mayo de 2023, a la Fiduciaria Popular el certificado de ejecución de recursos del plan de negocio denominado ID 81871 - COFFEE SCADA SAS. El certificado se adjunta a la presente comunicación.

CONCLUSIONES

1. El emprendedor Jhon Fredy Charry Cortes participó en la Convocatoria cerrada No. 176 Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre con plan de negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS y celebró el contrato de cooperación empresarial No. 556- 76-2022 suscrito el 10 de marzo de 2023, no asistió a reunión de alistamiento y manifestó su renuncia a través de correo electrónico.
2. La interventoría en su Certificado de no inicio del 25 de abril de 2022, informó al operador que, no se suscribió acta de inicio, ni el acta N° 1 de la primera visita de interventoría.
3. La Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender solicitó el 03 de mayo de 2023, a la Fiduciaria Popular S.A., el certificado de ejecución de recursos, en dicho certificado se evidencia la no ejecución presupuestal del Plan de Negocios ID 81871 - COFFEE SCADA SAS.

RECOMENDACIÓN

Derivado de lo expuesto con anterioridad y teniendo en cuenta que no hubo acta de inicio, y por ende no se inició la ejecución del contrato de cooperación empresarial, no es aplicable el protocolo de novedades contractuales y se recomienda dar por terminada la relación del contrato de cooperación empresarial No.

556-176-2022, suscrito entre el SENA, la Universidad Nacional de Colombia y el emprendedor.

Quedamos atentos a sus recomendaciones.

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

3 adjuntos



Informe de Interventoría- No inicio.pdf

222K



Certificado de no ejecución de recursos de la fiducia.pdf

257K



B.FI.1 [T]-1299-182-23.pdf

525K



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

CRM No. 7-2023-105463 - NO INICIO CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL NO. 556-176-2022, PLAN DE NEGOCIOS ID 81871 - COFFEE SCADA SAS

servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>

5 de mayo de 2023, 15:55

Para: DIRECCIONDEEMPLEO@sena.edu.co, LDLEALR@sena.edu.co, SENAFE2020_FIBOG@unal.edu.co

Cc: notifica.sciudadano@sena.edu.co

Apreciado Doctor(a) * LUZ DANA LEAL RUIZ - 15050

Se ha realizado la radicación del correo electrónico que se anuncia, para su respectivo trámite.

Radicado: 7-2023-105463 - NIS.: 2023-01-153455 de Fecha: 5/05/2023 2:33:02 p. m.

Asunto: CONTRATOS

Descripción del Asunto: NO INICIO CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL NO. 556-176-2022, PLAN DE NEGOCIOS ID 81871 - COFFEE SCADA SAS

Remitente Externo:

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

SENAFE2020_FIBOG@UNAL.EDU.CO

Atentamente,

Aplicativo OnBase

Grupo de Administración de Documentos

UNITYSCHEDULER 5/05/2023

4 adjuntos



01-MAIL-Recibidos Externos Radicado No. 7-2023-105463 Regional 1 - 5-05-2023.htm

22K



INFORME DE INTERVENTORÍA- NO INICIO.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - -5-05-2023.pdf

222K



B.FI.1 T -1299-182-23.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - -5-05-2023.pdf

525K



CERTIFICADO DE NO EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA FIDUCIA.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - -5-05-.pdf

257K
