

Informe de Gestión No. 29
Contrato de Adhesión No. 22 Municipio de Manizales,
Caldas
Período del 01 al 30 de septiembre del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Septiembre 30 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación.....	7
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	8
3.5 Informe de Interventoría	9
4 Atención al Emprendedor.....	15
CONCLUSIONES Y RETOS	15
ANEXOS.....	18

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 22; se presenta a continuación el informe con corte al 30. de septiembre de 2023, del contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Manizales, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de septiembre de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de septiembre del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Adhesión	22	Entidad Adherente	Municipio de Manizales, Caldas
Fecha de Inicio	03/05/2021		
Duración	Desde el 03/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$2.285.000.000		
Valor Aporte SENA	\$800.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$1.485.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Clemencia Orozco Ospina. Líder de proyecto. Secretaría TIC y Competitividad		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Clemencia Orozco Ospina		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Líder de proyecto. Secretaría TIC y Competitividad		
Número Telefónico o Celular	(606)8720670	Correo Electrónico	clemencia.orozco@manizales.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 22.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así mismo, los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_0228_SEPTIEMBRE_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

No. Convocatoria	188
Recursos SENA	\$ 800.000.000
Recursos Adherente	\$ 1.485.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 2.285.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 2.629.688.630

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 708.404.514
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 363.715.884
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.921.284.116
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Valor Traslado a la Fiducia SENA	\$ 800.000.000
Valor Traslado a la Fiducia Adherente	\$ 1.437.687.564
Valor Traslado a la fiducia acumulada	\$ 2.237.687.564
Ejecución recursos SENA	\$ 678.530.097
Ejecución recursos Adherente	\$ 942.703.068
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.621.233.165

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.


Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0087-0228
Saldo Total en Bancos	\$ 51.099.602,59
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 3.461.405,24
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 188 perteneciente al municipio de Manizales incluidos los recursos adicionados por el municipio de Manizales en el mes de noviembre de 2021.

Al 30 de septiembre de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de 1.921.284.116 equivalente al 84,08% de los recursos de la convocatoria dejando un saldo por comprometer de \$363.715.884, teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios con contrato vigente a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.621.233.165, correspondientes al 84,38% de los recursos comprometidos y al 70,95% de los recursos de la convocatoria. (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales.

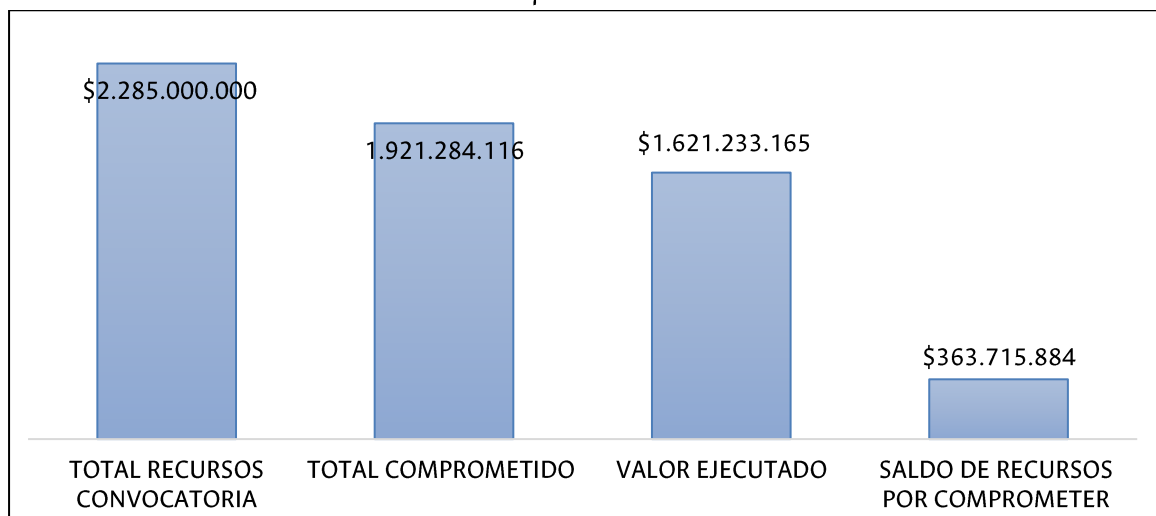

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Prevía solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava del contrato de adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 188 específica para el municipio de Manizales, Caldas, cuyo link de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1882020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Convocatoria	188		
Fecha de Lanzamiento	28/05/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	28/05/2021	Fecha de Cierre	15/02/2022
Fecha de Cierre Corte No. 1	23/07/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	22/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	18/11/2021	Fecha de Cierre Corte No. 4	14/03/2022
Fecha de Cierre Corte No. 5	30/09/2022		

Durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditación adelantados para los diferentes cierres de la convocatoria 188 – Manizales, Caldas.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Convocatoria			188 - Manizales				
Corte No. 1	Fecha Apertura		28/05/2021		Fecha de Cierre		23/07/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	04/08/21	Número de Planes Formalizados	15	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	100%
Corte No. 2	Fecha Apertura		24/07/2021		Fecha de Cierre		22/09/2021

Fecha de Publicación Final Acreditación	04/10/21	Número de Planes Formalizados	16	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	93.7%
Corte No. 3	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/11/21	Número de Planes Formalizados	5	Número de Planes Acreditados	5	% de Acreditación	100%
Corte No. 4	Fecha Apertura		30/01/2022		Fecha de Cierre		14/03/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	22/03/22	Número de Planes Formalizados	13	Número de Planes Acreditados	10	% de Acreditación	77%
Corte No. 5	Fecha Apertura		30/08/2022		Fecha de Cierre		30/09/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	10/10/22	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	4	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, para efectos de trazabilidad del informe a continuación se presentan las generalidades y resultados del proceso de evaluación de la Convocatoria No. 188 - municipio de Manizales, Caldas, realizado para el primer cierre en el mes agosto de 2021, para el segundo cierre en el mes de septiembre, para el tercer cierre en el mes de noviembre de 2021, para cuarto cierre en el mes de marzo de 2022 y para el quinto cierre en el mes de septiembre de 2022.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Número de Convocatoria			188 - Manizales				
Corte No. 1	Fecha Apertura		28/05/2021		Fecha de Cierre		23/07/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	23/08/21	Número de Planes Evaluados	15	Número de Planes Viabilizados	10	% de Viabilización	66%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	10	Valor Planes a Financiar	\$764.805.500
Corte No. 2	Fecha Apertura		24/07/2021		Fecha de Cierre		22/09/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	20/10/21	Número de Planes Evaluados	15	Número de Planes Viabilizados	9	% de Viabilización	60%

Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	\$674.018.885
Corte No. 3	Fecha Apertura		22/09/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	03/12/21	Número de Planes Evaluados	5	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	\$159.728.964
Corte No. 4	Fecha Apertura		30/01/2022		Fecha de Cierre		14/03/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	7/04/22	Número de Planes Evaluados	10	Número de Planes Viabilizados	9	% de Viabilización	90%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	May 2022 Sep 2022	Fecha de Consejo Directivo	28/06/22 29/09/22	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	\$714.133.212
Corte No. 5	Fecha Apertura		30/08/2022		Fecha de Cierre		30/09/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	21/10/22	Número de Planes Evaluados	4	Número de Planes Viabilizados	4	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	18/10/22	Fecha de Consejo Directivo	08/11/22	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$317.002.069

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 188, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 188

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 188 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73977	452-188-2021	MALVA PANADERIA ARTESANAL	13/01/2022	13/01/2023	\$79.625.652	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	72533	447-188-2021	HACIENDA EL BOSQUE	11/01/2022	11/01/2023	\$79.960.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,87%	TERMINADO
3	72972	448-188-2021	HOOKS	17/01/2022	17/01/2023	\$79.560.797	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	73268	449-188-2021	HUMAN LEARNING	28/01/2022	28/01/2023	\$79.292.099	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	73513	450-188-2021	PROMODISTT	18/01/2022	18/01/2023	\$54.807.706	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	73824	451-188-2021	HAPPY HOME	27/01/2022	27/01/2023	\$79.950.288	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	76640	453-188-2021	OFTALMOLOGIA VETERINARIA BIGOTES	20/01/2022	20/01/2023	\$72.682.080	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	76857	454-188-2021	FRUTOS EN EL BOSQUE	14/01/2022	14/01/2023	\$79.922.300	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	76937	455-188-2021	TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURA CASA GRANDE	9/02/2022	9/02/2023	\$79.005.578	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
10	76963	456-188-2021	WAPACHÉ	25/01/2022	25/01/2023	\$79.999.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo corte


Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
----	---------------------	--------------	-------------------------	-----------------	-------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------

1	78678	477-188-2021	Manila Cerveza Artesanal de Frutas	7/04/2022	7/08/2023	\$62.155.955	25,00%	66,67%	100,00%	100,00%	TERMINADO
2	77125	471-188-2021	Flexibo.Co	28/03/2022	28/03/2023	\$73.405.404	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
3	77637	473-188-2021	Sonrisas de Antaño	30/03/2022	30/03/2023	\$79.888.126	33,33%	50,00%	20,00%	92,85%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
4	78761	478-188-2021	Origen Food	30/03/2022	30/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
5	77012	470-188-2021	decoremus, Recubrimientos Funcionales	24/03/2022	24/03/2023	\$79.549.318	100,00%	100,00%	100,00%	98,74%	TERMINADO
6	77591	472-188-2021	Doco Confecciones	22/03/2022	22/03/2023	\$79.950.288	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	78010	474-188-2021	Neural Sports	5/04/2022	5/04/2023	\$75.225.978	83,33%	200,00%	100,00%	99,68%	TERMINADO
8	78265	475-188-2021	Elvira, Café Especial	1/04/2022	1/04/2023	\$78.716.136	80,00%	133,33%	100,00%	98,59%	TERMINADO
9	78356	476-188-2021	Think Green	23/03/2022	23/03/2023	\$65.127.680	100,00%	145,45%	100,00%	99,97%	TERMINADO

A continuación, en la tabla 10 se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 188 2C.

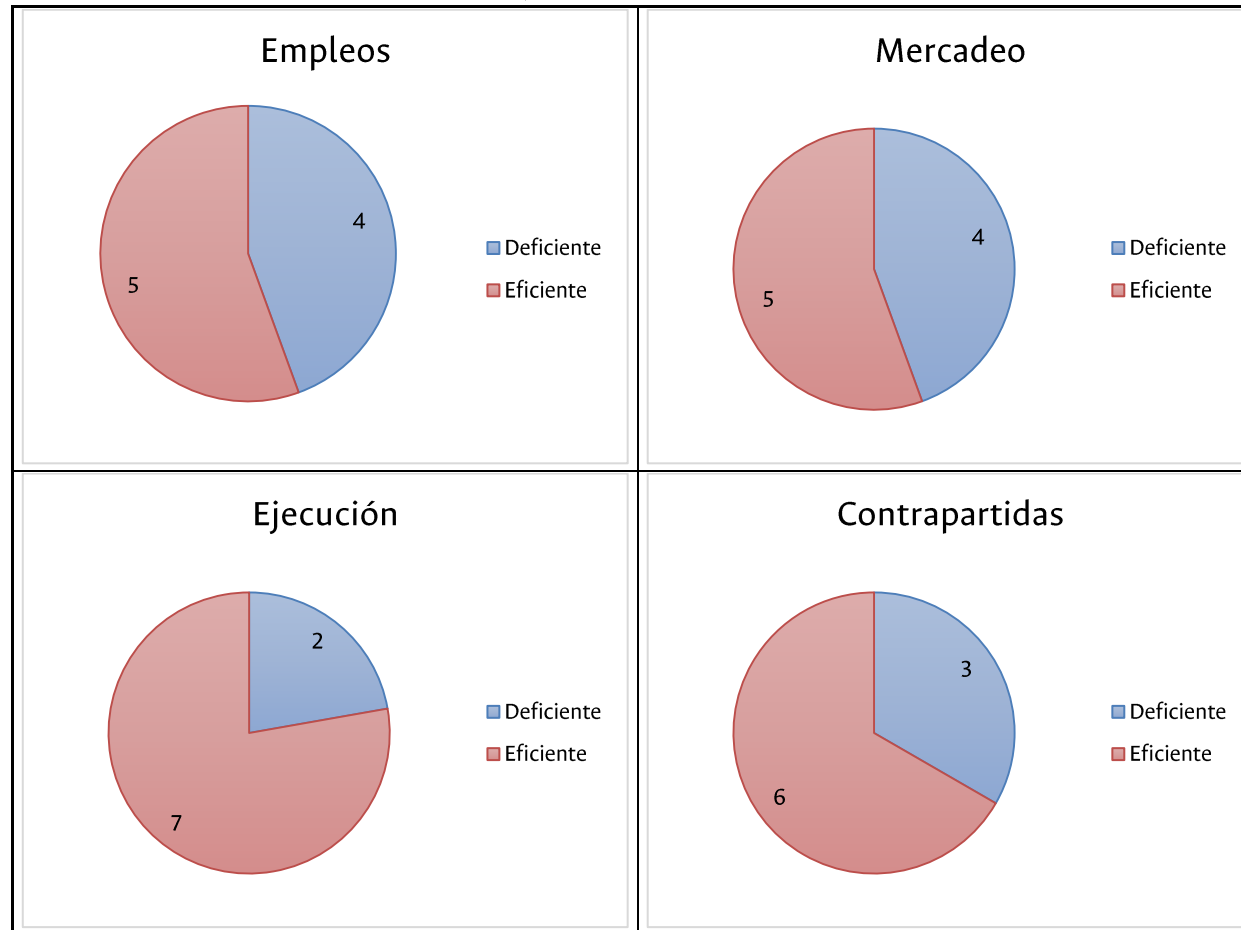

Planes de negocio tercer corte

Tabla 11. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	73451	526-188-2022	KONCIENCIA	18/04/2022	18/04/2023	\$79.939.464	80,00%	100,00%	100,00%	99,92%	TERMINADO
2	77085	527-188-2022	GESNOM, SOLUCIÓN INTEGRAL	29/04/2022	29/04/2023	\$79.789.500	83,33%	100,00%	100,00%	99,73%	TERMINADO

Planes de negocio cuarto corte

Tabla 12. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78532	549-188-2022	APSI			\$79.019.722	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	78759	552-188-2022	SONDELI			\$79.950.288	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
3	77617	562-188-2022	LA ACADEMIA	12/05/2023	12/05/2024	\$79.217.995	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
4	78676	548-188-2022	CONGELADOS BUENA MESA	14/04/2023	14/04/2024	\$79.425.165	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
5	79348	550-188-2022	GESEM GANADERIA	24/03/2023	24/03/2024	\$79.684.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
6	77879	547-188-2022	PLAN DE NEGOCIOS BIOINSECTOS	23/03/2023	23/03/2024	\$79.707.565	40,00%	0,00%	40,00%	51,07%	VIGENTE
7	78681	549-188-2022	ATTIVO	29/03/2023	29/03/2024	\$78.931.298	0,00%	0,00%	0,00%	78,98%	VIGENTE
8	80291	554-188-2022	REVITAL TERAPIA ACUATICA Y FÍSICA	28/03/2023	28/03/2024	\$79.336.000	0,00%	0,00%	60,00%	26,67%	VIGENTE

9	80292	555-188-2022	SELVORIA	27/03/2023	27/03/2024	\$78.861.179	66,67%	100,00%	100,00%	69,30%	VIGENTE
---	-------	--------------	----------	------------	------------	--------------	--------	---------	---------	--------	---------

Planes de negocio quinto corte

Tabla 13. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 188 5C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	76907	564-188-2022	CAFE COLOQUIO			\$78.076.288	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	82177	565-188-2022	CONACUAPONÍA	13/04/2023	13/04/2024	\$79.999.762	0,00%	0,00%	60,00%	22,20%	VIGENTE
3	82195	566-188-2022	KIUSHA KIDS	14/04/2023	14/04/2024	\$79.961.200	50,00%	100,00%	0,00%	84,49%	VIGENTE
4	83672	567-188-2022	CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR PARA MANOS Y PIES	17/04/2023	17/04/2024	\$78.964.819	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

Los planes terminados están en proceso de revisión de informe consolidado para finalizar la construcción de las carpetas y hacer la entrega al SENA.

La Universidad Nacional de Colombia solicitó el desarrollo de agenda especial para el seguimiento a la ejecución del plan de negocios relacionado a continuación:

Agendas especiales

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Soporte
1	82177	CONACUAPONÍA	Anexo 4 B.FI.1 [T]-1299-354-23

4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, se presentó una solicitud con radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-733-23, la respuesta a esta se encuentra en el anexo 5. Esta es una consulta acerca del acceso a plataforma del plan de negocio ID 82177 CONACUAPONÍA.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria en la cual se presentan los hitos y resultados más representados de la convocatoria 188.

Tabla 15. Ficha técnica de la convocatoria 188 municipio de Manizales, Caldas.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$2.285.000.000
Número total de planes formalizados	53
Número total de planes acreditados	49
Número total de planes viables	37
Número de planes financiados	34
Número de planes aprobados en CDN	34
Total recursos aprobados en CDN	\$2.629.688.630
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	9
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 708.404.514
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.921.284.116
Saldo de recursos por comprometer	\$ 363.715.884
Ejecución acumulada de recursos	\$1.621.233.165

A continuación, se presenta de manera gráfica el estado de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 188 – Municipio de Manizales, Caldas.

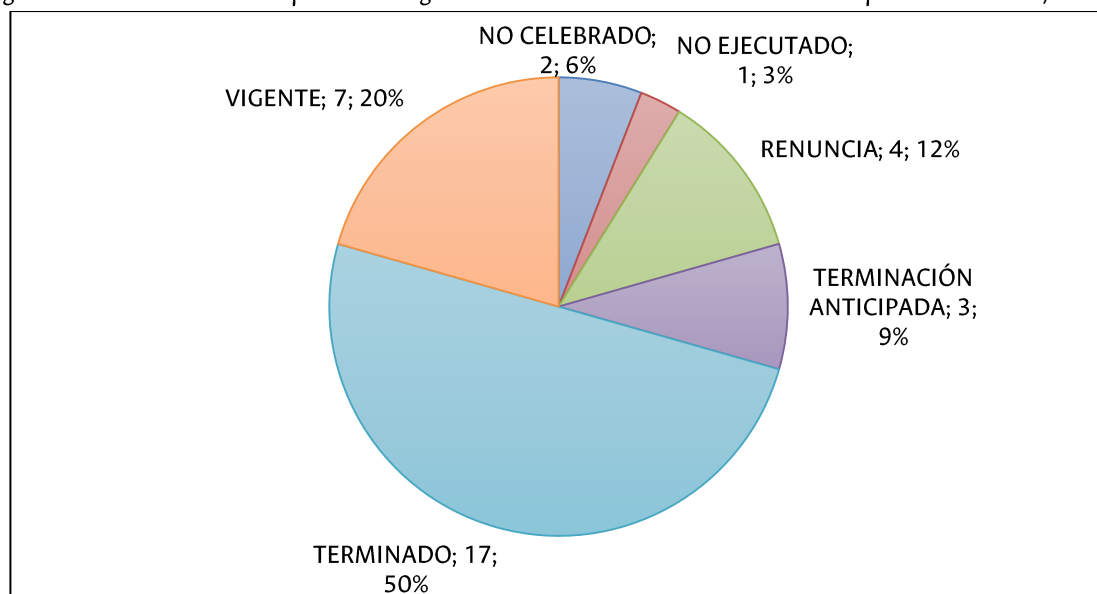

Conclusiones generales del período del 01 al 30 de septiembre de 2023:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución. Así mismo, en el mes de noviembre de 2021 se suscribió la adición a la adhesión por valor de \$685.000.000 recursos provenientes de la alcaldía de Manizales.
2. La Convocatoria 188 – Fondo Emprender, tuvo su primer cierre el día 27/07/2021 con la formalización de 15 planes de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 188 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 15 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del primer cierre viabilizó un total de 10 planes de negocios de los 15 planes de negocios acreditados para una eficiencia del 66%. Los 10 planes viabilizados recibieron aprobación para su financiamiento por valor de \$764.805.500.
4. El segundo cierre de la convocatoria 188 se realizó el día 22/09/2021, en el cual se formalizaron 16 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación del segundo cierre de la convocatoria 188 se acreditaron 15 planes de los 16 formalizados para un desempeño en la acreditación del 93.75%.
5. El proceso de evaluación del segundo cierre de la convocatoria se viabilizaron 9 planes los 15 planes de negocio acreditados para una efectividad del 60%. Los 6 planes viables fueron aprobados para financiamiento por valor total de \$674.018.885.
6. El día 18/11/2021 se realizó el tercer cierre, en el cual se formalizaron 5 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación del tercer cierre de la convocatoria 188 se acreditaron 5 planes de negocios de los 5 formalizados para un desempeño del 100% en la acreditación.
7. El proceso de evaluación del tercer cierre viabilizó 5 planes de los 5 acreditados con una efectividad del 100%. Teniendo en cuenta los recursos disponibles para el tercer cierre de la convocatoria se financiaron 2 planes de negocios de los 5 viables por valor de \$159.728.964.
8. El día 14 de marzo de 2022 se llevó a cabo el cuarto cierre de la convocatoria 188, en el cual se formalizaron 13 planes de negocios. Luego del proceso de acreditación se tiene como resultado 10 planes acreditados.
9. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre se viabilizan 9 de los 10 planes acreditados. Atendiendo los recursos disponibles de la convocatoria para el cierre se aprobó para financiamiento 9 planes por valor de \$714.133.212.
10. El día 30 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el quinto cierre de la convocatoria 188, en el cual se formalizaron 4 planes de negocios. Luego del proceso de acreditación se tiene como resultado 4 planes acreditados.
11. Como resultado del proceso de evaluación del quinto cierre se aprobó la financiación de 4 planes de negocios por valor de \$317.002.069.
12. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 24 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (7), agendas especiales (5), otras solicitudes operativas (3) y dedicación parcial (1) para la convocatoria 188 - Manizales, solicitudes resueltas oportunamente.
13. A la fecha la convocatoria presenta 9 desistimientos y 1 terminación anticipada con ejecución de recursos de financiamiento del Fondo Emprender, los cuales suman un total de \$788.292.640, los planes con esta situación corresponden a los relacionados a continuación: I.) ID 73977 - MALVA PANADERIA ARTESANAL, por un valor de \$79.625.652, II.) ID 78761- ORIGEN FOODS por valor de \$80.000.000, III.) ID 78759 SONDELI por valor de \$79.950.288, IV) ID 78532 APSI por valor de \$79.019.722, V.) ID 77125 FLEXIBO S.A.S por valor de

\$73.405.404, , VI) ID 78676 - CONGELADOS BUENA MESA por valor de \$79.425.165, VII) ID 77617 - LA ACADEMIA por valor de \$79.217.995, VIII) ID 76907 - CAFE COLOQUIO por valor de \$78.076.288 y IX) ID 79348 - GESEM GANADERÍA por valor de \$79.684.000. Una Terminación anticipada con ejecución de recursos: ID 77637 - SONRISAS DE ANTAÑO por valor de \$79.888.126.

14. Como resultado del proceso de evaluación y los desistimientos a la fecha del presente informe se tiene un saldo de recursos por comprometer de \$363.715.884
15. Al 30 de septiembre de 2023 17 planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 188 se encuentran terminados.
16. A la fecha del presente informe los planes de negocio con contrato vigente presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.621.233.165.
17. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
18. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 42 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 2 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 1 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 9 cerradas), Otras solicitudes operativas (1 abiertas y 12 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 5 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 2 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 10 cerradas).
19. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 188 se ha presentado 16 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de septiembre de 2023 se tiene un acumulado de 34 pagos rechazados de los cuales el 20% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 44% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 36% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
20. Desde la Universidad Nacional se está haciendo un seguimiento a la puesta en marcha de los planes de negocio, teniendo en cuenta su fecha de inicio y la fecha de finalización, verificando que estos no vayan a superar los tiempos del contrato marco suscrito entre la Universidad Nacional y el SENA. En este sentido, nuestra recomendación es que el ente aliado nos apoye en el seguimiento de estos planes de tal manera que su cumplimiento se dé entre las fechas del contrato del plan de cooperación empresarial.

PROYECCIONES A OCTUBRE 31 DE 2023

Se prevé que los planes de negocio con contratos de cooperación vigentes de la convocatoria, continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 188, la interventoría prepare y envíe los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 188 por valor total de \$363.715.884 por el SENA \$

117.238.853,50) y el ente adherente (\$246.477.030,5), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$3.787.166,59, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_0228_SEPTIEMBRE_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 188
Anexo 4	B.FI.1 [T]-1299-354-23
Anexo 5	Link Ingreso a plataforma
