

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	36 de 37
Versión No.	5		

CONTRATO No. 1977
05-09-2023

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-IDI-05	Página	37 de 37
Versión No.	5		

**CONTRATO No. 1977
05-09-2023**

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en caso de que los hechos y las circunstancias lo requieran.

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Tunja.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 1977 DE 2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II.

Código	CCE-EICP-IDI-05	Versión	5
--------	-----------------	---------	---

Tunja, 04 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN
R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 045


ASUNTO: Solicitud.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Acorde a la prorroga N°2 de abril de 2023, esta interventoría solicita amablemente se allegue a brevedad cronograma de ejecución para los 30 días contemplados por la adición en tiempo y de igual forma actualización de pólizas según la modificatoria de contrato.

Sin otro particular.


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 05 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 046

ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y en atención al oficio con membrete: CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 045, esta interventoría se reitera a la firma contratista que la entrega de la información solicitada es vital para la continuación del contrato de obra 1977 de 2023, por lo tanto, se solicita nuevamente se allegue en el término de un (01) día calendario cronograma de ejecución para los 30 días contemplados por la adición en tiempo y de igual forma actualización de pólizas según la modificatoria de contrato.

Adicional a esto se recuerda a contratista de obra que la entrega de garantías es una obligación contractual que de no llevarse a cabo puede acarrear multas como se cita a continuación: **"Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas."** Por otra parte, se aclara que de hacer caso omiso a la presente solicitud en el término indicado, se procederá a la aplicación de multas según "cláusula 15" del contrato de obra 1977 de 2023 donde se especifica **"Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas**



Contactos:

Tel: (038) 747 4417


Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor."

Sin otro particular.


SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 06 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 047

ASUNTO: OBSERVACIONES A INFORMES MENSUALES

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente Y en respuesta en su comunicado UT-CVP-COXT-034, Revisado los informes avance #3 periodo comprendido entre 27 de noviembre de 2023 a 26 de diciembre de 2023 e informe de avance #4 del 27 de diciembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023 y del 1 de febrero de 2024 a 27 de febrero de 2024 se encuentran las siguientes observaciones:

INFORME DE AVANCE #3

1. **Bitácora de obra:** no se anexa la bitácora de obra correspondiente al período mencionado.
2. **Informes Semanales:** tampoco se han anexado los informes semanales del período.
3. **Actas de comité:** no se evidencian actas de comité correspondiente al periodo o no se especifica si se realizaron o no
4. **Correspondencia enviada y recibida:** no se anexa la correspondencia enviada y recibida durante el periodo de 27 de noviembre de 2023 a 26 de diciembre de 2023.

INFORME DE AVANCE #4.

5. **Bitácora de obra:** no se anexa la bitácora de obra correspondiente al período mencionado



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

6. **Actas de comité:** en el informe se cita que en el anexo 7 se presentan las actas de comité, pero no se evidencian actas de comité correspondiente al periodo.

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas se solicita amablemente la entrega de la siguiente documentación faltante a la firma contratista un término no mayor a tres (3) días a partir de la recepción de la presente comunicación.

Sin otro particular.


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 19 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 050


ASUNTO: Solicitud bitacora de obra

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la bitácora de obra actualizada correspondiente al contrato de obra 1977 cuyo objeto es **MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ**. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas por lo cual se requiere la presencia en los frentes de obra, y no se acepta la ausencia por periodos prolongados de tiempo. De acuerdo a esto, la presente interventoría le solicita a la firma contratista que a más tardar el día 22 de abril de 2024 a las 7:00 am.

El contratista deberá garantizar que dicho libro permanezca en obra disponible para cualquier anotación o aclaración referente a la ejecución de las actividades diarias pertinentes al contrato de obra No. 1977 de 2023

Atentamente,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 19 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 051

ASUNTO: Solicitud reparación a redes eléctricas

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar la reparación inmediata de las redes eléctricas afectadas el día 18/04/2024 durante la ejecución del contrato de obra 1977 cuyo objeto es **MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ**. Específicamente en tramo ubicado en el barrio las quintas de la ciudad de Tunja, en la carrera 2b entre calles 48-58.

Ilustración 1: Rotura de acometidas eléctricas



Fuente: Elaboración propia



Contactos:


Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Atentamente,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 19 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI


CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 052

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD OFICIO UT-CVP-COXT-038

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

cordial saludo, por medio de la presente, y en respuesta a oficio recibido UT-CVP-COXT-038 con asunto: solicitud reunión virtual viernes 19/04/2024, nos complace informarles que el enlace al contrato estará disponible para todas las partes involucradas a las **2:30 p.m.** de hoy. Por favor, estén atentos a sus correos electrónicos o a la plataforma designada para acceder a la reunión a las 2:15 pm.

Atentamente,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 22 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN
R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 053

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA SUBSANACIONES DE INFORMES SST/AMBIENTALES

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo, por medio de la presente, y resaltando el compromiso expuesto por la firma contratista en la reunión virtual desarrollada el pasado viernes 19/04/2024 sobre la entrega completa y oportuna de las subsanaciones a las observaciones de los informes SST/ambientales y teniendo en cuenta que las mismas fueron remitidas por esta interventoría el pasado 10 de abril, se hace la salvedad que a la fecha no se han recibido y se solicita la entrega de las mismas.

Atentamente,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 25 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 054

ASUNTO: SOLICITUD RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y en atención a los siguientes oficios radicados por la presente interventoría:

OFICIO	FECHA RADICACIÓN	ASUNTO
CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 037	13/02/2024	DERECHO DE PETICION: "TRAMITE QUEJA PARCHEO SECTOR BOSQUE DE LA REPUBLICA "
CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 043	3/04/2024	DERECHO DE PETICION: "PAGO SERVICIOS PRESTADOS ING EDWARD RODRIGUEZ "
CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 044	3/04/2024	DERECHO DE PETICION: "PAGO ACREEDOR LUYAN INGENIERIA S.A.S "
CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 051	19/04/2024	"SOLICITUD REPARACION A REDES ELECTRICAS"

se solicita amablemente a la firma contratista se informe a la interventoría de las acciones tomadas por la empresa UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI, para solucionar cada una de las solicitudes remitidas y de la misma manera se anexen soportes que permitan la verificación de las mismas en un plazo perentorio de Un (01) día calendario a partir de la recepción del presente oficio, cabe resaltar que en la contestación del contratista se debe relacionar la respuesta a cada uno de los oficios realizados por la



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

interventoría y los que apliquen referentes a la contestación de derecho de petición hechos en el marco contractual del contrato 1977 de 2023. Por otra parte, se aclara que, de hacer caso omiso a la presente solicitud en el término indicado, se procederá a la aplicación de multas según "cláusula 15" del contrato de obra 1977 de 2023 donde se especifica "Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor."

Sin otro particular.


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 26 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 059

ASUNTO: Respuesta oficio UT-CVP-COXT-039

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y en respuesta a la solicitud de balance de mayores y menores cantidades esta interventoría le solicita a la firma contratista **UNION TEMPORAL CONSTRUVIAS PI**, sean anexados los siguientes documentos para dar inicio a acta de modificación No.4 al contrato de obra según los lineamientos otorgadas por la supervisión del contrato **No. 1977 de 2023 cuyo objeto es. SI-101 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.**

- Sabana de mayores y menores cantidades con memoria de cantidades
- Informe con Sustentación técnica donde se explique el porqué la modificación de mayores y menores cantidades.
- Anexo con correspondencia de solicitud.

Agradecemos su pronta atención a este asunto y quedamos a disposición para darle tramite lo más pronto posible.



Contactos:


Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265


Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Sin otro particular.



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com

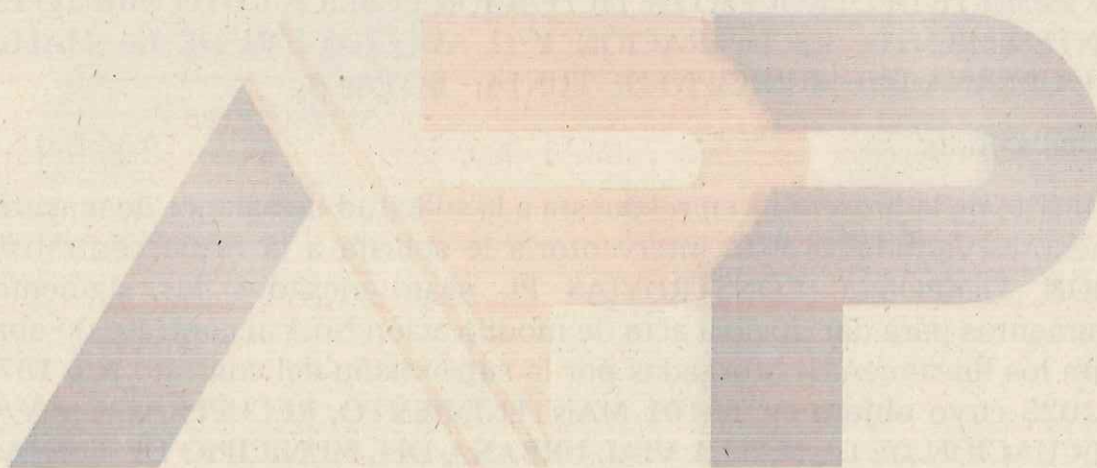

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 29 de abril de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI


CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 061

ASUNTO: Respuesta oficio UT-CVP-COXT-043

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente esta interventoría en atención al oficio **UT-CVP-COXT-043** manifiesta que una vez estudiadas las razones en las cuales la firma contratista de obra solicita la suspensión No. 2 del contrato 1977 de 2023, aprueba se haga la suspensión por un término de 15 días calendario.


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 29 de abril de 2024

GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 062

ASUNTO: Solicitud de suspensión No.2 al contrato de obra No. 1977 de 2023 y contrato de interventoría No. 1964 de 2023.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud realizada por la firma contratista de obra mediante oficio UT-CVP-COXT-043, de fecha 26 de abril de 2024, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo pertinente que permita a la suspensión No.02 al contrato de obra de obra No. 1977 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la suspensión No.02 del contrato de interventoría 1964 de 2023 a partir del día 04 de mayo de 2024 por un término de quince (15) días calendario.

Sin otro en particular, Atentamente


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 29 de abril de 2024

GERMÁN DARÍO MORA PÉREZ
Secretario De Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN
R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 063

ASUNTO: Invitación comité de obra

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, esta interventoría solicita comité de obra virtual, con el fin de tratar temas afines a solicitud de suspensión de la firma contratista, porcentaje de ejecución actual, programación de contratista para el plazo restante de obra y discusión de requerimientos en el marco del contrato realizados por la interventoría.

Link de la reunión: <https://meet.google.com/znm-nyzt-fhh>

Sin otro en particular, Atentamente

SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

Tunja, 06 de mayo de 2024

GERMÁN DARÍO MORA PÉREZ
Secretario De Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN
R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 064


ASUNTO: Invitación comité de obra.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, esta interventoría solicita comité de obra presencial en la oficina de la secretaria de infraestructura territorial la cual queda ubicada en el piso 5to de la alcaldía en la ciudad de Tunja. el día martes **07/05/2024** a las **8:00 am**, con el fin de tratar temas puntuales en relación al informe de auditoría financiera y de gestión por parte de la controlaría municipal de Tunja, porcentaje de ejecución actual, programación de contratista para el plazo restante del contrato de obra 1964 de 2023 y discusión de requerimientos en el marco del contrato realizados por la interventoría.

Sin otro en particular, Atentamente


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 10 de mayo de 2024

ING. GERMAN DARIO MORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 068

ASUNTO: Solicitud de suspensión No.02 al contrato de obra No.1977 de 2023 y contrato de interventoría No.1964 de 2023

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud realizada por la firma contratista de obra mediante oficio UT-CVP-COXT-048 de fecha 06 de mayo de 2024, se solicita amablemente a la supervisión del contrato proceder con el trámite administrativo pertinente que permita la suspensión No.02 al contrato de obra No.1977 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la suspensión No.02 del contrato de interventoría 1964 de 2023 a partir del día jueves 16 de mayo de 2024 por un término de quince (15) días calendario.

la fecha de terminación del contrato de obra y interventoria sera el dia 02 de junio de 2024.

Sin otro en particular, Atentamente


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 28 de mayo de 2024

GERMAN DARIO MORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 070

ASUNTO: Respuesta derecho de petición fecha 14 de marzo de 2024

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y de acuerdo con lo manifestado en el derecho de petición presentado por la señora Olga Lucía Ortega Ramos, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Cristales de la ciudad de Tunja, la presente interventoría se permite manifestar lo siguiente:

Solicitud No. 01:

“1. Copia del acta de la reunión sobre la descripción del tramo a intervenir entre la Secretario de Infraestructura Territorial y la junta de acción comunal Canapro Cristales de la calle 7ª entre calle 45 y 46 la cual quedo priorizada y fue ejecutado según contrato No. 1977 de 2023 contratista APP CONTROL INGENIERIA S.A.S”

Esta interventoría manifiesta que la solicitud realizada es remitida por competencia a la entidad contratante, dado que, como firma de interventoría no tenemos acceso ni participamos en las mesas de participación ciudadana para la definición de frentes a intervenir con presupuestos participativos, pese a que puede que dichos presupuestos en efecto sean ejecutados por el contrato de obra 1977 de 2023.

“2. Se expida copia del acta del tramo final intervenido entre la Secretario de Infraestructura Territorial y la junta de acción comunal Canapro Cristales



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja y la dirección exacta donde se realizó dicha obra contrato No. 1977 de 2023 APP CONTROL INGENIERIA S.A.S"

Esta interventoría manifiesta que el acta solicitada por la peticionaria no fue suscrita y no hace parte de los procesos requeridos por la supervisión del municipio de Tunja para la ejecución de los contratos de obra e interventoría No. 1977 y 1964 de 2023, no obstante, en aras de dar claridad a la petición y certificar la información solicitada nos permitimos manifestar lo siguiente:

Para el frente en cuestión, el día 18 de septiembre de 2023 el municipio de Tunja mediante oficio 1.10. 1 -2-3 1172 cuyo asunto es "Verificación de puntos de intervención." Hace entrega de los posibles puntos de intervención o frentes de obra a ejecutar en el marco del contrato de obra 1977 de 2023, dado que, los mismos no están establecidos en los documentos del proceso contractual.

Dicho lo anterior, se establece en conjunto con los profesionales del municipio de Tunja, profesionales de obra e interventoría el procedimiento y/o metodología para la definición y puntualización de las actividades a realizar en cada frente mencionado, esto último, dada la necesidad de acordar y verificar en campo las limitantes técnicas y presupuestales para cada frente en particular, por tal motivo, para el frente de obra en cuestión denominado "REPARCHEO DE CARRERA 7° ENTRE CALLE 45 Y 46 - BARRIO LOS CRISTALES" tenemos que:

REPARCHEO DE CARRERA 7° ENTRE CALLE 45 Y 46 - BARRIO LOS CRISTALES	Se debe realizar parcheo en el 36% KR 7 - CL 45 - CL 46. venciones corresponde a obras de mantenimiento vial, por ende, corresponden a vías existentes ya pavimentadas	\$ 61.000.000,00	\$ 54.900.000,00	\$ 6.100.000,00
---	--	------------------	------------------	-----------------

Se evidencia la asignación presupuestal de 61 millones de pesos los cuales se distribuyen en \$54.900.000,00 para la obra física y la asignación de \$6.100.000,00 para el seguimiento y control por parte de interventoría, dichos topes presupuestales eran condicionantes al momento de establecer el alcance físico de cada frente de obra en particular

Con el fin de iniciar las labores de ejecución en el barrio los cristales, el día jueves 9 de noviembre de 2023 se realizó recorrido con los profesionales delegados de la supervisión de la entidad, el personal profesional de interventoría y de la firma contratista de obra en el barrio Los Cristales de la ciudad de Tunja, específicamente en la Calle 7 entre la Calle 45 y 46, tramo definido para la ejecución del contrato. Dando cumplimiento a la metodología establecida y con el fin de evaluar la condición o gravedad del



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

deterioro de la carpeta de rodadura que existe en la vía, se procede a realizar la auscultación visual por parte de los profesionales mencionados los cuales concluyen y determinan que:

- Se evidenció que la Calle 7, entre la Calle 45 y 46, presenta un deterioro estructural en la mayor parte de su área, superando el 80% de su superficie total (ver anexo No.01). Dado esto, es inviable realizar un mantenimiento de tipo parcheo o bacheo, ya que el mismo consiste en la intervención de áreas localizadas del pavimento con el fin de corregir los defectos relacionados con un deterioro estructural o problemas de humedad, materiales o construcción¹. De acuerdo con la normatividad del INVIAS, capítulo 4.1.5, se establece que, según la severidad de los daños evidenciados en campo, es necesaria la realización de una reconstrucción. Esta consiste en la remoción y el reemplazo parcial o total de la estructura de pavimento existente, conservando la explanación y el alineamiento de la vía. Esta solución se establece debido a que la estructura está agotada, no tiene vida residual y presenta elevados índices de deterioro superficial, como deformaciones permanentes y fisuramientos de fatiga.
- La solución planteada anteriormente no es viable atenderla con la ejecución del contrato de obra 1977 de 2023, puesto que el mismo tiene el objeto de la realización de mantenimientos, recuperaciones y/o adecuaciones de la malla vial de la ciudad de Tunja y no comprende reconstrucciones completas. Además, es importante aclarar que los topes presupuestales establecidos por frente son insuficientes para tal fin.
- Acorde a lo anterior, se llevó a cabo la inspección del sector y del barrio en cuestión con el fin de establecer las posibles áreas a intervenir. Estas áreas fueron evaluadas tanto desde una perspectiva técnica como presupuestal para garantizar su viabilidad. Además, se priorizó la selección de aquellas que generarían el mayor beneficio para la comunidad del sector.
- Posterior al recorrido, se establece que, con el rubro establecido para la intervención y las características técnicas en campo, los frentes posibles que garantizaban la estabilidad y el beneficio de la comunidad eran los mencionados a continuación:
 - 1 Cra 7 entre calle 46 y calle 46^a
 - 2 Calle 46a entre Cra 7 y Cra 8^a
 - 3 Carrera 7a entre la calle 43a y calle 46

¹ cap. 4.1.1.2 guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras Norma Inviás pag.284



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

4 Cra 6ac entre calle 43a y carrera 6 avenida norte
mediante anexo No.02 se adjunta registro fotográfico de las zonas intervenidas.

Finalmente, se concluye que se realizaron las obras tendientes al beneficio de la comunidad, acorde a los criterios de supervisión del proyecto por parte del municipio de Tunja y los profesionales de los contratos de obra e interventoría. Es importante mencionar que las obras realizadas generan un beneficio en la movilidad y reducción de la accidentalidad para toda la comunidad del sector. Además, cabe destacar que la vía elegida inicialmente no cuenta con salida en el costado sur, lo cual limita los beneficios únicamente a los habitantes de la carrera 7° entre las calles 45 y 46.

Sin otro en particular, Atentamente



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 31 de mayo de 2024

UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
LUZ MILA ACEVEDO GALAN

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 071

ASUNTO: Entrega copilado correcciones Acta parcial No.1 contrato 1964 de 2023

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente nos permitimos remitir enlace de google drive para visualización de copilado de las correcciones realizadas al acta parcial No.1 del contrato de interventoría, dado que la plataforma secop II no permite el cargue completo del documento con la calidad que permita su lectura:

https://drive.google.com/open?id=1OdNHhIGXljDVMdA0KvNKPRVIREkWLn1X&usp=drive_fs

Sin otro en particular, Atentamente,


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 05 de junio de 2024

ING. GERMAN DARIO MORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 073

ASUNTO: Solicitud reinicio contratos de interventoría y obra 1964 de 2023 y 1977 de 2023.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud de la firma contratista de obra mediante radicado UT-CVP-COXT-057 en la cual se solicita el reinicio del contrato 1977 de 2023, la firma contratista de interventoría da aval y aprobación a dicha solicitud y en concordancia solicita el reinicio del contrato de interventoría 1964 de 2023.

Dicho lo anterior, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo que permita la suscripción del reinicio de los contratos en asunto, se aclara que dicho reinicio no generará costos adicionales a la entidad.

Atentamente ,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 05 de junio de 2024

ING. GERMAN DARIO MORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 075

ASUNTO: Solicitud Ampliación No.1 a la Suspensión No.2 de los contratos 1977 de 2023 y 1964 de 2023.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud de la firma contratista de obra mediante radicado UT-CVP-COXT-054, en la cual se solicita la ampliación No.1 a la suspensión No.2 al contrato en asunto, la firma contratista de interventoría da aval y aprobación a dicha solicitud considerando que las razones son válidas y corresponden a la situación actual del contrato de obra, en concordancia a esta solicitud y dado el desarrollo en paralelo de los objetos contractuales se solicita la ampliación No.1 a la suspensión No.2 del contrato de interventoría 1964 de 2023.


Dicho lo anterior, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo pertinente y se adjuntan los soportes necesarios para la legalización del mismo.

Se aclara que la Ampliación No.1 a la suspensión No. 2 terminaría el día 19 de Junio de 2024 y su finalización el día 23 de junio de 2023.

Documentos adjuntos:

- Oficio UT-CVP-COXT-056

Atentamente,


SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 12 de junio de 2024

INGENIERO
GERMAN MORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 076

ASUNTO: Solicitud prórroga No.04 contrato de obra No. 1977 de 2023 y contrato de interventoría No. 1964 de 2023

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud de la firma contratista de obra mediante radicado UT-CVP-COXT-060, en la cual se solicita prórroga No. 04 en el contrato en asunto por un término de veinte (20) días, la firma contratista de interventoría da aval y aprobación a dicha solicitud considerando que las razones manifestadas en el mismo son válidas y acordes a la situación actual del contrato de obra, de igual forma en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia del contrato de interventoría se solicita también la prórroga del contrato 1964 de 2023 por un término de veinte (20) días.

Dicho esto, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo pertinente que permita el adicional en tiempo de los contratos 1977 y 1964 de 2023, cabe mencionar que dicha prórroga no generará a la entidad contratante costos adicionales.

Se anexa documentación pertinente, Sin otro particular.

Documentos adjuntos:

- Oficio UT-CVP-COXT-060 y Boletín climático mayo 2024



Contactos:


Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547


Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrollingeneria.com

Atentamente,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com

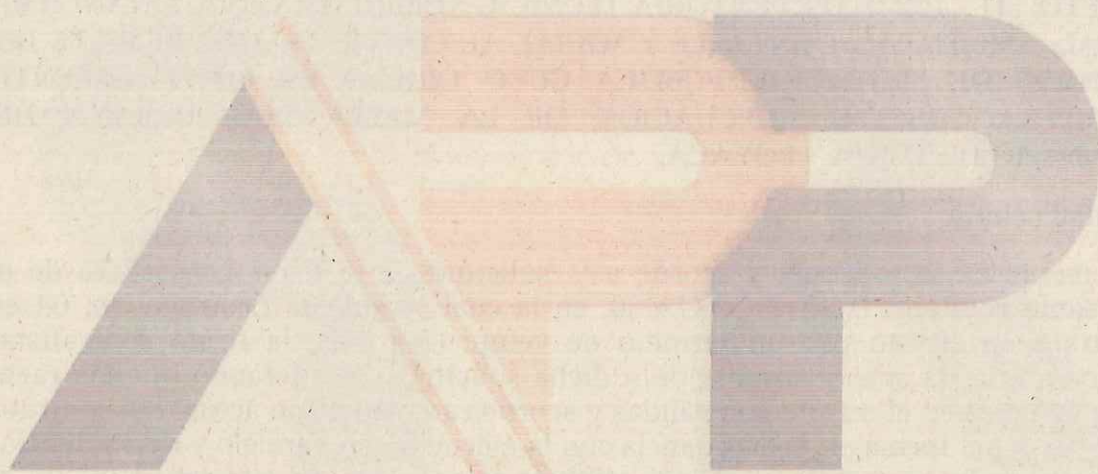

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 13 de junio de 2024

INGENIERO
GERMAN DARIO MORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 077

ASUNTO: *Solicitud de ampliación No.2 a la suspensión No.2 al contrato de obra No.1977 de 2023 y contrato de interventoría No.1964 de 2023*

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud realizada por la firma contratista de obra mediante oficio UT-CVP-COXT-061 de fecha 13 de junio de 2024, se solicita amablemente a la supervisión del contrato proceder con el trámite administrativo pertinente que permita la ampliación No.2 de la suspensión No.02 al contrato de obra No.1977 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la ampliación No.2 de suspensión No.02 del contrato de interventoría 1964 de 2023 a partir del día 19 de junio de 2024 por un término de quince (30) días calendario.

La fecha de terminación del contrato de obra y de interventoría será el día 19 de julio de 2024.

Atentamente,


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 14 de junio de 2024

JULIAN ANDRES SANTANA LEON
R/L UNION TEMPORAL CONTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 078

ASUNTO: *observaciones informe mensual mes abril*

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde al informe mensual mes abril de 2024 periodo comprendido entre 28 de marzo de 2024 a 27 de abril de 2024 presentado por la firma contratista, se encuentran las siguientes observaciones:

INFORME:

- En la tabla 2 información general del contrato de obra se debe actualizar todas las modificaciones que se han desarrollado en el marco del contrato a la fecha del periodo del informe mensual.

ANEXO ENSAYOS DE CALIDAD PARA MATERIALES:

- los ensayos de caracterización de material para Base granular se encuentran desactualizados con fechas correspondientes al año 2023, se deben actualizar el ensayo.
- los ensayos de compactación de material para Base granular se encuentran desactualizados con fechas correspondientes al año 2022, se deben actualizar el ensayo.

ACTAS DE COMITÉ

- en el informe se especifica que se anexan actas de comité generadas a lo largo del periodo de ejecución del 28 de marzo a 27 de abril de 2024, pero no se evidencian.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417


Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas se solicita amablemente la entrega de la siguiente documentación faltante a la firma contratista un término no mayor a tres (1) días a partir de la recepción de la presente comunicación.

Sin otro particular,


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com

**Contactos:**

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 21 de junio de 2024

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL DE TUNJA
O QUIEN HAGA SUS VECES

LUZ MILA ACEVEDO GALAN
UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 080

ASUNTO: *Solicitud comité extraordinario y reiteración suscripción de ampliación n°2 a la suspensión 2 de los contratos 1964 y 1977 de 2023.*

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito manifestar preocupación sobre el estado actual de los contratos de obra No. 1977 de 2023 y contrato de interventoría No. 1964 de 2023, cuyo proyecto en común es el "MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ", acorde a los siguientes considerandos:

CONSIDERANDOS

- El día 16 de mayo de 2024 se suscribió el acta de suspensión No. 2, la cual tenía fecha de finalización el pasado 04 de junio de 2024, basado en lo manifestado en los oficios UT-CVP-COXT-048 de la firma contratista del 06 de mayo y el oficio CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 068 de interventoría del 07 de mayo de 2024.
- Según el oficio UT-CVP-COXT-054 de la firma contratista de fecha 04 de junio de 2024 y el oficio CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 075 de interventoría del 05 de junio de 2024, se suscribió el día 05 de junio de 2024 el acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2, la cual tenía fecha de finalización el día 19 de junio del presente año.
- El pasado 13 de junio de 2024, la firma contratista solicitó mediante el oficio UT-CVP-COXT-061 la ampliación número 2 de la suspensión número 2, solicitud que fue avalada por la firma de interventoría y remitida al supervisor del proyecto y a su equipo de trabajo el día jueves 13 de junio de 2024 mediante el oficio CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 077.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrollingenieria.com


- La unidad especial de contratación estatal radicó observaciones a las actas de ampliación 2 de la suspensión No. 2 de los contratos el día 18 de junio de 2024.
- Las observaciones emitidas por la unidad especial de contratación fueron subsanadas por la firma contratista de obra e interventoría el día martes 18 de junio de 2024.
- Teniendo en cuenta que la ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 tenía fecha de finalización el día 19 de junio de 2024, esta interventoría solicitó y radicó la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión 2 con tiempo suficiente para su trámite administrativo correspondiente.
- A la fecha de la presente, hoy 21 de junio de 2024, no se tiene respuesta alguna por parte de la entidad contratante y/o supervisor que permita suscribir y protocolizar la ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 de los contratos de obra e interventoría 1964 de 2023 y 1977 de 2023.
- La ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 finalizó el día miércoles 19 de junio de 2024, lo cual a fecha de hoy deja los contratos mencionados en un estado incierto en el que se desconoce cómo se debe proceder administrativamente.

SOLICITUD

En vista de lo anterior, solicitamos de manera urgente la realización de un Comité extraordinario entre la Unidad Especial De Contratación y la Secretaría de Infraestructura Territorial de la Ciudad de Tunja, con la presente firma de interventoría, con el fin de discutir la situación actual de los contratos mencionados y establecer la ruta que permita la culminación a feliz término de los contratos de obra e interventoría.

Se aclara que la coyuntura actual de la Secretaría de Infraestructura Territorial respecto a la supervisión de los contratos en referencia no debería afectar la correcta ejecución y suscripción de actos administrativos necesarios que permitan culminar los contratos en ejecución. Por tal motivo, se deja precedente de que las solicitudes realizadas por la firma de interventoría fueron realizadas en los tiempos solicitados para la suscripción de trámites, según lo indicado en las circulares emitidas por la Unidad Especial De Contratación de la ciudad de Tunja. Por tal motivo, no nos hacemos responsables de las afectaciones que la coyuntura actual de la Alcaldía genere por acciones u omisiones a los contratos en cuestión.

Sin otro particular, quedamos en espera de pronta y positiva respuesta para la realización del comité extraordinario, para lo cual manifestamos tener absoluta y total disponibilidad, contando a partir del recibo de la presente.


SEBASTIAN TOLEDO MOYA

R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 24 de junio de 2024

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL DE TUNJA
O QUIEN HAGA SUS VECES

LUZ MILA ACEVEDO GALAN
UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 081


ASUNTO: Reiteración solicitud comité extraordinario y reiteración suscripción de ampliación n°2 a la suspensión 2 de los contratos 1964 y 1977 de 2023.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, se reitera lo solicitado en radicado número ATU2024ER031479 de fecha 21 de junio de 2024 indicando nuevamente la necesidad de la realización de comité extraordinario con la Unidad Especial De Contratación y la Secretaria de Infraestructura Territorial del municipio de Tunja con la presente firma de interventoría.

Atentamente;



SEBASTIAN TOLEDO MOYA

R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 24 de junio de 2024

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL DE TUNJA
O QUIEN HAGA SUS VECES

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 082

ASUNTO: Reiteración *solicitud modificadorio No.4 contrato 1977 de 2023.*

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, se reitera lo solicitado mediante oficio CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 073 de fecha 05 de junio de 2024, indicando nuevamente la necesidad de la realización de la modificadoria No.4 del contrato 1977 de 2023 con el fin de terminar la realización de actividades de obra.

Esta interventoría manifiesta su preocupación. dado que esta solicitud de modificación contractual No.4, se tramita ante la entidad el pasado miércoles 05 de junio de 2024, previendo que la suscripción del mismo se realizaría según los tiempos de revisión contemplados por la circular N° 001 de 2024, emitida por la Unidad Especial de Contratación del municipio de Tunja. Por lo anterior, se solicita amablemente a la secretaria de Infraestructura territorial, se informe a esta interventoría en qué estado se encuentra solicitud radicada, puesto que a la fecha no se han remitido observaciones de los documentos radicados por parte de ninguna de las dos sectoriales.

Atentamente;


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 02 de julio de 2024

CARLOS GABRIEL HERNÁNDEZ CARRILLO
Secretario de infraestructura

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 083

ASUNTO: Reiteración No.2 a solicitud modificadorio No.4 contrato 1977 de 2023


OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETÓ ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, se reitera lo solicitado mediante oficios CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 073 de fecha 05 de junio y CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 082 de fecha 24 de junio de 2024, indicando nuevamente la necesidad de la realización de la modificatoria No.4 del contrato 1977 de 2023 con el fin de terminar la realización de actividades de obra.

Esta interventoría manifiesta su preocupación. dado que esta solicitud de modificación contractual No.4, se tramitó ante la entidad el pasado miércoles 05 de junio de 2024, previendo que la suscripción de este se realizaría según los tiempos de revisión contemplados por la circular N° 001 de 2024, emitida por la Unidad Especial de Contratación del municipio de Tunja. Por lo anterior, se solicita amablemente a la secretaría de Infraestructura territorial, se informe a esta interventoría en qué estado se encuentra solicitud radicada, puesto que a la fecha no se han remitido observaciones de los documentos radicados por parte de ninguna de las dos sectoriales.

Sin otro particular.



SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 2 de julio de 2024

Sr. Carlos Alirio Hurtado Carvajal
PETICIONARIO

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 084

ASUNTO: Respuesta derecho de petición


OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, esta interventoría en atención a derecho de petición allegado por el señor Carlos Alirio Hurtado Carvajal, se permite indicar que contrario a lo que manifiesta en el oficio de solicitud la continuidad de la obra **no** está supeditada al desembolso de recursos por parte de la secretaría de infraestructura, sino a la presencia de lluvias en el área urbana que impiden el correcto proceso constructivo de la intervención, así como también la suscripción de Mayores y menores cantidades de obra por parte de la entidad contratante a la plataforma Secop II, que permita la ejecución y pago de las actividades necesarias para la finalización de la intervención en los tramos previstos sin que se constituya un hecho cumplido.

Cabe resaltar que, si bien en el momento se encuentra inconclusa la intervención vial, una vez se reinicie contrato se retomará la ejecución de actividades de obra atendiendo a los posibles daños ocasionados en las capas granulares instaladas, en cumplimiento de las especificaciones de construcción de carreteras INVIAS 2022, esto a costo y riesgo del contratista.

Atentamente:


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 03 de julio de 2024

CARLOS GABRIEL HERNÁNDEZ CARRILLO

Secretario de infraestructura

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 085

ASUNTO: Reiteración No.3 a solicitud modificadorio No.4 contrato 1977 de 2023


OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, se reitera lo solicitado mediante oficios CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 073 de fecha 05 de junio, CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 082 de fecha 24 de junio de 2024 y CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 083 de fecha 02 de julio de 2024, indicando nuevamente la necesidad de la realización de la modificatoria No.4 del contrato 1977 de 2023 con el fin de terminar la realización de actividades de obra.

Esta interventoría manifiesta su preocupación. dado que esta solicitud de modificación contractual No.4, se tramitó ante la entidad el pasado miércoles 05 de junio de 2024, previendo que la suscripción de este se realizaría según los tiempos de revisión contemplados por la circular N° 001 de 2024, emitida por la Unidad Especial de Contratación del municipio de Tunja. Por lo anterior, se solicita amablemente a la secretaría de Infraestructura territorial, se informe a esta interventoría en qué estado se encuentra solicitud radicada, puesto que a la fecha no se han remitido observaciones de los documentos radicados por parte de ninguna de las dos sectoriales.

Sin otro particular.



SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 03 de julio de 2024

**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
O QUIEN HAGA SUS VECES**

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 086


ASUNTO: Solicitud comité técnico

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, esta interventoría en atención a respuesta de la solicitud realizada por parte de la supervisión el día 03 de julio de 2024 en el cual se solicita una reunión para socializar temas de importancia del contrato de la referencia, solicita amablemente comité técnico para el día 04 de julio del 2024 en las instalaciones de la secretaria de infraestructura.

Sin otro particular, quedamos atentos a la disposición y fijación de la hora del comité por parte de la supervisión del proyecto


SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 11 de julio de 2024

LUZ MILA ACEVEDO GALAN
UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 087

ASUNTO: Solicitud de información.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, esta interventoría solicita información con respecto a al estado de suscripción de la ampliación N°2 a la Suspensión N°2 de los contratos 1977 y 1964 de 2023, dado que se radicaron según los tiempos previstos en circular 001 de 2024 emitida por la UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE TUNJA para que su suscripción se realizará el día 19 de junio de 2024 atendiendo las observaciones de del caso y a la fecha no se evidencia en la plataforma Secop II la documentación que soporte el adicional a la suspensión N°2.

Atentamente;


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 25 de julio de 2024

ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 090


ASUNTO: Solicitud reinicio contratos de interventoría y obra 1964 de 2023 y 1977 de 2023.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud de la firma contratista de obra mediante radicado UT-CVP-COXT-065 en la cual se solicita el reinicio del contrato 1977 de 2023, la firma contratista de interventoría da aval y aprobación a dicha solicitud y en concordancia solicita el reinicio del contrato de interventoría 1964 de 2023.

Dicho lo anterior, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo que permita la suscripción del reinicio de los contratos en asunto.


SEBASTIAN TOLEDO MOYA

R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA

Correo: appcontrolingenieria@gmail.com

Anexo 1: Solicitud firma contratista



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 03 de Agosto de 2024

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102

ASUNTO: Solicitud instalación de Asfalto en tramos.

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.


Cordial saludo:

Por medio de la presente, la Firma Interventora desea expresar su preocupación con respecto a la no instalación de carpeta de rodadura (MCD-19) en el parche ubicado en el sector Santa Rita, dado que hasta la fecha no se ha llevado acabo la pavimentación correspondiente. Es importante recordar que La capa granular instalada en estos sectores está en riesgo de deterioro, al igual que la emulsión asfáltica, adicionalmente a lo anterior la falta de pavimentación genera problemas de seguridad vial para los usuarios de estas vías.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la firma contratista la instalación inmediata de asfalto en los mencionados tramos.

Se anexa registro fotográfico.

Sin otro particular.


SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:



Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Ilustración 2: Tramo Santa Rita

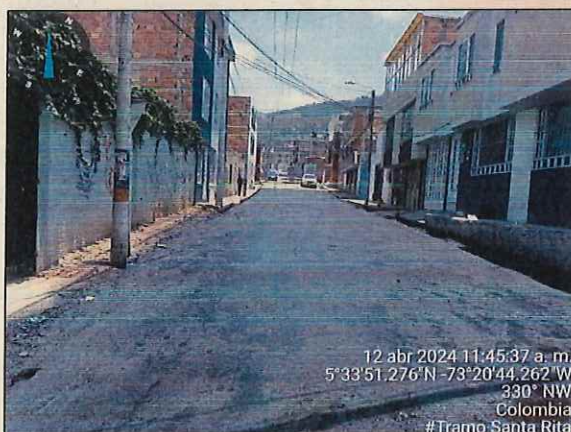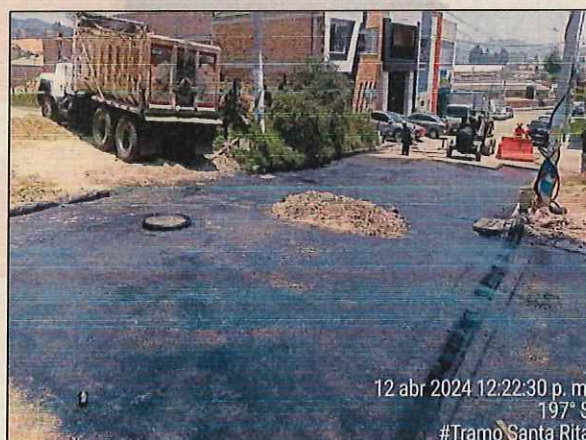

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

Tunja, 03 de agosto de 2024

GERMÁN DARÍO MORA PÉREZ

Secretario De Infraestructura Territorial

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN

R/L UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

CTO. 1964/2023/SIT-102 OF (

ASUNTO: SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS Y COMITÉ DE OBRA

OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente esta interventoría en cumplimiento de sus funciones y en pro a garantizar la calidad en los procesos constructivos de las obras objeto del contrato 1977 de 2023, solicita amablemente a la firma contratista que se retire y remplace a costo y riesgo de contratista la mezcla asfáltica instalada en el barrio Palos verdes el día 03 de Agosto del presente año, puesto que se realizó actividad de SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) en condiciones de lluvia, donde pese a las indicaciones de pausa de actividades por parte de interventoría la firma contratista hace caso omiso. Cabe resaltar que el proceso constructivo llevado a cabo por la firma UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI contradice en toda forma las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS-2022 450.4.15 Limitaciones en la ejecución donde se especifica "Tampoco se permitirán la extensión ni la compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a cinco grados Celsius (5° C)."(cursiva y subraya nuestra).



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 318 683 5421 / 312411 3265

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.aadcontrolinaenieria.com



Imagen 1. Ejecución de actividades de obra día 03/08/2024

Dadas las actuaciones del contratista de obra, mencionadas anteriormente se indica que la interventoría deja evidencia de las observaciones pertinentes a través del presente oficio (dado que firma contratista no ha permitido la respectiva anotación en la bitácora, la cual debe permanecer en obra según las obligaciones del contratista derivadas del contrato 1977 de 2023) y así mismo indica que presuntamente se transgredió la **cláusula 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, TÉCNICAS, a) Alcance** *"En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las características y calidad de la obra terminada, que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados; también se hace énfasis en la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a la obra a su cargo. Por otra parte, la omisión intencional de descripciones detalladas de procedimientos en muchas de las Especificaciones, refleja la suposición básica de que EL CONTRATISTA conoce las prácticas aceptables respectivas. No se pretende imponer al CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener los mismos resultados con otros*



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

procedimientos de su selección, aceptables. Ver anexo técnico.” (cursiva y subraya nuestra), b) Especificaciones normalizadas “Para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se aplicarán como normativas las especificaciones técnicas establecidas POR EL MUNICIPIO, las cuales se pueden consultar en la Secretaría de Infraestructura y que están basadas en los análisis de precios unitarios establecidos por la Gobernación de Boyacá y de acuerdo a especificaciones laboradas por la Sociedad de Ingenieros y arquitectos para el Municipio de Tunja

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso mantenimiento, recuperación y/o adecuación de la malla vial, se debe tener presente la legislación colombiana en materia de protección ambiental, leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y soportan desde el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales, y humanos, por lo tanto este marco legal deberá ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en todos sus aspectos referentes a los trabajos objeto de la licitación.

EL INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspendan las obras de mantenimiento, recuperación y/o adecuación, si existe un incumplimiento sistemático por parte de EL CONTRATISTA para cumplir los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones de EL INTERVENTOR a este respecto.” (cursiva y subraya nuestra), por lo tanto, de no ser retirada la mezcla asfáltica según lo indicado en las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS-2022 450, se procederá con el incumplimiento del contrato según cláusula 14. multas.

De la misma manera se solicita a la entidad contratante la programación de comité de obra a brevedad con el fin de tratar temas afines a porcentaje de ejecución actual, programación de contratista para el plazo restante de obra y discusión de requerimientos en el marco del contrato realizados por la interventoría.

Sin otro particular, atentamente,


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA
Correo: appcontrolingenieria@gmail.com



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

RECIBIDOS

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Secretaría de
Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA



1,10-3,3 0023

Tunja, 29 de diciembre de 2023

Ingeniero

JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA

Rep. Legal – APP CONTROL INGENIERIA S.A.S

appcontrolingenieria@gmail.com

REF.: SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: Verificación de puntos de intervención.

Cordial saludo Ingeniero Álvarez,

Mediante el presente escrito me permito desde la supervisión del contrato de interventoría, presentar el seguimiento de las obras ejecutadas y pendientes por ejecutar, a continuación, se presenta el cuadro resumen:

PROYECTOS	VALOR PROYECTOS APROBADOS	VALOR PROYECTOS EJECUTADOS	POR EJECUTAR 2024
Reparqueo - Barrio Paraíso Calle 12, calle 11 con carrera 16 y 17	\$ 50.166.747,54	\$ 35.710.811	\$ 14.455.937
REPARCHEO ENTRE LA CLL 5 Y KRA 14 - BARRIO HUNZA	\$ 55.412.566,90	\$ 59.068.610	
REPARCHEO KRA 1 ENTRE CLL 11 Y CLL 12 - BARRIO PEÑITAS	\$ 43.000.000,00	\$ -	\$ 43.000.000
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL (INTERNA)- BARRIO PORTAL DE OTOÑO	\$ 10.000.000,00	\$ 18.795.993	
REPARCHEO CLL 8 ENTRE KRA 1 Y 2 - BARRIO PEÑITAS	\$ 188.000.000,00	\$ 137.973.577	\$ 50.026.423
Reparqueo CL 5 desde la KR 6 hasta KR 4C - Barrio Doña Eva	\$ 233.409.875,40	\$ 307.602.180	
Pavimentación de la vía o mantenimiento de vías - Calle 26 a,	\$ 187.466.053,32	\$ 298.138.268	



NIT.891800846 - 1

Calle 19 N° 9-95 Edificio Municipal - Centro Histórico
Tunja, Boyacá - 740 57 70 • infraestructura@tunja.gov.co

• www.tunja-boyaca.gov.co •





Secretaría de
Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA



Tunja
La Capital
que nos UNE

PROYECTOS	VALOR PROYECTOS APROBADOS	VALOR PROYECTOS EJECUTADOS	POR EJECUTAR 2024
calle 27 a, transversal 27 y la calle 28 entre diagonal 26a y carrera 8 este Barrio Prados de San Luis			
REPARCHEO CALLE 9 CON CARRERA 10 - BARRIO SUAREZ	\$ 150.000.000,00	\$ 64.483.446	\$ 85.516.554
Mantenimiento vial CL 9A barrio Suárez que intersecta con la KR 10 y CL 10 A	\$ 114.153.404,40	\$ 42.649.331	\$ 71.504.073
Mantenimiento vial de la KR 11 B por la CL 14 A hasta la KR 11 barrio Urbanización el Bosque	\$ 55.757.299,98	\$ 104.320.706	
PAVIMENTACION VIA- KR 13 ENTRE CLL 31A A CL 31B - BARRIO GAITAN	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000
Parcheo - carrera 18 entre la diagonal 33 y la salida villa de leyva Barrio La Fuente 4 Etapa	\$ 56.643.129,90	\$ 25.285.108	\$ 31.358.022
Parcheo - Calle 36 entre la carrera 16 hasta la carrera 18 a Barrio los Trigales, La Calleja y la Fuente	\$ 59.492.737,08	\$ 51.049.227	
Parcheo - carrera 16A y 164 , entre la calle 32 y 36 Barrio San Diego	\$ 83.584.879,56	\$ 85.543.598	
Parcheo - Transversal 17 entre calle 21 y 22 Barrio Kennedy	\$ 63.602.345,52	\$ 29.942.419	\$ 33.659.926
REPARCHEO CARRERA 8° ENTRE CALLE 53 Y 54 - BARRIO LA GRANJA	\$ 100.000.000,00	\$ 66.873.230	\$ 33.126.770
REPARCHEO DE CARRERA 7° ENTRE CALLE 45 Y 46 - BARRIO LOS CRISTALES	\$ 61.000.000,00	\$ 57.060.229	
REPARCHEO VIAL - BARRIO LAS QUINTAS	\$ 21.156.810,59	\$ -	\$ 21.156.811
PAVIMENTACION CLL 39 ENTRE K 1RA Y KRA 2 E - LA ESMERALDA		\$ 5.233.369	
REPARCHEO KRA 1E ENTRE CLL 39 Y 40 - BARRIO LA ESMERALDA		\$ -	
REPARCHEO DE CALLE 78, 78 CARRERA O Y 1 - BARRIO BALCONES DE TERRANOVA	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000
ARREGLO DE LA SEGUNDA CALLE QUE ESTÁ CON ADOQUIN - TRANSVERSAL 0A ESTE CON CALLE #69-21 Y TRANSVERSAL OESTE - BARRIO SUAMOX	\$ 69.470.467,00	\$ -	\$ 69.470.467



NIT.891800846 - 1

Calle 19 N° 9-95 Edificio Municipal - Centro Histórico
Tunja, Boyacá - 740 57 70 • infraestructura@tunja.gov.co

• www.tunja-boyaca.gov.co •





PROYECTOS	VALOR PROYECTOS APROBADOS	VALOR PROYECTOS EJECUTADOS	POR EJECUTAR 2024
REPARCHEO VIA CALLE 74 Y 75 - BARRIO PALOS VEDES	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 35.000.000
Arreglo de las CLL Transversal 0A Este con 69 y Transversal 0 con 69 - Barrio Altos de Suamox	\$ 53.016.354,72	\$ -	\$ 53.016.355
Mantenimiento malla vial CL 75 - Barrio Palos Verdes	\$ 32.810.042,16	\$ -	\$ 32.810.042
Mantenimiento vial en adoquin KR 13 Este con 71 y 72 - Barrio Capitolio	\$ 67.065.498,36	\$ -	\$ 67.065.498
REPARCHEO VIA ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO SANTA RITA CARRERA 8A - BARRIO VILLA LUZ	\$ 34.046.545,00	\$ -	\$ 34.046.545
REPARCHEO DE LA CALLE 78 ENTRE AVENIDA 6 Y 10A - BARRIO PORTAL DE HUNZAUA	\$ 50.509.620,00	\$ -	\$ 50.509.620
REPARCHEO CALLE 76 CON CARRERA 9° - BARRIO MANANTIAL DEL NORTE	\$ 54.761.591,00	\$ -	\$ 54.761.591
PAVIMENTACIÓN CARRERA 6 CON 59 Y 59A - BARRIO VILLA LUZ		\$ -	
Reparcheo - Carrera 55 A desde la avenida norte hasta la 11 - Barrio Soaquira	\$ 110.746.686,00	\$ 94.741.016	\$ 16.005.670
Reparcheo - Barrio Asís Boyacense	\$ 292.702.190,00	\$ 305.431.592	
CARRERA 4C ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A CALLE 5A ENTRE CARRERA 4C Y CARRERA 4B VILLA BACHUE	\$ 45.587.468,01	\$ 45.587.468	
CARRERA 10 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25	\$ 221.963.309,92	\$ 221.963.310	
PMT Y PGIO		\$ 9.428.481	\$ 2.893.205
	\$ 2.631.525.622,36	\$ 2.066.881.971,04	\$830.383.508

Teniendo en cuenta que para la vigencia 2024, la asignación de la supervisión estará a cargo el secretario de Infraestructura entrante, nos permitimos dejar la ruta de intervención, de los tramos pendientes para el cumplimiento de la política pública de presupuestos participativos.

Es importante que la interventoría tenga en cuenta que los recursos asignados a los contratos 1977 de 2023 y 1964 de 2023, hacen parte del rubro de presupuestos participativos, por lo tanto, solo se pueden intervenir los proyectos aprobados, es





importante aclara que el valor de la columna POR EJECUTAR 2024, corresponde al valor de obra y de interventora, a continuación se relación lo tramos que se deben ejecutar.


PROYECTOS	VALOR PROYECTOS APROBADOS	VALOR PROYECTOS EJECUTADOS	POR EJECUTAR 2024
Reparqueo - Barrio Paraíso Calle 12, calle 11 con carrera 16 y 17	\$ 50.166.747,54	\$ 35.710.811	\$ 14.455.937
REPARCHEO KRA 1 ENTRE CLL 11 Y CLL 12 - BARRIO PEÑITAS	\$ 43.000.000,00	\$ -	\$ 43.000.000
REPARCHEO CLL 8 ENTRE KRA 1 Y 2 - BARRIO PEÑITAS	\$ 188.000.000,00	\$ 137.973.577	\$ 50.026.423
REPARCHEO CALLE 9 CON CARRERA 10 - BARRIO SUAREZ	\$ 150.000.000,00	\$ 64.483.446	\$ 85.516.554
Mantenimiento vial CL 9A barrio Suárez que intersecta con la KR 10 y CL 10 A	\$ 114.153.404,40	\$ 42.649.331	\$ 71.504.073
PAVIMENTACION VIA- KR 13 ENTRE CLL 31A A CL 31B - BARRIO GAITAN	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000
Parcheo - carrera 18 entre la diagonal 33 y la salida villa de leyva Barrio La Fuente 4 Etapa	\$ 56.643.129,90	\$ 25.285.108	\$ 31.358.022
Parcheo - Transversal 17 entre calle 21 y 22 Barrio Kennedy	\$ 63.602.345,52	\$ 29.942.419	\$ 33.659.926
REPARCHEO CARRERA 8° ENTRE CALLE 53 Y 54 - BARRIO LA GRANJA	\$ 100.000.000,00	\$ 66.873.230	\$ 33.126.770
REPARCHEO VIAL - BARRIO LAS QUINTAS	\$ 21.156.810,59	\$ -	\$ 21.156.811
REPARCHEO DE CALLE 78, 78 CARRERA 0 Y 1 - BARRIO BALCONES DE TERRANOVA	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000
ARREGLO DE LA SEGUNDA CALLE QUE ESTÁ CON ADOQUIN - TRANSVERSAL 0A ESTE CON CALLE #69-21 Y TRANSVERSAL OESTE - BARRIO SUAMOX	\$ 69.470.467,00	\$ -	\$ 69.470.467
REPARCHEO VIA CALLE 74 Y 75 - BARRIO PALOS VEDES	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 35.000.000
Arreglo de las CLL Transversal 0A Este con 69 y Transversal 0 con 69 - Barrio Altos de Suamox	\$ 53.016.354,72	\$ -	\$ 53.016.355
Mantenimiento malla vial CL 75 - Barrio Palos Verdes	\$ 32.810.042,16	\$ -	\$ 32.810.042





PROYECTOS	VALOR PROYECTOS APROBADOS	VALOR PROYECTOS EJECUTADOS	POR EJECUTAR 2024
Mantenimiento vial en adoquin KR 13 Este con 71 y 72 - Barrio Capitolio	\$ 67.065.498,36	\$ -	\$ 67.065.498
REPARCHEO VIA ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO SANTA RITA CARRERA 8A - BARRIO VILLA LUZ	\$ 34.046.545,00	\$ -	\$ 34.046.545
REPARCHEO DE LA CALLE 78 ENTRE AVENIDA 6 Y 10A - BARRIO PORTAL DE HUNZUA	\$ 50.509.620,00	\$ -	\$ 50.509.620
REPARCHEO CALLE 76 CON CARRERA 9° - BARRIO MANANTIAL DEL NORTE	\$ 54.761.591,00	\$ -	\$ 54.761.591
Reparqueo - Carrera 55 A desde la avenida norte hasta la 11 - Barrio Soaquira	\$ 110.746.686,00	\$ 94.741.016	\$ 16.005.670
PMT Y PGIO		\$ 9.428.481	\$ 2.893.205
			\$830.383.508

Sin otro particular.


Ing. Pedro Alejandro Rodríguez Ávila
Secretario de Infraestructura Territorial
Proyector: Ing. Catalina Suspes e Ing. Juanita del Pilar Pedreros





APP CONTROL INGENIERIA S.A.S <appcontrolingenieria@gmail.com>

SAC - ALCALDIA DE TUNJA

1 mensaje

Notificaciones SAC <notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co>
Para: appcontrolingenieria@gmail.com

2 de julio de 2024, 9:49

Estimado usuario:

Se ha radicado el siguiente requerimiento:

No. Radicado PQR: ATU2024ER032634**Fecha Radicación:** 02/07/2024**Ciudadano:** APP CONTROL INGENIERIA S.A.S**Asunto:** Reiteración No. 2 solicitud modificadorio No.4 contrato 1977 de 2023.

Contenido: Tunja, 02 de julio de 2024 CARLOS GABRIEL HERNÁNDEZ CARRILLO Secretario de infraestructura CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 083 ASUNTO: Reiteración No.2 a solicitud modificadorio No.4 contrato 1977 de 2023 OBJETO: SIT - 102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. Cordial saludo: Por medio de la presente, se reitera lo solicitado mediante oficios 1964/2023/SIT-102 OF 073 de fecha 05 de junio de 2024 y CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 082 de fecha 24 de junio de 2024, indicando nuevamente la necesidad de la realización de la modificatoria No.4 del contrato 1977 de 2023 con el fin de terminar la realización de actividades de obra. Esta interventoría manifiesta su preocupación. dado que esta solicitud de modificación contractual No.4, se tramitó ante la entidad el pasado miércoles 05 de junio de 2024, previendo que la suscripción de este se realizaría según los tiempos de revisión contemplados por la circular N° 001 de 2024, emitida por la Unidad Especial de Contratación del municipio de Tunja. Por lo anterior, se solicita amablemente a la secretaría de Infraestructura territorial, se informe a esta interventoría en qué estado se encuentra solicitud radicada, puesto que a la fecha no se han remitido observaciones de los documentos radicados por parte de ninguna de las dos sectoriales. Sin otro particular. SEBASTIÁN TOLEDO MOYA R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS INTERVENTORÍA Correo: appcontrolingenieria@gmail.com

Recuerde que puede ingresar al sistema SACv2 con su respectivo usuario y contraseña para hacer seguimiento del mismo.

También puede ser consultado ingresando por la siguiente url:

[Ver Radicado](#)

**ÉSTE CORREO ES ÚNICAMENTE INFORMATIVO - POR FAVOR NO RESPONDER ESTE MENSAJE
NO RESPONDER - Mensaje Generado Automáticamente.**

Si tienes alguna consulta con respecto a este correo puede contactarse directamente con la Entidad Territorial donde radicó su solicitud.

Este correo es únicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener información privilegiada y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) deberá borrarlo inmediatamente. Queda notificado que el mal uso, divulgación no autorizada, alteración y/o modificación malintencionada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y pueden ser legalmente sancionados.



APP CONTROL INGENIERIA S.A.S <appcontrolingenieria@gmail.com>

SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO

Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Para: "APP CONTROL INGENIERIA S.A.S" <appcontrolingenieria@gmail.com>

4 de julio de 2024, 8:10

Buenos Días

Cordial Saludo,

Deseando éxito en sus labores diarias aprovecho la oportunidad de informar que la reunión de queda agendada para el día de mañana 5 de julio de 2024 a las 7:00 am en la secretaria de infraestructura, favor confirmar asistencia, para fines correspondientes.

Cordialmente.

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
Secretario de Infraestructura Territorial



De: APP CONTROL INGENIERIA S.A.S <appcontrolingenieria@gmail.com>

Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 18:13

Para: Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>; atencionalciudadano <atencionalciudadano@tunja.gov.co>

Asunto: SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO

[El texto citado está oculto]

ANEXO No. 7
INFORME SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

ACTA DE COBRO PARCIAL NO.03 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1964 DE 2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL INTERVENTORÍA

**SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO,
RECUPERACIÓN Y/O A DECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ**



**CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE A 29 DE DICIEMBRE DE 2023; DEL 01 DE
FEBRERO A 16 DE MAYO Y DEL 29 DE JULIO A 5 DE AGOSTO DE 2024**

**APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARIA DE INFRAERUCTURA
TUNJA, 2024**

TABLA DE CONTENIDO

LOCALIZACIÓN	5
LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
LOCALIZACIÓN POR TRAMOS	6
RESUMEN GENERAL CONTRATOS	13
RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA 1964 DE 2023	13
RESUMEN CONTRATO DE OBRA 1977 DE 2023	14
COMPONENTE AMBIENTAL	16
COMPONENTE PMA	16
Indicadores de control para programas de manejo ambiental	17




LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización general del proyecto.....	5
Ilustración 2: Localización Tramo I	6
Ilustración 3: Localización Tramo II	7
Ilustración 4: Localización Tramo III	7
Ilustración 5: Localización Tramo IV	8
Ilustración 6: Localización Tramo V.....	9
Ilustración 7: Localización Tramo VI	9
Ilustración 8: Localización Tramo VII.....	10
Ilustración 9: Localización Tramo VIII	10
Ilustración 10: Localización Tramo IX	11
Ilustración 11: Localización Tramo X	11
Ilustración 12: Localización Tramo XI	12
Ilustración 13: Localización Tramo XII	12
Ilustración 14: Registro de capacitaciones ambientales.....	19
Ilustración 15: Señalización de las áreas de trabajo.....	20
Ilustración 16: Inspección de maquinaria y equipos.....	22

CONTROL INGENIERIA S.A.S.

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Resumen general Contrato 1964 de 2023	13
Tabla 2: Resumen general Contrato 1977 de 2023	14
Tabla 3: Programas de manejo ambiental	16
Tabla 4: Indicadores adoptados de Seguimiento del Plan de manejo ambiental	17
Tabla 5: Control de capacitaciones ambientales	19
Tabla 6: Seguimiento de residuos de escombros por tramo	20
Tabla 7: Seguimiento a PQRS y requerimientos de la comunidad	22

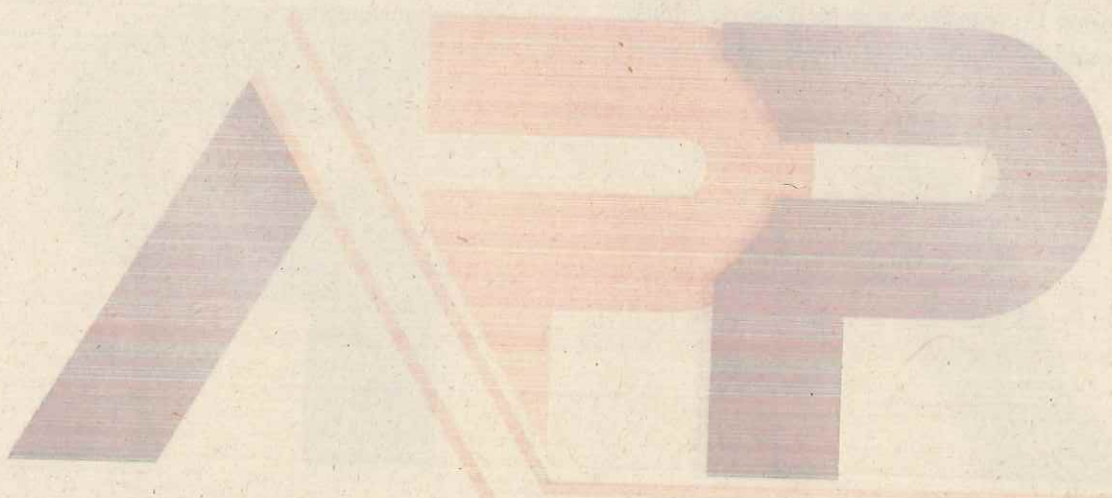

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Tunja Capital del departamento de Boyacá, Está ubicada en las coordenadas 5°32'7"N 73°22'04"O y su longitud en relación con Bogotá es de 0 grados, 43 minutos y 0 segundos.

El proyecto se encuentra comprendido en el municipio de Tunja; los tramos a intervenir contemplan el mantenimiento, recuperación y/o adecuación de la malla vial urbana.

Ilustración 1: Localización general del proyecto



Fuente: Estudio previo

LOCALIZACIÓN POR TRAMOS:

Durante el periodo de ejecución se realizaron actividades en los tramos mencionados a continuación:

TRAMO I: BARRIO CAPITOLIO INTERSECCIÓN DE ACCESO A LA CALLE 72 POR LA CARRERA 2A

El sector del barrio capitolio, en la intersección de acceso a la calle 72 por la carrera a situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, como grietas de esquina y lineales y de retracción, losa dividida, daño del sello de junta, entre otras.

Ilustración 2: Localización Tramo I




Fuente: Localización con Google maps

TRAMO II: BARRIO SUAMOX DIAGONAL 69 ENTRE CALLES 0 ESTE Y 0A ESTE

El tramo ubicado en la diagonal 69 entre calles 0 este y 0a del barrio suamox de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 3: Localización Tramo II

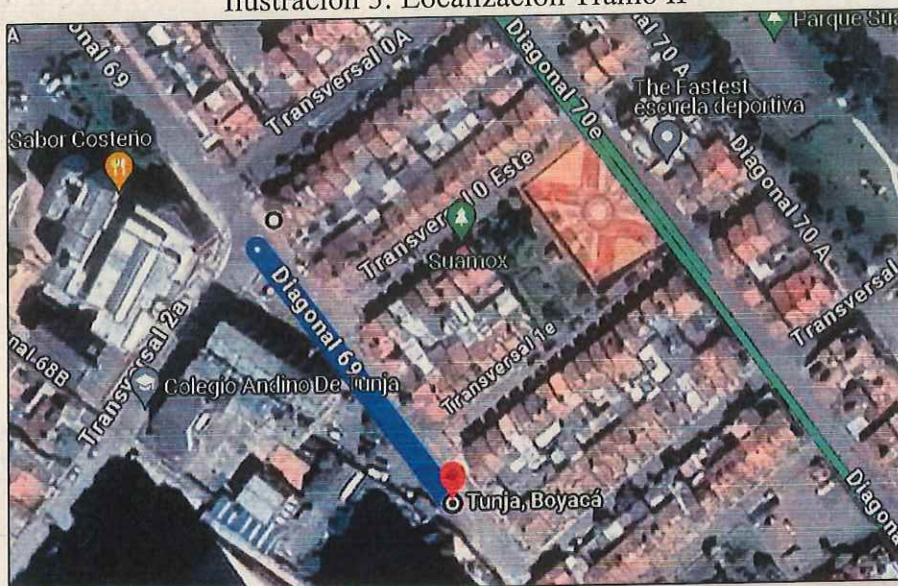


Fuente: Localización con Google maps

**TRAMO III: BARRIO PEÑITAS CALLE 12 ENTRE CARRERAS 1 Y 2E -
INTERSECCIÓN DE LA CALLE 12 CON CARRERA 3E**

El tramo ubicado en la Calle 12, entre carreras 1 y 2e e intersección de la calle 12 con carrera 3e ubicado en las Peñitas de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen: desplazamientos, abultamientos y ahuellamientos de la rodadura, adicionalmente se presentan grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 4: Localización Tramo III

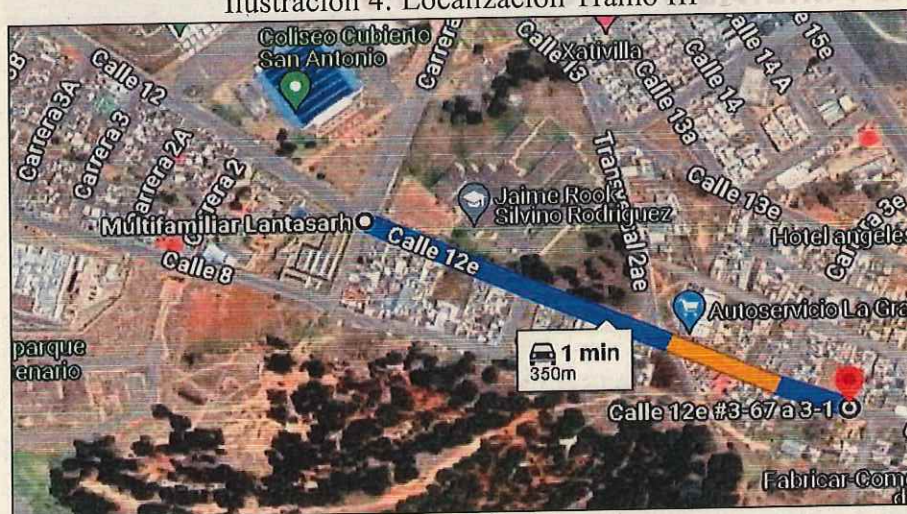

Fuente: Localización con Google maps

TRAMO IV: BARRIO SUAREZ CALLE 9 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 – CALLE 10 INTERSECCION CARRERA 9

El tramo se encuentra ubicado en la Calle 9 entre carrera 8 y 10, y el segundo se encuentra ubicado en la calle 10 intersección carrera 9. estas calzadas presentan una condición de deterioro predominante que demanda una intervención inmediata. La vía exhibe notables signos de deterioro en la carpeta de rodadura existente, tales como grietas, baches y un desgaste generalizado. Esta arteria vial reviste una importancia crítica para el Barrio Suarez y la ciudad de Tunja en su conjunto, ya que circulan vehículos de transporte público que conecta a los residentes con diversas zonas de la ciudad, y su adecuado estado es esencial para la movilidad de los habitantes y el desarrollo económico de la región.

Ilustración 5: Localización Tramo IV



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO V: BARRIO PARAISO CALLE 12 NO. 15-2

El segmento de intersección ubicado en la Calle 12 con carrera 15, en el Barrio Paraíso de la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro pronunciada que demanda una intervención inmediata. La vía exhibe notables signos de deterioro, principalmente la presencia de un bache en la sección transversal de la vía. Esta arteria vial reviste una importancia crítica para el Barrio paraíso y la ciudad de Tunja ya que circulan vehículos de transporte público que conecta a los residentes

TRAMO VII: MANANTIAL CALLE 79

El sector del barrio manantial, en la intersección de acceso a la calle 79, situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, y deterioro estructural y funcional, como fisuras longitudinales y baches predominantes, entre otros, adicionalmente a lo anterior es un corredor vial importante para la ciudad donde se mueve el transporte público colectivo.

Ilustración 8: Localización Tramo VII



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO VIII: SANTA RITA INTERSECCION CARRERA 4 CON CALLE 58

El tramo ubicado en la intersección carrera 4 con calle 58 del barrio santa Rita de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada por patologías estructurales y funcionales de la estructura de pavimento existente. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 9: Localización Tramo VIII



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO IX: PALOS VERDES CALLE 74 CON TRANSVERSAL 2ª

El tramo ubicado en la calle 74 con transversal 2ª del barrio palos verdes de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen: desplazamientos, abultamientos y ahuellamientos de la carpeta de rodadura, adicionalmente se presentan grietas longitudinales y transversales. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 10: Localización Tramo IX



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO X: BALCONES DE TERRANOVA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1ª Y 1

El tramo se encuentra ubicado en la calle 79 entre carrera 1ª y 1 en el barrio balcones de terranova de la ciudad de Tunja este tramo vial presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen: desplazamientos, abultamientos y ahuellamientos de la carpeta de rodadura, adicionalmente se presentan grietas longitudinales y transversales. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 11: Localización Tramo X



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO XI: LAS QUINTAS SOBRE LA CARRERA 2B ENTRE CALLES 48 Y 49

El tramo sobre la carrera 2 b entre calles 48 y 49 del barrio las quintas de la ciudad de Tunja presentan un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada y desgastada por patologías estructurales y funcionales de la estructura de pavimento existente. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 12: Localización Tramo XI



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO XII: LA FUENTE SOBRE LA CARRERA 18 CON CALLE 32

El sector del barrio la fuente, sobre la carrera 18 con calle 32 situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, y deterioro estructural y funcional, como fisuras longitudinales y baches predominantes, pérdida de carpeta de rodadura entre otros.

Ilustración 13. Localización Tramo XII



Fuente: Localización con Google maps

RESUMEN GENERAL CONTRATOS

En el presente capítulo se presentan los procesos administrativos generados durante la ejecución del contrato desde su inicio hasta su estado actual, dichos procesos comprenden actas de suspensión, Prorrogas, adiciones presupuestales, actas de cobro, actas de modificación de cantidades. Actas de ítems no previstos entre otros.

RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA 1964 DE 2023

Tabla 1: Resumen general Contrato 1964 de 2023

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
PROCESO DE CONTRATACION:	CONTRATO DE INTERVENTORIA 1964 DE 2023
NUMERO DE CONTRATO:	No. 1964 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA:	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S NIT.900.446.925-7 R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA C.C. 1.049.638.727 DE TUNJA
OBJETO:	SIT-102 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	\$ 181.214.949,30
PLAZO INICIAL:	TENDRÁ UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y SU LIQUIDACIÓN
ACTA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODIFICATORIA N°1:	09 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION No.1:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO SUSPENSION NO.1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024
PLAZO AMPLIACION No.1 A SUSPENSION No.1:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 1 DE FEBERO DE 2024
PRORROGA NO.1:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.3:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.4:	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSION No.2:	DIESIESIS (16) DE MAYO DE 2024
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°2:	CINCO (5) DE JUNIO DE 2024

AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JUNIO 2024
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JULIO 2024
ACTA DE REINICIO N°2:	VIENTI NUEVE (29) DE JULIO DE 2024
FECHA DETERMINACION	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fuente: Elaboración Propia


RESUMEN CONTRATO DE OBRA 1977 DE 2023

Tabla 2: Resumen general Contrato 1977 de 2023

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA	
PROCESO DE CONTRATACION:	CONTRATO DE OBRA 1977 DE 2023
NUMERO DE CONTRATO:	NO. 1977 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI NIT. 901749548-8 R/L JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN CC. 79.683.679 DE BOGOTÁ
OBJETO:	SI-101 - MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	\$2.447.322.045,00
PLAZO INICIAL:	"EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, SIN EXCEDER 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO."
ACTA DE INICIO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	29 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO SUSPENSION NO.1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024
PLAZO AMPLIACION No.1 A SUSPENSION No.1:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 1 DE FEBERO DE 2024
PRORROGA NO.1:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.3:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA N°4:	UNO (1) DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.2:	DIESIESIS (16) DE MAYO DE 2024
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°2:	CINCO (5) DE JUNIO DE 2024
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JUNIO 2024

AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JULIO 2024
ACTA DE REINICIO N°2:	VIENTI NUEVE (29) DE JULIO DE 2024
MODIFICATORIO N°4:	UNO (1) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fuente: Elaboración Propia

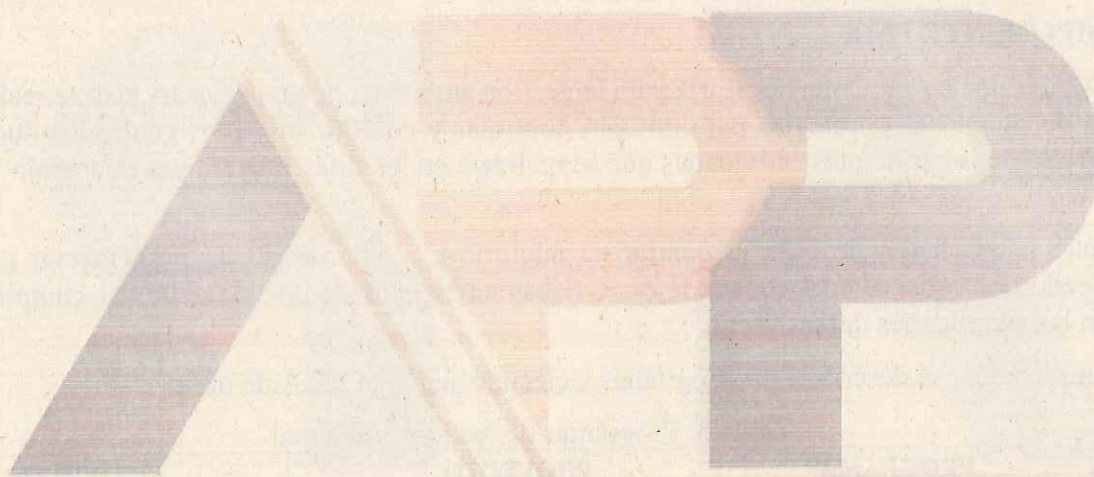

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

COMPONENTE AMBIENTAL

El objetivo particular de este componente, es reportar a la Secretaria de Infraestructura, Alcaldía Mayor de Tunja quien actúa como entidad contratante, el estado actual de las obras con relación a los aspectos generales y particulares del componentes Ambiental en el desarrollo del proyecto, que debe dar en cumplimiento el contratista de obra UNION TEMPORAL CONSTRUVIAS PI y a nombre propio la firma interventora APP CONTROL INGENIERIA S.A.S. con contrato N°1964 de 2023 de objeto: SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ.

COMPONENTE PMA

El PMA es una herramienta necesaria para la gestión ambiental de un proyecto, este se realiza con el fin de establecer estrategias para mitigar, controlar y corregir impactos generados durante el desarrollo de las diferentes actividades que se realizará en los diferentes frentes de trabajo

Durante la ejecución de obra el contratista adquirió el compromiso de implementar el PMA planteado por firma el cual consta de once fichas ambientales a las que debe dar cumplimiento según las necesidades del proyecto.

A continuación, se describen los programas a ejecutar según el PMA de obra:

Tabla 3: Programas de manejo ambiental

No.	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD
1	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL	Conformación del grupo de gestión social y ambiental	Conformación del grupo de gestión ambiental y social
		Capacitación ambiental al personal de obra	Capacitación ambiental al personal de obra
2	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción	Medidas para el manejo integral de materiales de Construcción
		Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales	Acciones de señalización de frente de obra y sitios temporales- Señalización de manejo de trafico
		Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos	Adecuada disposición de material de escombros y materiales de demolición
		Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	Manejo y disposición de residuos
			reciclaje de residuos
			disposición de residuos especiales y peligrosos

3	PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA	Proyecto de manejo de aguas superficiales	Adecuado acopio temporal de materiales de construcción retirados de los causes Control de volumen de agua para uso industrial
		Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos	Alquiler de baños en viviendas para evitar generación de residuos
4	PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de sitios de acopio temporales	Medidas de manejo para instalación, funcionamiento y desmantelamiento de sitio de acopio temporal
		Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Medidas de manejo para maquinaria, equipos y vehículos
5	DESARROLLO LOCAL	Seguimiento y control a la mano de obra contratada	Contratación de personal de la zona con enfoque de género diferencial
		Seguimiento y control de las obras con participación comunitaria	Levantamiento de actas de vecindad, manejo de PQRS

Fuente: Elaboración propia con base en PMA de la unión temporal CONSTRUVIAS PI

Indicadores de control para programas de manejo ambiental

Con el fin de realizar seguimiento y control a los programas de manejo ambiental esta interventoría adopta los siguientes indicadores los cuales de manera cuantificable reflejarán el porcentaje de cumplimiento y/o de eficiencia en la ejecución del plan de manejo ambiental, con lo cual se tomarán medidas correctivas.

Tabla 4: Indicadores adoptados de Seguimiento del Plan de manejo ambiental

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL				
PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMA DE EVALUACIÓN	OPTIMO	REF. INDICADOR
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	No. De profesionales propuestos para la gestión ambiental y social	$\frac{\text{No. Profesionales Contratados}}{\text{No. Profesionales Propuestos}}$	100%	DAGA-1.1-01
	Requerimientos entidades	$\frac{\text{No. de requerimientos Emitidos}}{\text{No. Requerimientos superados}}$	100%	
CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA	Capacitaciones realizadas	$\frac{\text{No. de personas capacitadas}}{\text{No. Total de personas Laborando}}$	100%	DAGA-1.2-02
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Quejas y reclamos	No. de quejas y reclamos por manejo de materiales de construcción	0	PAC-2.1- 04

PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES	Accidentes	No. de Accidentes imputados a Falta de señalización.	0	PAC-2.3-06
PROYECTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	Requerimientos autoridades e interventoría	Requerimientos exigidos por autoridades ambientales	0	PAC-2.4-07
	Quejas y reclamos de las comunidades	Quejas y reclamos de la comunidad.	0	
PROYECTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	Volumen de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario	$RSD = RSG - (RSR1 + RSR2) - RSP$	Registro de entrega de RSP a empresas autorizadas	PAC-2.5-08
PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	acciones implementadas	Cumplir con el 100% de las propuestas en los programas para manejo de agua superficial.	100%	PMIT-3.1-10
PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS	Soluciones Planteadas	No de soluciones planteadas = al No. De soluciones requeridas	Igualdad	PMIT-3.2-11
PROYECTO INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE SITIOS DE ACOPIO TEMPORALES	Medidas ambientales Realizadas	$\frac{\text{No. Medidas ambientales ejecutadas}}{\text{No. Medidas ambientales programadas}}$	100%	PMIT-5.3-17
PROYECTO DE MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	Accidentes registrados	No. De accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos	0	
	Estado del parque automotor	$\frac{\text{No. Vehiculos con revision tecnico mecanica.}}{\text{No. Vehiculos utilizados en el proyecto}}$	100%	
PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL	Manejo de PQRS	No. De PQRS gestionadas/No de PQRS generadas*100	100%	SM-PDL-6.1-2.1

Fuente: Elaboración propia en base a guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura.
INVIAS 2022

El control de cada una de las fichas ambientales fue adjunto a los informes mensuales ya presentados mediante sus respectivos anexos, correspondientes al periodo de ejecución desde el 27 de noviembre al 29 de diciembre del año 2023; del 01 de febrero al 16 de mayo y del 29 de julio al 05 de agosto del año 2024.

❖ Conformación Del Grupo De Gestión Social y Ambiental

El contratista de obra realizo el seguimiento a las PQRS que se presentaron durante el periodo informado dando cierre parcialmente a los mismos.

Se mantuvo en obra el profesional ambiental de obra acorde a su dedicación contratada quien se encargó de dar cumplimiento a las actividades contempladas en el PMA de obra en sinergia con las actividades de obra ejecutadas.

❖ Capacitación Ambiental al Personal de Obra

Esta interventoría realizo seguimiento al desarrollo de capacitaciones realizadas por el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUVIAS PI a los trabajadores del proyecto, los temas fueron elegidos por el contratista dependiendo las necesidades de obra, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes capacitaciones ambientales, los soportes de asistencia de las misas fueron anexos en cada uno de los informes mensuales de obra e interventoría.

Tabla 5: Control de capacitaciones ambientales

FECHA	TEMA	NO. PARTICIPANTES
30/11/23	Cuidado de las zonas verdes	10
13/12/23	Cubrimiento, manejo de materiales de construcción	10
27/12/23	Manejo de sustancias químicas	5
05/02/24	Riesgo biológico	4
14/02/24	Cuidado de las zonas verdes	9
21/02/24	Clasificación en la fuente punto ecológico	9
06/03/24	Orden y aseo	7
05/04/24	Ahorro y cuidado de fuentes hídricas	11
27/04/24	Manejo de áreas contaminadas con sustancias peligrosas	11
03/05/24	Manejo adecuado de materiales de construcción	7
13/05/24	Disposición final de RCD	6
01/08/24	Ahorro eficiente y uso de recursos naturales	6

Fuente: Elaboración propia con base en PMA de la unión temporal CONSTRUVIAS PI



Ilustración 14. Registro de capacitaciones ambientales

❖ Manejo Integral De Materiales De Construcción

En el sitio de obra no se realizó acopio de material teniendo en cuenta las actividades de obra las cuales correspondieron a excavación de zonas afectadas, mejoramiento e instalación de emulsión asfáltica.

❖ Proyecto De Señalización Frentes De Obra y Sitios Temporales

Se realizó la debida instalación de señalización en los frentes de obra instalados con el fin de proteger las áreas y salvaguardar la vida del personal ajeno al proyecto y de los trabajadores.



Ilustración 15. Señalización de las áreas de trabajo

❖ Proyecto De Manejo y Disposición Final De Escombros y Lodos

En el presente periodo se generó material RCD producto de demolición y excavación, el cual fue trasladado y dispuesto en el sitio de disposición final de RCD previamente aprobado, acorde a las actividades ejecutadas. Se adjuntaron a los informes mensuales de obra e interventoría los certificados de seguimiento del volumen de RCD generados.

Tabla 6: Seguimiento de residuos de escombros por tramo

BARRIO	m3
Kennedy	51
Paraíso	8
Peñitas	42
Suarez	122
Peñitas	240
Capitolio	108
Soamox	172
Manantial	22
Santa Rita	90
Palos verdes	14
Balcones de terranova	18
Las quintas	45
La fuente	28
Total	960

Fuente: Elaboración propia con base en PMA de la unión temporal CONSTRUVIAS PI

❖ Proyecto De Manejo y Disposición Final De Residuos Sólidos Convencionales y Especiales

Se mantuvo en obra el punto ecológico instalado con el fin de realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos convencionales y posterior disposición mediante la entrega a los vehículos de recolección urbana teniendo en cuenta la cantidad mínima de residuos generada.

❖ Proyecto De Manejo De Aguas Superficiales

El proyecto no contempla la intervención en sumideros, así mismo, no se requiere de consumo de agua para las actividades de obra.

❖ Proyecto De Manejo De Residuos Líquidos Domésticos

El proyecto no genera residuos líquidos domésticos teniendo en cuenta que no se realizó instalación de baños portátiles, el servicio de baño fue suministrado mediante la modalidad de préstamo en viviendas aledañas a las áreas de trabajo en cada uno de los tramos intervenidos. Se adjuntaron a los informes mensuales de obra e interventoría los certificados de préstamo de baño en cada tramo intervenido.

❖ Proyecto Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento De Sitios De Acopio Temporales

El proyecto no contemplo la instalación de campamento teniendo en cuenta las actividades de obra.

❖ Proyecto De Manejo De Maquinaria, Equipos y Vehículos

Diariamente se realizó inspección preoperacional de maquinaria, equipos y vehículos usados en obra, la firma contratista realizó la entrega de los registros como evidencia de ello, así mismo, no se presentaron accidentes y/o derrames de sustancias químicas en obra como consecuencia de daños a dichos elementos. Se adjuntaron a los informes mensuales de obra e interventoría los registros de seguimiento preoperacional implementados.

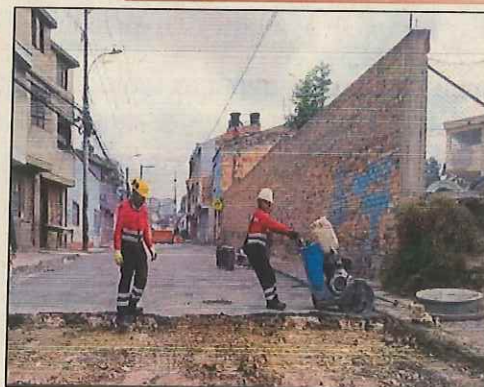


Ilustración 16. Inspección de maquinaria y equipos

❖ Proyecto De Desarrollo Local

En el periodo informado se presentaron PQR's y requerimientos de arreglo de andenes, se tienen presentes para cierre las solicitudes abiertas en los periodos anteriores:


Tabla 7: Seguimiento a PQRS y requerimientos de la comunidad

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PQRS	SEGUIMIENTO
27-10-23	LUIS EDIXON SUAREZ	80.088.021	Solicitud pago de daños a vehículo por elementos de obra en el barrio El Dorado	La firma contratista entrega paz y salvo firmado por el solicitante con fecha del 17 de junio del 2024.
19-12-23	KAROL AGUIRRE	1.057.411.762	Solicitud pago de liquidación	La firma contratista entrega paz y salvo firmado por la solicitante con fecha del 30 de noviembre del 2023.
-	HANCEL PACHECO	7.183.609	Notificación de terminación de contrato laboral el día 11 de diciembre de 2023	La firma contratista realiza cambio del profesional residente a partir del día 12 de diciembre de 2023
17-01-24	MARIA FERNANDA MORENO	-	Solicitud pago de deuda por parte de la U.T.	En seguimiento de cierre
13-03-24	EDWARD RODRIGUEZ	1.049.622.430	Solicitud pago salario y planillas ss de los meses diciembre 2023 y febrero 2024	La firma contratista presenta comprobantes de transacción de pago y planillas de ss pagadas de los periodos señalados
03-04-24	LUYAN INGENIERIA S.A.S.	901364845-7	Solicitud pago servicios alquiler de maquinaria	La firma contratista presenta acuerdo de pago con el solicitante
19-04-24	CARLOS ALIRIO HURTADO	7.185.519	Solicitud reparación red eléctrica barrio Las Quintas	Se presenta paz y salvo del propietario vivienda afectada

	ARREGLOS DAÑOS OCASIONADOS EN LOS TRAMOS: <ul style="list-style-type: none">- Barrio la Calleja- Barrio San Diego- Barrio Villa Bachué y Doña Eva- Barrio el Bosque- Barrio Palos Verdes- Barrio El dorado y Suarez (arreglo andén)	La firma contratista presenta oficio respuesta donde señala que en el periodo final del contrato previo a su terminación realizara las visitas y arreglos pertinente
--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

Cordialmente,


Ing. RODRIGO ALBERTO MENDIVELSO
MP 15202136023BYC

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

ANEXO No. 8
INFORME SEGUIMIENTO SG-SST

CONTROL INGENIERIA S.A.S.

ACTA DE COBRO PARCIAL NO.03 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1964 DE 2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO SST INTERVENTORÍA

**SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO,
RECUPERACIÓN Y/O A DECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ**



**CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE A 29 DE DICIEMBRE DE 2023; DEL 01 DE
FEBRERO A 16 DE MAYO Y DEL 29 DE JULIO A 5 DE AGOSTO DE 2024**

**APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TUNJA, 2024**

TABLA DE CONTENIDO

LOCALIZACIÓN	5
LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
LOCALIZACIÓN POR TRAMOS:	6
RESUMEN GENERAL CONTRATOS	13
RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA 1964 DE 2023	13
RESUMEN CONTRATO DE OBRA 1977 DE 2023	14
COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	16
COMPONENTE SST	16
AFILIACIONES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	16
AFILIACIONES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORÍA	16
Personal calificado de interventoría	18
AFILIACIONES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA	18
Mano de obra calificada	21
Mano de obra no calificada	22
Relación De Maquinaria	23
Charlas y Capacitaciones	23
Control de entrega y uso de EPP's	24
Higiene industrial	25

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

LISTADO DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1: Localización general del proyecto.....</i>	<i>5</i>
<i>Ilustración 2: Localización Tramo I.....</i>	<i>6</i>
<i>Ilustración 3: Localización Tramo II.....</i>	<i>7</i>
<i>Ilustración 4: Localización Tramo III.....</i>	<i>7</i>
<i>Ilustración 5: Localización Tramo IV.....</i>	<i>8</i>
<i>Ilustración 6: Localización Tramo V.....</i>	<i>9</i>
<i>Ilustración 7: Localización Tramo VI.....</i>	<i>9</i>
<i>Ilustración 8: Localización Tramo VII.....</i>	<i>10</i>
<i>Ilustración 9: Localización Tramo VIII.....</i>	<i>10</i>
<i>Ilustración 10: Localización Tramo IX.....</i>	<i>11</i>
<i>Ilustración 11: Localización Tramo X.....</i>	<i>11</i>
<i>Ilustración 12: Localización Tramo XI.....</i>	<i>12</i>
<i>Ilustración 13: Localización Tramo XII.....</i>	<i>12</i>
<i>Ilustración 14: Control de capacitaciones en obra</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 15: Control de uso de dotación y EPP's en obra</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 16: Permanencia de elementos de primeros auxilios en obra</i>	<i>25</i>

CONTROL INGENIERIA S.A.S.

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Resumen general Contrato 1964 de 2023	13
Tabla 2: Resumen general Contrato 1977 de 2023	14
Tabla 3: Relación de planillas de seguridad social interventoría	17
Tabla 4: Mano de obra calificada-interventoría	18
Tabla 5: Relación de planillas de seguridad social obra	19
Tabla 6: Mano de obra calificada-Obra	21
Tabla 7: Mano de obra calificada adicional	22
Tabla 8: Mano de obra no calificada – Obra	22
Tabla 9: Relación de maquinaria	23
Tabla 10: Control de capacitaciones SST	23




LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Tunja Capital del departamento de Boyacá, Está ubicada en las coordenadas 5°32'7"N 73°22'04"O y su longitud en relación con Bogotá es de 0 grados, 43 minutos y 0 segundos.

El proyecto se encuentra comprendido en el municipio de Tunja; los tramos a intervenir contemplan el mantenimiento, recuperación y/o adecuación de la malla vial urbana.

Ilustración 1: Localización general del proyecto

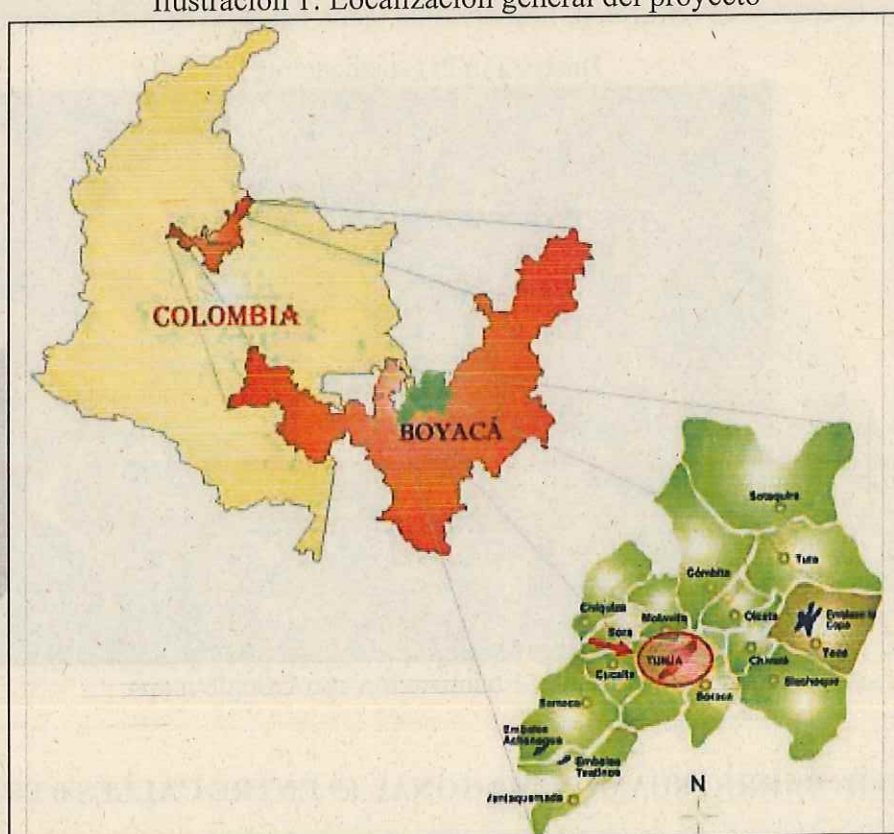

Fuente: Estudio previo


LOCALIZACIÓN POR TRAMOS:

Durante el periodo de ejecución se realizaron actividades en los tramos mencionados a continuación:

TRAMO I: BARRIO CAPITOLIO INTERSECCIÓN DE ACCESO A LA CALLE 72 POR LA CARRERA 2A

El sector del barrio capitolio, en la intersección de acceso a la calle 72 por la carrera a situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, como grietas de esquina y lineales y de retracción, losa dividida, daño del sello de junta, entre otras.

Ilustración 2: Localización Tramo I

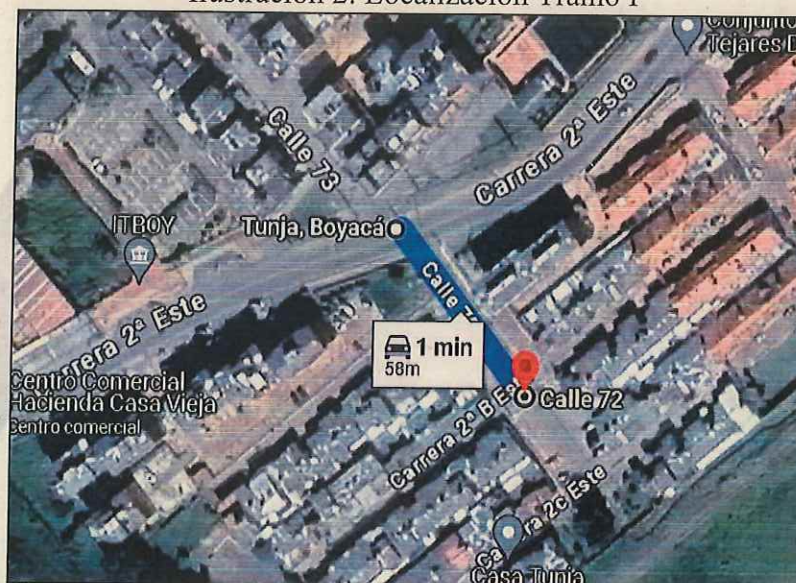

Fuente: Localización con Google maps

TRAMO II: BARRIO SUAMOX DIAGONAL 69 ENTRE CALLES 0 ESTE Y 0A ESTE

El tramo ubicado en la diagonal 69 entre calles 0 este y 0a del barrio suamox de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 3: Localización Tramo II




Fuente: Localización con Google maps

TRAMO III: BARRIO PEÑITAS CALLE 12 ENTRE CARRERAS 1 Y 2E – INTERSECCIÓN DE LA CALLE 12 CON CARRERA 3E

El tramo ubicado en la Calle 12, entre carreras 1 y 2e e intersección de la calle 12 con carrera 3e ubicado en las Peñitas de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen: desplazamientos, abultamientos y ahuellamientos de la rodadura, adicionalmente se presentan grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 4: Localización Tramo III

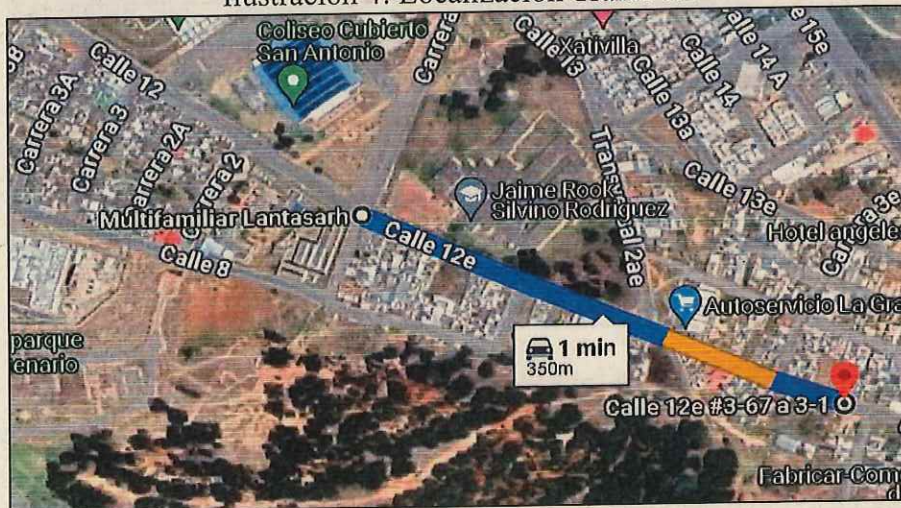


Fuente: Localización con Google maps

TRAMO IV: BARRIO SUAREZ CALLE 9 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 – CALLE 10 INTERSECCION CARRERA 9

El tramo se encuentra ubicado en la Calle 9 entre carrera 8 y 10, y el segundo se encuentra ubicado en la calle 10 intersección carrera 9. estas calzadas presentan una condición de deterioro predominante que demanda una intervención inmediata. La vía exhibe notables signos de deterioro en la carpeta de rodadura existente, tales como grietas, baches y un desgaste generalizado. Esta arteria vial reviste una importancia crítica para el Barrio Suarez y la ciudad de Tunja en su conjunto, ya que circulan vehículos de transporte público que conecta a los residentes con diversas zonas de la ciudad, y su adecuado estado es esencial para la movilidad de los habitantes y el desarrollo económico de la región.

Ilustración 5: Localización Tramo IV

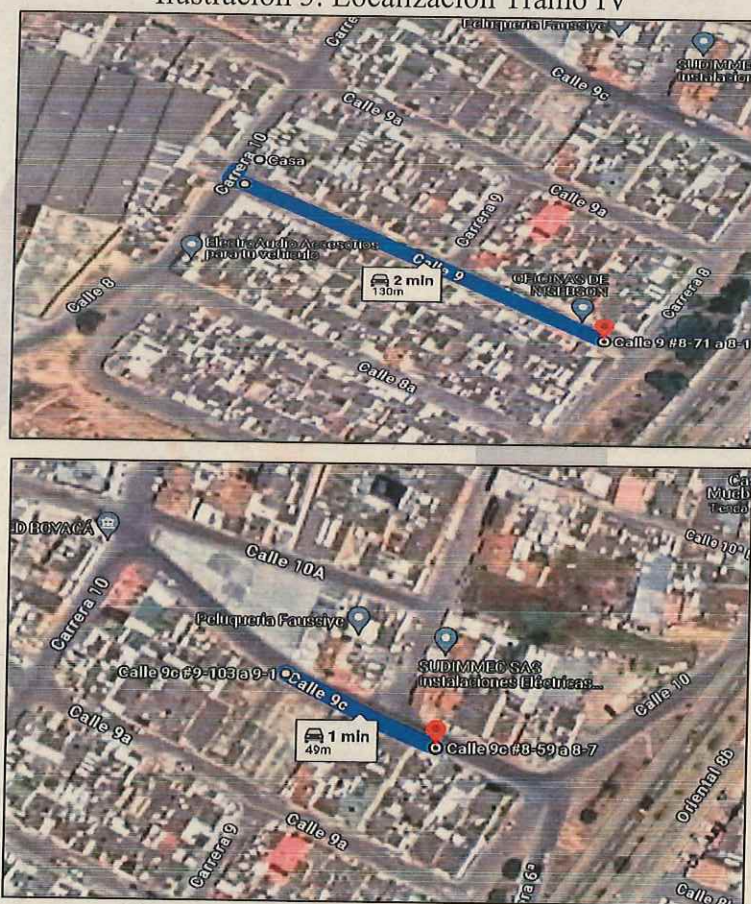

Fuente: Localización con Google maps

TRAMO V: BARRIO PARAISO CALLE 12 NO. 15-2

El segmento de intersección ubicado en la Calle 12 con carrera 15, en el Barrio Paraíso de la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro pronunciada que demanda una intervención inmediata. La vía exhibe notables signos de deterioro, principalmente la presencia de un bache en la sección transversal de la vía. Esta arteria vial reviste una importancia crítica para el Barrio paraíso y la ciudad de Tunja ya que circulan vehículos de transporte público que conecta a los residentes

con diversas zonas de la ciudad, y su adecuado estado es esencial para la movilidad de los habitantes y el desarrollo económico de la región

Ilustración 6: Localización Tramo V



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO VI: BARRIO KENNEDY INTERSECCION TRANSVERSAL 17 CON CALLE 22, TRANSVERSAL 17 No. 21-29, INTERSECCION TRANSVERSAL 17 CON CALLE 20, CALLE 20 No. 17-24

El sector del Kennedy, en las direcciones transversal 17 con calle 22, transversal 17 no. 21-29, intersección transversal 17 con calle 20, calle 20 no. 17-24 situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, como grietas, baches y una superficie degradada.

Ilustración 7: Localización Tramo VI



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO VII: MANANTIAL CALLE 79

El sector del barrio manantial, en la intersección de acceso a la calle 79 situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, y deterioro estructural y funcional, como fisuras longitudinales y baches predominantes, entre otros, adicionalmente a lo anterior es un corredor vial importante para la ciudad donde se mueve el transporte público colectivo.

Ilustración 8: Localización Tramo VII



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO VIII: SANTA RITA INTERSECCION CARRERA 4 CON CALLE 58

El tramo ubicado en la intersección carrera 4 con calle 58 del barrio santa Rita de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada por patologías estructurales y funcionales de la estructura de pavimento existente. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 9: Localización Tramo VIII



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO IX: PALOS VERDES CALLE 74 CON TRANSVERSAL 2ª

El tramo ubicado en la calle 74 con transversal 2ª del barrio palos verdes de la ciudad de Tunja presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen: desplazamientos, abultamientos y ahuellamientos de la carpeta de rodadura, adicionalmente se presentan grietas longitudinales y transversales. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 10: Localización Tramo IX



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO X: BALCONES DE TERRANOVA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1ª Y 1

El tramo se encuentra ubicado en la calle 79 entre carrera 1ª y 1 en el barrio balcones de terranova de la ciudad de Tunja este tramo vial presenta un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen: desplazamientos, abultamientos y ahuellamientos de la carpeta de rodadura, adicionalmente se presentan grietas longitudinales y transversales. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 11: Localización Tramo X



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO XI: LAS QUINTAS SOBRE LA CARRERA 2B ENTRE CALLES 48 Y 49

El tramo sobre la carrera 2 b entre calles 48 y 49 del barrio las quintas de la ciudad de Tunja presentan un notorio estado de deterioro, lo que demanda una pronta intervención. Los signos visibles de este desgaste incluyen grietas longitudinales y transversales, baches y una superficie degradada y desgastada por patologías estructurales y funcionales de la estructura de pavimento existente. La reparación de esta vía es esencial para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida en este sector del barrio.

Ilustración 12: Localización Tramo XI



Fuente: Localización con Google maps

TRAMO XII: LA FUENTE SOBRE LA CARRERA 18 CON CALLE 32

El sector del barrio la fuente, sobre la carrera 18 con calle 32 situado en la ciudad de Tunja, presenta una condición de deterioro significativo que exige una intervención inmediata. La infraestructura en esta área exhibe señales evidentes de desgaste, y deterioro estructural y funcional, como fisuras longitudinales y baches predominantes, pérdida de carpeta de rodadura entre otros.

Ilustración 13: Localización Tramo XII



Fuente: Localización con Google maps

RESUMEN GENERAL CONTRATOS

En el presente capítulo se presentan los procesos administrativos generados durante la ejecución del contrato desde su inicio hasta su estado actual, dichos procesos comprenden actas de suspensión, Prorrogas, adiciones presupuestales, actas de cobro, actas de modificación de cantidades. Actas de ítems no previstos entre otros.

RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA 1964 DE 2023

Tabla 1: Resumen general Contrato 1964 de 2023

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
PROCESO DE CONTRATACION:	CONTRATO DE INTERVENTORIA 1964 DE 2023
NUMERO DE CONTRATO:	No. 1964 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA:	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S NIT.900.446.925-7 R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA C.C. 1.049.638.727 DE TUNJA
OBJETO:	SIT-102 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	\$ 181.214.949,30
PLAZO INICIAL:	TENDRÁ UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y SU LIQUIDACIÓN
ACTA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODIFICATORIA N°1:	09 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION No.1:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO SUSPENSION NO.1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024
PLAZO AMPLIACION No.1 A SUSPENSION No.1:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 1 DE FEBERO DE 2024
PRORROGA NO.1:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.3:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.4:	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSION No.2:	DIESESIS (16) DE MAYO DE 2024
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°2:	CINCO (5) DE JUNIO DE 2024

AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JUNIO 2024
AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JULIO 2024
ACTA DE REINICIO N°2:	VIENTI NUEVE (29) DE JULIO DE 2024
FECHA DETERMINACION	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fuente: Elaboración Propia


RESUMEN CONTRATO DE OBRA 1977 DE 2023

Tabla 2: Resumen general Contrato 1977 de 2023

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA	
PROCESO DE CONTRATACION:	CONTRATO DE OBRA 1977 DE 2023
NUMERO DE CONTRATO:	NO. 1977 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVIAS PI NIT. 901749548-8 R/L JULIÁN ANDRÉS SANTANA LEÓN CC. 79.683.679 DE BOGOTÁ
OBJETO:	SI-101 - MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	\$2.447.322.045,00
PLAZO INICIAL:	"EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, SIN EXCEDER 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO."
ACTA DE INICIO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	29 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO SUSPENSION NO.1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024
PLAZO AMPLIACION No.1 A SUSPENSION No.1:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 1 DE FEBERO DE 2024
PRORROGA NO.1:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PRORROGA NO.3:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA N°4:	UNO (1) DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.2:	DIESIESIS (16) DE MAYO DE 2024
AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°2:	CINCO (5) DE JUNIO DE 2024
AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JUNIO 2024

AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N°2:	DIECINUEVE (19) DE JULIO 2024
ACTA DE REINICIO N°2:	VIENTI NUEVE (29) DE JULIO DE 2024
MODIFICATORIO N°4:	UNO (1) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fuente: Elaboración Propia

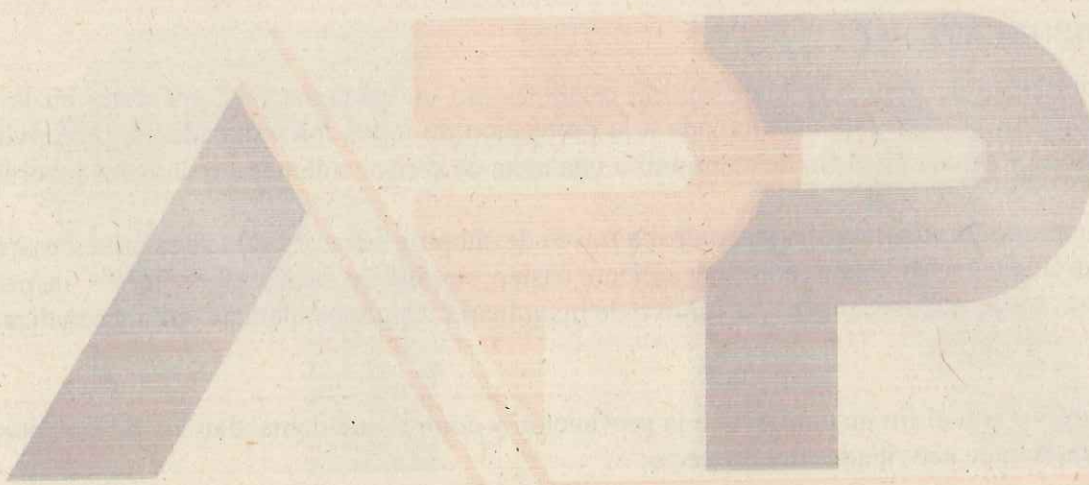

CONTROL INGENIERIA S.A.S.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo particular de este componente, es reportar a la secretaria de Infraestructura, Alcaldía Mayor de Tunja quien actúa como entidad contratante, el estado actual de las obras con relación a los aspectos generales y particulares del componente de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto, que debe dar en cumplimiento el contratista de obra UNION TEMPORAL CONSTRUIAS PI y a nombre propio la firma interventora APP CONTROL INGENIERIA S.A.S. con contrato N°1964 de 2023 de objeto: SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ.

COMPONENTE SST

El contratista de obra y la interventoría establecieron un esquema SST enfocado en la mejora continua, su política esta encaminada a la protección de todos los trabajadores, promoviendo la seguridad y salud con el fin de disminuir a una meta de cero accidentes e incidentes laborales.

La interventoría llevo a cabo su control a través de subprogramas establecidos en el desarrollo de las actividades relacionadas con: saneamiento básico, suministro de dotación y EPP's, inspecciones HSE de áreas, mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos, demarcación y señalización de obra, entre otros.

Lo anterior con el fin de conllevar a la prevención y control que demandan los riesgos propios de la ejecución de actividades del proyecto.

AFILIACIONES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución de los contratos es necesaria la afiliación de mano de obra calificada y no calificada con el fin de cumplir con los requisitos de ley, el presente capitulo establece la relación de planillas de mano de obra y personal presente durante la ejecución de los contratos 1977 y 1964 de 2023.

AFILIACIONES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

El siguiente cuadro muestra la relación de planilla pagadas durante el periodo del presente informe por la interventoría.

Tabla 3: Relación de planillas de seguridad social interventoría

RELACION DE PLANILLAS		
No. Planilla	MES PAGO	AÑO
72763372	NOVIEMBRE	2023
9459990268		
9460307101		
9458772480		
28251366		
9459926848		
9460412248	DICIEMBRE	
9460586998		
9460416576		
9460159753		
28502833		
74316453		
8374598121	FEBRERO	
9463911800		
75712766		
9467298107		
9462743661		
29094064		
75712788	MARZO	
9467298701		
9465171379		
29425430		
9464338516		
7921564941		
9465385900	ABRIL	
29853070		
9467298811		
79455940		
7921573256		
9466626058		
79455945	MAYO	
7926421616		
9471482577		
9467429210		
9466635384		
30158588		
79455955	JULIO	
9471482899		
9470870730		

9471512453		
7933176351		

Fuente: Elaboración Propia

Personal calificado de interventoría

A continuación, se muestra la relación de personal de mano de obra calificada ofertada por esta interventoría.

Tabla 4: Mano de obra calificada-interventoría

PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CARGO	DEDICACION
CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20%
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1	100%
EDWIN ALEXANDER PALACIOS		
BREYNER HELY PINILLA HURTADO	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2	100%
GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL	20%
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%
RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	ESPECIALISTA AMBIENTAL	20%
EMILIO BLADIMIR PANQUEVA ALVAREZ	ESPECIALISTA HSEQ	100%

Fuente: Elaboración Propia

Nota No.1: Se realizó cambio del profesional INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1 a partir del 01 de febrero de 2024 previa solicitud y evaluación de la HV del profesional de ingreso por parte de la supervisión, así como su visto bueno al cambio.

Nota No.2: La relación de planillas de pagos de seguridad social se adjunta de manera discriminada mes a mes en el presente informe mediante el **ANEXO No.7 PLANILLAS SS INTERVENTORÍA**.

AFILIACIONES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

El siguiente cuadro muestra la relación de planilla pagadas durante el periodo del presente informe por el contratista.

Tabla 5: Relación de planillas de seguridad social obra

RELACION DE PLANILLAS		
No. Planilla	MES PAGO	AÑO

9460074856	NOVIEMBRE	2023
9459703167		
9459442936		
77494965		
72819974		
1059487584		
9459953944		
7907345161		
73175096		
7907495161		
7905202353		
73018417		
73020998		
73022096		
73023348		
4530232887		
73013003		
4530725867	DICIEMBRE	2023
73035142		
74383096		
77494870		
74121935		
73890063		
74386816		
77494103		
9460978687		
9461260133		
8628096231		
9460619718		
7929447233		
7907482388		
4559656661		
9463648291	FEBRERO	2024
9463432907		
5165695553		
8629705883		
9464328134		
7929461910		
7926581826		
75895198		
77709051		
77810096		
75409368		
75409330		
75784656		
75801930		
75409304		

4559656813		
77871666		
77709197		
77810351		
76562091		
76221837		
76534645		
77664135		
75632154	MARZO	
76221770		
9465024331		
5165698811		
8629928936		
9465224942		
7929465711		
7919676153		
77823112		
77709388		
77810494		
792948478		
76948177		
77327957		
77814082		
77327890	ABRIL	
76473479		
77328048		
9466437740		
5165789620		
8629967067		
9465786864		
7923963329		
78062174		
9467956048		
78062124		
79008678		
5165789620		
9469455101		
78062223	MAYO	
79008059		
7927033873		
79009517		
79011704		
7935735100		
9468041119		
79239153		
7936868317	JULIO	

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUIAS PI

Mano de obra calificada

A continuación, se muestra la relación de personal de mano de obra calificada solicitada según anexo técnico del proceso licitatorio No. LP-AMT-0052023.

Tabla 6: Mano de obra calificada-Obra

PERSONAL OBRA			
NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	DEDICACION
JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE OBRA	30%
CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMÓN ARIAS	1.049.609.347	RESIDENTE DE OBRA No.1	100%
JUAN FELIPE APONTE PEÑA	1.054.681.740		
HANCEL STYD PACHECO RODRIGUEZ	7.183.609	RESIDENTE DE OBRA No.2	100%
RAFAEL ALEXANDER PÁEZ BONILLA	1.076.660.080		
JULIAN ANDRES SANTANA LEON	79.683.679	RESIDENTE DE OBRA No.3	100%
RAMIRO ALFONSO CARDENAS SANCHEZ	7.184.188	ASESOR EN GEOTECNIA	35%
CAROL ANDREA MARTINEZ FIGUEROA	1.018.462.674	ASESOR AMBIENTAL	35%
DIANA CAROLINA DALLOS MORANTES	1.049.606.252	INGENIERO QHSE	100%
JUAN CAMILO ALARCON PINILLA	1.076.665.297	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA No.1	100%
MARIA CAMILA CASTILLA LEON	1.018.494.026	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA No.2	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUIAS PI

El contratista en su nómina de trabajadores cuenta con mano de obra calificada adicional presentes en la siguiente tabla:

Tabla 7: Mano de obra calificada adicional

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA
EDUARD RODRIGUEZ	1049622430	ING. AUXILIAR	02/10/2023	19-02-2024

CARLOS FONSECA	1049622330	INSPECTOR DE OBRA	03/10/2023	29-12-2023
KEVIN SARMIENTO	1049655662	ING. AUXILIAR	27/09/2023	-
SONIA PATRICIA TRIANA MURCIA	20430286	CORD. MAQUINARIA	27/09/2023	-
MARIA FERNANDA PALACIOS	1130264810	INSPECTOR SST	15/11/2023	29-12-2023

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUIAS PI

Mano de obra no calificada

La firma contratista de obra realizo vinculación de personal de mano de obra no calificada para el desarrollo de las diferentes actividades en campo, se presenta la relación de dicho personal:

Tabla 8: Mano de obra no calificada – Obra

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA
FABIO ORLANDO TENJO	1055227559	OPERADOR	27/09/2023	07/03/2024
FRUTOSO CAITA	79238032	OPERADOR	27/09/2023	11/12/2023
BRAYAN PARRA	1069754556	AYUDANTE DE OBRA	27/09/2023	29-12-2023
JOSÉ VICENTE VARGAS	6773374	CONDUCTOR	27/09/2023	27-12-2023
LEONARDO ANÍBAL MALAVER	1049626483	AYUDANTE DE OBRA	27/09/2023	27-12-2023
NELSON ENRIQUE MALAVER	1049647912	AYUDANTE DE OBRA	27/09/2023	27-12-2023
NÉSTOR MALAVER	1049610492	CONDUCTOR	27/09/2023	30/11/2023
NILSON TIBÁQUIRA	79667355	CONDUCTOR	27/09/2023	24/12/2023
SEGUNDO NEPUNUSENO FUNEME	6763274	AYUDANTE DE OBRA	27/09/2023	27-12-2023
TITO TIBAMBRE	7173539	OFICIAL DE OBRA	27/09/2023	30/11/2023
RICARDO PIRATOBA	6767355	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2023	27-12-2023
ALFREN GRIMALDO	9693727	AYUDANTE DE OBRA	23/10/2023	30/11/2023
DANIEL SOTO	1033808005	AYUDANTE DE OBRA	23/10/2023	30/11/2023
WILSON AROCA	80729010	AYUDANTE DE OBRA	23/10/2023	-
ANDRÉS PULIDO	1119238315	AYUDANTE DE OBRA	24/10/2023	30/11/2023
BRAYAN GONZÁLEZ	1005340915	AYUDANTE DE OBRA	24/10/2023	30/11/2023
JHON ERAZO	1032378340	OPERADOR	25/10/2023	10/12/2023
YESID HERNÁN VERGARA	79867798	AYUDANTE DE OBRA	08/02/2024	-
MAURICIO ASCANIO	88211610	AUX. TOPOGRAFÍA	08/02/2024	21/03/2024
ADRIÁN BOHÓRQUEZ	1007930536	OPERADOR	08/02/2024	07/05/2024
MANUEL ROJAS	79249541	OPERADOR	08/02/2024	-
EDILBERTO ROJAS	6772144	CONDUCTOR	08/02/2024	-
JHON REDONDO	1049616545	CONDUCTOR	08/02/2024	08/04/2024
BLADIMIR TORRES	6774082	CONDUCTOR	08/02/2024	15/02/2024
YESID BARRERA	7180323	AYUDANTE DE OBRA	13/02/2024	27/02/2024

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUVIAS PI

Nota: La relación de pagos de seguridad social de contratista de obra, se adjunta en el informe de obra.

Relación De Maquinaria

Según el Anexo técnico del proceso licitatorio LP-AMT-0052023 el equipo mínimo debe encontrarse en disponibilidad inmediata sin embargo durante la ejecución del proyecto hasta el periodo se han usado los equipos acá descritos:

Tabla 9: Relación de maquinaria

RELACIÓN DE MAQUINARIA REQUERIDA VS MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA
RETROEXCAVADORA - CARGADORA	3
MINICARGADOR CON MARTILLO	3
VOLQUETAS DOBLES	6
RODILLO COMPACTADOR	6
CORTADORA DE ASFALTO	6
SALTARIN	6

Fuente: Elaboración propia con base en anexo técnico

No obstante, se implementó el desarrollo de preoperacionales según ejecución y uso de actividades de obra.

Charlas y Capacitaciones

El contratista de obra realizó la implementación de charlas y capacitaciones con el fin de generar conciencia y educación en el personal de obra, los soportes se adjuntan mediante el anexo correspondiente.

Tabla 10: Control de capacitaciones SST

FECHA	TEMA	NO. PARTICIPANTES
28/11/23	Dolor lumbar	15
14/12/23	Alcohol y drogas	12
28/12/23	Estrés laboral	5
03/02/24	Riesgo locativo	5
08/02/24	Inducción y reinducción	9
12/02/24	Herramientas manuales	7
28/02/24	Primeros auxilios	9
11/03/24	Orden y aseo	9
13/04/24	Almacenamiento seguro de sustancias químicas	11

20/04/24	Señalización y demarcación de seguridad	11
08/05/24	Calistenias y pausas activas	6
15/05/24	Posiciones ergonómicas en el trabajo	6
03/08/24	Seguridad vial	6

Fuente: Elaboración propia con base en informes presentados por la unión temporal CONSTRUVIAS PI



Ilustración 14: Control de capacitaciones en obra

Control de entrega y uso de EPP's

Se realizó el control en la entrega y uso adecuado de EPP's, así como la reposición de aquellos que se encuentran desgastados a consecuencia de su uso.



Ilustración 15: Control de uso de dotación y EPP's en obra

Higiene industrial

Se realizó el suministro de elementos de atención de primeros auxilios en caso de presentarse algún tipo de incidente y/o accidente en obra. A la fecha no se han presentado accidentes a consecuencia de las actividades de obra.




Ilustración 16: Permanencia de elementos de primeros auxilios en obra

Se realizó instalación de punto de hidratación para consumo del personal de obra acorde a la normatividad vigente.

Nota: Los soportes del control de seguimiento de SST se adjuntaron al informe de seguimiento del contratista de obra, previa revisión por interventoría correspondientes al periodo de ejecución desde el 27 de noviembre al 29 de diciembre de 2023; del 01 de febrero al 16 de mayo y del 29 de julio al 05 de agosto del 2024.

Cordialmente,


Ing. EMILIO BLADIR PANQUEVA
MP 15202170576 BYC

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

SEBASTIAN TOLEDO MOYA identificado con C.C. No. 1.049.638.727 de Tunja en mi condición de representante legal de **A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S** identificada con NIT 900.446.925-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos ocho (8) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **WALTER YESID JIMENEZ ZAPATA** identificado con CC 1.049.613.918 de TUNJA con Tarjeta Profesional No. **276787-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT 900.446.925-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de TUNJA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos ocho (8) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


En constancia, se firma en Tunja, a los 17 días del mes de agosto de 2024



Firma representante legal

Nombre: **SEBASTIAN TOLEDO MOYA**

Documento de Identidad: CC 1.049.638.727



Firma REVISOR FISCAL

Nombre: **WALTER YESID JIMENEZ ZAPATA**

Documento de Identidad: CC 1.049.613.918

TP 276787-T

PLANILLAS

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



NOVIEMBRE

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
CC	7176729	CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA	CRA-3B No 41-48	7404387	vargasigua@yahoo.com										1	0
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE I - Independiente	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	2023-11	2023-11	28/11/2023	72763372	TOTAL A PAGAR \$330.600	
		BOYACÁ			TUNJA											

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	145.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
0	0	0	0	0	SENA				
0	0	0	0	0	ICBF				
0	0	0	0	0	ESAP				
0	0	0	0	0	MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA									
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados					
Salud	1	145.000	145.000	145.000					
Pensión	1	185.600	185.600	185.600					
Riesgos Laborales	0	0	0	0					
CCF	0	0	0	0					
ESAP	0	0	0	0					
ICBF	0	0	0	0					
MEN	0	0	0	0					
SENA	0	0	0	0					
TOTALES	2	330.600	330.600	330.600					

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD					1	0
2023-11	2023-11	I	28/11/2023	72763372	TOTAL A PAGAR	
					\$330.600	

PAAGDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF																							
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL BOYACA C	CHIQUEQUIRA	CHIQUEQUIRA-BOYACA	3124113265	SI																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																															
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Clase	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla																	
Pensión	Salud	Pago	Pago	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla																	
2023-11	2023-12	333631365	945990268	E	2023/12/07	2023/12/13	BANCOLOMBIA	6						\$361,400																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO																															
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ced	tas	cup	ap	sg	cor	pos	in	ge	ima	vac	avo	vec	in	tip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa
SUCURSAL: PRINCIPAL BOYACA C (1 Afiliados)																				\$1,160,000	\$185,600	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000		
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																				\$1,160,000	\$185,600	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000		
Ciudad: CHIQUEQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																				\$1,160,000	\$185,600	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000		
1	CC	1046480825																		23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF10	30	\$1,160,000	6,9600
Total Afiliados (1)																				\$1,160,000	\$185,600	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000		
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF																							
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL BOYACA C	CHIQUEQUIRA	CHIQUEQUIRA-BOYACA	3124113265	SI																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																															
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Clase	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla																	
Pensión	Salud	Pago	Pago	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla																	
2023-11	2023-12	333631365	945990268	E	2023/12/07	2023/12/13	BANCOLOMBIA	6						\$361,400																	
RESUMEN DE PAGO																															
RIESGO																															
CODIGO																															
NIT																															
DV																															
AFILIADOS																															
VALOR LIQUIDADO																															
INTERESES MORA																															
SALDOS E INCAPACIDADES																															
VALOR A PAGAR																															
APP (ADMINISTRADORAS: 1)															1	\$185,600	\$1,100	\$0	\$186,700												
PORVENIR															1	\$185,600	\$1,100	\$0	\$186,700												
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															1	\$80,800	\$500	\$0	\$81,300												
ARL SURA															1	\$80,800	\$500	\$0	\$81,300												
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)															1	\$46,400	\$300	\$0	\$46,700												
CONFABOY															1	\$46,400	\$300	\$0	\$46,700												
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)															1	\$46,400	\$300	\$0	\$46,700												
SANITAS															1	\$46,400	\$300	\$0	\$46,700												
TOTAL															1	\$359,200	\$2,200	\$0	\$361,400												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		TUNJA PRINCIPAL	CLL 43 # 8A-06	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2023-11	2023-12	333627448		E	2023/12/07	2023/12/13	BANCOLOMBIA	6	\$3,468,500					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO														
NOVEDADES														
No.	Identificación	Nombre	Ingre	tit	de	toe	dis	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac
PENSION														
SALUD														
CCF														
RIESGOS														
PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	Ingre	tit	de	toe	dis	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac
SUCURSAL: TUNJA PRINCIPAL (12 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PROFESIONALES (9 Afiliados)														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)														
1	CC	7182495												
BUSTAMANTE JULIAN														
2	CC	1057603814												
CASTRO RICHARD														
3	CC	1007208822												
GAMBRA JUAN														
4	CC	1057516347												
GAMBOA LAURA														
5	CC	1003691194												
LOPEZ DUJAN														
6	CC	1049643326												
PAEZ WILMER X														
7	CC	1051954848												
PINILLA BREYNER														
8	CC	1049655354												
JAONEDRA JHONATHAN														
9	CC	1049614533												
TIBACIO JUAN X														
Centro de Trabajo: PROFESIONALES OBRAS (3 Afiliados)														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)														
10	CC	1055333260												
CORREDO CAROLA X														
11	CC	1054373745												
GUITIVA JORGE														
12	CC	1049638272												
TOLEDO SEBASTIAN														
Total		Afiliados (12)												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA PRINCIPAL	CLL 43 # 8A-06	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	333627448	9460307101	2023/12/07	2023/12/13	BANCOLOMBIA		6	\$3,468,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					12	\$2,076,000	\$12,300	\$0	\$2,088,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$371,200	\$2,200	\$0	\$373,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$1,463,500	\$8,600	\$0	\$1,472,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$241,300	\$1,500	\$0	\$242,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$333,600	\$2,000	\$0	\$335,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	12	\$333,600	\$2,000	\$0	\$335,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$519,100	\$3,100	\$0	\$522,200
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	12	\$519,100	\$3,100	\$0	\$522,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					12	\$519,100	\$3,300	\$0	\$522,400
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$300	\$0	\$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$118,400	\$700	\$0	\$119,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$108,300	\$700	\$0	\$109,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$600	\$0	\$93,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$60,400	\$400	\$0	\$60,800
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$600	\$0	\$93,400
TOTAL					12	\$3,447,800	\$20,700	\$0	\$3,468,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7187105		GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 #55a-46	TUNJA-BOYACA	7444976		\$1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11		9458772480		9458772480	2023/12/04	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,037,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 7187105	GARCIA GERMAN	230301	30	\$3,576,000	\$572,200	EP5008	30	\$3,576,000	\$447,000		0	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,576,000	\$18,700	0	\$0		
Total		Afiliados (1)			\$3,576,000	\$572,200			\$3,576,000	\$447,000			\$0	\$0	\$0		\$3,576,000	\$18,700		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$447,000	\$0	\$0	\$447,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$447,000	\$0	\$0	\$447,000
TOTAL				1	\$1,037,900	\$0	\$0	\$1,037,900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	APL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CG 7181346	0	RODRIGO ALBERTO MENDELVELO CELY	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-4006		CARRERA 6 2 37	3204803495		INGR811@GMAIL.COM		\$		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN.										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	28251386	I	2023-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28251386	2023-12-13	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7181346	0	RODRIGO ALBERIO MENDIVIELSO CELY	1	01	POSITIVA - 14-23	„SUCURSAL	8299	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO	EMAIL			
15-años		CARRERA 8 y 237			3204880496	ING611@GMAIL.COM		EXENTO DE PARAFISCALES \$	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	28251386	I -	2023-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28251386		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	1.160.000	IBC SALUD	1.160.000	IBC CAJAS
			1.160.000	IBC PARA F

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
NUUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.100	0	0	0	6.100
Gran Total					336.700	0	0	0	336.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7318490		PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 N 4-48	TUNUNGUA-BOYACA	7400025	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-11	2023-11	333684546	945992648	I		2023/12/22	2023/12/13	BANCO DE BOGOTA	\$411,400
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CCC 7318490		PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 B N 4-48	TUNUNGUA-BOYACA	7400025	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	333684546	9459926848	1	2023/12/22	2023/12/13	BANCO DE BOGOTA	0	\$411,400

RESUMEN DE PAGO									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
</									

DICIEMBRE

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA PRINCIPAL	CLL 43 # 8A-06	TUNJA-BOYACA	3124113265	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	353817088	9460586998	E	2024/01/09	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	\$3,836,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,329,600	\$0	\$0	\$2,329,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,587,200	\$0	\$0	\$1,587,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$341,800	\$0	\$0	\$341,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$341,800	\$0	\$0	\$341,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$582,400	\$0	\$0	\$582,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$582,400	\$0	\$0	\$582,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
TOTAL				12	\$3,836,200	\$0	\$0	\$3,836,200	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7181346	0	RODRIGO ALBERTO MENDELSSO CELY	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8298	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-806		CARRERA 6 2 37	3204800496			ING611@GMAIL.COM		\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2023-12	2023-12	28502833	I	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	28502833	2024-01-12	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLEADO		DIAS		PENSIÓN		SALUD		CCF	
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	FECHA PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO
1	CC 7181346	MENDIVIELSO CELY RODRIGO ALBERTO	1.100.000	2024-01-16	2024-01-12	2024-01-12	2024-01-12	2024-01-12	2024-01-12

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7181348	0	RODRIGO ALBERTO MENDELSSO CELY	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural	
MUNIDEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-806		CARRERA 6 2 37	3204800496		ING611@GMAIL.COM		\$		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2023-12	2023-12	28502833	I	2024-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	28502833	2024-01-12	Pagada						

TOTALES IBC									
IBC PENSIÓN	1.160.000	IBC SALUD	1.160.000	IBC RIESGOS	1.160.000	IBC CAJAS	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS (Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP (Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.100	0	0	0	6.100
Gran Total					336.700	0	0	0	336.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 7187105		GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 #55a-46	TUNJA-BOYACA	7444976	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2023-12	2023-12	9460159753	I	2024/01/03	2023/12/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,037,900				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
1	CC 7187105	GARCIA GERMAN	230301	30	\$3,576,000	\$572,200	EP5008	30	\$3,576,000	\$447,000	\$0	14-23
Total		Afiliados(1)			\$3,576,000	\$572,200			\$3,576,000	\$447,000	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$447,000	\$0	\$0	\$447,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$447,000	\$0	\$0	\$447,000	
TOTAL				1	\$1,037,900	\$0	\$0	\$1,037,900	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900446975	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B- MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL BOYACA C	CHIQUEQUIRA	CHIQUEQUIRA-BOYACA	3124113265		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-12	2024-01	339135577	9460412248	E	2024/01/09	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$359,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR		230301	800,724,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL					1	\$359,200	\$0	\$0	\$359,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 7318490		PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 B N 4-48	TUNUNGUA-BOYACA	7400025	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2023-12	2023-12	339351327	9460416576	I	2024/01/23	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$411,400					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0
Ciudad: TUNUNGUA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0
1	CC 7318490	PANQUEVA EMILIO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7318490		PANQUEVA ALVAREZ ENILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 B N 4-48	TUNUNGUA-BOYACA	7400025	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-12	2023-12	339351327	9460416576	I	2024/01/23	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$411,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
TOTAL					1	\$411,400	\$0	\$0	\$411,400

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD				1	0
2023-12	2023-12	I	15/03/2024	74316453	\$422.200

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0		65	10,200	0	185.200	1

[illegible]

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
		SENA			
0	0	0	0	0	0
		ICBF			
0	0	0	0	0	0
		ESAP			
		MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	185.200
Pensión	1	224.000	237.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	399.000	422.200

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO FENSIONES			1	0
2023-12	2023-12	I	15/03/2024	743/16453	TOTAL A PAGAR \$422.200

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARA ESCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Cédula	Símbolo	Código	Examinado	INB	TSE	TAE	TBP	TAP	ICF	SLM	VAC	AVP	VCT	IRL	COAFACCIÓN	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	C-Id EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	Coligación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICAP	Aporte MEN	Aporte ESAP		
1	CC	7176729	VARGAS GLIA CARLOS AUGUSTO		3	0		Z													25-14	1,400,000	224,000	0	0	EP-S005	1,400,000	175,000					0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

FEBRERO

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	Razón Social		Clase	Código	ARL	F. Presentación	ACT. EDO	TIPO DE EMPRESA
CC 7181348	0	RODRIGO ALEJO MENDEZ SOLY		I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP 15-806		DIRECCIÓN CARRERA 6 2 37				TELÉFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
						3204690496	ING811@GMAIL.COM		\$

Pagoda[illegible]

ASOPAGOS
s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7181348	0	RODRIGO ALBERTO MENIVIELLO GELY	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural	
MUN-DEP 15-806		DIRECCIÓN CARRERA 6 237			TELÉFONO		EMAIL ING281@GMAIL.COM	EXENTO DE PARAFISCALES	\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
PERIODO REINSEÑ	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO
2024-02	2024-02	29094064	I	2024-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
1	29094064		Pagada	TODOS		0
						ENTIDAD RECAUDO
						BANCOLOMBIA

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000		0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224608	8	1	208.000	0	0	0	208.000
PS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	162.500	0	0	0	162.500
RRP(Administradoras: 1)				1	6.786	0	0	0	6.786
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.786	0	0	0	6.786
Gran Total					377.286	0	0	0	377.286

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	7176729	CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA	CRA. 3B No 41 - 48	7404387	vargasigua@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOYACÁ	TUNJA
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 1
					UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$403.100
PERIODO SALUD	2024-02	2024-02	2003/2024	75712766	

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	7176729	CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA	CRA. 3B No 41 - 48	7404387	vargasigua@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOYACÁ	TUNJA
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 1
					UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$403.100
PERIODO SALUD	2024-02	2024-02	2003/2024	75712766	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS005	Santas EPS	800251440-6	175.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
					0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.000	0	0	0	0	12	2.300	0	176.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Formulario de Cotización de Seguros de Vida														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a		Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria							Fondo	Solidaridad		
			No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Saldo a Favor	Fondo	Solidaridad	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	176.800
Pensión	1	224.000	226.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	399.000	403.100

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	20/03/2024	75712786	\$403,100	

PAAGDA

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS
No. Identificación: CC7183596
Dirección: CALLE 21 #13-0223
Telefono: 3125079699
Correo: carolinaecheverry.gil@gmail.com
Ciudad: VILLA DE LEYVA
Número de Planilla: 8374598121

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS
Tipo y número de identificación	CC7183596
Número de planilla	8374598121
Fecha pago	2024-02-09
Número de autorización pago	14095822
Banco	1023

Número de Empleados	1
Período de Cotización Salud	febrero de 2024
Período de Cotización Pensión	febrero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	377300
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	6800	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	208000	1
EPS010	EPS Sura	162500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 7183596
APELLIDOS Y NOMBRES: EDWIN ALEXANDER PALACIOS VARGAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS010	230201	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	6800	0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7187105		GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 #553-46	TUNJA-BOYACA	7444976	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	9462743661	9462743661	I	2024/03/04	2024/02/19	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,037,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
1	CC 7187105	GARCIA GERMAN	230301	30	\$3,576,000	\$572,200	EP008	30	\$3,576,000	\$447,000		0		\$447,000		14-23	30	\$3,576,000	\$18,700				\$0
Total Afiliados(1)					\$3,576,000	\$572,200			\$3,576,000	\$447,000				\$447,000				\$3,576,000	\$18,700				\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	1	\$447,000	\$0	\$0	\$447,000
TOTAL				1	\$1,037,900	\$0	\$0	\$1,037,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 7318490		PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 B N 4-48	TUNUNGUA-BOYACA	7400025	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2024-02	2024-02	500045478	9463911800	I	2024/03/21	2024/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$461,000					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0
Ciudad: TUNUNGUA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0
1	CC 7318490	PANQUEVA EMILIO	210201	30		\$208,000	EPS005	30		\$1,300,000		0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

CC 7318490

dv

PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

PRINCIPAL

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

CALLE 45 B N 4-48

Ciudad-Departamento

TUNUNGUA-BOYACA

Teléfono

7400025

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2024-02

Clave

500045478

Pago

9463911800

Planilla

1

Tipo

Planilla

Limite

2024/03/21

Fecha

2024/03/07

Pago

BANCOLOMBIA

Banco

Dias Mora

0

Valor

\$461,000

RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1		\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1		\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1		\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1		\$461,000	\$0	\$0	\$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																									
NIT 90046925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA CONSULTORIAS	CENTRO TUNJA	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI																									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																	
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago																											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																								
2024-02	2024-03	651291726	9467298107	E	2024/03/07	2024/05/20	BANCOLOMBIA	74	\$338,900																								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tdc	tae	tdc	tap	cop	cor	vti	sin	lga	lnc	avp	vet	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
1	ICC	1051954848	PINILLA BREYNER										230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800
Total Afiliados(1)																										\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$318,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA CONSULTORIAS	CENTRO TUNJA	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	651291726	9467298107	E	2024/03/07	2024/05/20	BANCOLOMBIA	74	\$338,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$13,000	\$0	\$221,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$13,000	\$0	\$221,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$500	\$0	\$7,300
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$500	\$0	\$7,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$3,300	\$0	\$55,300
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	1	\$52,000	\$3,300	\$0	\$55,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$3,300	\$0	\$55,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$3,300	\$0	\$55,300
TOTAL					1	\$318,800	\$20,100	\$0	\$338,900

MARZO

CONTROL INGENIERIA S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7181346	0	RODRIGO ALBERTO MENDIVILLO CELY	I	01	POSITIVA - 14-23		8299	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN							
15-006		CARRERA 6 2 37							
					TELÉFONO		EMAIL		
					3204890496		INC811@GMAIL.COM		
								EXENTO DE PARAFISCALES	\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUD
2024-03	2024-03	29/05-30	1	2024-05-10	TODOS	TODOS	377.286	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	29/25-30	2024-04-11	Pagada						

[illegible]

ASOPAGOS
s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 7111348	0	RODRIGO ALBERTO MENENDEZ GELY	1	01	POSITIVA - 14-23		8.299	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN							
15-806		CARRERA 6 2 37				TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
						3204890498	ING617@GMAIL.COM	\$	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO FOLIOS	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2024-03	2024-03	2904254-30	I	2024-05-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS		0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	2904254-30		Pagando							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS (Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUOVA E P. S. A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
NRP (Administradoras: 1)				1	6.788	0	0	0	6.788
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.788	0	0	0	6.788
Gran Total					377.286	0	0	0	377.286

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	PLANILLA ASOCIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
CC	7176729	CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA	CRA. 3B No 41 - 48	7404387	vargasigua@yahoo.com						EMPLADOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
ÚNICA	I - Independiente			BOYACÁ	TUNJA	2024-03	2024-03	I	20/03/2024	75712788	TOTAL A PAGAR
											\$399,000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	0	0
						0					175.000
											1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.000	0	0	0	0	0	0	0	224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas								

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	399.000	399.000

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)
CC	7176729	CARLOS AUGUSTO VARGAS (GUA	CRA. 39 No 41 - 48	7404387	vargasgustao@yahoo.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
ÚNICA	1 - Independiente			BOYACÁ	TUNJA	1	20/03/2024
						NÚMERO PLANILLA	75712788
						EMPLEADOS	1
						UPC	0
						TOTAL A PAGAR	\$399.000

DETALLE POR COTIZANTE																											
INFORMACIÓN COTIZANTE														INFORMACIÓN NOVEDADES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Códn. Muest.	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero
1	CC	7176729	VARGAS IGUA CARLOS AUGUSTO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 7318490		PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 B N 4-48	TUNUNGUA-BOYACA	7400025	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Lmite	Pago	Banco	Días Mora	Valor				
2024-03	2024-03	564940339		1	2024/04/19	2024/04/09	BANCOLOMBIA	0	\$461,000				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
					\$1,300,000	\$208,000				\$162,500	\$0		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
					\$1,300,000	\$208,000				\$162,500	\$0		\$0
Ciudad: TUNUNGUA Depto: BOYACA (1 Afiliados)													
1	CC 7318490	PANQUEVA EMILIO	236201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30		\$162,500	\$0	14-11	\$0
Total Afiliados(1)						\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7218490		PANQUEVA ALVAREZ EMILIO BLADIMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 B N 4-48	TUNJUNGA-BOYACA	7400025	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-03	2024-03	564340339	Planilla	Límite	Pago				
		9465771379	I	2024/04/19	2024/04/09	BANCOLOMBIA	0		\$461,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$461,000	\$0	\$0	\$461,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Reason Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 900-46925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA CONSULTORIAS	CENTRO TUNJA	TUNJA-BOYACA	3124113285	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2024-03	2024-04	651379616	9467298701	E	2024/04/05	2024/05/20	BANCOLOMBIA	45	\$330,900			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	tae	cup	tap	cop	cor	vet	sin
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		TUNJA CONSULTORIAS	CENTRO TUNJA	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	651379616	9467298701	E	2024/04/05	2024/05/20	BANCOLOMBIA	45	\$330,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$7,800	\$0	\$215,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$7,800	\$0	\$215,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$300	\$0	\$7,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$300	\$0	\$7,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$2,000	\$0	\$54,000
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	1	\$52,000	\$2,000	\$0	\$54,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$2,000	\$0	\$54,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$2,000	\$0	\$54,000
TOTAL				1		\$318,800	\$12,100	\$0	\$330,900



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEXA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	718396 EDWIN ALEXANDER PALACIOS BOYACA 999999 INDEPENDIENTE Cambiado al por mayor de computadores, equipo per UNICO NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	7921564841 2024 2024/04/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
CEDULA DE CIUDADANA TUNJA CRA 1 ESTE 13 80 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	MES mayo 2024	MES mayo 2024 INDEPENDIENTES 52285573

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	230201	PROTECCION	Nº. COTIZANTES	1	COTIZACIÓN	\$ 238.000	EMPLEADOR	COTIZANTE	\$ 0
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	230210	DA SUPRAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	Nº. COTIZANTES	1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	\$ 0
SUB-TOTALES:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSION									
SALUD									
PARAFISCALES									
TOTAL									

TOTAL \$ 370.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7187105		GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 #553-46	TUNJA-BOYACA	7444976	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	9464338516			2024/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	\$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 7187105	GARCIA GERMAN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$225,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,800,000		0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000				\$0	\$0			\$1,800,000			\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
TOTAL				1	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400
