

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión: 1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Número:	23001227 02 H3 DE 2023	Fecha:	22/03/2024
OBJETO: DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET.			
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PORTAL AEROCIVIL 2023		
Interventor y/o Supervisor:	MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA ANDRÉS FELIPE MOLINA BARRIOS		
Valor inicial del contrato:	2.782.998.775,00 incluido IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	Hasta el dieciséis 16 de diciembre de 2024		
Fecha de inicio del contrato:	22/03/2024	Fecha de terminación del contrato:	16/12/2024
PRÓRROGAS			
Número de Prórroga		Plazo	
1.			
2.			
3.			
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):			
ADICIONES			
Número de Adición		Valor (\$)	
1.			
2.			
3.			

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión: 1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

Valor total del contrato:			
SUSPENSIONES			
Número del Acta de Suspensión		Tiempo	
1. NINGUNA			
2.			
3.			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)			
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción	
1. Modificadorio 01	Cláusula sexta, cláusula séptima y clausula décima segunda.	Eliminar la cláusula sexta – anticipo, modificando cláusula séptima – forma de pago y cláusula décima segunda – garantías de cumplimiento	
2.			
3.			
CESIONES			
Cedente		Cesionario	
1.			
2.			
3.			
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD			
Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)	
1.			
2.			
3.			
GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	PÓLIZA DE SEGURO		

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión:1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

Número de Garantía:	18-44-101096407		
Fecha de Expedición de la Garantía:	20/08/2024	Fecha de Aprobación de la garantía	22/08/2024
Descripción del Amparo:	Cumplimiento del contrato Calidad del servicio Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		
Porcentaje:	Cumplimiento del contrato – 20% del valor contrato Calidad del servicio - 20% del valor contrato Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales - 20% del valor contrato		
Anexo:	2		

Fecha de Apro

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación:					
2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
se han realizado las actividades relacionadas: planeación, instalación y configuración de la plataforma del CMS (Gestor de Contenidos) Nexura Plataform; habilitación VPN site to site, aprobación del diseño gráfico del home del portal del CEA y posteriormente el de la nueva sede electrónica; levantamiento de información con las diferentes áreas de la entidad para conocer necesidades de información para presentarse tanto en el portal del CEA como de la sede electrónica, las cuales no se desarrollaron con la celeridad y oportunidad requerida Se concluyeron las actividades necesarias para la gestión y trámite del primer pago. Trámite realizado el día 22 de agosto de 2024.					
Número del entregable	Entregable	Estado	% Avance	Fecha de aprobación	Observaciones
1	Documento del Plan de gestión del proyecto	Aprobado	100%	09/05/2024	Acta de aceptación firmada
2	Cronograma detallado	Aprobado	100%	09/05/2024	Acta de aceptación firmada
3	Project charter	Aprobado	100%	09/05/2024	Acta de aceptación firmada
4	Documento con el diseño de la arquitectura de la solución y configuración del CMS v1.0	Aprobado	100%	14/05/2024	Acta de aceptación firmada
5	Documento con la diagramación y diseño gráfico propuesto y aprobado v 1.0	Aprobado	100%	10/07/2024	Acta de aceptación firmada
9	Documento plan de pruebas	Aprobado	100%	23/05/2024	Acta de aceptación firmada
15	Documento de estrategia y plan de gestión del cambio	Aprobado	100%	23/05/2024	Acta de aceptación firmada
A la fecha se describe de manera general las actividades que a la fecha se han realizado:					

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión:1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

- Diseño y construcción del portal del CEA del cual se tienen pendientes unas tareas previas a la puesta en el ambiente productivo y definición de salida en vivo.
- Generación de wireframes (representación visual a escala de grises de la estructura y funcionalidad de una página web)
- Generación de diseños gráfico a partir de los wireframes y/o prototipos aprobados: Componentes transversales, micrositios, secciones genéricas, mapas interactivos de gestión de proyectos y catálogo de servicios de aeropuertos administrados por Aerocivil
- Construcción de la sede electrónica a partir de los diseños gráficos y componentes que ya han sido aprobados
- Se realizó con el apoyo del CEA taller en el Colegio Fe y Alegría como estrategia dirigida a una población de niños/niñas entre 7 a 12años, para conocer lo que espera un niño de un sitio web orientado a ellos con relación a Aerocivil.
- Desarrollos particulares, con los cuales se atienden los requerimientos de diferentes dependencias con cargo a la bolsa de horas, que incluyeron actividades de levantamiento de información, validación y verificación de requerimientos, generación, verificación y aprobación:
 - Consulta en línea de información meteorológica
 - Consulta en línea de licencias de personal aeronáutico
 - Consulta en línea certificados médicos de personal aeronáutico
 - Consulta en línea empresas aéreas
 - Consulta en línea matrículas de aeronaves
 - Actualizaciones listas de verificación y listas de NOTAM válidos
 - Búsquedas avanzadas con filtros (módulo de normatividad)
 - Módulo de gestión interna de accidentes para posterior uso de los datos para la expedición de la certificación de accidentalidad
 - Formulario para comentarios a proyectos de norma
 - Módulo para la gestión de solicitudes, procesos y formularios
 - Módulo para la gestión de solicitudes, procesos y formularios
- Levantamiento de información, definición de alcance y verificación por parte del área correspondiente y estimación de horas para los siguientes desarrollos:
 - Formulario para presentación de examen de evaluación de Seguridad y Salud en el trabajo, certificado de resultado del examen y módulo de gestión de evaluaciones y del banco de preguntas
 - Mapa interactivo de gestión de proyectos
 - Mapa interactivo catálogo de Aeropuertos

El avance con corte 30 de noviembre de 2024 es: Planeado 77%, real del 52% con un desfase del 25%.

Se generan los siguiente entregables y se hace el trámite del segundo pago el día 30 de noviembre de 2024:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Principio de procedencia:
8000.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

Número del entregable	Entregable	Estado	% Avance	Fecha de aprobación	Observaciones
6	Acta de construcción del portal, conforme a lo señalado en el ítem 4.	Aprobado	100%	27/11/2024	Acta de aceptación firmada
7	Acta de migración de contenido, conforme a lo señalado en el ítem 6	Aprobado	100%	27/11/2024	Acta de aceptación firmada
8	Acta de recibo desarrollos efectuados y horas consumidas.	Aprobado	100%	27/11/2024	Acta de aceptación firmada
10	Documento ejecución y resultado de las pruebas (primera versión)	Aprobado	100%	27/11/2024	Acta de aceptación firmada

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.782.998.775,00	\$828.135.664,00	
ADICIONES	\$ 0		
AJUSTES	0		
EN TRAMITE DE PAGO		\$509.948.111,00	
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR			
OTROS			
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA		\$1.444.914.999,00	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$2.782.998.775,00	\$2.782.998.775,00	\$ 0

NOTA: EL SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORRESPONDIENTE A \$1.444.914.999,00, pasaría como reserva presupuestal. Valor que cancelará con la entrega a satisfacción de los entregables asociados a los pagos: tercer y cuarto (último pago).

3.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión:1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	___ DÍAS _3_ MESES hasta el 16 de marzo de 2025. ___ AÑOS
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS _____ VALOR EN SMMLV DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO _____ _____
OTRA	

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación: En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.", con el fin de garantizar la eficacia y el cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, solicito:

Prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses, contados a partir del 17 de diciembre de 2024, del contrato de prestación de servicios 23001227 02 H3 DE 2023 sustentada por el contratista mediante comunicación de fecha 04 de diciembre de 2024, en la cual manifiesta:

"...debe hacer mención a que, en atención a la magnitud de la ejecución del Contrato No. 23001227 02 H3 DE 2023 inicialmente estaba planeada por la entidad para que se ejecute por un plazo estimado de doce (12) meses: cómo se puede observar en el cronograma establecido en la resolución No. 02547 del día 30 de noviembre de 2024, mediante la cual la directora administrativa (e) de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL ordenó la apertura de la Licitación Pública No.23001227 H3 DE 2023, que tiene por objeto "DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF)", se establece que la audiencia de adjudicación del contrato se realizará el día 29 de diciembre de 2023 y, la publicación del Acto Administrativo de Adjudicación del Contrato o de Declaratoria de desierta se realizaría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la celebración de dicha audiencia.

En ese orden de ideas, puede observarse que el proceso contractual inicialmente estaba previsto para ser adjudicado y celebrado en el mes de diciembre de 2023. No obstante, debido a modificaciones en el cronograma del proceso de contratación, la adjudicación del Lote No. 2 "DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET" se llevó a cabo mediante Resolución

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión:1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

00291 del 19 de febrero de 2024. Así, puede observarse que se afectó el cronograma de adjudicación y, por tanto, la planeación que inicialmente estaba establecida para que se lleve a cabo la ejecución del contrato.

Aunado a lo anterior, el Contrato No. 23001227 02 H3 DE 2023 solo fue legalizado hasta el día 21 de marzo de 2024 y el Acta de Inicio del Contrato fue suscrita el día 22 de marzo de 2024. En atención a lo cual se vio considerablemente reducido el plazo de ejecución, que se estableció hasta el día 16 de diciembre de 2024.

Como corolario de lo anterior, puede resumirse lo siguiente: la entidad contratante tenía establecida dentro de su planeación que la adjudicación del contrato se realice durante el mes de diciembre de 2023 y su ejecución vaya hasta el día 16 de diciembre de 2024. No obstante, mediante modificaciones al cronograma del proceso de contratación, se postergó la adjudicación del contrato que solamente se llevó a cabo el día 19 de febrero de 2024. Esto afectó los tiempos de ejecución que se tenían previstos para el contrato y retrasó el inicio de la ejecución hasta el día 22 de marzo de 2024, disminuyendo en forma considerable el plazo de ejecución que inicialmente se tenía planeado para el contrato por causas no imputables al contratista.

Por otro lado y en concordancia con lo anteriormente expuesto, si bien es cierto que la finalización del contrato No. 23001227 02 H3 DE 2023 contractualmente está estipulado hasta el día 16 de diciembre del 2024; se han presentado situaciones que han dificultado una correcta ejecución del cronograma del contrato, generando desfases en las entregas finales, teniendo en cuenta la realización de reuniones de levantamiento de información, así como la posterior revisión de las propuestas de prototipos, diseños gráficos del home, de las secciones, micrositos y sus aprobaciones se han extendido en el tiempo, ya que no fueron detectadas en las reuniones iniciales y a medida que ha avanzado el proyecto por el impacto que este va a generar en la sede electrónica otras dependencias quisieron integrarse; a la fecha algunas dependencias de la entidad siguen entregando información fundamental para la construcción de nuevos micrositos y generación de nuevos desarrollos que impactan procesos internos que redundará en la atención de la ciudadanía y en general de toda la entidad a través de la nueva sede electrónica.

Finalmente, debe mencionarse la cláusula DÉCIMA CUARTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO del Contrato No. 23001227 02 H3 DE 2023, que reza de la siguiente manera:

“(…) DÉCIMA CUARTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana (...)”

Como se deriva de la cláusula anteriormente transcrita, se pueden presentar situaciones de demora en la satisfacción de las prestaciones a cargo de las partes por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, causas que por su naturaleza no son atribuibles a las partes. Una de esas causas que se presentaron dentro del contrato son las fallas en la infraestructura de nube las cuales afectaron en la instalación de librerías de la plataforma base ocasionando que los entornos de pruebas estuvieran listos en los tiempos indicados, adicionalmente, la infraestructura en la que se encuentra el actual portal de la entidad es muy sensible a presentar errores y caídas lo cual dificulto realizar migraciones de forma masiva. Estas situaciones, no atribuibles al contratista, han afectado el plazo de ejecución del contrato y los cronogramas inicialmente previstos.

Por las razones anteriormente expuestas, se requiere la prórroga en el plazo de ejecución del contrato, tiempo en el cual se finalizarán las actividades pendientes correspondientes a la migración de contenidos, construcción de nuevos micrositos, implementación de nuevos micrositos, despliegue a producción, transferencia de conocimiento, gobierno de portal y la finalización de la bolsa de horas en desarrollos ya identificados.

.....
De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente cronograma de ejecución:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Principio de procedencia:
8000.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

Sede electrónica

Actividad	Fecha inicio	Fecha finalización
Migración y montajes de contenidos	-	31/12/2024
Validación de migración	02/01/2025	24/01/2025
Ajustes encontrados	25/01/2025	07/02/2025
Aseguramiento de calidad	11/02/2025	15/02/2025
Nuevos Micrositios	-	31/12/2024
Chatbot IA Regenerativa	-	16/12/2024
Transferencia de conocimiento	18/02/2025	28/02/2025
Gobierno del portal	20/02/2025	28/02/2025
Revisiones finales	03/03/2025	11/03/2025
Despliegue a producción	12/03/2025	14/03/2025

Nota: Las actividades con guion (-) en fecha inicio se debe a que están en ejecución en estos momentos.

Finalmente, se aclara que la presente solicitud de prórroga al Contrato No. 23001227 02 H3 DE 2023 solo impacta el plazo de ejecución para finalizar con completitud el objeto contratado y en ningún caso se adicionan recursos económicos...

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista respecto a las razones que fundamentan su solicitud, como supervisores del contrato consideramos que tanto los aspectos técnicos de fuerza mayor o caso fortuito no atribuibles a las partes como son las fallas de la infraestructura en nube que generaron atrasos en instalaciones bases necesarias para la correcta configuración de la plataforma sobre la cual se construye la sede electrónica y el portal del CEA y que la sede electrónica que actualmente está en producción está construida en una plataforma de software (SharePoint 2013), que hoy día es obsoleta y ya no tiene soporte por parte de Microsoft la hace sensible ante caídas e indisponibilidad del servicio para afrontar un proceso de migración masiva. Estas consideraciones desde el punto de vista técnica generaron retrasos en el cronograma inicialmente previsto.

Por otra parte, las situaciones de desfase en las entregas finales relacionadas con reuniones de levantamiento de información, revisión de prototipos, diseños gráficos, del home, micrositios, secciones genéricas y sus aprobaciones; revisión de historias de usuario que explican la funcionalidad de los nuevos servicios que se construyen por la bolsa de horas, se han extendido en el tiempo, además han generado reuniones de trabajo adicionales que no habían sido detectadas en las reuniones iniciales, pero con el avance del proyecto ha sido necesario programarlas con el fin de obtener productos que cumplan con los requerimientos de las áreas.

Aunado a lo anterior, es importante resaltar dada la magnitud del proyecto, que desde la Dirección de la Información y Sistemas de TI se tenía previsto tener un plazo de ejecución de 12 meses, que no fue factible dado que el proceso se adjudicó en febrero de 2024. Tiempo que hoy día es indispensable para culminar las actividades contractuales con éxito al poner a disposición de los servidores públicos, usuarios del sector y el ciudadano en general una nueva sede electrónica que apalanca el cumplimiento del objetivo institucional "Consolidación de la Transformación Institucional", así como las Políticas de: Gobierno Digital, la Política de



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO


Principio de procedencia:
8000.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, Servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, entre otras. A continuación, se describe a partir de una línea de tiempo como se dio el proceso de licitación pública que dio origen al contrato:

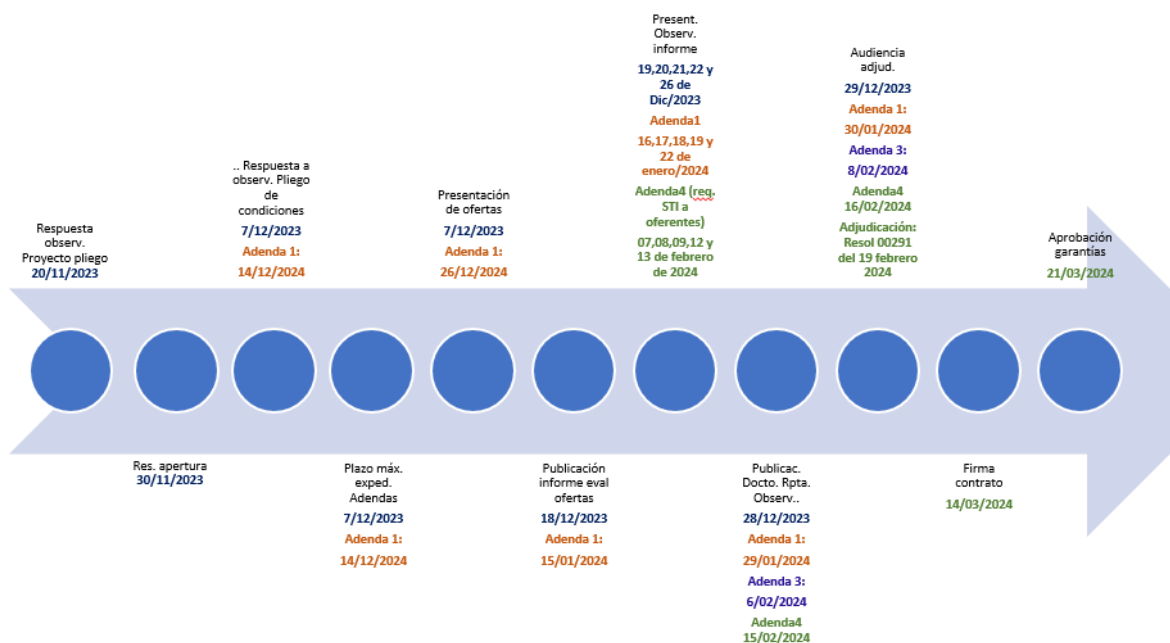

Desplazamiento en el tiempo tomando como referencia la fecha de adjudicación inicial prevista (29/12/2023) y la fecha de aprobación de garantías (21/03/2024): 82 días.

Por otra parte, el no otorgar la prórroga traerá un impacto negativo que se resume como sigue:

1. No cumplir con el objeto contractual
2. Incumplir la meta del plan de acción que impulsa el objetivo institucional de "La transformación institucional a la modernidad"
3. Dificultad para implementar los lineamientos definidos en la política de Gobierno Digital
4. Alto riesgo de mantener la sede electrónica actual, ya que está construido en una plataforma tecnológica que a la fecha es obsoleta.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 8000.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión:1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

JUSTIFICACIÓN LEGAL	
<p>Se encuentra basamento jurídico fuerte para justificar la presente prórroga por el periodo solicitado, toda vez que se encuentran razones suficientes para no solo afirmar que existe una fuerza mayor que exime de responsabilidad a las partes y que justifica la constitución de la reserva presupuestal, sino también los documentos precontractuales y estructuración del proyecto, demuestran que el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual era aproximadamente de 12 meses y no de 9 meses, que resultó siendo el plazo final, debido a la demora en la aprobación de las vigencias futuras, así como las múltiples adendas expedidas durante el proceso de selección.</p>	
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA	
<p>La presente modificación contractual no afecta de manera alguna la ecuación económica del contrato, teniendo en cuenta que no se está realizando inclusión de actividades o ítems.</p> <p>La extensión del plazo de ejecución solicitado para el contrato no origina costos adicionales para la entidad.</p>	
EVIDENCIAS APORTADAS	
<ol style="list-style-type: none">1. Se anexa correo y carta enviada por el contratista comunicación de fecha 04 de diciembre de 2024.2. Concepto supervisores. Formato 69.3. Solicitud ordenador del gasto.	
CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR	
<p>En nuestra calidad de supervisores del contrato 23001227 02 H3 cuyo objeto DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET. Se solicita la modificación del contrato en la prórroga del plazo de ejecución descrita en el presente documento, lo anterior, con base en lo argumentado por el contratista en su solicitud y en lo que se indica en el aparte de este documento denominado JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.</p> <p>El contratista en el documento de solicitud genera el plan de trabajo para cumplir con el 100% del contrato en el plazo de ejecución adicional del contrato de tres (3) meses solicitados.</p>	
 Firmado digitalmente por MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA Fecha: 2024.12.10 16:06:57 -05'00'	 Firmado digitalmente por ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS Fecha: 2024.12.10 16:00:30 -05'00'
MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA	ANDRÉS FELIPE MOLINA BARRIOS
PROFESIONAL AERONAUTICO	PROFESIONAL AERONAUTICO
