

Informe de Gestión No. 49
Adhesión No. 12 Municipio de Caldas
Período del 01 al 31 de diciembre de 2024

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Diciembre 31 de 2024



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación.....	7
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	8
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor	17
CONCLUSIONES Y RETOS	17
ANEXOS	19

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, de la Adhesión No. 12; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de diciembre de 2024, de la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Caldas, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de diciembre de 2024, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente, se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

Número de Adhesión	12	Entidad Adherente	Municipio de Caldas
Fecha de Inicio	30/11/2020		
Duración	Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.500.000.000		
Valor Aporte SENA	\$900.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$600.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Jorge Mario Rendón Velez Alcalde del municipio de Caldas		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Melisa Torres Velez		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Contratista		
Número Telefónico o Celular	3205370214	Correo Electrónico	desarrollo@caldasantioquia.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para la adhesión No. 12.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto, así como la información financiera del proyecto a corte del presente informe se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9014_DICIEMBRE_2024).

Tabla 2. Información Financiera de la Adhesión No. 12 suscrita con el Municipio de Caldas, Antioquia.

No. Convocatoria	177
Recursos SENA	\$ 900.000.000
Recursos Adherente	\$ 600.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.500.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 2.048.616.245
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0

Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 694.864.148
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 146.247.903
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.353.752.097
Valor Reintegro Aliado.	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 12 suscrita con el Municipio de Caldas, Antioquia.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	\$ 812.251.258,20
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 541.500.838,80
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.353.752.097,00
Ejecución recursos SENA	\$ 805.458.680,22
Ejecución recursos Adherente	\$ 536.972.453,48
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.342.431.133,70


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 12 suscrita con el Municipio de Caldas, Antioquia.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9014
Saldo Total en Bancos	\$ 67.637.775,48
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 4.610.228,36
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 177 perteneciente al municipio de Caldas, Antioquia, se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.353.752.097 equivalente al 90,25% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$146.247.903 teniendo en cuenta las renunciaciones presentadas por los emprendedores a los recursos de financiamiento de la convocatoria 177.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.342.431.133,70 equivalentes al 99,16% de los recursos comprometidos y 89,50% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros de la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

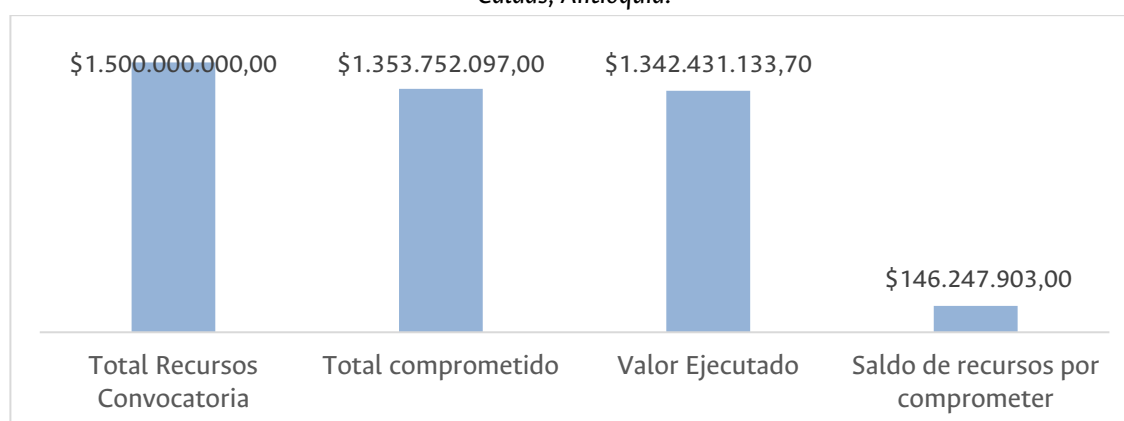

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 177 específica para el municipio de Caldas, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1772020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

Número de Convocatoria	177		
Fecha de Lanzamiento	03/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	10/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	14/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	15/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	10/05/2021	Fecha de Cierre Corte No. 4	18/04/2022

Fecha de Cierre Corte No. 5	06/06/2022	Fecha de Cierre Corte No. 6	31/10/2022
-----------------------------	------------	-----------------------------	------------

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de diciembre del 2024 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditación adelantados para los cierres de la convocatoria No. 177.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

Número de Convocatoria				177			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		14/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	26/02/21	Número de Planes Formalizados	14	Número de Planes Acreditados	11	% de Acreditación	79%
Corte No. 2	Fecha Apertura		15/02/2021		Fecha de Cierre		15/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	26/03/21	Número de Planes Formalizados	16	Número de Planes Acreditados	11	% de Acreditación	69%
Corte No. 3	Fecha Apertura		16/03/2021		Fecha de Cierre		10/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/05/21	Número de Planes Formalizados	20	Número de Planes Acreditados	18	% de Acreditación	90%
Corte No. 4	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		18/04/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	26/04/22	Número de Planes Formalizados	6	Número de Planes Acreditados	5	% de Acreditación	83%
Corte No. 5	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		06/06/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/2022	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%
Corte No. 6	Fecha Apertura		05/10/2022		Fecha de Cierre		31/10/2022
Fecha de Publicación	09/11/22	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%

Final Acreditación							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con el fin de tener trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados de la convocatoria No.177 – municipio de Caldas, Antioquia.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

Número de Convocatoria					177		
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		14/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	18/03/21	Número de Planes Evaluados	11	Número de Planes Viabilizados	4	% de Viabilización	36%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	24/03/21	Fecha de Consejo Directivo	06/04/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$311.511.650
Corte No. 2	Fecha Apertura		15/02/2021		Fecha de Cierre		15/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	13/04/21	Número de Planes Evaluados	11	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	73%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	8	Valor Planes a Financiar	\$636.469.143
Corte No. 3	Fecha Apertura		16/03/2021		Fecha de Cierre		10/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	07/06/21	Número de Planes Evaluados	18	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	67%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	7	Valor Planes a Financiar	\$547.641.939
Corte No. 4	Fecha Apertura		Abril 2022		Fecha de Cierre		18/04/2022
Fecha de Publicación	12/05/22	Número de Planes Evaluados	5	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	100%

Final Evaluación							
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/05/22	Fecha de Consejo Directivo	28/06/22	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$399.344.896
Corte No. 5	Fecha Apertura		Mayo 2022		Fecha de Cierre		18/04/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/2022	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	50%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/2022	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$66.646.477
Corte No. 6	Fecha Apertura		Octubre 2022		Fecha de Cierre		31/10/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	22/11/2022	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	Diciembre 2022	Fecha de Consejo Directivo	Diciembre 2022	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$79.002.140

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de diciembre de 2024 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 177, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 177.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74237	276-177-2021	TE GUIO			\$79.878.930	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	72300	275-177-2021	CAFÉ CIELO ROTO	12/07/2021	12/07/2022	\$79.875.758	100,00%	118,18%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74296	277-177-2021	SIMETRIA Y ESPACIO	26/07/2021	26/07/2022	\$79.876.889	80,00%	133,33%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74313	278-177-2021	NOVA COWORKING	27/07/2021	27/07/2022	\$79.880.073	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO


Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 177 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74510	314-177-2021	AGRÍCOLA SAN MIGUEL			\$79.878.723	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	74507	312-177-2021	D'LOUISE ACCESORIOS			\$79.876.530	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
3	74508	313-177-2021	IBI LAB	6/09/2021	6/09/2022	\$79.877.639	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	RENUNCIA
4	73483	307-177-2021	LENCERIA FANTASY LOVE	12/08/2021	12/08/2022	\$79.895.677	100,00%	150,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74011	308-177-2021	MALEBOLO	12/08/2021	12/08/2022	\$77.177.177	125,00%	160,00%	160,00%	100,00%	TERMINADO
6	74239	309-177-2021	EL CELLER DEL DUC	9/09/2021	9/01/2023	\$79.880.073	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	74262	310-177-2021	AGROTURISMO LA JUANITA	6/09/2021	6/10/2022	\$79.999.998	83,33%	107,69%	100,00%	96,61%	TERMINADO
8	74314	311-177-2021	CENTRO DE RELAJACION YANTRA	25/08/2021	25/08/2022	\$79.883.326	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al segundo corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 2. Cumplimiento de indicadores CV 177 2C.

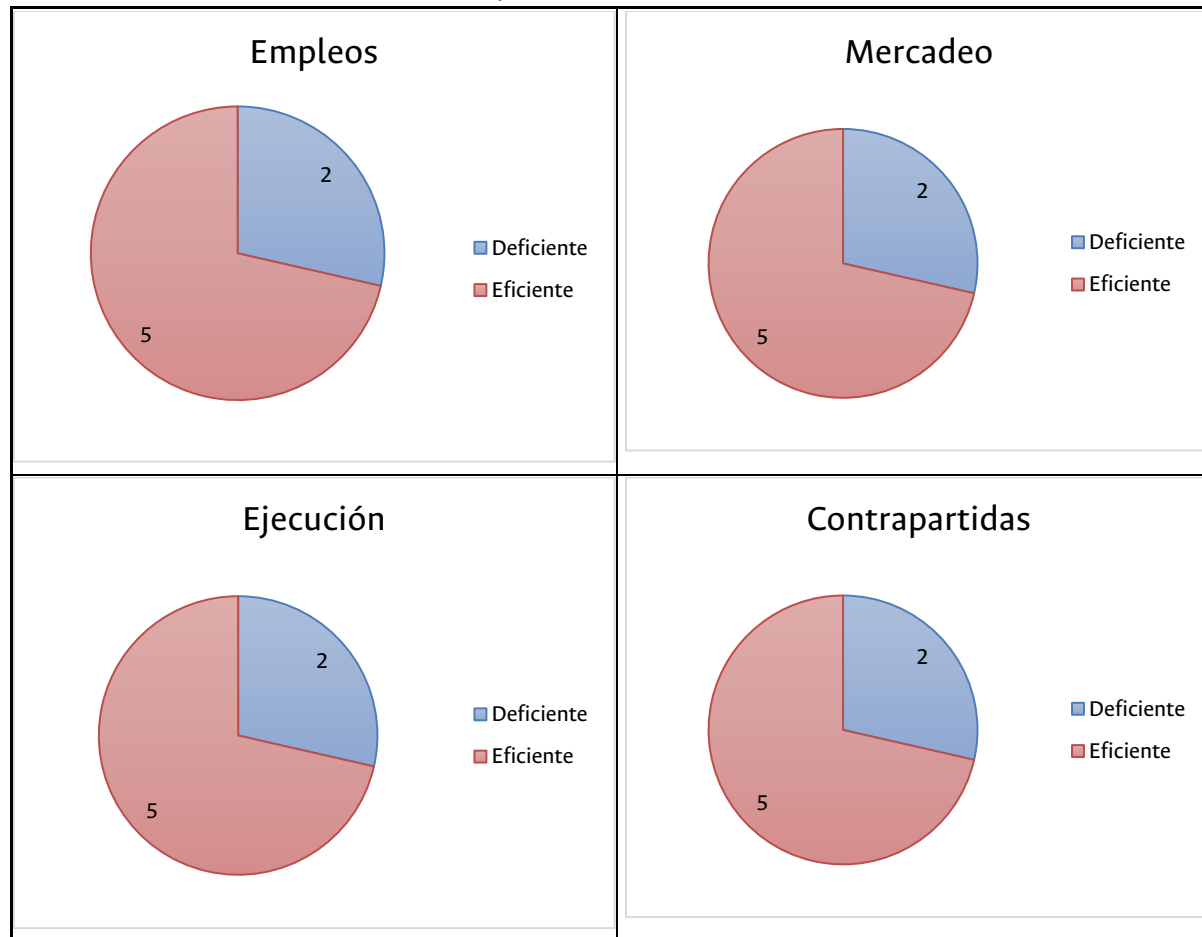




Planes de negocio tercer corte

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74263	367-177-2021	TRIGO Y AROMAS			\$79.879.010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74438	369-177-2021	NATIVA CASA RODANTE			\$70.224.239	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
3	73188	364-177-2021	MERY DESIGN	2/11/2021	2/11/2022	\$79.238.825	83,33%	100,00%	100,00%	99,88%	TERMINADO
4	74121	365-177-2021	AMAN	19/01/2022	19/01/2023	\$79.880.073	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	TERMINADO
5	74235	366-177-2021	BAÑO DE LUNA	10/11/2021	10/03/2023	\$79.002.674	100,00%	128,57%	100,00%	94,67%	TERMINADO
6	74311	368-177-2021	LA CAMPESINA	4/11/2021	4/11/2022	\$79.881.926	80,00%	112,50%	100,00%	99,50%	TERMINADO
7	74734	370-177-2021	NATULANDA	20/04/2022	20/04/2023	\$79.535.192	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para los planes de negocio pertenecientes al tercer corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 3. Cumplimiento de indicadores CV 177 3C.

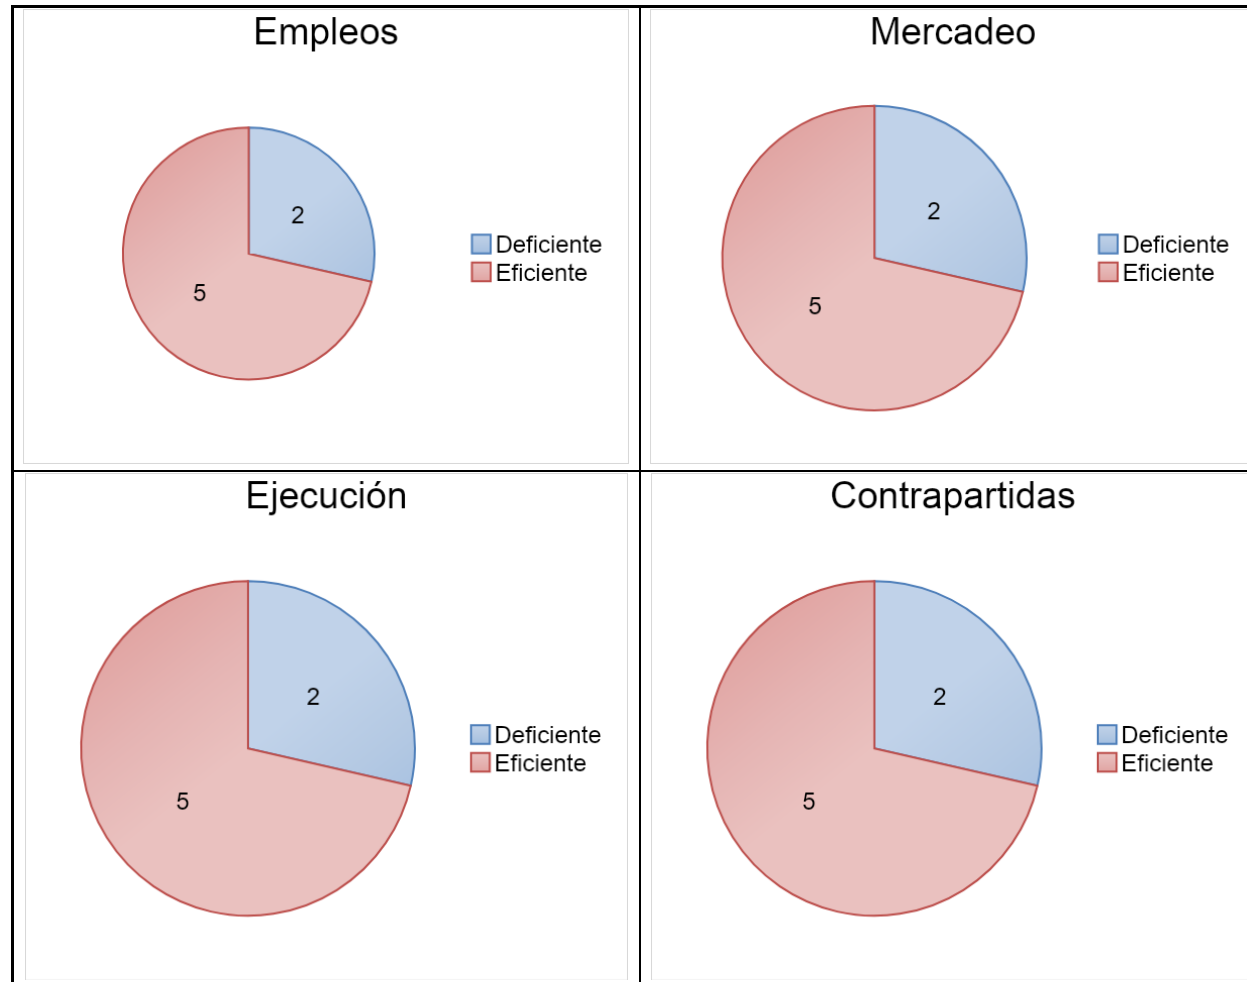

Planes de negocio cuarto corte

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74930	547-177-2022	CONFECCIONES CRISVAL			\$79.600.460	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	64606	543-177-2022	903 NINE ZERO THREE	28/03/2023	28/03/2024	\$79.999.548	100,00%	133,33%	133,33%	99,87%	TERMINADO
3	74282	544-177-2022	EL MERCADITO DE ELI	11/04/2023	11/04/2024	\$79.884.274	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74505	545-177-2022	D&M LA FÁBRICA	11/05/2023	11/05/2024	\$79.879.750	100,00%	100,00%	100,00%	95,36%	TERMINADO
5	74671	546-177-2022	3DOGS	30/03/2023	30/03/2024	\$79.980.864	100,00%	100,00%	100,00%	99,92%	TERMINADO

Planes de negocio quinto corte

Tabla 12. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 5C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74316	557-177-2022	ASEPROA GOURMET	3/08/2023	3/08/2024	\$66.646.477	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA

Planes de negocio sexto corte

Tabla 13. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 6C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74498	569-177-2022	ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA	5/05/2023	5/05/2024	\$79.002.140	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 17 planes de negocio. Actualmente, no hay planes de negocio en ejecución.

Tabla 14. Estado de los planes de negocio entregados al SENA

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	72300	CAFÉ CIELO ROTO	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$79.875.758,00
2	74296	SIMETRIA Y ESPACIO	TERMINADO	24/08/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-0071-2023	\$79.876.685,63
3	74313	NOVA COWORKING	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$79.880.072,18
4	73483	LENCERIA FANTASY LOVE	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$79.895.677,00
5	74011	MALEBOLO	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$77.177.177,00
6	74239	EL CELLER DEL DUC	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$79.880.072,55
7	74262	AGROTURISMO LA JUANITA	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$77.289.181,00
8	74314	CENTRO DE RELAJACION YANTRA	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$79.883.326,00
9	73188	MERY DESIGN	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$79.140.857,28

10	74121	AMAN	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$79.856.126,00
11	74235	BAÑO DE LUNA	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$74.788.868,00
12	74311	LA CAMPESINA	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$79.483.699,00
13	74734	NATULANDA	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$79.535.192,00
14	64606	903 NINE ZERO THREE	TERMINADO	2/07/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2125-2024	\$79.893.481,04
15	74282	EL MERCADITO DE ELI	TERMINADO	25/07/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2124-2024	\$ 79.884.274,00
16	74505	D&M LA FÁBRICA	TERMINADO	25/07/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2124-2024	\$ 76.174.321,02
17	74671	3DOGS	TERMINADO	2/07/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2125-2024	\$79.916.366,00

Para el plan de negocio identificado con el ID-74296 **SIMETRÍA Y ESPACIO** condonado mediante la resolución No. 1-0071 del 24 de enero de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para este contrato de cooperación empresarial.

Con relación a los planes de negocio condonados mediante la resolución No. 1-1752 del 01 de septiembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

Frente a los planes de negocio condonados con la resolución No. 1-2313 del 15 de noviembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial. Con respecto a los planes de negocio contenidos en las resoluciones No. 1-02808 y 1-02809 del 29 de diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para ciento veintiséis (126) contratos de cooperación empresarial.



Finalmente, frente a los planes correspondientes a las resoluciones Nros. 1-2124 -2024 y 1-2125-2024, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron casos de atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 177, la cual presenta los aspectos más relevantes de esta.

Tabla 15. Hitos relacionados con la Adhesión No. 12 suscrita con el municipio de Caldas, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 1.500.000.000,00
Número total de planes formalizados	59
Número total de planes acreditados	48
Número total de planes viables	31
Número de planes financiables	26
Número de planes aprobados en CDN	26
Total recursos aprobados en CDN	\$ 2.048.616.245,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	9
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 694.864.148,00
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$ 1.353.752.097,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 146.247.903,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.342.431.133,70

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 4. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 177.

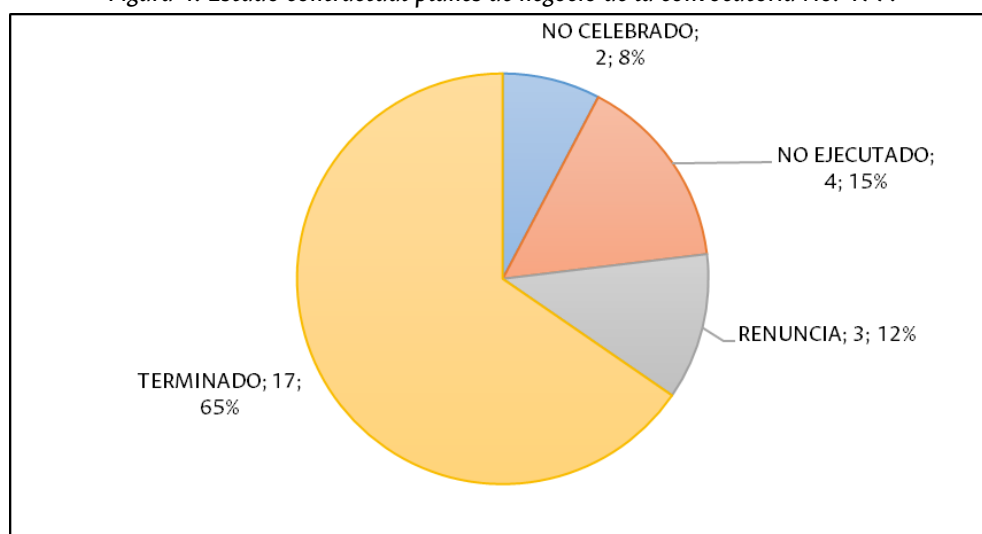

Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de diciembre de 2024, podemos encontrar:

1. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizó 4 de los 11 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 36% de viabilización. Los cuatro planes de negocio aprobados para financiación suman un total de recursos por valor de \$311.511.650.
2. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 177, viabilizó 8 de los 11 planes de negocio acreditados. Los 8 planes aprobados para financiamiento en el segundo corte de la convocatoria suman recursos por valor de \$636.469.143.
3. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 177 – Fondo Emprender, viabilizó 12 de los 18 planes de negocio acreditados, de los cuales fueron aprobados para financiamiento 7 planes por valor de \$547.641.939 atendiendo los recursos disponibles de la convocatoria al momento de la aprobación.
4. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre de la convocatoria 177 se tienen 5 planes de negocio viables aprobados para financiamiento por valor de \$399.344.896.
5. Como resultado del proceso de evaluación del quinto cierre de la convocatoria 177 se tiene 1 plan de negocio viable de los dos planes acreditados el cual fue aprobado para financiamiento por valor de \$66.646.477.
6. Como resultado del proceso de evaluación del sexto cierre de la convocatoria 177 se aprobó el financiamiento de un plan de negocio por valor de \$79.601.426.
7. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 36 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (10), prórrogas (7), otras solicitudes operativas (7), renunciaciones (6), aplazamiento de visitas (3) y agendas especiales (3) para la convocatoria 177 - Caldas, solicitudes resueltas oportunamente.
8. A la fecha se presentan nueve (9) desistimientos a los recursos de financiamiento por un valor acumulado de \$ 694.864.148, los planes que presentan esta situación son: I) ID 74237 TE GUIO por valor de \$79.878.930 aprobado en el primer cierre, II) ID 74510 Agrícola San Miguel por valor de \$79.878.723 aprobado en el segundo cierre, III) ID 74507 D'LOUISE ACCESORIOS por valor de \$79.876.530 aprobado en el segundo cierre, IV) ID 74263 - TRIGO Y AROMAS por valor de \$79.879.010 aprobado en el tercer cierre, V) ID 74438 – NATIVA CASA RODANTE, por valor de \$70.224.239, aprobado en el tercer cierre, VI) ID 74508 – IBI LAB, por valor de \$79.877.639, aprobado en el segundo cierre, VII) ID 74930 CONFECCIONES CRISVAL por valor de \$79.600.460 aprobado en el cuarto cierre, VIII) ID 74498 – ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA por valor de \$ 79.002.140,00 aprobado en el sexto cierre y IX) ID 74316 – ASEPROA GOURMET por valor de \$66.646.477 aprobado en el quinto cierre.
9. Los planes de negocio con contratos de cooperación empresarial presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.342.431.133,70
10. En lo corrido del año 2024, en el proceso de interventoría se han recibido 1 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renunciaciones (0 abiertas y 0 cerradas).
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 177 no se han presentado pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de diciembre de 2024 se tiene un acumulado de 22 pagos rechazados de los cuales el 55% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 13% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 32% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2025

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no comprometidos en la convocatoria No. 177 por valor de \$58.499.161,20 por el ente adherente, más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 4.610.228,36, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9014_DICIEMBRE_2024
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 177



DAVIVIENDA



H.62

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9014

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 12 SENA-CALDAS-ANTIOQUIA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$67,358,842.52
Más Créditos	\$278,932.96
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$67,637,775.48
Saldo Promedio	\$67,358,842.52

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	\$ 278,932.96+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Diciembre 31 de 2024

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72300	CAFÉ CIELO ROTO	177	\$ 79.875.758,00	\$ 319.503,03	\$ 80.195.261,03	\$ 79.875.758,00	\$ 319.503,03	\$ 80.195.261,03	\$ -	\$ -	\$ -
74296	SIMETRIA Y ESPACIO	177	\$ 79.876.889,00	\$ 319.507,56	\$ 80.196.396,56	\$ 79.982.980,00	\$ 319.931,92	\$ 80.302.911,92	\$ 106.294,37	\$ 425,18	\$ -
74313	NOVA COWORKING	177	\$ 79.880.073,00	\$ 319.520,29	\$ 80.199.593,29	\$ 79.880.072,18	\$ 319.520,29	\$ 80.199.592,47	\$ -	\$ -	\$ -
73483	LENCERIA FANTASY LOVE	177-2	\$ 79.895.677,00	\$ 319.582,71	\$ 80.215.259,71	\$ 79.895.677,00	\$ 319.582,71	\$ 80.215.259,71	\$ -	\$ -	\$ -
74011	MALEBOLO	177-2	\$ 77.177.177,00	\$ 308.708,71	\$ 77.485.885,71	\$ 77.177.177,00	\$ 308.708,71	\$ 77.485.885,71	\$ -	\$ -	\$ -
74239	EL CELLER DEL DUC	177-2	\$ 79.880.073,00	\$ 319.520,29	\$ 80.199.593,29	\$ 79.880.072,55	\$ 319.520,29	\$ 80.199.592,84	\$ -	\$ -	\$ -
74262	AGROTURISMO LA JUANITA	177-2	\$ 79.999.998,00	\$ 319.999,99	\$ 80.319.997,99	\$ 77.289.181,00	\$ 309.156,72	\$ 77.598.337,72	\$ -	\$ -	\$ -
74314	CENTRO DE RELAJACION YA	177-2	\$ 79.883.326,00	\$ 319.533,30	\$ 80.202.859,30	\$ 79.883.326,00	\$ 319.533,30	\$ 80.202.859,30	\$ -	\$ -	\$ -
74507	D'LOUISE ACCESORIOS	177-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74508	IBI LAB	177-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
73188	MERY DESIGN	177-3	\$ 79.238.825,00	\$ 316.955,30	\$ 79.555.780,30	\$ 79.140.857,28	\$ 316.563,43	\$ 79.457.420,71	\$ -	\$ -	\$ -
74121	AMAN	177-3	\$ 79.880.073,00	\$ 319.520,29	\$ 80.199.593,29	\$ 79.856.126,00	\$ 319.424,50	\$ 80.175.550,50	\$ -	\$ -	\$ -
74235	BAÑO DE LUNA	177-3	\$ 79.002.674,00	\$ 316.010,70	\$ 79.318.684,70	\$ 74.788.868,00	\$ 299.155,47	\$ 75.088.023,47	\$ -	\$ -	\$ -
74263	TRIGO Y AROMAS	177-3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74311	LA CAMPESINA	177-3	\$ 79.881.926,00	\$ 319.527,70	\$ 80.201.453,70	\$ 79.483.699,00	\$ 317.934,80	\$ 79.801.633,80	\$ -	\$ -	\$ -
74438	NATIVA CASA RODANTE	177-3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74734	NATULANDA	177-3	\$ 79.535.192,00	\$ 318.140,77	\$ 79.853.332,77	\$ 79.535.192,00	\$ 318.140,77	\$ 79.853.332,77	\$ -	\$ -	\$ -
74316	ASEPROA GOURMET	177-5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64606	903 NINE ZERO THREE	177-4	\$ 79.999.548,00	\$ 319.998,19	\$ 80.319.546,19	\$ 79.893.481,04	\$ 319.573,92	\$ 80.213.054,96	\$ -	\$ -	\$ -
74282	EL MERCADITO DE ELI	177-4	\$ 79.884.274,00	\$ 319.537,10	\$ 80.203.811,10	\$ 79.884.274,00	\$ 319.537,10	\$ 80.203.811,10	\$ -	\$ -	\$ -
74505	D&M LA FÁBRICA	177-4	\$ 79.879.750,00	\$ 319.519,00	\$ 80.199.269,00	\$ 76.174.321,02	\$ 304.697,28	\$ 76.479.018,30	\$ -	\$ -	\$ -
74671	3DOGS	177-4	\$ 79.980.864,00	\$ 319.923,46	\$ 80.300.787,46	\$ 79.916.366,00	\$ 319.665,46	\$ 80.236.031,46	\$ -	\$ -	\$ -
74498	ECO-MEZCLADORES ANTIO	177-6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1.353.752.097,00	\$ 5.415.008,39	\$ 1.359.167.105,39	\$ 1.342.537.428,07	\$ 5.370.149,70	\$ 1.347.907.577,77	\$ 106.294,37	\$ 425,18	\$ -

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72300
Plan de Negocios:	CAFÉ CIELO ROTO
Convocatoria	177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario	NANCY ROCIO JARAMILLO ARANGO
Cedula	43628685
No. Contrato	275-177-2021
Valor Contrato	\$79.875.758, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CAFE CIELO ROTO S.A.S.
Nit	901.494.108-4
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ASÍS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio	7/12/2021
Segunda visita	10/29/2021
Tercera visita	2/28/2022
Cuarta visita	7/22/2022
Prorroga	
Fecha finalización	7/12/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	11	13	118%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6732	2103	31%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$247.536.000, 00	\$112.283.379, 00	45,36%	\$79.875.758, 00	\$79.875.758, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74296
Plan de Negocios:	SIMETRIA Y ESPACIO
Convocatoria	177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario	GISELL STEFANNY ISAZA MOSQUERA
Cedula	1039474512
No. Contrato	277-177-2021
Valor Contrato	\$79.876.889, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	SIMETRÍA Y ESPACIO CONSTRUCTORA SAS
Nit	901.500.092-1
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ASÍS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio	7/26/2021
Segunda visita	11/23/2021
Tercera visita	3/23/2022
Cuarta visita	8/3/2022
Prorroga	
Fecha finalización	7/26/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	9	12	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	130	14	11%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$170.000.000, 00	\$40.655.560, 00	23,92%	\$79.876.889, 00	\$79.876.685,63 0	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74313
Plan de Negocios:	NOVA COWORKING
Convocatoria	177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario	SARA BURITICÁ MEJÍA
Cedula	1026139346
No. Contrato	278-177-2021
Valor Contrato	\$79.880.073, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NOVA COWORKING SAS
Nit	901.500.292-8
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ASÍS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio	7/27/2021
Segunda visita	11/24/2021
Tercera visita	3/24/2022
Cuarta visita	8/2/2022
Prorroga	
Fecha finalización	7/27/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	5100	2126	42%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$68.607.160, 00	\$26.110.599, 00	38,06%	\$79.880.073, 00	\$79.880.072,180	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74237
Plan de Negocios:	TE GUIO
Convocatoria	177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario	JULIAN VANEGAS LOPEZ
Cedula	1001420947
No. Contrato	276-177-2021
Valor Contrato	\$79.878.930, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
9	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.878.930, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 1 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73483
Plan de Negocios:	LENCERIA FANTASY LOVE
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	DURLEY ELENA BELTRAN GOMEZ
Cedula	43593654
No. Contrato	307-177-2021
Valor Contrato	\$79.895.677, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LENCERÍA FANTASY LOVE SAS
Nit	901.505.457-9
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	8/12/2021
Segunda visita	12/9/2021
Tercera visita	4/18/2022
Cuarta visita	8/17/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/12/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	9	150%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	3700	1034	28%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$173.700.000, 00	\$9.071.370, 00	5,22%	\$79.895.677, 00	\$79.895.677, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74011
Plan de Negocios:	MALEBOLO
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	MICHELL BALLESTAS FERNANDEZ
Cedula	71362501
No. Contrato	308-177-2021
Valor Contrato	\$77.177.177, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MALEBOLO SAS
Nit	901.504.386-1
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	8/12/2021
Segunda visita	12/10/2021
Tercera visita	4/19/2022
Cuarta visita	8/18/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/12/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	5	8	160%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	8	160%	6830	3005	44%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$253.100.000, 00	\$8.668.559, 00	3,42%	\$77.177.177, 00	\$77.177.177, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74239
Plan de Negocios:	EL CELLER DEL DUC
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	VIRGINIA DEL CARMEN GONZÁLEZ ALMANZA
Cedula	1027942107
No. Contrato	309-177-2021
Valor Contrato	\$79.880.073, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EL CELLER DEL DUC S.A.S
Nit	901.512.525-0
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/9/2021
Segunda visita	1/19/2022
Tercera visita	5/12/2022
Cuarta visita	9/26/2022
Prorroga	4
Fecha finalización	1/9/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	42000	12663	30%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.000.000, 00	\$176.755.900, 00	89,27%	\$79.880.073, 00	\$79.880.072,55 0	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74262
Plan de Negocios:	AGROTURISMO LA JUANITA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	SANTIAGO CANO MAYA
Cedula	1026157402
No. Contrato	310-177-2021
Valor Contrato	\$79.999.998, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGROTURISMO LA JUANITA S.A.S
Nit	901.509.628-1
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/6/2021
Segunda visita	1/20/2022
Tercera visita	5/13/2022
Cuarta visita	10/14/2022
Prorroga	1
Fecha finalización	10/6/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	13	14	108%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	1368	55	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$125.145.000, 00	\$4.445.378, 00	3,55%	\$79.999.998, 00	\$77.289.181, 00	96,61%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74314
Plan de Negocios:	CENTRO DE RELAJACION YANTRA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	LUZ ANDREA TANGARIFE CASTRILLON
Cedula	43687210
No. Contrato	311-177-2021
Valor Contrato	\$79.883.326, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CENTRO DE RELAJACIÓN YANTRA S.A.S.
Nit	901.511.898-8
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/25/2021
Segunda visita	1/27/2022
Tercera visita	5/3/2022
Cuarta visita	8/26/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/25/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	14	14	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	1555	241	15%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$122.600.000, 00	\$14.422.640, 00	11,76%	\$79.883.326, 00	\$79.883.326, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74508
Plan de Negocios:	IBI LAB
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	BRYAND VÉLEZ HOLGUÍN
Cedula	1037637591
No. Contrato	313-177-2021
Valor Contrato	\$79.877.639, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	IBI LAB SAS
Nit	901.514.472-8
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/6/2021
Segunda visita	1/21/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/6/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	24	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$167.500.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.877.639, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74507
Plan de Negocios:	D'LOUISE ACCESORIOS
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	LUISA FERNANDA SISQUIARCO TABORDA
Cedula	1026154268
No. Contrato	312-177-2021
Valor Contrato	\$79.876.530, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.876.530, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74510
Plan de Negocios:	AGRÍCOLA SAN MIGUEL
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ
Cedula	8071683
No. Contrato	314-177-2021
Valor Contrato	\$79.878.723, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.878.723, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73188
Plan de Negocios:	MERY DESIGN
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	JOHNY ALEXANDER HOLGUIN ACEVEDO
Cedula	1020393013
No. Contrato	364-177-2021
Valor Contrato	\$79.238.825, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CF MERY DESIGN S.A.S.
Nit	901.527.552-5
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/21/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	11/2/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	23700	8459	36%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$257.670.000, 00	\$14.779.821, 00	5,74%	\$79.238.825, 00	\$79.140.857,28 0	99,88%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74121
Plan de Negocios:	AMAN
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	DANIELA CASTRO MARÍN
Cedula	1037597865
No. Contrato	365-177-2021
Valor Contrato	\$79.880.073, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	A-MAN SAS
Nit	901.554.138-3
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	1/19/2022
Segunda visita	5/12/2022
Tercera visita	9/12/2022
Cuarta visita	2/2/2023
Prorroga	
Fecha finalización	1/19/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	850	204	24%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.400.000, 00	\$20.456.072, 00	14,67%	\$79.880.073, 00	\$79.856.126, 00	99,97%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74235
Plan de Negocios:	BAÑO DE LUNA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	YULY MABEL GÓMEZ BEDOYA
Cedula	1026132418
No. Contrato	366-177-2021
Valor Contrato	\$79.002.674, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HIERBAS DE LUNA SAS
Nit	901.536.165-6
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	11/10/2021
Segunda visita	2/28/2022
Tercera visita	8/10/2022
Cuarta visita	11/17/2022
Prorroga	4
Fecha finalización	3/10/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	9	129%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	10400	3551	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$156.750.000, 00	\$3.979.923, 00	2,54%	\$79.002.674, 00	\$74.788.868, 00	94,67%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74311
Plan de Negocios:	LA CAMPESINA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	CAMILA GONZALEZ GIRALDO
Cedula	1026162020
No. Contrato	368-177-2021
Valor Contrato	\$79.881.926, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LA CAMPESINA FRUTAL SAS
Nit	901.528.243-9
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	11/4/2021
Segunda visita	3/1/2022
Tercera visita	7/15/2022
Cuarta visita	11/11/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/4/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	9485	1900	20%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$178.210.000, 00	\$5.533.323, 00	3,1%	\$79.881.926, 00	\$79.483.699, 00	99,5%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74734
Plan de Negocios:	NATULANDA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	DANIELA ZULUAGA TORO
Cedula	1026143081
No. Contrato	370-177-2021
Valor Contrato	\$79.535.192, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NATULANDA S.A.S
Nit	901.583.977-1
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	4/20/2022
Segunda visita	8/31/2022
Tercera visita	12/28/2022
Cuarta visita	5/4/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	11128	331	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$183.162.500, 00	\$32.988.470, 00	18,01%	\$79.535.192, 00	\$79.535.192, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74263
Plan de Negocios:	TRIGO Y AROMAS
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	OSCAR DANIEL ACEVEDO HERNÁNDEZ
Cedula	1026150362
No. Contrato	367-177-2021
Valor Contrato	\$79.879.010, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.879.010, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74438
Plan de Negocios:	NATIVA CASA RODANTE
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario	NATALY GÓMEZ GARCÍA
Cedula	1035850717
No. Contrato	369-177-2021
Valor Contrato	\$70.224.239, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
3	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$70.224.239, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	64606
Plan de Negocios:	903 NINE ZERO THREE
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario	CARLOS AUGUSTO CUARTAS PEREZ
Cedula	71337057
No. Contrato	543-177-2022
Valor Contrato	\$79.999.548, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NINE ZERO THREE S.A.S.
Nit	901.694.243-9
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	3/28/2023
Segunda visita	7/27/2023
Tercera visita	12/5/2023
Cuarta visita	4/1/2024
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2024

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	8	133%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	8	133%	1840	100	5%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$227.800.000, 00	\$6.915.968, 00	3,04%	\$79.999.548, 00	\$79.893.481,04 0	99,87%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74282
Plan de Negocios:	EL MERCADITO DE ELI
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario	MARIANA JARAMILLO DUQUE
Cedula	1039457332
No. Contrato	544-177-2022
Valor Contrato	\$79.884.274, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ORGÁNICOS TIERRA SANA S.A.S.
Nit	901.697.736-1
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	4/11/2023
Segunda visita	8/28/2023
Tercera visita	12/21/2023
Cuarta visita	4/22/2024
Prorroga	
Fecha finalización	4/11/2024

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	6	86%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	20050	8864	44%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$110.774.500, 00	\$65.649.828, 00	59,26%	\$79.884.274, 00	\$79.884.274, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74505
Plan de Negocios:	D&M LA FÁBRICA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario	ROBERT ALBERTO PUELLO PÁEZ
Cedula	3743081
No. Contrato	545-177-2022
Valor Contrato	\$79.879.750, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MOBBLO S.A.S.
Nit	901.709.430-7
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	5/11/2023
Segunda visita	8/29/2023
Tercera visita	12/21/2023
Cuarta visita	5/20/2024
Prorroga	
Fecha finalización	5/11/2024

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	490	15	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$221.168.750, 00	\$7.567.151, 00	3,42%	\$79.879.750, 00	\$76.174.321,02 0	95,36%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74671
Plan de Negocios:	3DOGS
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario	LINA MARCELA LOPERA FERNANDEZ
Cedula	43280084
No. Contrato	546-177-2022
Valor Contrato	\$79.980.864, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	3DOGS S.A.S.
Nit	901.694.218-4
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	3/30/2023
Segunda visita	7/27/2023
Tercera visita	11/23/2023
Cuarta visita	4/2/2024
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2024

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	1870	205	11%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$213.500.000, 00	\$6.352.941, 00	2,98%	\$79.980.864, 00	\$79.916.366, 00	99,92%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74930
Plan de Negocios:	CONFECCIONES CRISVAL
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario	JORGE ANDRES GARCIA GOMEZ
Cedula	71397559
No. Contrato	547-177-2022
Valor Contrato	\$79.600.460, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4		0,0%			0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
		0,0%			0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
		0,0%	\$79.600.460, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -5 Cierre - 5

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74316
Plan de Negocios:	ASEPROA GOURMET
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -5 Cierre
Beneficiario	NATALIA VELEZ CARDONA
Cedula	32151283
No. Contrato	557-177-2022
Valor Contrato	\$66.646.477, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	MEVAK ALIMENTACIÓN CON SENTIDO S.A.S.
Nit	901.736.638-6
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	8/3/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/3/2024

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
3	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	8075	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.862.500, 00	\$,000	0,0%	\$66.646.477, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -6 Cierre - 6

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74498
Plan de Negocios:	ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA
Convocatoria	177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -6 Cierre
Beneficiario	MANUELA GUTIÉRREZ CARRASQUILLA
Cedula	1234988511
No. Contrato	569-177-2022
Valor Contrato	\$79.002.140, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA S.A.S.
Nit	901.707.147-8
Ciudad	Caldas
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	5/5/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/5/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	6	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	0	0,0%	45200	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$227.168.750, 00	\$,000	0,0%	\$79.002.140, 00	\$,000	0,0%
