



Informe de Gestión No. 49
Adhesión No. 17 Gramalote Colombia Limited
Período del 01 al 31 de diciembre del 2024

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Diciembre 31 de 2024

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria.....	5
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación	7
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación.....	8
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor	14
CONCLUSIONES Y RETOS.....	14
ANEXOS.....	16

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, de la Adhesión No. 17; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de diciembre de 2024, de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Gramalote Colombia Limited, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de diciembre de 2024, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor). Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por

el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de diciembre del año 2024.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

Número de Adhesión	17	Entidad Adherente	Gramalote Colombia Limited
Fecha de Inicio	15/12/2020		
Duración	Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.492.265.100		
Valor Aporte SENA	\$746.132.550		
Valor Aporte Aliado	\$746.132.550		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Juan Felipe Gómez		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Juan Felipe Gómez		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Profesional Senior de Sostenibilidad. Gramalote Colombia Limited		
Número Telefónico o Celular	3107916982	Correo Electrónico	felipe.gomez@gramalote.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de diciembre, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para la adhesión No. 17.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del para el manejo de los recursos se presentan a continuación (Ver anexo 1. EXTRACTO_DAV_9097_DICIEMBRE_2024).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

No. Convocatoria	185
Recursos SENA	\$ 746.132.550
Recursos Adherente	\$ 746.132.550
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.492.265.100
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.651.535.918
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 226.273.537
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 67.002.719
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.425.262.381
Valor Reintegro Aliado.	\$ 33.501.359
Fecha de Reintegro	2/10/2024

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	\$ 712.631.190,50
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 712.631.190,50
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.425.262.381,00
Ejecución recursos SENA	\$ 683.478.667,05
Ejecución recursos Adherente	\$ 683.478.667,05
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.366.957.334,10

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.


Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9097
Saldo Total en Bancos	\$ 29.858.908,22
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 5.081.623,05
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$4.375.240,50

Cabe mencionar que de los rendimientos financieros en fiducia generados por los recursos aportados por la entidad Gramalote Colombia Limited, \$629.416,00 y \$3.745.824,50 fueron reintegrados el 09 de febrero de 2023 y 02 de octubre de 2024 por la Universidad Nacional de Colombia por concepto de rendimientos financieros.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 185 perteneciente a Gramalote Colombia Limited, se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.425.262.381 equivalente al 95,51% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$67.002.719 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.366.957.334,10, equivalentes al 95,91% de los recursos comprometidos y 91,60% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

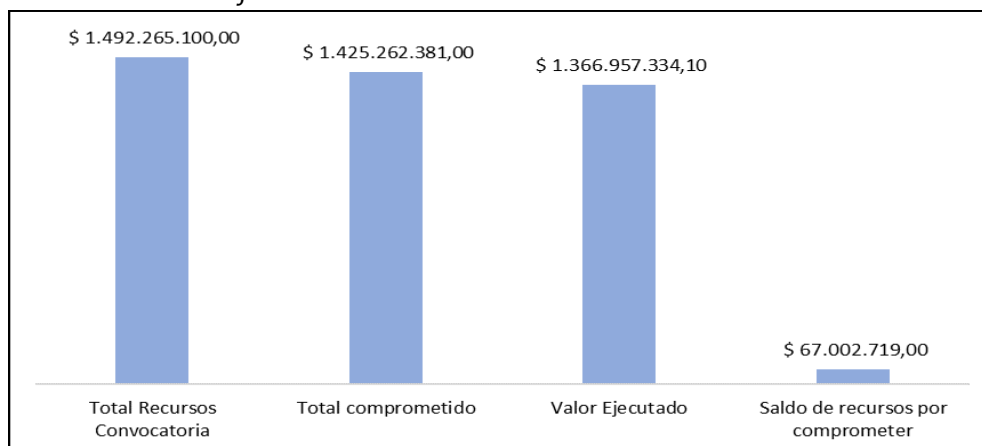

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Prevía solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices

establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de septiembre de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 185 específica para Gramalote cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en la dirección <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1852020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

Número de Convocatoria	185		
Fecha de Lanzamiento	09/02/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	09/02/2021	Fecha de Cierre	10/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/03/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	10/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	18/07/2021	Fecha de cierre No 4	18/11/2021

Durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad en el presente informe se relacionan los resultados del proceso de acreditación.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

Número de Convocatoria				185			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/02/2021		Fecha de Cierre		10/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/03/21	Número de Planes Formalizados	9	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	78%
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/03/2021		Fecha de Cierre		10/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/05/21	Número de Planes Formalizados	16	Número de Planes Acreditados	14	% de Acreditación	88%
Corte No. 3	Fecha Apertura		11/05/2021		Fecha de Cierre		18/07/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	29/07/21	Número de Planes Formalizados	14	Número de Planes Acreditados	13	% de Acreditación	93%

Corte No. 4	Fecha Apertura		02//11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/11/21	Número de Planes Formalizados	3	Número de Planes Acreditados	3	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a continuación, se presentan las generalidades y resultados del proceso de evaluación de la convocatoria 185.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 17 suscrita con Gramalote Colombia Limited.

Número de Convocatoria			185				
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/02/2021		Fecha de Cierre		10/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	12/04/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	50%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	\$239.902.479
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/03/2021		Fecha de Cierre		10/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	07/06/21	Número de Planes Evaluados	14	Número de Planes Viabilizados	9	% de Viabilización	64%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	\$718.854.994
Corte No. 3	Fecha Apertura		11/05/2021		Fecha de Cierre		18/07/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	13/08/21	Número de Planes Evaluados	13	Número de Planes Viabilizados	7	% de Viabilización	53%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	7	Valor Planes a Financiar	\$559.679.087
Corte No. 4	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021

Fecha de Publicación Final Evaluación	03/12/21	Número de Planes Evaluados	3	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	66.6%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	\$133.099.358

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de diciembre de 2024, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de diciembre de 2024 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 185, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 185.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 185 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72882	341-185-2021	CULTIVOS HIDROVIDA			\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	70675	340-185-2021	MAMASANTA	23/08/2021	23/08/2022	\$79.952.191	80,00%	120,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	73703	342-185-2021	CREATRONICOS	17/08/2021	17/08/2022	\$79.950.288	175,00%	120,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo corte

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 185 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74475	405-185-2021	APICOLA CAMPO ALEGRE	N/A	N/A	\$79.951.139	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	67696	402-185-2021	ALIZAFIRO	29/10/2021	29/10/2022	\$79.950.154	14,29%	0,00%	100,00%	99,93%	TERMINADO
3	74406	403-185-2021	G2VESTIDOS	29/10/2021	29/10/2022	\$79.950.143	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74439	404-185-2021	DOMATIC INMOBILIARIA	11/11/2021	11/11/2022	\$79.949.247	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74687	406-185-2021	ECO HOTEL ALDEA DEL NARE	2/11/2021	2/11/2022	\$79.950.154	85,71%	100,00%	100,00%	99,37%	TERMINADO
6	74713	407-185-2021	EL JARDIN DE LA MIEL	5/11/2021	5/11/2022	\$79.372.488	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	TERMINADO
7	74714	408-185-2021	AVICOLA MAXI SUPER.	8/11/2021	8/11/2022	\$79.834.279	0,00%	0,00%	60,00%	52,48%	TERMINADO
8	74724	409-185-2021	AREPAS DH	2/11/2021	2/11/2022	\$79.947.390	100,00%	100,00%	100,00%	89,15%	TERMINADO
9	74751	410-185-2021	ADEGOSS	3/11/2021	3/11/2022	\$79.950.000	100,00%	100,00%	100,00%	86,76%	TERMINADO


Planes de negocio tercer corte

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la CV 185 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72404	428-185-2021	CANTERO CACAO	31/01/2022	31/01/2023	\$79.954.010	100,00%	100,00%	120,00%	100,00%	TERMINADO
2	72790	429-185-2021	CUBO	27/01/2022	27/01/2023	\$79.949.554	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74404	430-185-2021	CANNATE	28/01/2022	28/05/2023	\$79.954.537	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74413	431-185-2021	AREPAS KMY	18/01/2022	18/03/2023	\$79.948.314	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74443	432-185-2021	ECOSOS	19/01/2022	19/05/2023	\$79.950.599	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	74462	433-185-2021	LA TIERRA PROMETIDA	20/01/2022	20/01/2023	\$79.968.044	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	74476	434-185-2021	CISNES DISEÑO Y CONFECCIÓN	21/01/2022	21/01/2023	\$79.954.029	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 2. Cumplimiento de indicadores CV 185 3C.

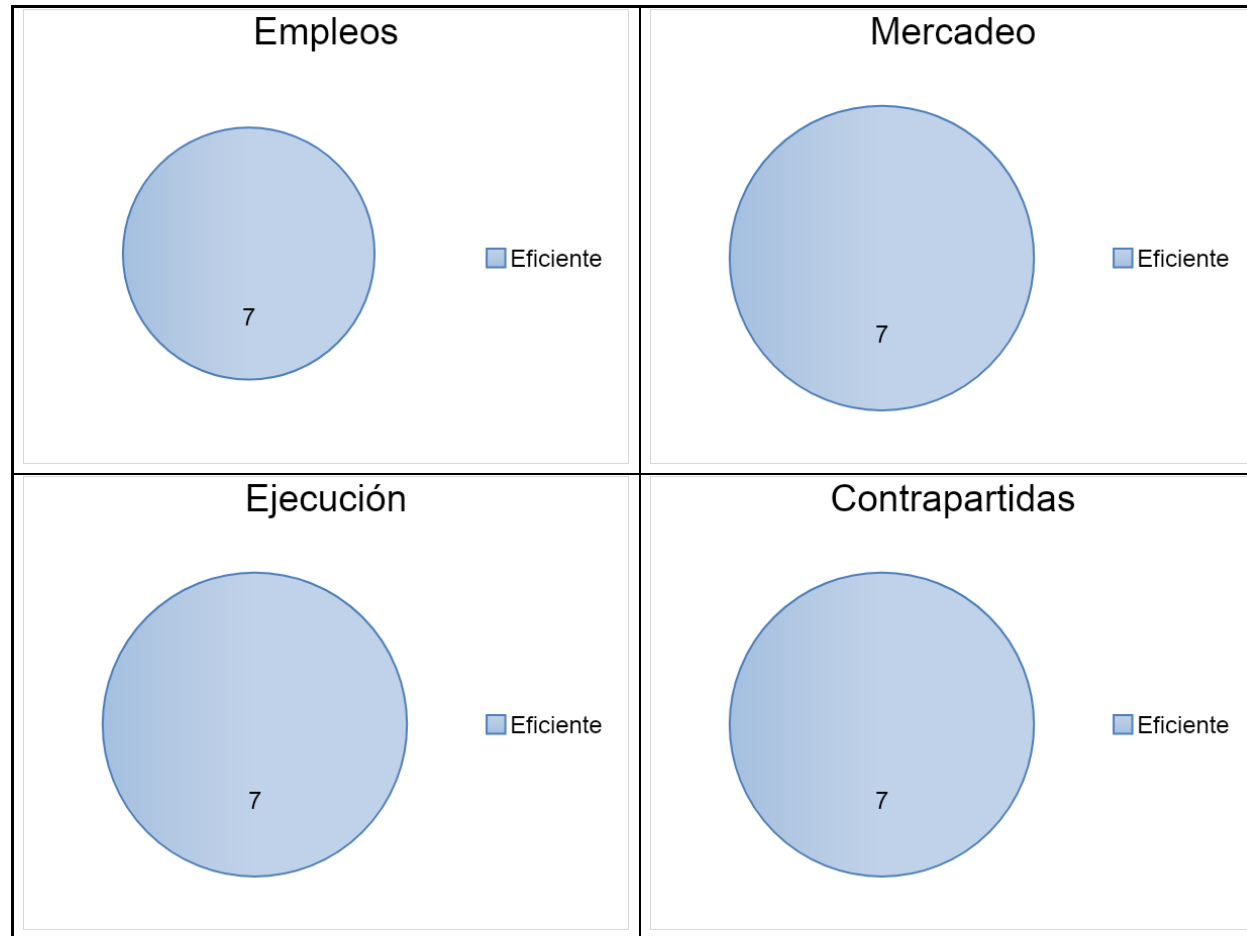

Planes de negocio cuarto corte

Tabla 11. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la CV 185 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78130	525-185-2022	FINCA HOTEL LAS ACACIAS	N/A	N/A	\$66.322.398	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	74484	524-185-2022	ECOREFUGIO ALICANTE	18/04/2022	18/04/2023	\$66.776.960	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 18 planes de negocio, los cuales se relacionan en la tabla 12.

Tabla 12. Estado de los planes de negocio entregados al SENA

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	67696	ALIZAFIRO	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.891.987
2	70675	MAMASANTA	TERMINADO	23/12/2022	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 79.952.183
3	72404	CANTERO CACAO	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.954.010
4	72790	CUBO	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.947.730
5	73703	CREATRONICOS	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 79.950.288
6	74404	CANNATE	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 79.954.537
7	74406	G2VESTIDOS	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 79.950.142
8	74413	AREPAS KMY	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.948.314
9	74439	DOMATIC INMOBILIARIA	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 79.949.247
10	74443	ECOSOS	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.950.599
11	74462	LA TIERRA PROMETIDA	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.968.044
12	74476	CISNES DISEÑO Y CONFECCIÓN	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 79.954.029
13	74484	ECOREFUGIO ALICANTE	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 66.776.960
14	74687	ECO HOTEL ALDEA DEL NARE	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 79.450.153
15	74713	EL JARDIN DE LA MIEL	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 79.278.086
16	74714	AVICOLA MAXI SUPER.	TERMINADO	13/10/2023	NO CONDONACIÓN	NO CONDONADO	1-02810-2023	\$ 41.896.179
17	74724	AREPAS DH	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 70.823.362
18	74751	ADEGOSS	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 69.361.484

Con relación a los planes de negocio condonados mediante las resoluciones No. 1-1752 del 01 de septiembre de 2023 y 1-2313 del 15 de diciembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial. Frente a los planes de negocio condonados mediante las resoluciones No. 1-02808 y 1-02809 del 29 de diciembre de 2023, es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para ciento veintiséis (126) contratos de cooperación empresarial.

Finalmente, para los planes de negocio correspondientes a la resolución 1-2122 del 23 de agosto de 2024, se informa al adherente que, el equipo del proyecto UNAL 2020 adelanta las gestiones para el cierre contractual de los expedientes de los contratos de cooperación empresarial condonados mediante el acto administrativo mencionado conforme las actividades previstas en el protocolo de liquidaciones del Fondo Emprender .

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 14 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 185, la cual resume los aspectos de mayor interés de la convocatoria. Los criterios definidos en esta ficha se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.

Tabla 13. Ficha técnica convocatoria 185 - Gramalote Colombia Limited.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 1.492.265.100,00
Número total de planes formalizados	42
Número total de planes acreditados	36
Número total de planes viables	21
Número de planes financiables	21
Número de planes aprobados en CDN	21
Total recursos aprobados en CDN	\$ 1.651.535.918,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	3
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 226.273.537,00
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ 0
Total recursos comprometidos	\$ 1.425.262.381,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 67.002.719,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.366.957.334,10

A continuación, se presenta de manera gráfica el estado de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 3. Estado de los planes de negocio entregados al SENA

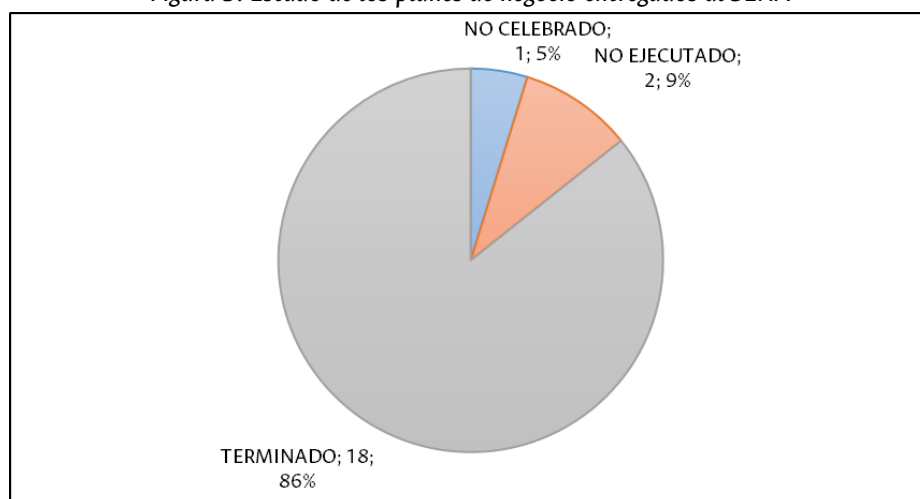

Para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 185.

Conclusiones generales del período del 01 al 31 de diciembre de 2024

La Convocatoria 185 – Fondo Emprender, tuvo su cierre el 10/03/2021, donde se formalizaron 9 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1, acreditó 7 de los 9 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 78% de acreditación.

1. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 185 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabiliza 3 de 6 planes de negocios evaluados, para un desempeño del 50%. Se aprobaron para financiación en el primer corte de la Convocatoria 185, 3 planes de negocio, por valor de \$239.902.479.
2. En el Corte No. 2 de la convocatoria se efectuó el 10/05/2021 en donde se formalizaron 16 planes de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 185, acreditó 14 de los 16 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 185 – Fondo Emprender, viabilizó 9 de 14 planes de negocios, para un desempeño del 64%. Para el Corte No. 2 de la convocatoria, se aprobó la financiación de 9 planes de negocios por un valor de \$718.854.994.
4. El corte No. 3 de la convocatoria 185 se realizó el 18/07/2021, donde se formalizaron 14 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 185 acreditó 13 de los 14 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 93% de acreditación.
5. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 185 – Fondo Emprender, viabilizó 7 de los 13 planes acreditados, para un desempeño del 53%. Se aprobaron para financiación en el corte No. 3 de la convocatoria No. 185, 7 planes de negocio por valor de \$559.679.087.
6. El corte No. 4 de la convocatoria 185 se realizó el 18/11/2021, donde se formalizaron 3 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la Convocatoria 185 acreditó 3 de los 3 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
7. El proceso de evaluación del corte No. 4 de la convocatoria 185 viabilizó 2 de los tres planes evaluados para un desempeño del 66,7%. Se aprobaron para financiación en el corte No. 4 de la convocatoria No. 185, 2 planes de negocio por valor de \$133.099.358.
8. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 40 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (16), agendas especiales (12), prórrogas (9) e informes y conceptos (3) para la convocatoria 185 – Gramalote, solicitudes resueltas oportunamente.
9. A la fecha la convocatoria presenta (3) solicitudes de desistimiento por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento de los planes identificados con los ID 72882 - CULTIVOS HIDROVIDA, ID 74475 – APICOLA CAMPO ALEGRE e ID 78130 FINCA HOTEL LAS ACACIAS estos desistimientos suman un total \$226.273.537.
10. Actualmente se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.425.262.381, quedando un saldo por comprometer de \$ 67.002.719,00
11. Se tienen 18 planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 185 que se encuentran terminados.
12. A la fecha del presente informe los planes de negocio presentan una ejecución acumulada de \$1.366.957.334,10.
13. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma

se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o el SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.

14. Para el año 2023, en el proceso de interventoría se recibieron 24 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 3 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 3 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 10 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 4 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 2 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 2 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
15. En lo corrido del año 2024, en el proceso de interventoría se han recibido 1 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 0 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
16. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 185 no se han presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de diciembre de 2024 se tiene un acumulado de 22 pagos rechazados de los cuales el 27% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 41% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 31% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2025

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$706.382,55, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9097_DICIEMBRE_2024
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 185



DAVIVIENDA



H.67

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9097

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GESTOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$29,735,772.39
Más Créditos	\$123,135.83
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$29,858,908.22
Saldo Promedio	\$29,735,772.39

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	\$ 123,135.83+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Diciembre 31 de 2024

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
70675	MAMASANTA	185	\$ 79.952.191,00	\$ 319.808,76	\$ 80.271.999,76	\$ 79.952.182,59	\$ 319.808,73	\$ 80.271.991,32	\$ -	\$ -	\$ -
73703	CREATRONICOS	185	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ 79.950.288,00	\$ 319.801,15	\$ 80.270.089,15	\$ -	\$ -	\$ -
67696	ALIZAFIRO	185-2	\$ 79.950.154,00	\$ 319.800,62	\$ 80.269.954,62	\$ 79.891.986,94	\$ 319.567,95	\$ 80.211.554,89	\$ -	\$ -	\$ -
74406	G2VESTIDOS	185-2	\$ 79.950.143,00	\$ 319.800,57	\$ 80.269.943,57	\$ 79.950.142,25	\$ 319.800,57	\$ 80.269.942,82	\$ -	\$ -	\$ -
74439	DOMATIC INMOBILIARIA	185-2	\$ 79.949.247,00	\$ 319.796,99	\$ 80.269.043,99	\$ 79.949.247,00	\$ 319.796,99	\$ 80.269.043,99	\$ -	\$ -	\$ -
74687	ECO HOTEL ALDEA DEL NAI	185-2	\$ 79.950.154,00	\$ 319.800,62	\$ 80.269.954,62	\$ 79.450.153,32	\$ 317.800,61	\$ 79.767.953,93	\$ -	\$ -	\$ -
74713	EL JARDIN DE LA MIEL	185-2	\$ 79.372.488,00	\$ 317.489,95	\$ 79.689.977,95	\$ 79.278.086,00	\$ 317.112,34	\$ 79.595.198,34	\$ -	\$ -	\$ -
74714	AVICOLA MAXI SUPER.	185-2	\$ 79.834.279,00	\$ 319.337,12	\$ 80.153.616,12	\$ 41.896.179,00	\$ 167.584,72	\$ 42.063.763,72	\$ -	\$ -	\$ -
74724	AREPAS DH	185-2	\$ 79.947.390,00	\$ 319.789,56	\$ 80.267.179,56	\$ 71.269.612,00	\$ 285.078,45	\$ 71.554.690,45	\$ 446.250,00	\$ 1.785,00	\$ -
74751	ADEGOSS	185-2	\$ 79.950.000,00	\$ 319.800,00	\$ 80.269.800,00	\$ 69.361.484,00	\$ 277.445,94	\$ 69.638.929,94	\$ -	\$ -	\$ -
72404	CANTERO CACAO	185-3	\$ 79.954.010,00	\$ 319.816,04	\$ 80.273.826,04	\$ 79.954.010,00	\$ 319.816,04	\$ 80.273.826,04	\$ -	\$ -	\$ -
72790	CUBO	185-3	\$ 79.949.554,00	\$ 319.798,22	\$ 80.269.352,22	\$ 79.947.730,00	\$ 319.790,92	\$ 80.267.520,92	\$ -	\$ -	\$ -
74404	CANNATE	185-3	\$ 79.954.537,00	\$ 319.818,15	\$ 80.274.355,15	\$ 96.754.528,60	\$ 387.018,11	\$ 97.141.546,71	\$ 16.799.991,60	\$ 67.199,97	\$ -
74413	AREPAS KMY	185-3	\$ 79.948.314,00	\$ 319.793,26	\$ 80.268.107,26	\$ 79.948.314,00	\$ 319.793,26	\$ 80.268.107,26	\$ -	\$ -	\$ -
74443	ECOSOS	185-3	\$ 79.950.599,00	\$ 319.802,40	\$ 80.270.401,40	\$ 79.950.599,00	\$ 319.802,40	\$ 80.270.401,40	\$ -	\$ -	\$ -
74462	LA TIERRA PROMETIDA	185-3	\$ 79.968.044,00	\$ 319.872,18	\$ 80.287.916,18	\$ 79.968.044,00	\$ 319.872,18	\$ 80.287.916,18	\$ -	\$ -	\$ -
74476	CISNES DISEÑO Y CONFECO	185-3	\$ 79.954.029,00	\$ 319.816,12	\$ 80.273.845,12	\$ 79.954.029,00	\$ 319.816,12	\$ 80.273.845,12	\$ -	\$ -	\$ -
74484	ECOREFUGIO ALICANTE	185-4	\$ 66.776.960,00	\$ 267.107,84	\$ 67.044.067,84	\$ 66.776.960,00	\$ 267.107,84	\$ 67.044.067,84	\$ -	\$ -	\$ -
78130	FINCA HOTEL LAS ACACIAS	185-4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1.425.262.381,00	\$ 5.701.049,55	\$ 1.430.963.430,55	\$ 1.384.203.575,70	\$ 5.536.814,32	\$ 1.389.740.390,02	\$ 17.246.241,60	\$ 68.984,97	\$ -

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	70675
Plan de Negocios:	MAMASANTA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JORGE MARIO BETANCUR ARIAS
Cedula	8103742
No. Contrato	340-185-2021
Valor Contrato	\$79.952.191, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS MAMASANTA SAS
Nit	901.511.312-4
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	8/23/2021
Segunda visita	12/2/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	8/23/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/23/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	5	6	120%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	3000	179	6%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$100.000.000, 00	\$4.185.000, 00	4,18%	\$79.952.191, 00	\$79.952.182,59 0	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73703
Plan de Negocios:	CREATRONICOS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JONATHAN ALEXANDER SÁNCHEZ RESTREPO
Cedula	1039760169
No. Contrato	342-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.288, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CREATRONICOS S.A.S
Nit	901.510.342-0
Ciudad	Yolombo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	8/17/2021
Segunda visita	12/14/2021
Tercera visita	4/21/2022
Cuarta visita	8/22/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/17/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	7	175%	5	6	120%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6150	2729	44%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$124.500.030, 00	\$13.964.339, 00	11,22%	\$79.950.288, 00	\$79.950.288, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72882
Plan de Negocios:	CULTIVOS HIDROVIDA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	YEISON STIVEN MEJIA EUSSE
Cedula	1020458675
No. Contrato	341-185-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	67696
Plan de Negocios:	ALIZAFIRO
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	RICARDO VALENCIA NARANJO
Cedula	3415411
No. Contrato	402-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.154, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRUPO EMPRESARIAL ALIZAFIRO S.A.S
Nit	901.532.557-1
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	6/17/2022
Cuarta visita	12/30/2022
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	6	86%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1255	426	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$144.551.500, 00	\$32.973.120, 00	22,81%	\$79.950.154, 00	\$79.891.986,94 0	99,93%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74406
Plan de Negocios:	G2VESTIDOS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	LORENA ESTEFANY ZULUAGA MÁRQUEZ
Cedula	1037500301
No. Contrato	403-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.143, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	G2V COMPANY S.A.S
Nit	901.533.527-5
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/23/2022
Tercera visita	6/21/2022
Cuarta visita	11/2/2022
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2520	2067	82%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$155.150.000, 00	\$49.411.060, 00	31,85%	\$79.950.143, 00	\$79.950.142,25 0	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74439
Plan de Negocios:	DOMATIC INMOBILIARIA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NICOLE RIVERA PARRA
Cedula	1037667562
No. Contrato	404-185-2021
Valor Contrato	\$79.949.247, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DOMATIC SAS
Nit	901.537.988-5
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FLÓREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/10/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	11/29/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	239	8	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$267.694.000, 00	\$10.450.000, 00	3,9%	\$79.949.247, 00	\$79.949.247, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74687
Plan de Negocios:	ECO HOTEL ALDEA DEL NARE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NATALIA VALENCIA NARANJO
Cedula	43870519
No. Contrato	406-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.154, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ALDEA DEL NARE S.A.S
Nit	901.532.558-9
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	6/17/2022
Cuarta visita	11/3/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	6	86%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	136	5	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$49.670.000, 00	\$6.800.000, 00	13,69%	\$79.950.154, 00	\$79.450.153,320	99,37%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74713
Plan de Negocios:	EL JARDIN DE LA MIEL
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	DIANA JANET GARZON GAVIRIA
Cedula	42683977
No. Contrato	407-185-2021
Valor Contrato	\$79.372.488, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EL JARDIN DE LA MIEL SAS
Nit	901.536.647-4
Ciudad	Maceo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/4/2022
Tercera visita	7/22/2022
Cuarta visita	11/24/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5000	454	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$47.500.000, 00	\$8.580.000, 00	18,06%	\$79.372.488, 00	\$79.278.086, 00	99,88%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74714
Plan de Negocios:	AVICOLA MAXI SUPER.
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ELKIN ALEXANDER GOMEZ MAYA
Cedula	71174308
No. Contrato	408-185-2021
Valor Contrato	\$79.834.279, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AVICOLA MAXI SUPER S.A.S
Nit	901.534.849-6
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	3/23/2022
Tercera visita	7/19/2022
Cuarta visita	11/16/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	11	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	18000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$153.000.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.834.279, 00	\$41.896.179, 00	52,48%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74724
Plan de Negocios:	AREPAS DH
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NAZLY DANIELA GIRALDO BERRIO
Cedula	1035388175
No. Contrato	409-185-2021
Valor Contrato	\$79.947.390, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AREPAS DH S.A.S
Nit	901.534.526-2
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	2/25/2022
Tercera visita	6/21/2022
Cuarta visita	11/16/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	217260	17192	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$246.978.000, 00	\$30.050.000, 00	12,17%	\$79.947.390, 00	\$70.823.362, 00	88,59%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74751
Plan de Negocios:	ADEGOSS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ANDRES SUAREZ ACEVEDO
Cedula	71173585
No. Contrato	410-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	KAIROS SYSTEMS S.A.S
Nit	901.535.346-8
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	HINCAPIÉ GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	3/1/2022
Tercera visita	6/30/2022
Cuarta visita	11/21/2022
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	42	21	50%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$132.000.000, 00	\$62.100.000, 00	47,05%	\$79.950.000, 00	\$69.361.484, 00	86,76%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74475
Plan de Negocios:	APICOLA CAMPO ALEGRE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ALEJANDRA CASTRO MONTOYA
Cedula	1039454033
No. Contrato	405-185-2021
Valor Contrato	\$79.951.139, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$79.951.139, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72404
Plan de Negocios:	CANTERO CACAO
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	YANIRA ORTIZ LINERO
Cedula	52184179
No. Contrato	428-185-2021
Valor Contrato	\$79.954.010, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CANTERO CACAO S.A.S
Nit	901.556.874-5
Ciudad	Yolombo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	1/31/2022
Segunda visita	5/24/2022
Tercera visita	9/16/2022
Cuarta visita	2/3/2023
Prorroga	
Fecha finalización	1/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	21299	4016	19%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$151.380.000, 00	\$17.556.328, 00	11,6%	\$79.954.010, 00	\$79.954.010, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72790
Plan de Negocios:	CUBO
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	JUAN DIEGO ECHAVARRIA CORREA
Cedula	1036621296
No. Contrato	429-185-2021
Valor Contrato	\$79.949.554, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CUBOGESPRO S.A.S
Nit	901.556.880-1
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	6/2/2022
Tercera visita	10/19/2022
Cuarta visita	1/30/2023
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	3	3	100%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$93.968.811, 00	\$49.500.000, 00	52,68%	\$79.949.554, 00	\$79.947.730, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74404
Plan de Negocios:	CANNATE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	OLGA LUCIA BAENA MEJIA
Cedula	43571148
No. Contrato	430-185-2021
Valor Contrato	\$79.954.537, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CANÑATÉ PANELA'S SAS
Nit	901.554.968-1
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/28/2022
Segunda visita	6/3/2022
Tercera visita	10/21/2022
Cuarta visita	1/24/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	5/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	31935	6094	19%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$143.880.000, 00	\$50.014.968, 00	34,76%	\$79.954.537, 00	\$79.954.537, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74413
Plan de Negocios:	AREPAS KMY
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ JARAMILLO
Cedula	1037500575
No. Contrato	431-185-2021
Valor Contrato	\$79.948.314, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AREPAS KMY S.A.S
Nit	901.555.413-9
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/23/2022
Tercera visita	9/20/2022
Cuarta visita	3/24/2023
Prorroga	2
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	131300	9073	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$171.600.000, 00	\$17.442.200, 00	10,16%	\$79.948.314, 00	\$79.948.314, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74443
Plan de Negocios:	ECOSOS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	MARÍA DEL CONSUELO OSSA YEPES
Cedula	42992081
No. Contrato	432-185-2021
Valor Contrato	\$79.950.599, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GECOSOS S.A.S
Nit	901.556.380-9
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/19/2022
Segunda visita	5/24/2022
Tercera visita	9/21/2022
Cuarta visita	1/26/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	5/19/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	59400	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$152.460.000, 00	\$,000	0,0%	\$79.950.599, 00	\$79.950.599, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74462
Plan de Negocios:	LA TIERRA PROMETIDA
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	LEIDY JOHANNA SERNA DUQUE
Cedula	1035853069
No. Contrato	433-185-2021
Valor Contrato	\$79.968.044, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CABAÑAS LA TIERRA PROMETIDA ALOJAMIENTO RURAL SAS
Nit	901.555.067-3
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/20/2022
Segunda visita	5/25/2022
Tercera visita	10/20/2022
Cuarta visita	1/25/2023
Prorroga	
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2794	253	9%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$165.966.000, 00	\$20.515.300, 00	12,36%	\$79.968.044, 00	\$79.968.044, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74476
Plan de Negocios:	CISNES DISEÑO Y CONFECCIÓN
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) - 3 cierre
Beneficiario	KARLA CRISTINA MONTOYA MUÑETON
Cedula	1037504369
No. Contrato	434-185-2021
Valor Contrato	\$79.954.029, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CISNES COLOMBIA S.A.S
Nit	901.555.518-3
Ciudad	Cisneros
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/21/2022
Segunda visita	5/26/2022
Tercera visita	10/18/2022
Cuarta visita	2/13/2023
Prorroga	
Fecha finalización	1/21/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2890	371	13%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$161.440.000, 00	\$16.927.732, 00	10,49%	\$79.954.029, 00	\$79.954.029, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) – 4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74484
Plan de Negocios:	ECOREFUGIO ALICANTE
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) – 4 cierre
Beneficiario	OMAR ALEXANDER RIOS RESTREPO
Cedula	71193198
No. Contrato	524-185-2022
Valor Contrato	\$66.776.960, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ECORREFUGIO ALICANTE S.A.S
Nit	901.582.416-5
Ciudad	Maceo
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	BUSTAMANTE HIGINIO MAGALY ALBANNY
Fecha de Inicio	4/18/2022
Segunda visita	8/17/2022
Tercera visita	12/21/2022
Cuarta visita	4/24/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
3	3	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1600	166	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$144.000.000, 00	\$34.742.575, 00	24,13%	\$66.776.960, 00	\$66.776.960, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 185 - Gramalote (Antioquia) – 4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78130
Plan de Negocios:	FINCA HOTEL LAS ACACIAS
Convocatoria	185 - Gramalote (Antioquia) – 4 cierre
Beneficiario	WILLIAM RICARDO ÁLZATE BOTERO
Cedula	7571870
No. Contrato	525-185-2022
Valor Contrato	\$66.322.398, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	San Roque
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
3	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$66.322.398, 00	\$,000	0,0%
