

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC,
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	BOGOTÁ D.C.		
BENEFICIARIO:	EJÉRCITO NACIONAL		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 61.811.415.199,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 61.811.415.199,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MARLENY RIVERA GALEANO	01/12/2024	A LA FECHA
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	27/11/2024	01/12/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	FAIVER RIVERA MONTES	04/12/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.106024	15/11/2024	\$ 50.067246.311,00
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.1924	15/11/2024	\$ 11.744.168.888,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	04/12/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Cumplimiento del Contrato FECHA: 06/12/2025		
	Calidad del Servicio FECHA: 06/06/2028		
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales FECHA: 06/12/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$1.207.490.041		
VALOR DE OBRA	\$60.374.502.050		
VALOR INTERVENTORÍA	N/A		
VALOR TOTAL	\$ 61.811.415.199,00		

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	NO APLICA	16/12/2024	\$ 17.523.536.209
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución.	NO APLICA	DD/MM/AAA A	\$ 25.615.562.981
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante	NO APLICA	DD/MM/AAA A	\$5.872.084.444
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.	100%	DD/MM/AAA A	\$5.599.070.946
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
30-44-101060994	Cumplimiento 20%	\$ 88.850.135,00	03/12/2024	06/12/2025
	Calidad de servicio 20%	\$ 88.850.135,00	03/12/2024	06/06/2028
	Pagos de salarios 5%	\$ 22.212.533,74	06/06/2025	06/12/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución implementación**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. 097 de 2024	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-	\$ 60.371.994.550,00

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	19/06/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
PÓLIZA No.	84763 y 24532		
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE CODALTEC: DICIEMBRE DE 2024:	SI	NO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025	
Se realizó seguimiento al contrato durante el mes de enero de 2025 mediante correos electrónicos, oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del CODALTEC.	
Se realiza seguimiento de este contrato con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC:	
“(…) 21) Presentar al Ministerio del Interior y al Municipio un (1) informe de gestión, técnico, administrativo y financiero, respecto de la ejecución del proyecto objeto del contrato, así como del estado de la ejecución del contrato los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al periodo informado (…)”	
RESUMEN CONVENIO:	
El día 13 de enero de 2025 el contratista derivado envía el formulario “DEC04 Proceso de exportación equipos” del gobierno australiano, el cual fue diligenciado por las partes, enviado a fabrica y está pendiente de verificación por parte de fábrica.	
El día 20 de enero de 2025 el contratista derivado reporta un avance del 45% en el proceso de fabricación de equipos.	

Con oficio No 20250100043131-CODALTEC del 25 de enero de 2025 se solicita el estado actual de los desembolsos pendientes a CODALTEC.

El día 30 de enero de 2025 el contratista derivado envía certificación de fábrica reportando un avance de 56.32%.

actividades realizadas a la fecha en las cuales están se indicaron en el cronograma; así mismo a continuación hacemos una descripción de cada una de ellas:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIONES
1	Acta aprobación de polizas	REALIZADO	100%	
2	Reunion de inicio	REALIZADO	100%	
3	Inicio tramite licencia de exportación	REALIZADO	100%	
4	Cronograma	REALIZADO	100%	
5	Carta aceptación PO emitida por el fabricante	REALIZADO	100%	
6	Certificado Generado por el contratista fecha inicial y final estimada del término de fabricación de los equipos	REALIZADO	100%	
7	Orden de compra	REALIZADO	100%	
8	Fabricación de Equipos	EN PROCESO	45%	
9	Transporte	NO INICIADO	0%	
10	Nacionalización	NO INICIADO	0%	
11	Entrega equipos	NO INICIADO	0%	

Como referencia y parte del seguimiento que se está realizando con el fabricante nos ha enviado un registro de fotos de los equipos que hacen parte del presente contrato.



De igual manera Newsat manifiesta que dentro del proceso de ejecución de actividades que están programadas no tenemos evidencia de algún retraso y que a la fecha todas las actividades se están ejecutando acorde lo planificado.

Estado financiero del contrato

El día 12 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003123-036911 Id: 461217 a Subdirectora de Gestión Contractual solicitando el primer desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

El día 12 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003123-036916 Id: 461276 a coordinador de Grupo financiero solicitando el primer desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

El día 24 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003122-037971 Id: 468217a Subdirectora de Gestión Contractual solicitando el segundo desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

El día 24 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003122-037973 Id: 468225 a coordinador de Grupo financiero solicitando el segundo desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por supervisión de CODALTEC:

- Informe de supervisión mes de enero de 2025
- Informe financiero mes de enero de 2025
- Extracto bancario mes de enero de 2025

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
Durante el mes de noviembre, se avanzó en la formalización y puesta en marcha del **Contrato No. 2374 de 2024**, permitido consolidar las bases para el correcto desarrollo del contrato en sus fases siguientes.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	 FAIVER RIVERA MONTES Apoyo a la supervisión Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON
--	--

04 DE FEBRERO DE 2025 No. 003, DEL CONTRATO CD-2374-2024
PERIODO DEL INFORME DESDE EL 10/01/2025 HASTA EL 31/01/2025

1. GENERALIDADES CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Territorio Nacional. Domicilio Contractual será la ciudad de Bogotá		
BENEFICIARIO:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MININTERIOR – FONSECON	\$ 61.811.415.199	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 61.811.415.199	
FECHA FIRMA DE LA MINUTA	27/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/06/2025 (6 MESES)		
SUPERVISOR CONTRATO / MININTERIOR	MARLENY RIVERA GALEANO		
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	03/12/2024 - 06/06/2028	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	05/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	NA		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	NA		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.436.913.149		
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	\$ 60.374.502.050		
VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN	NA		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		
VALOR TOTAL,	\$ 61.811.415.199		

PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 30-44-101060994	Cumplimiento 20% del valor de la Administración de recursos.	\$ 287.382.629,76	03/12/2024	06/12/2025
	Calidad de servicio 20% del valor de la Administración de recursos.	\$ 287.382.629,76	06/06/2025	06/12/2025
	Pago de salarios 5% del valor de la Administración de recursos.	\$ 71.845.657,44	03/12/2024	06/06/2028

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	En la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$24.451.673.330.00) , contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	N/A	DD/MM/AAAA	De los \$24.451.673.330 facturado con consecutivo FE 364 del 12/dic/24 a MININTERIOR, a la fecha se han desembolsado \$17.523.536.209
SEGUNDO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$24.451.673.330) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.163.899.651) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución	N/A	DD/MM/AAAA	De los \$24.451.673.330 facturado con consecutivo FE 369 del 20/dic/24 a MININTERIOR, a la fecha no se han recibido desembolsos. De los \$1.163.899.651 facturado con consecutivo FE 370 del 20/dic/2024 a MININTERIOR a la fecha no se han recibido desembolsos
TERCER DESEMBOLSO	En la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.872.084.444,00) , contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente	N/A	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones	N/A	DD/MM/AAAA	\$ 0,00

	municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.			
TOTAL, FACTURADO A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				\$ 50.067.246.311,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				\$ 17.523.536.209,00
TOTAL, PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (MINISTERIO)				\$ 32.543.710.102,00
RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 535.292,10

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Adquisición e implementación

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL.		\$ 60.371.994.550
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación del contrato	19/06/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 60.371.994.550
COMPañÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
PÓLIZA No.	84763 y 24532		
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024		

4. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) (Para este periodo no aplica)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
------------	------------	------------	------------	------------	------------

5. INFORME ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Durante el presente mes, se ha realizado las siguientes actividades relevantes:

- El día 13 de enero de 2025 el contratista derivado envía el formulario “DEC04 Proceso de exportación equipos” del gobierno australiano, el cual fue diligenciado por las partes, enviado a fabrica y está pendiente de verificación por parte de fábrica.
- El día 20 de enero de 2025 el contratista derivado reporta un avance del 45% en el proceso de fabricación de equipos.
- Con oficio No 20250100043131-CODALTEC del 25 de enero de 2025 se solicita el estado actual de los desembolsos pendientes a CODALTEC.
- El día 30 de enero de 2025 el contratista derivado envía certificación de fábrica reportando un avance de 56.32%.

A continuación, se presenta registro fotográfico de los avances en la fabricación de los equipos, estas imágenes se pueden encontrar en el documento anexo de “Informe_Fabrica_2025_01_30 Manufacturing Status Report NEWSAT-CODALTEC.pdf”:

IRK: #2726-#2724



DSX Mk 1#2012



DSX Mk1 and MPS Brackets Complete Shots



Atentamente,



LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
Administrador proyecto /contrato interadministrativo de
administración de proyectos No. 2374 de 2024

CODALTEC

INFORME FINANCIERO CONTRATO 2374-2024						
Periodo de Enero 2025, originado el 4 de febrero de 2025						
"CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL"						
NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON						
CUENTA (AHORROS) No.		0379400004170		DEL BANCO:	DAVIVIENDA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 61.811.415.199,00				
VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 61.811.415.199,00				
DESCRIPCION	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	% APORTADO X FACTURA			
PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-364	12-dic-24	\$ 24.451.673.330,00	71,67%			
SEGUNDO DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-369	20-dic-24	\$ 24.451.673.330,00				
SEGUNDO DESEMBOLSO ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-370	20-dic-24	\$ 1.163.899.651,00				
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR		FECHA DE GIRO	# FACTURA	VALOR		
		16/12/2024	FE-364	\$ 17.523.536.209,00		
TOTAL FACTURADO A FONSECON				\$ 50.067.246.311,00		
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR				\$ 17.523.536.209,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO				\$ 32.543.710.102,00		
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)				\$ 17.523.536.209,00		
VALOR CONTRATADO						
CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO	
097/2024	NEWSAT SAS	\$ 60.371.994.550,00		\$ 60.371.994.550,00	\$ 60.371.994.550,00	
TOTAL CONTRATADO				\$ 60.371.994.550,00	\$ 60.371.994.550,00	
VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:						
CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECCACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	VALOR DEL PAGO
097/2024	Primer desembolso. Contrato 097	1	972024	27/12/2024	\$ 17.523.000.000,00	\$ 17.523.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 17.523.000.000,00	\$ 17.523.000.000,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----				
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS		
31/12/2024	\$ 535.201,04					
31/01/2025	\$ 91,06					
TOTAL (3)	\$ 535.292,10	TOTAL (4)	\$ 0,00			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)		\$ 17.523.536.209,00				
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)		\$ 17.523.000.000,00				
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)		\$ 535.292,10				
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)		\$ 0,00				
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)		\$ 535.292,10				
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)		\$ 1.071.501,10				
OBSERVACIONES						
FIRMA						
Mateo Ochoa Administrador proyecto /contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024						
1						
* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS						
* DURANTE ESTE PERIODO SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ESTO SE REPORTARAN CON EL CIERRE DE ENERO DE 2025						
ELABORO: @LOCHOA						



DAVIVIENDA



H.25

CUENTA DE AHORROS 3794 0000 4170

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

LPARRADO@CODALTEC.COM

Saldo Anterior	\$1,071,410.04
Más Créditos	\$91.06
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,071,501.10
Saldo Promedio	\$1,071,410.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 91.06+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Bogotá D.C., 20 enero de 2025

NWS-OPER-2025-003

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA
Attn LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN
Supervisor Contrato de suministro de bienes No. 097-2024
BOGOTA DC - COLOMBIA

REF. informe actividades contrato suministro de bienes No. 097-24

Respetados Señores:

Mediante el presente nos permitimos dar a conocer las actividades realizadas a la fecha en las cuales están se indicaron en el cronograma; así mismo a continuación hacemos una descripción de cada una de ellas:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	AVANCE	OBERVACIONES
1	Acta aprobación de polizas	REALIZADO	100%	
2	Reunion de inicio	REALIZADO	100%	
3	Inicio tramite licencia de exportación	REALIZADO	100%	
4	Cronograma	REALIZADO	100%	
5	Carta aceptación PO emitida por el fabricante	REALIZADO	100%	
6	Certificado Generado por el contratista fecha inicial y final estimada del término de fabricación de los equipos	REALIZADO	100%	
7	Orden de compra	REALIZADO	100%	
8	Fabricación de Equipos	EN PROCESO	45%	
9	Transporte	NO INICIADO	0%	
10	Nacionalización	NO INICIADO	0%	
11	Entrega equipos	NO INICIADO	0%	


Como referencia y parte del seguimiento que se está realizando con el fabricante nos ha enviado un registro de fotos de los equipos que hacen parte del presente contrato.



De igual manera Newsat manifiesta que dentro del proceso de ejecución de actividades que están programadas no tenemos evidencia de algún retraso y que a la fecha todas las actividades se están ejecutando acorde lo planificado.

Para cualquier aclaración adicional, estamos a su total disposición.

Cordialmente,



DIEGO SALAZAR
Representante legal
NEWSAT SAS

DroneShield Group Pty Ltd
Level 5, 126 Phillip Street
SYDNEY NSW 2000

29 January 2025
Company: NEWSAT
End User: CODALTEC & Colombian National Army
Office at Calle 98 A # 60 - 87
Subject: Manufacturing Progress Update

To whom it may concern,

We are pleased to provide you with an update on the manufacturing progress of your ordered products. As of today, we have achieved significant milestones in the production process. Below is a summary of the current manufacturing status:

Manufacturing Progress Report - NewSat S.A.S

Sales Product Number of Manufactured Goods	Product Number	Product Description	Order Quantity	Product Completion % of Manufactured Goods	Weighted % of Manufactured Goods for Project	Current Completion % of Manufactured Goods with Weighting	Serial Number	Production Status
DS-210	DRO-083	Drone Sentry-X Mk2 (Detect & Defeat) System	16	30%	30%	9%	0835979542103, 0835979542104, 0835979542105, 0835979542106, 0835979542107, 0835979542108, 0835979542109, 0835979542110, 0835979542111, 0835979542112, 0835979542113, 0835979542114, 0835979542115, 0835979542116, 0835979542117, 0835979542118	Production
DS-121	DRO-121	DroneSentry-C2 Tactical Tablet	16	50%	30%	15%	1216475042066, 1216475042067, 1216475042068, 1216475042069, 1216475042070, 1216475042071, 1216475042072, 1216475042073, 1216475042074, 1216475042075, 1216475042076, 1216475042077, 1216475042078, 1216475042079, 1216475042080, 1216475042081	Inventory In Stock and Transit, Due to Arrive FEB
DS-116	DRO-061	Immediate Response Kit Mk4	6	100%	11%	11%	0350198542816, 0350198542817, 0350198542818, 0350198542819, 0350198542820, 0350198542821, 0557569542258, 0557569542344, 0557569542359, 0557569542371, 0557569542385, 0557569542451	In Stock-Complete
DS-210	DRO-083	Drone Sentry-X Mk2 (Detect & Defeat) System	1	30%	2%	1%	835979542119.00	Production
DS-120	DRO-102	Echodyne EchoShield	3	100%	6%	6%	NA	Production Complete, Goods with Echodyne and In Transit
DS-107-2	DS-107-2	DroneOpt2 - FLIR HDC UC System	1	15%	2%	0%	NA	In Production with Teledyne
DRO-107	DRO-107	SmartHub Module	1	90%	2%	2%	1079920642006.00	Quality Check
DRO-108	DRO-108	DroneOpt Module	1	20%	2%	0%	1089920642006.00	Inventory In Stock and Transit, Due to Arrive FEB
DS-407	DRO-036	On-Prem ComputeNode with C2 Software (Year 1)	1	100%	2%	2%	368269542056.00	Provisioning
DS-402	DRO-066	MAST	2	50%	4%	2%	NA	Inventory In Stock and Transit, Due to Arrive FEB
DS-051	DRO-051	MPS Brackets	1	100%	2%	2%	NA	In Stock-Complete
DS-054	DRO-054	TMS Brackets	1	75%	2%	1%	NA	Production
DS-079	DRO-079	Camera Calibration Bracket	1	75%	2%	1%	NA	Production
DS-207	DRO-039	Drone Sentry-X Mk1 (Detect & Defeat) System	2	100%	4%	4%	0393909542012, 0393909542025	In Stock-Complete

% of Completion: 56.32%

This progress demonstrates our commitment to ensuring timely delivery and meeting the highest manufacturing standards. The remaining production is on schedule, and we anticipate full completion by the end of March 2025. The current manufacturing completion stands at **56.32%**, calculated by assessing the completion status of each product line and weighting it against the overall order composition. This ensures that the progress reflects both the quantity and completion status of each manufactured good.

Status Images

IRK: #2726-#2724



IRK: #2823-#2726



IRK: #2911-#2728





DRONESHIELD

IRK: #2960-#2721





IRK #2992-#2721



IRK: #2997-#2716

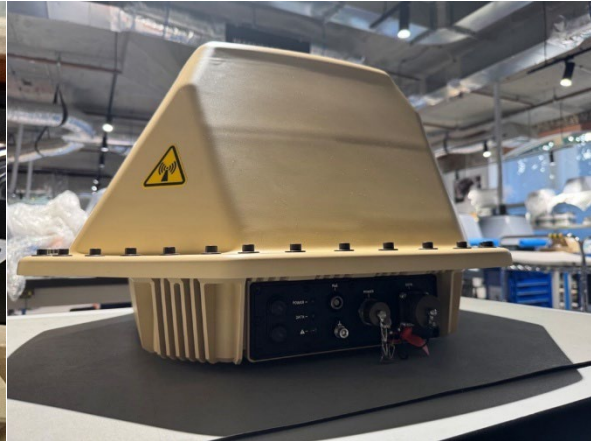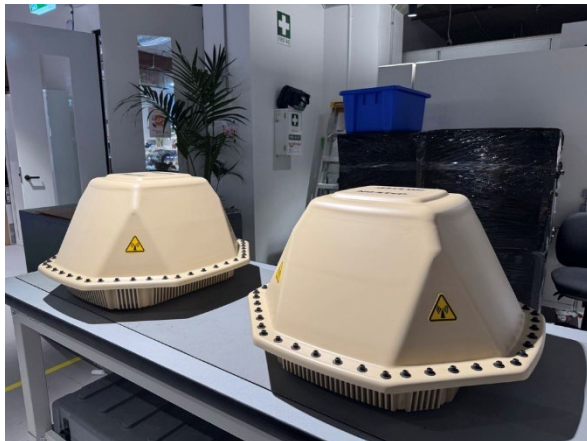

DSX Mk 1#2012**DSX Mk1: #2025****DSX Mk1 and MPS Brackets Complete Shots**

As the remaining products are currently in final production, transit, or undergoing provisioning, we are unable to provide photos at this stage. However, we will be happy to share images as soon as they become available. Let us know if there is any other information we can provide in the meantime.

We are on track to meet all expected timelines for shipment, delivery, and project completion. Our team is managing the process closely to ensure a smooth and timely execution. Should you require any further details, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

Louis Gamarra

Louis Gamarra | Sales Director

Louis.gamarra@droneshield.com

www.droneshield.com

Letter From Echodyne Indicating Product Completion

ECHODYNE

January 29th, 2025

Dear CODALTEC team,

We are pleased to inform you that EchoShield radars are currently in stock and ready for fulfillment. At this time, we are actively working with our partners at DroneShield to determine the necessary export requirements to Colombia.

We appreciate your patience and will keep you updated on the progress. Please let us know if you have any questions or require further information

Best regards,



Yaniv Mendelson
Director C-UAS
Echodyne Corp.
