

Informe de Gestión No. 45

**Adhesión No. 25 Municipio de Acacias
Período del 01 al 23 de marzo del 2025**

**Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

Marzo 23 de 2025

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo.....	3
1.2 Informe Financiero.....	3
2 Informe Jurídico.....	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
Atención al Emprendedor	15
CONCLUSIONES Y RETOS	15
ANEXOS.....	17

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, de la Adhesión No. 25; se presenta a continuación el informe con corte al 23 de marzo de 2025, de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias, Meta.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Acacias, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2025, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 23 de marzo del año 2025.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias.

Número de Adhesión	25	Entidad Adherente	Municipio de Acacias
Fecha de Inicio	02/08/2021		
Duración	Desde el 02/08/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.500.000.000		
Valor Aporte SENA	\$900.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$600.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Pedro Harvey Ramírez Riveros		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	N/A		
Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	contratacion@acacias-meta.gov.co, recursohumano@acacias-meta.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 23 de marzo del 2025, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para la adhesión No. 25.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta exclusiva del proyecto se presenta a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO_BBVA_8510_MARZO_2025).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria de la Adhesión No. 25 suscrita con el Municipio de Acacias

No. Convocatoria	191
Recursos SENA	\$ 900.000.000
Recursos Adherente	\$ 600.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.500.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.519.340.144
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0

Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 80.000.000
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 60.659.856
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.439.340.144
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	N/A

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 25 suscrita con el Municipio de Acacias

Valor Traslado a la Fiducia SENA	\$ 863.604.086,40
Valor Traslado a la Fiducia Adherente	\$ 575.736.057,60
Valor Traslado a la fiducia acumulada	\$ 1.439.340.144,00
Ejecución recursos SENA	\$ 833.086.505,51
Ejecución recursos Adherente	\$ 555.391.003,67
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.388.477.509,18

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 25 suscrita con el Municipio de Acacias

Banco	BBVA
Cuenta de Ahorros No	0309-0002-0004-8510
Saldo Total en Bancos	\$ 59.110.953,93
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 14.501.855,00
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 191 perteneciente al municipio de Acacias - Meta, al 23 de marzo de 2025 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.439.340.144 equivalente al 95,96% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$60.659.856, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento por parte de los emprendedores.

Así mismo, los planes de negocio aprobados para financiamiento a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.388.477.509,18, equivalente al 96,47% del total de recursos comprometidos y 92,57% de los recursos totales de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias, Meta.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 23 de marzo del 2025, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias, Meta.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No 191 específica para el municipio de Acacias, Meta, cuyo link de acceso se encuentra disponible en <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1912020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Número de Convocatoria	191		
Fecha de Lanzamiento	12/08/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	01/09/2021	Fecha de Cierre	18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	30/09/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	15/12/2022		

Durante el período del 01 al 23 de marzo de 2025, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2025 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efecto de trazabilidad se presenta la información consolidada del proceso de acreditación para la convocatoria 191, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias Meta.

Número de Convocatoria			191				
Corte No 1	Fecha Apertura		12/08/2021		Fecha de Cierre		30/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/10/21	Número de Planes Formalizados	9	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	77.78%
Corte No 2	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	22/11/21	Número de Planes Formalizados	13	Número de Planes Acreditados	12	% de Acreditación	92.3%
Corte No 3	Fecha Apertura				Fecha Cierre		15/12/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	23/12/22	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Durante el período del mes de marzo de 2025 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, se presentan los resultados consolidados del proceso de evaluación de la convocatoria No. 191 Acacias, realizado para el primer cierre en el mes agosto de 2021 y para el segundo cierre en el mes de noviembre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias, Meta.

Número de Convocatoria			191				
Corte No. 1	Fecha Apertura		12/08/2021		Fecha de Cierre		30/09/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	28/10/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	6	% de Planes Viabilizados	85.71%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	6	Valor Planes a Financiar	\$479.344.393
Corte No. 2	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021

Fecha de Publicación Final Evaluación		Número de Planes Evaluados	12	Número de Planes Viabilizados	12	% de Planes Viabilizados	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	6/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	12	Valor Planes a Financiar	\$959.995.751
Corte No. 3	Fecha Apertura					Fecha de Cierre	15/12/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	17/01/23	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Planes Viabilizados	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	13/03/23	Fecha de Consejo Directivo	02/05/23	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$80.000.000

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 23 de marzo de 2025, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 23 de marzo de 2025 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 191, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 191.


Planes de negocio primer cierre

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	76836	506-191-2021	Tipsco - Plataforma - Digital.	22/04/2022	22/04/2023	\$79.545.232	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
2	76842	507-191-2021	Llanofrutos Sas	19/04/2022	19/04/2023	\$79.846.604	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	77931	508-191-2021	Apiario Yerbabuena	18/03/2022	18/03/2023	\$79.952.557	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	78376	509-191-2021	Palo de Mango	5/04/2022	5/04/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	78407	510-191-2021	Al Natural, Vive Sano.	6/04/2022	6/04/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	78454	511-191-2021	Miel Meile	7/04/2022	7/04/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen con el indicador, mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 2. Cumplimiento de indicadores CV 191 1C.

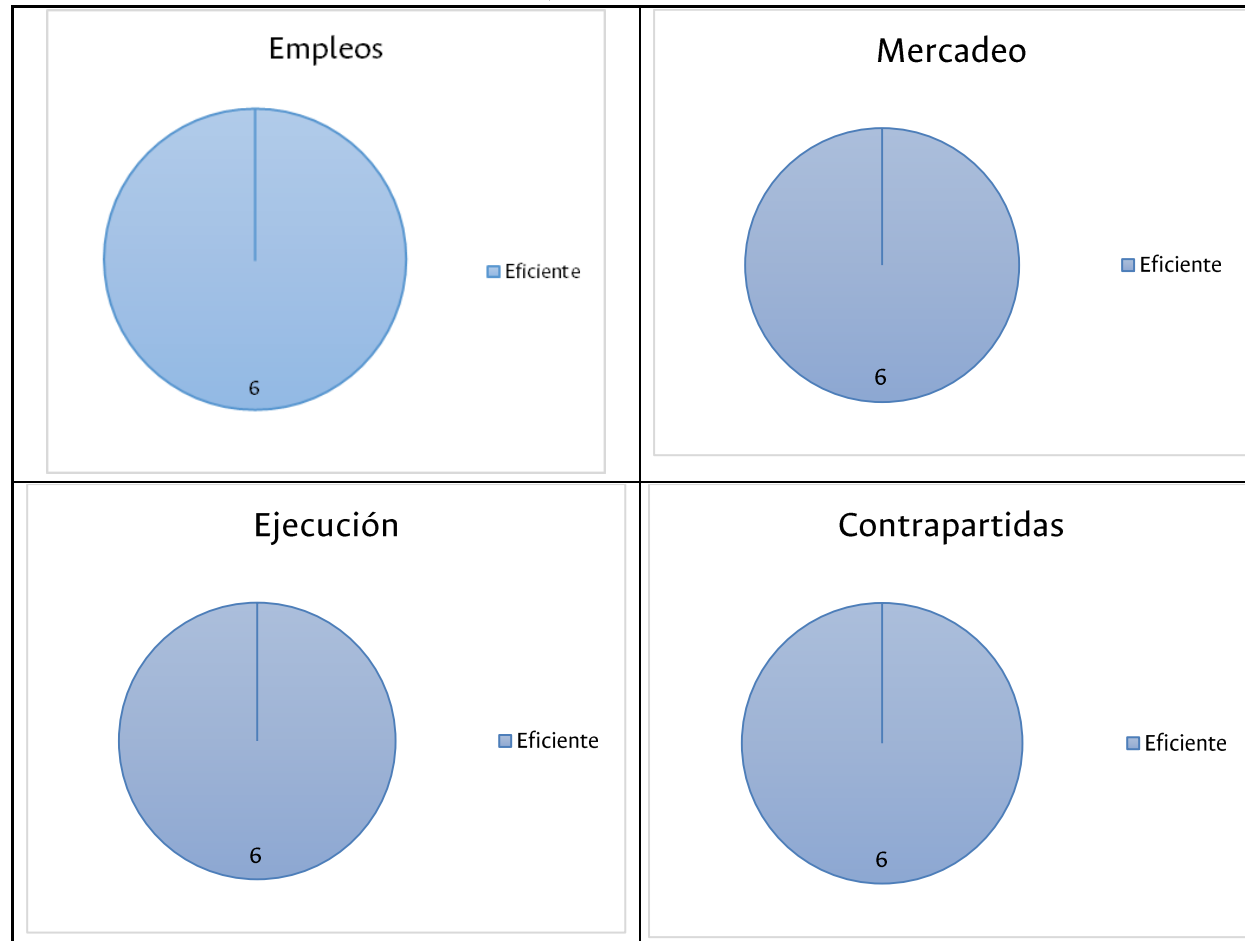

Planes de negocio segundo cierre


Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 2C.


No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78540	535-191-2022	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR	25/05/2022	25/05/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	79720	539-191-2022	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES	17/05/2022	17/05/2023	\$80.000.000	25,00%	50,00%	80,00%	53,00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
3	78105	530-191-2022	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S	23/05/2022	23/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	78257	531-191-2022	TRÓPICOS DE ACACIAS	18/05/2022	18/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	TERMINADO
5	78400	532-191-2022	ANGEL FLORES Y DETALLES	20/05/2022	20/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	TERMINADO
6	78446	533-191-2022	GALERIA CAFE LIBROS	9/05/2022	9/05/2023	\$80.000.000	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	78460	534-191-2022	DELIPEZ DEL LLANO	29/04/2022	29/04/2023	\$79.995.751	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	78876	536-191-2022	DULCE PATILLA	23/05/2022	23/05/2023	\$80.000.000	83,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	79267	537-191-2022	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..	12/05/2022	12/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	TERMINADO
10	79405	538-191-2022	LLANOGALLETA...	10/05/2022	10/05/2023	\$80.000.000	100,00%	120,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
11	79777	540-191-2022	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	31/05/2022	31/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
12	79846	541-191-2022	CIMARRON GOURMET	9/05/2022	9/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	91,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Figura 3. Cumplimiento de indicadores CV 191 2C.

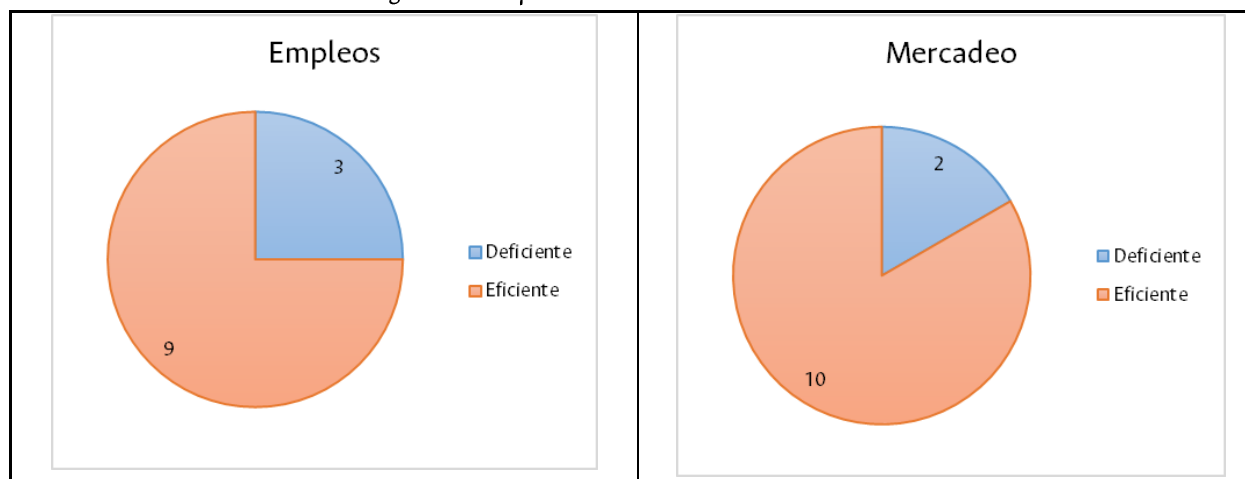

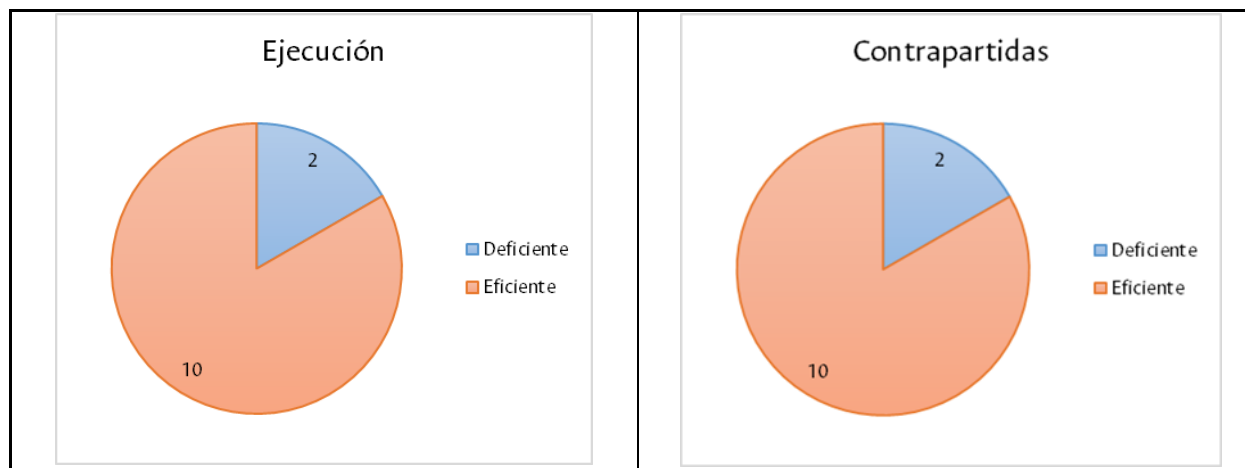

Plan de negocio tercer cierre

Tabla 10. Estado del plan de negocio beneficiario de la convocatoria 191 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	79724	574-191-2023	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY	24/07/2023	24/07/2024	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 18 planes de negocio, el detalle de los proyectos se muestra a continuación:

Tabla 11. Estado de los planes de negocio entregados al SENA.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	76836	Tipsco - Plataforma - Digital.	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 79.489.226
2	76842	Llanofrutos Sas	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 79.846.604
3	77931	Apiario Yerbabuena	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.952.557
4	78105	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.704.248
5	78257	TRÓPICOS DE ACACIAS	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 78.153.932
6	78376	Palo de Mango	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 80.000.000
7	78400	ANGEL FLORES Y DETALLES	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 78.251.587
8	78407	Al Natural, Vive Sano.	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 80.000.000
9	78446	GALERIA CAFE LIBROS	TERMINADO	18/06/2024	NO CONDONACIÓN	NO CONDONADO	1-2128-2024	\$ 80.000.000
10	78454	Miel Meile	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 80.000.000
11	78460	DELIPEZ DEL LLANO	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 79.991.112
12	78876	DULCE PATILLA	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.999.999
13	79267	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 78.204.059
14	79405	LLANOGALLETA...	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 80.000.000
15	79720	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO	TERMINACIÓN ANTICIPADA	13/10/2023	NO CONDONACIÓN	NO CONDONADO	1-02810-2023	\$ 42.005.115

		IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES						
16	79777	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 79.932.335
17	79846	CIMARRON GOURMET	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 72.946.736
18	79724	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY	TERMINADO	6/09/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2841-2024	\$80.000.000,00

En relación con la información plasmada en la tabla No. 11 la cual tiene que ver con los proyectos condonados mediante la resolución No. 1-02808 del 29 de diciembre de 2023, es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

Respecto a los planes de negocio NO CONDONADOS conforme las disposiciones de la Resolución No. 1-02810 del 29 de diciembre de 2023, se informa que, se adelantan las actividades de cobranza o recuperación de cartera, y fueron cerrados los expedientes contractuales de conformación de expedientes para la liquidación unilateral de los contratos de cooperación empresarial.

Para los planes de negocio correspondientes a la resolución 1-2122 del 23 de agosto de 2024, es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial el 30 de diciembre de 2024.

A la fecha se encuentra en construcción los expedientes y la elaboración de las actas de liquidación bilateral o unilateral de los planes de negocio según la resolución de NO condonación No. 1-2128, considerando que se recibió por parte del SENA la constancia de ejecutoria el día 07 de febrero de 2025.

Frente a los planes de negocio relacionados en la resolución 1-2841 del 31 de octubre de 2024 a la fecha de presentación de este informe se informa que, fue solicitado al SENA la publicación en la página web de la notificación por aviso a los emprendedores condonados, de conformidad con la actividad número 10 del protocolo de liquidaciones del Fondo Emprender. Cumplido el termino de 10 días hábiles para presentar las observaciones al contenido del acta de liquidación, se emite la constancia de ejecutoria con la cual se cierran definitivamente los expedientes de los contratos de cooperación empresarial asociados al acto administrativo de condonación, considerando que se recibió por parte del SENA la constancia de ejecutoria el día 07 de febrero de 2025.

Atención al Emprendedor

Durante el período correspondiente al mes de marzo de 2025, no se atendieron solicitudes por parte de emprendedores.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria la cual presenta los aspectos más relevantes.

Tabla 12. Ficha técnica de la convocatoria 191 municipio de Acacias, Meta

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 1.500.000.000,00
Número total de planes formalizados	23
Número total de planes acreditados	20
Número total de planes viables	19
Número de planes financiados	19
Número de planes aprobados en CDN	19
Total recursos aprobados en CDN	\$ 1.519.340.144,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 80.000.000,00
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ 0
Total recursos comprometidos	\$ 1.439.340.144,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 60.659.856,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.388.477.509,18

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 4. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 191– Municipio de Acacias.

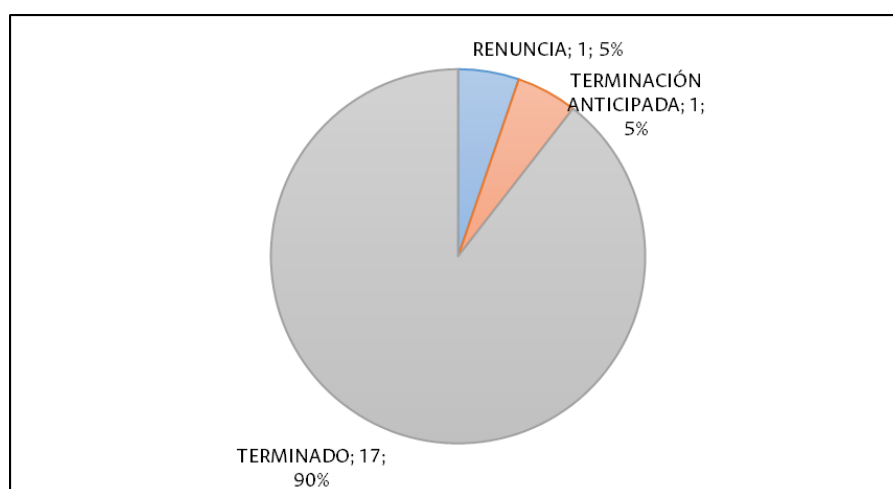

Conclusiones generales del período del 01 al 23 de marzo de 2025:

1. En términos jurídicos, de la Adhesión No. 25 suscrita con el municipio de Acacias - Meta, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La Convocatoria 191 – Fondo Emprender, asociada a la presente adhesión, tuvo el primer cierre el día 30/09/2021 con la formalización de 9 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el primer cierre de la convocatoria 191 se acreditaron 7 de los 9 planes correspondiente al 77.8% de los planes.
3. El proceso de evaluación del primer cierre viabilizó un total de 6 planes de negocios de los 7 planes acreditados para una eficiencia del 85.7%. Los 6 planes viabilizados fueron aprobados para financiamiento por valor de \$479.344.393.
4. El segundo cierre de la convocatoria 191 tuvo lugar el día 18/11/2021, en el cual se formalizaron 13 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el segundo se acreditaron 12 de los 13 planes correspondientes al 92% de los planes.
5. El proceso de evaluación del segundo cierre se viabilizó un total de 12 planes de negocios de los 12 planes acreditados para una eficiencia del 100%. Los 12 planes viables fueron aprobados para financiamiento por valor total de \$959.995.751.
6. Se tiene una renuncia a los recursos de financiamiento por valor de \$80.000.000 correspondiente al plan de negocios ID 78540 – PLANTA DE CONCENTRADO AVIGAN JR aprobado en el segundo cierre de la convocatoria 191.
7. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o del SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
8. Durante el año 2023 en el proceso de interventoría se recibieron 30 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (14), agendas especiales (6), terminaciones anticipadas (3), informes y conceptos (3), aplazamiento de visitas (2) y dedicación parcial (2) para la convocatoria 191 - Acacias, solicitudes resueltas oportunamente.
9. Durante el año 2024, en el proceso de interventoría se han recibido 3 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 2 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 1 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
10. En lo corrido del año 2025, en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por parte de los emprendedores.
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 191 no se ha presentado pago exitosos en el periodo de estudio, al cierre de marzo de 2025 se tiene un acumulado de 20 pagos rechazados de los cuales el 31% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 14% son rechazos de tipo bancario

(cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 55% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES AL CIERRE DE CONTRATO ADHERENTE

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no comprometidos en la convocatoria No. 191 por valor de \$24.263.942,40 por el ente adherente, más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 14.501.855,00, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_BBVA_8510_MARZO_2025
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 191

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .
CRA 45 # 26-85 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



11789 2028

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489
PERÍODO DESDE: 01-03-2025 HASTA: 31-03-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200048510
Fecha de corte	31-03-2025
Pagos de intereses desde	0.00
Saldo promedio mensual	58,933,676.93

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		58,933,676.93	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	177,277.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	59,110,953.93

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-03-2025	31-03-2025	ABONO INTERESES GANADOS		177,277.00	59,110,953.93

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Marzo 31 de 2025

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
76836	TIPSCO - PLATAFORMA - D	191	\$ 79.545.232,00	\$ 318.180,93	\$ 79.863.412,93	\$ 79.489.226,00	\$ 317.956,90	\$ 79.807.182,90	\$ -	\$ -	\$ -
76842	LLANOFRUTOS SAS	191	\$ 79.846.604,00	\$ 319.386,42	\$ 80.165.990,42	\$ 79.846.604,00	\$ 319.386,42	\$ 80.165.990,42	\$ -	\$ -	\$ -
77931	APIARIO YERBABUENA	191	\$ 79.952.557,00	\$ 319.810,23	\$ 80.272.367,23	\$ 79.952.557,00	\$ 319.810,23	\$ 80.272.367,23	\$ -	\$ -	\$ -
78376	PALO DE MANGO	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78407	AL NATURAL, VIVE SANO.	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78454	MIEL MEILE	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78105	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.704.248,00	\$ 318.816,99	\$ 80.023.064,99	\$ -	\$ -	\$ -
78257	TRÓPICOS DE ACACIAS	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 78.153.932,00	\$ 312.615,73	\$ 78.466.547,73	\$ -	\$ -	\$ -
78400	ANGEL FLORES Y DETALLES	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 78.251.586,50	\$ 313.006,35	\$ 78.564.592,85	\$ -	\$ -	\$ -
78446	GALERIA CAFE LIBROS	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78460	DELIPEZ DEL LLANO	191-2	\$ 79.995.751,00	\$ 319.983,00	\$ 80.315.734,00	\$ 79.991.111,56	\$ 319.964,45	\$ 80.311.076,01	\$ -	\$ -	\$ -
78540	PLANTA DE CONCETRADO	191-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
78876	DULCE PATILLA	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.999,02	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,02	\$ -	\$ -	\$ -
79267	JOROPO ALMA CHOCOLAT	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 78.204.059,00	\$ 312.816,24	\$ 78.516.875,24	\$ -	\$ -	\$ -
79405	LLANOGALLETA...	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
79720	IXORA CENTRO DE ENTREN	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 42.005.115,10	\$ 168.020,46	\$ 42.173.135,56	\$ -	\$ -	\$ -
79777	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.932.335,00	\$ 319.729,34	\$ 80.252.064,34	\$ -	\$ -	\$ -
79846	CIMARRON GOURMET	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 72.946.736,00	\$ 291.786,94	\$ 73.238.522,94	\$ -	\$ -	\$ -
79724	CENTRO DEPORTIVO Y REC	191-3	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 93.055.556,00	\$ 372.222,22	\$ 93.427.778,22	\$ 13.055.556,00	\$ 52.222,22	\$ -
			\$ 1.439.340.144,00	\$ 5.757.360,58	\$ 1.445.097.504,58	\$ 1.401.533.065,18	\$ 5.606.132,27	\$ 1.407.139.197,45	\$ 13.055.556,00	\$ 52.222,22	\$ -



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76836
Plan de Negocios:	Tipsco - Plataforma - Digital.
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	JOSE ALEXANDER REY MATEUS
Cedula	86062832
No. Contrato	506-191-2021
Valor Contrato	\$79.545.232, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TIPSCO COLOMBIA SAS
Nit	901.578.859-9
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/22/2022
Segunda visita	8/30/2022
Tercera visita	12/21/2022
Cuarta visita	5/25/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/22/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2602	250	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$208.160.000, 00	\$23.800.000, 00	11,43%	\$79.545.232, 00	\$79.489.226, 00	99,93%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76842
Plan de Negocios:	Llanofrutos Sas
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	JONATHAN TAMAYO
Cedula	1107045390
No. Contrato	507-191-2021
Valor Contrato	\$79.846.604, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LLANOFRUTOS SAS
Nit	901.572.712-8
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/19/2022
Segunda visita	8/29/2022
Tercera visita	12/20/2022
Cuarta visita	5/24/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/19/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	41192	36939	90%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$44.411.950, 00	\$39.088.000, 00	88,01%	\$79.846.604, 00	\$79.846.604, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77931
Plan de Negocios:	Apiario Yerbabuena
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	LAURA JULIETH MUÑOZ CUBILLOS
Cedula	1010112091
No. Contrato	508-191-2021
Valor Contrato	\$79.952.557, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	APIARIO YERBABUENA SAS
Nit	901.579.822-1
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	8/4/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2000	1100	55%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$30.977.600, 00	\$29.055.197, 00	93,79%	\$79.952.557, 00	\$79.952.557, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78376
Plan de Negocios:	Palo de Mango
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	HUGO ALEJANDRO JARAMILLO CALVO
Cedula	1121879218
No. Contrato	509-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PALO DE MANGO AJ S.A.S
Nit	901.565.815-9
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RIVAS FLÓREZ ELIANA PATRICIA
Fecha de Inicio	4/5/2022
Segunda visita	8/5/2022
Tercera visita	12/5/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	37440	7959	21%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$156.965.399, 00	\$25.492.750, 00	16,24%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78407
Plan de Negocios:	Al Natural, Vive Sano.
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	LESLIE ALEJANDRA NAVAS MURIEL
Cedula	1122143354
No. Contrato	510-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AL NATURAL VIVE SANO SAS
Nit	901.581.548-4
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RIVAS FLÓREZ ELIANA PATRICIA
Fecha de Inicio	4/6/2022
Segunda visita	8/3/2022
Tercera visita	12/5/2022
Cuarta visita	4/11/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	19545	1553	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.887.500, 00	\$10.556.090, 00	7,71%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78454
Plan de Negocios:	Miel Meile
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	ANGIE MARIANA REYES HUERFANO
Cedula	1018492717
No. Contrato	511-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES CARACHOS SAS
Nit	901.570.124-8
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RIVAS FLÓREZ ELIANA PATRICIA
Fecha de Inicio	4/7/2022
Segunda visita	8/3/2022
Tercera visita	12/7/2022
Cuarta visita	4/12/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/7/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1752	2108	120%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$88.771.000, 00	\$49.162.000, 00	55,38%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78105
Plan de Negocios:	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	YADI LORENA DUARTE CAÑAS
Cedula	1099203023
No. Contrato	530-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EXOTICOS DE ACACIAS SAS
Nit	901.594.791-4
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/23/2022
Segunda visita	9/26/2022
Tercera visita	2/3/2023
Cuarta visita	6/5/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9713	8720	90%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$28.362.379, 00	\$32.124.000, 00	113,26%	\$80.000.000, 00	\$79.704.248, 00	99,63%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78257
Plan de Negocios:	TRÓPICOS DE ACACIAS
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	ESMERALDA MONTES PIMENTEL
Cedula	1123510152
No. Contrato	531-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TROPICOS DE ACACIAS S.A.S
Nit	901.591.839-5
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/18/2022
Segunda visita	9/27/2022
Tercera visita	2/6/2023
Cuarta visita	6/1/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	39000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$45.240.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$78.153.932, 00	97,69%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78400
Plan de Negocios:	ANGEL FLORES Y DETALLES
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	MARIA ANGELICA OLAYA ANGEL
Cedula	1122122277
No. Contrato	532-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ANGEL FLORES Y DETALLES SAS
Nit	901.592.302-7
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/20/2022
Segunda visita	9/23/2022
Tercera visita	2/1/2023
Cuarta visita	6/2/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/20/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2110	2378	113%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$163.810.000, 00	\$84.541.460, 00	51,61%	\$80.000.000, 00	\$78.251.586,50 0	97,81%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78446
Plan de Negocios:	GALERIA CAFE LIBROS
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	KIMI LLANEDA MEDINA DAZA
Cedula	47432770
No. Contrato	533-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GALERIA.CAFÉ.LIBROS SAS
Nit	901.587.498-1
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/9/2022
Segunda visita	9/21/2022
Tercera visita	1/24/2023
Cuarta visita	5/30/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/9/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	27900	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$124.245.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78460
Plan de Negocios:	DELIPEZ DEL LLANO
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	ROSA ELENA RAMIREZ PARRADO
Cedula	21177362
No. Contrato	534-191-2022
Valor Contrato	\$79.995.751, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DELIPEZ DEL LLANO SAS
Nit	901.585.741-8
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	4/29/2022
Segunda visita	9/20/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	5/29/2023
Prorroga	
Fecha finalización	4/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8250	8649	105%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$152.543.000, 00	\$158.179.519, 00	103,7%	\$79.995.751, 00	\$79.991.111,56 0	99,99%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78540
Plan de Negocios:	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JUAN CAMILO RAMÍREZ MENDIETA
Cedula	1122128674
No. Contrato	535-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	AVIGAN JR SAS
Nit	901.593.163-4
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/25/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	1755	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$157.365.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78876
Plan de Negocios:	DULCE PATILLA
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LORENA RUEDA RUBIO
Cedula	1122129530
No. Contrato	536-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DULCE PATILLA SAS
Nit	901.587.378-6
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	5/23/2022
Segunda visita	9/28/2022
Tercera visita	1/26/2023
Cuarta visita	6/9/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	180000	3200	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.680.000, 00	\$2.200.000, 00	1,81%	\$80.000.000, 00	\$79.999.999,02 0	100%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79267
Plan de Negocios:	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JUAN JOSÉ TRIANA CHAVES
Cedula	1122143289
No. Contrato	537-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	JOROPO ALMA CHOCOLATERA SAS
Nit	901.591.474-0
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/12/2022
Segunda visita	9/26/2022
Tercera visita	1/30/2023
Cuarta visita	6/8/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/12/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	13950	8496	61%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.675.000, 00	\$17.537.000, 00	16,14%	\$80.000.000, 00	\$78.204.059, 00	97,76%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79405
Plan de Negocios:	LLANOGALLETA...
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LUIS ENRIQUE LINARES DUCUARA
Cedula	1122143476
No. Contrato	538-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LLANOGALLETAS SAS
Nit	901.591.004-2
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/10/2022
Segunda visita	9/22/2022
Tercera visita	1/25/2023
Cuarta visita	5/30/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/10/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	6	120%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	144000	113390	79%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$157.320.000, 00	\$71.954.698, 00	45,74%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79720
Plan de Negocios:	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	YULIE MARCELA GALINDO JIMENEZ
Cedula	1018422778
No. Contrato	539-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	IXORA, ACTIVA TUS SENTIDOS S.A.S.
Nit	901.594.385-7
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/17/2022
Segunda visita	9/26/2022
Tercera visita	1/31/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	4	2	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	1350	109	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$94.500.000, 00	\$2.265.000, 00	2,4%	\$80.000.000, 00	\$42.005.115,10 0	52,51%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79777
Plan de Negocios:	EL SEÑOR CAMPO S.A.S
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LORENA ALEJANDRA PLATA HERNÁNDEZ
Cedula	1020714001
No. Contrato	540-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SEÑOR CAMPO SAS
Nit	901.598.382-3
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/31/2022
Segunda visita	9/23/2022
Tercera visita	2/13/2023
Cuarta visita	6/9/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	12240	459	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.720.000, 00	\$3.921.965, 00	3,61%	\$80.000.000, 00	\$79.932.335, 00	99,92%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79846
Plan de Negocios:	CIMARRON GOURMET
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JORGE ANDRES ARAGÓN LEÓN
Cedula	1022326486
No. Contrato	541-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CIMARRON GOURMET SAS
Nit	901.478.927-9
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/9/2022
Segunda visita	9/28/2022
Tercera visita	1/26/2023
Cuarta visita	6/6/2023
Prorroga	
Fecha finalización	5/9/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEREO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6808	1212	18%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$160.872.000, 00	\$13.130.000, 00	8,16%	\$80.000.000, 00	\$72.946.736, 00	91,18%



Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Acacias - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79724
Plan de Negocios:	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY
Convocatoria	191 - Acacias - 3 cierre
Beneficiario	RAMON CAMILO GAITAN VILLEGAS
Cedula	1122124454
No. Contrato	574-191-2023
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY SAS
Nit	901.733.051-1
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	PÁEZ VARGAS SANDRA PATRICIA
Fecha de Inicio	7/24/2023
Segunda visita	11/20/2023
Tercera visita	3/12/2024
Cuarta visita	7/25/2024
Prorroga	
Fecha finalización	7/24/2024

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1144	46	4%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$82.710.000, 00	\$14.773.670, 00	17,86%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%
