

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° PS-001-2025. - “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. CI 0126-2024.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025.

**CONTRATISTA:
ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.**

**PRESENTADO A:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA**

**RIOHACHA, LA GUAJIRA
MAYO DE 2025.**

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.1.1 NOMBRE DEL PROYETO.....	5
1.2 OBJETIVOS	5
1.2.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.2.2 Objetivos Específicos	5
1.3. SITUACION EXISTENTE.....	6
1.4 JUSTIFICACIÓN.....	6
1.5. LOCALIZACION DEL PROYECTO	8
2. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.....	9
2.1 Información General del contrato	9
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	10
4. METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA.....	12
5. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS BJETIVOS.....	13
5.1 OBJETIVO 1. MEJORAR ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.....	13
5.2 OBJETIVO 2: FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	13
6. ASPECTOS TECNICOS DEL CONSULTOR.....	13
6.1. Descripción de actividades ejecutadas	13
6.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.....	14
6.1.2 Ilustrar la Conservación de los Recursos Naturales en Sitios Específicos de las Instituciones Públicas Del Departamento de La Guajira.....	24
6.1.3. Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.....	27
6.1.4. Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.....	32
6.2 Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.....	39

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....41

7. ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA.....41

7.1. Actividades de carácter técnico.....41

8. ASPECTOS FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA.....42

8.1 Avance financiero de las actividades.....42

9. SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA AL CONSULTOR DEL CONTRATO 001 DE 2025.43

10. ANEXOS.....44

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024	

1. INTRODUCCION

La sociedad actual enfrenta el problema de la contaminación ambiental, provocada por el poco valor que le dan al cuidado del ambiente y de la naturaleza en general, además de las actividades que se desarrollan, conllevando a diversos y numerosos problemas ambientales, que van de la escala local a la global (pérdida de biodiversidad, calentamiento global, pérdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, contaminación por agroquímicos, entre tantos otros).

A través del tiempo, el hombre ha alterado el equilibrio de la naturaleza provocando una transformación de su entorno: sobrepoblación, agotamiento de recursos naturales, extinción de diversas especies y hábitat silvestre, acumulación de residuos sólidos, contaminación atmosférica, entre otras; deteriorando cada vez más las condiciones ambientales básicas para la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras de nuestro territorio.

La educación constituye un factor determinante para las buenas prácticas dentro de la sociedad, en la interacción entre las personas y el medio ambiente, sin embargo, es un tema que se deja a un lado, dándole importancia a las problemáticas de tipo económico y político, sin tener en cuenta que día a día el deterioro ambiental cada vez es mayor.

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA como máxima autoridad del medio ambiente en el departamento de La Guajira para cumplir con la misión de administrar, el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible del país, adelanto el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, el cual se ejecutara en 181 instituciones educativas del departamento de La Guajira en donde se realizaran 30 socializaciones del Proyecto, dos en cada municipio. De igual manera, durante el proyecto se Implementarán un plan de medios y divulgación del proyecto, se desarrollarán 30 talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, se realizarán 181 capacitaciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, instalación de 362 puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. Así mismo, se realizarán 15 ilustraciones de la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira y el fortalecimiento de las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira a través de la entrega de 1475 libros o recursos didácticos necesarios para que todos los niños y niñas, sin excepción, puedan observar, describir, analizar y manipular, un material que constituya una experiencia valiosa para aprender.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias de CORPOGUAJIRA, de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato de interventoría N° CI 0126 de 2024 “Presentar los

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna”, y describe las labores que se llevaron a cabo en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Mayo de 2025.

La interventoría realiza seguimiento permanente, vigilando el desarrollo de las actividades con el fin de verificar que las contratadas se ejecuten en las condiciones de calidad, cantidad, plazo, y valor acordado en la minuta del contrato.

El grupo de trabajo de la Interventoría para el periodo que comprende el presente informe estuvo conformado por un director, un Profesional de campo (Ingeniero ambiental) y una trabajadora social.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 NOMBRE DEL PROYETO

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

1.2.2 Objetivos Específicos

- **Objetivo específico 1:**

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.

- **Objetivo específico 2:**

Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

1.3 SITUACION EXISTENTE

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La segunda es causada por la débil articulación institucional en la gestión ambiental, pocas gestiones de conservación de los recursos naturales e insuficiente información de educación ambiental para la toma de decisiones, esta situación genera un crecimiento de la problemática ambiental como lo es el crecimiento de la contaminación Ambiental y los problemas en salud de la población. De igual manera, se genera incumplimiento de las políticas ambientales, lo que genera un aumento del uso inadecuado de los recursos naturales y un deterioro de la Imagen institucional.

Magnitud actual del problema: Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Para el Desarrollo de un ambiente sostenible es imprescindible establecer estrategias que permitan tomar conciencia de los problemas ambientales que afectan a la comunidad y por ende al bienestar común. Las numerosas formas de vivir, los cambios de hábitos, el desconocimiento de la población frente a temas ambientales, ha determinado la necesidad de generar espacios y momentos oportunos para incorporar el conocimiento del cuidado del ambiente de una manera práctica, sencilla y accesible. El cambio climático y sus respectivos efectos, los problemas de residuos urbanos, el inadecuado uso y manejo de los recursos hídricos, etc., son algunos de los ejemplos más relevantes de cómo se viene modificando el ambiente como resultado de una débil conciencia ambiental. Si bien es cierto, la educación ambiental en Colombia está regida por Ley 99 de 2003, pocos son los avances que se han logrado, especialmente porque no se alcanza un cambio en los modelos de vida y recientemente el 1549 de 2012, es evidente que los nuevos profesionales continúan tomando decisiones empresariales que generan impactos negativos al medio ambiente.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para cumplir con la misión de administrar, el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible del país, debe adelantar un proceso dinámico de planificación ambiental que permita a la entidad y al departamento de La Guajira orientar mediante la coordinación y concertación el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables buscando alternativas de desarrollo sostenible acorde las características de la jurisdicción.

Este proyecto forma parte de la práctica pedagógica sobre las necesidades ambientales, que se detectaron en el departamento de La Guajira, acerca del cuidado del medio ambiente, la conservación y preservación de

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

sus recursos naturales, en perspectiva de fomentar desde la enseñanza temprana una cultura 44 ambiental, que incida de manera definitiva en todo el proceso vivencial para la comunidad de este departamento.

Por todo lo anteriormente expuesto CORPOGUAJIRA que tiene competencia en materia de administración, conservación y control de los recursos naturales en el área de su jurisdicción según lo dispuesto en el, Decreto 2811 de 1974, Decreto de 1541 de 1978, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997, Decreto 155 de 2004, Decreto 1076 de 2015, en el cumplimiento normal de la actividad que desarrolla, tramite por intermedio del Grupo de Educación Ambiental, el proyecto aprobado para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”, el cual fue debidamente viabilizado y aprobado para su ejecución.

Para velar por la adecuada inversión de los recursos y ejecución del proyecto, la corporación regional de la guajira (corpoguajira), decidió contratar una interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

La interventoría se compromete a ser un seguimiento mensual de las actividades, e igualmente reportarlos avances de ejecución en periodos mensuales.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias de CORPOGUAJIRA, de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato de interventoría N° **CI 0126-2024** “Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna”, y describe las labores que se llevaron a cabo en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 y 31 de Mayo del 2025.

La interventoría realiza seguimiento permanente, vigilando el desarrollo de las actividades con el fin de verificar que las contratadas se ejecuten en las condiciones de calidad, cantidad, plazo, y valor acordado en la minuta del contrato.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

1.5 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:

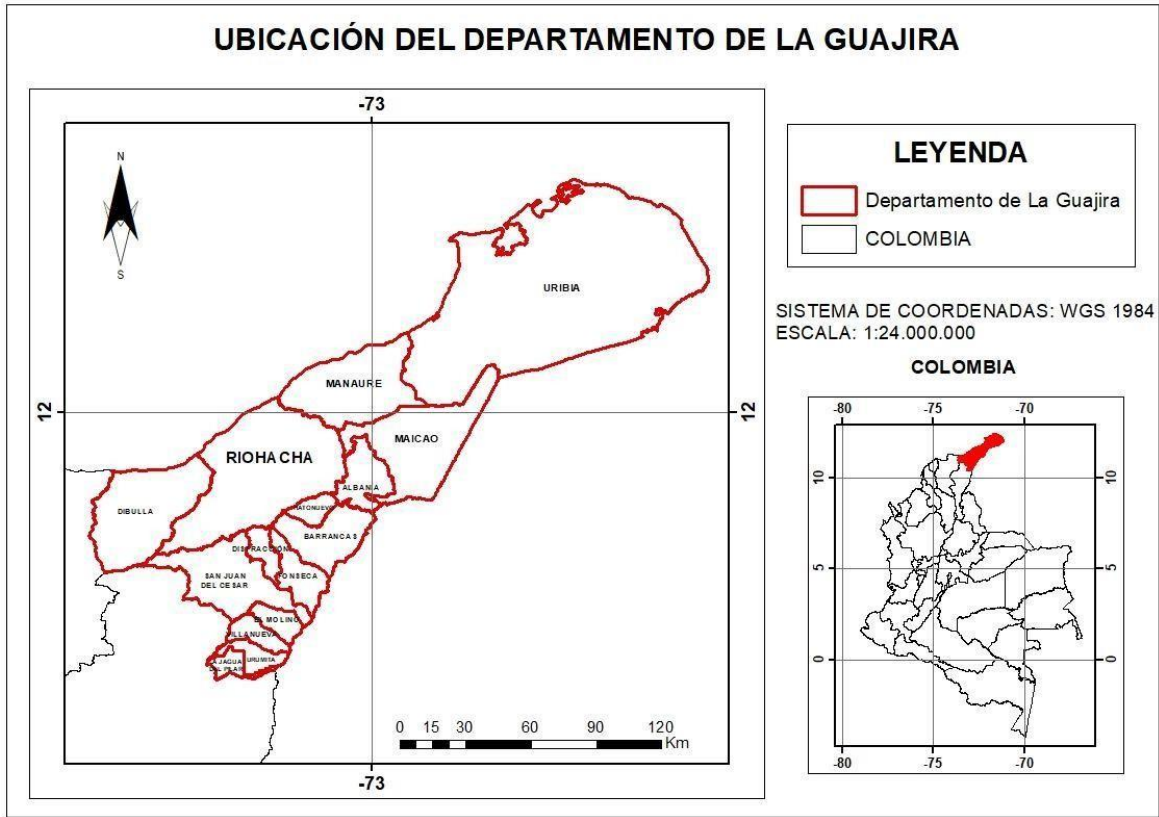


Figura 1. Ubicación específica del Proyecto.
Fuente: proyecto

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

2. CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para cumplir con la misión de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible, fomentando desde la enseñanza temprana una cultura ambiental suscribió con la firma “SOLTAM S.A.S”, el Contrato de prestación de servicios No. 001 de 2025, cuyo objeto es el “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001”.

2.1 Información General del contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025.	
NÚMERO CONTRATO: 001 DE 2025	CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S	
VALOR INICIAL: \$ 1.711.921.999.00	PLAZO: CINCO (5) MESES	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.		
FECHA DE INICIO:	17 DE FEBRERO DE 2025.	
FECHA DE TERMINACION:	16 DE AGOSTO DE 2025.	
INTERVENTORIA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	
SUPERVISOR DESIGNADO:	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951	ULTIMA ACTUALIZACION : 28/01/2025	COMPAÑIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PLAZO INICIAL: 05 Meses	PLAZO ADICIONAL: NINGUNO	

Tabla 1: Resumen del contrato N° 001 de 2025.
Revisión de Vigencia de las Garantías.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

Tabla 2: Descripción de las vigencias de las garantías.

AMPAROS	VIGENCIAS		VR ASEG.	EXPEDICION	COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2025	28/12/2025	\$ 171.192.200,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	28/01/2025	28/12/2025	\$ 171.192.200,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	28/01/2025	28/12/2025	\$ 171.192.200,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL DE ANTICIPO:	28/01/2025	28/12/2025	\$ 855.961.000,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2025	28/06/2028	\$ 85.596.100,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 09 de enero de 2025.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI 0126-2024.

Tabla 3. Descripción del contrato de interventoría No. CI 0126-2024

CONTRATO	No. CI 0126-2024.
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.
CONTRATANTE	CORPOGUAJIIRA
CONTRATISTA	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$116.700.000,00) M/L
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN.	16 DE AGOSTO DE 2025.
SUPERVISIÓN	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

Tabla 4: Presupuesto de obras.

PRESUPUESTO OFICIAL					
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA					
1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1.1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	\$ 1.065.091,05	\$ 31.952.731,43
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1	\$ 22.890.000,00	\$ 22.890.000,00
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Número	30	\$ 13.155.719,33	\$ 394.671.579,89
	Subtotal 1				\$ 449.514.311,32
2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181	\$ 944.020,52	\$ 170.867.714,80
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362	\$ 1.572.498,04	\$ 569.244.289,58
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15	\$ 5.213.156,63	\$ 78.197.349,38
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1	\$ 170.828.260,75	\$ 170.828.260,76
	Subtotal 2				\$ 989.137.614,51
Subtotal del Proyecto					\$ 1.438.651.925,83
Iva 19%					\$ 273.343.866
Interventoría					\$ 116.714.456,25
Valor total del proyecto					\$ 1.828.710.247,98

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

4. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

Tabla 6. Anexo al cronograma de actividades.

ANEXO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
ITEM	ACTIVIDAD	METODOLOGIA	RECURSOS
1	Realizar socialización del Proyecto.	Realizar acompañamiento técnico en las actividades contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría para que se lleven a cabo el número de socializaciones y las especificaciones técnicas, en el sector educativo.	Un trabajador social , un ingeniero ambiental y un vehículo.
2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.	Se realizara seguimiento para que se Realicen las cuñas radiales, la entrega de oficios a la población del área del proyecto, las Publicaciones en periódicos locales y departamental la cual debe cumplir con las especificaciones técnicas y características exigidas por CORPOGUAJIRA.	Un (1) profesional Trabajadora Social, un ingeniero ambiental y un vehículo.
3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales	Se Realizara acompañamiento técnico en las actividades de Capacitación a 3000 personas entre estudiantes y docentes en la conservación de los recursos naturales Contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Trabajadora Social, un ingeniero ambiental y un vehículo.
4	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Realizar acompañamiento técnico en las actividades contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría, para que se realicen los talleres de sensibilización en las las instituciones Educativas.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)
5	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	Se realizara seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones, Zonificación de los puntos para la implementación de los puntos ecológicos -Instalación de puntos ecológicos (Código de Colores) contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)
6	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.	Se realizara seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones contempladas, Zonificación de los sitios donde se ubicará el mural a realizar con pinturas ecológicas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)
7	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira..	Se realizara seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones contempladas, Acta de Entrega de los Libros a la persona responsables de recibirlo con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

5. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS OBJETIVOS

El proyecto “**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA**”, Tiene como objetivo General Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.. A continuación se describen las actividades para alcanzar los objetivos.

5.1 OBJETIVO 1. MEJORAR ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

- 1.1 Realizar socialización del Proyecto.
- 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.
- 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

5.2 OBJETIVO 2: FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

- 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
- 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
- 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.
- 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

6. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONSULTOR

6.1 Descripción de actividades ejecutadas

Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades, Según el cronograma ajustado del contrato, se ejecutaron trabajos en las actividades 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

6.1.1. Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente

Esta actividad a corte del presente informe se alcanzó a realizar en los siguientes municipios, como se muestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHA	UBICACIÓN DE LA I.E.
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	13/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	13/05/2025	Urbana
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	16/05/2025	Rural
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	13/05/2025	Urbana
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	13/05/2025	Urbana
La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	13/05/2025	Urbana
San Juan del Cesar.	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	15/05/2025	Urbana
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	16/05/2025	Rural
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	16/05/2025	Rural
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	16/05/2025	Rural
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	19/05/2025	Rural
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	21/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	21/05/2025	Rural
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	27/05/2025	Rural

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	27/05/2025	Rural
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	14/05/2025	Urbana
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	16/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	16/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	16/05/2025	Urbana
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	16/05/2025	Urbana
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	15/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	15/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	15/05/2025	Rural
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	15/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	15/05/2025	Rural
Barrancas	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	19/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	19/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	19/05/2025	Urbana
	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	19/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	19/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	19/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	21/05/2025	Urbana
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	22/05/2025	Rural
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	20/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	20/05/2025	Urbana
	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	20/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	20/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	20/05/2025	Urbana
	CENTRO EDUCATIVO JOSE	20/05/2025	Rural

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

	PEREZ		
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	22/05/2025	Rural
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	22/05/2025	Rural
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	22/05/2025	Rural
Hatonuevo	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	21/05/2025	Urbana
	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	21/05/2025	Urbana
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	21/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	21/05/2025	Rural
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	21/05/2025	Rural
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	23/05/2025	Rural
	CE LOS REMEDIOS	23/05/2025	Rural
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA	23/05/2025	Rural
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	23/05/2025	Rural
Maicao	INSTITUCION #1	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #2	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #3	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #4	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #5	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #6	26/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #7	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #8	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #6	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #9	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #10	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #11	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #12	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #13	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #14	27/05/2025	Urbana
	INSTITUCION #15	27/05/2025	Urbana
Riohacha DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	30/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	30/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R.	30/05/2025	Urbana

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

	FISCHIONE		
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	30/05/2025	Urbana
	INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA	30/05/2025	Urbana

En total el contratista realizó la sensibilización en 78 instituciones educativas en los municipios anteriormente descritos, logrando la cobertura del 100% en los municipios de:

- ✓ Urumita.
- ✓ El Molino
- ✓ La Jagua del Pilar
- ✓ Villanueva
- ✓ Distracción
- ✓ Hatonuevo
- ✓ Barrancas
- ✓ Fonseca

Según, el cuadro anterior el Contratista alcanzo un 43.09% de ejecución en esta actividad

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>Mar, 13 de may 2025 08:58 Cl. 6 # 9-75, Urumita, La Guajira 10.560496°N, 73.009220°W Nota: Interventoria E. Z. Código de Foto: R2YNPLHCN4AYN2</p>	 <p>20 may 2025 11:20:52 a.m. 10°52'57.54" N 72°56'44.12" W 14-29 Calle 21 Fonseca La Guajira #Interventoria</p>
<p>Foto 1: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA, municipio de Urumita.</p>	<p>Foto 2: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA, municipio de Fonseca.</p>

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 3: Taller de sensibilización en la I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, municipio de La Jagua del Pilar.



Foto 4: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE,



Foto 5: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA, municipio de San Juan del Cesar.



Foto 6: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA, municipio de San Juan del Cesar,

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 7: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMELO, municipio de San Juan del Cesar



Foto 8: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA, municipio de San Juan del Cesar.



Foto 9: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL, municipio de Distracción.



Foto 10: Taller de sensibilización en el CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION - SEDE LOS HORNITOS, municipio de Distracción.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		<div>ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ</div> <div></div>
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 11: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA, municipio de Distracción.



Foto 12: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON, municipio de Fonseca.



Foto 13: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, municipio de Fonseca.



Foto 14: Taller de sensibilización en la CENTRO EDUCATIVO AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - El Hatico, municipio de Fonseca.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 15: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CAMARGO, municipio de Hatonuevo.



Foto 16: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA, Distrito de Riohacha.



Foto 17: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR, distrito de Riohacha.

6.1.2 Ilustrar la Conservación de los Recursos Naturales en Sitios Específicos de las Instituciones Públicas del Departamento de La Guajira.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

En esta actividad el contratista realizará 15 murales con pinturas ecológicas alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definir un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad. Los muros intervenidos deben tener un área de 25 m² como mínimo, de acuerdo al área disponible, para su buena visibilidad. La ubicación de cada mural y/o valla se hará en terrenos del municipio de carácter público, identificado y acordado con las respectivas autoridades locales. Cada mural, tendrá un mensaje que aparte de llamativo y vistoso, sea motivo de reflexión para el buen uso y manejo de los recursos, fauna y flora del entorno.

Durante este periodo el contratista realizo 4 murales en los siguientes municipios:

Municipio de Manaure.

	
Foto 18: muro antes de hacer el Mural.	Foto 19: Mural realizado por el contratista.

Municipio de Maicao.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 20: Muro antes de hacer el Mural.



Foto 21: Mural realizado por el contratista.

Municipio de Fonseca.



Foto 22: Mural realizado por el contratista.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

Municipio de Barrancas.

	
Foto 23: Muro antes de hacer el Mural.	Foto 24: Mural realizado por el contratista.

6.1.3. Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

En esta actividad el contratista ha realizado la entrega de 156 puntos ecológicos en las 78 instituciones educativas intervenidas hasta la fecha del presente informe. Estas entregas se realizaron de la siguiente manera:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD DE PUNTOS ECOLOGICOS ENTREGADOS
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	2
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	2
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	2
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	2
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	2

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	2
San Juan del Cesar.	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	2
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	2
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	2
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	2
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	2
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	2
	I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO	2
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	2
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	2
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	2
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	2
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	2
Barrancas	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	2

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	


	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	2
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	2
	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	2
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	2
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	2
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	2
	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	2
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	2
	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	2
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	2
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	2
Hatonuevo	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	2
	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	2
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	2
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	2
	CE LOS REMEDIOS	2
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA	2
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	2
Maicao	INSTITUCION #1	2
	INSTITUCION #2	2
	INSTITUCION #3	2
	INSTITUCION #4	2
	INSTITUCION #5	2
	INSTITUCION #6	2
	INSTITUCION #7	2
	INSTITUCION #8	2
	INSTITUCION #6	2

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024	

Riohacha DTC	INSTITUCION #9	2
	INSTITUCION #10	2
	INSTITUCION #11	2
	INSTITUCION #12	2
	INSTITUCION #13	2
	INSTITUCION #14	2
	INSTITUCION #15	2
	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	2
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	2
	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	2
	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	2

De esta manera el contratista en esta actividad ha tenido un avance del 43.09% en esta actividad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

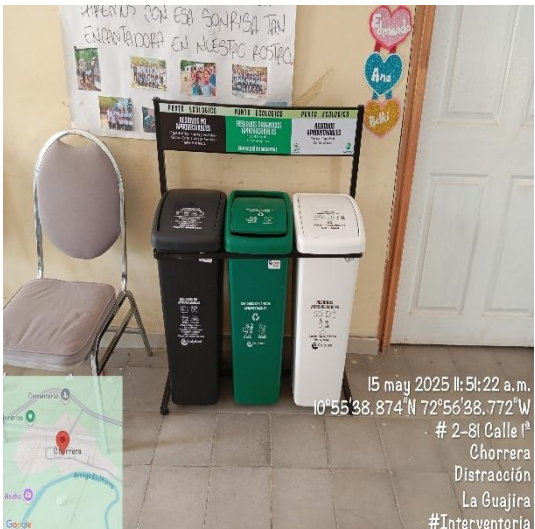 <p>15 may 2025 11:51:22 a.m. 10°55'38.874"N 72°56'38.772"W # 2-81 Calle 1ª Chorrera Distracción La Guajira #Interventoria</p>	 <p>20 may 2025 12:01:47 p.m. 10°54'29.052"N 72°51'20.22"W # 14-145 Calle 14 Fonseca La Guajira #Interventoria</p>
<p>Foto 25: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL, municipio de Distracción</p>	<p>Foto 26: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA, municipio de Fonseca.</p>

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 27: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CAMARGO, municipio de Hatonuevo.



Foto 28: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA, municipio de Distracción.



Foto 29: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE, municipio de El Molino.



Foto 30: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON, municipio de Fonseca.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 31: Puntos ecológicos entregado en la I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES, Municipio de El Molino.



Foto 32: Puntos ecológicos entregado en la I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, municipio de la Jagua del Pilar.



Foto 33: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, municipio de Fonseca.



Foto 34: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR, Distrito de Riohacha.

6.1.4. Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

En esta actividad el contratista debe realizar la entrega de libros que buscan el fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento de La Guajira, al respecto el documento técnico determina que las instituciones educativas urbanas se les entregara 11 ejemplares y a las instituciones educativas rurales se les entregara 5 ejemplares. Hasta la fecha se ha realizado la entrega de 678 libros como se describe en la siguiente tabla:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UBICACIÓN DE LA I.E.	CANTIDAD
Urumita	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA	Urbana	11
	CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL)	Rural	5
El Molino	INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE	Urbana	11
	I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES	Urbana	11
La Jagua del Pilar	I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	Urbana	11
San Juan del Cesar.	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA	Urbana	11
	CENTRO RURAL EL TABLAZO	Rural	5
	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	Rural	5
	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	Rural	5
	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	Rural	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA	Rural	5
	I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE	Rural	5
	I.R MERCEDES ROMERO DE	Rural	5

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

	QUINTERO		
Villanueva	INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL	Urbana	11
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND	Urbana	11
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	Urbana	11
Distracción	INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL	Rural	5
	CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA	Rural	5
Barrancas	INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	Urbana	11
	CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO	Urbana	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS	Rural	5
Fonseca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA	Urbana	11
	IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	Urbana	11
	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	Rural	5


INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO	Rural	5
	CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE	Rural	5
Hatonuevo	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	11
	I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ	Urbana	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ	Rural	5
	I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	Rural	5
Albania	CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA	Rural	5
	CE LOS REMEDIOS	Rural	5
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA	Rural	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI	Rural	5
Maicao	INSTITUCION #1	Urbana	11
	INSTITUCION #2	Urbana	11
	INSTITUCION #3	Urbana	11
	INSTITUCION #4	Urbana	11
	INSTITUCION #5	Urbana	11
	INSTITUCION #6	Urbana	11
	INSTITUCION #7	Urbana	11
	INSTITUCION #8	Urbana	11
	INSTITUCION #6	Urbana	11
	INSTITUCION #9	Urbana	11
	INSTITUCION #10	Urbana	11
	INSTITUCION #11	Urbana	11
	INSTITUCION #12	Urbana	11
	INSTITUCION #13	Urbana	11
	INSTITUCION #14	Urbana	11
	INSTITUCION #15	Urbana	11
Riohacha DTC	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE	Urbana	11

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

	INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA	Urbana	11
TOTAL			678

En el siguiente grafico se observa la distribución de estos libros, teniendo en cuenta la ubicación de la Institución Educativa.

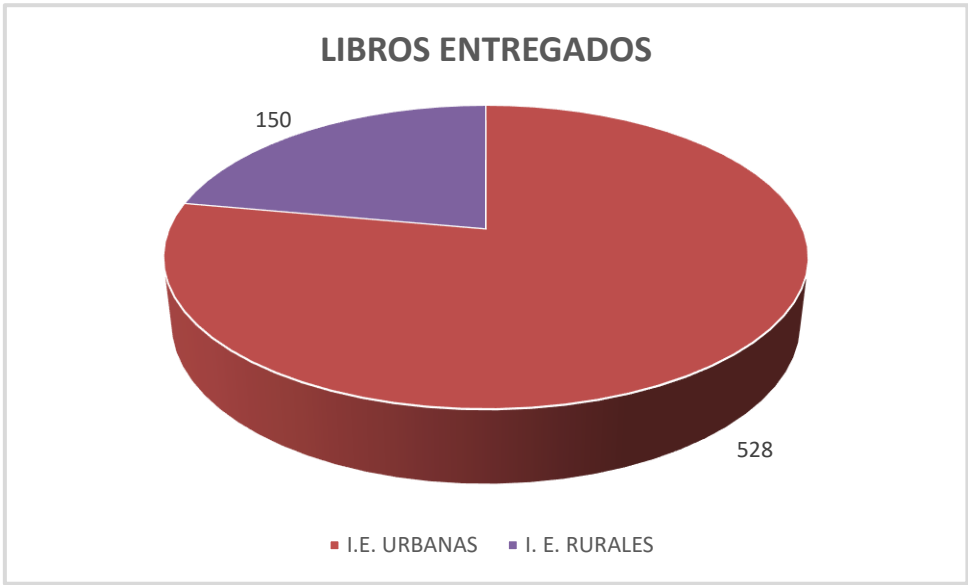

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	



Foto 35: Entrega de libros en la INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA, municipio de Fonseca.



Foto 36: Entrega de libros en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA, municipio de Urumita.



Foto 37: Entrega de libros en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, Municipio de Fonseca.

6.2 Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024	

Tabla 7. Anexo al cronograma de actividades

ITEM	ACTIVIDADES	UNID	CANT	VR UNIT (sin IVA)	VR TOTAL (sin IVA)	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE		VALOR EJECUTADO
1.1	Realizar socialización del Proyecto.	Numero	30	\$ 1.065.091,05	\$ 31.952.731,43	15	50%		\$ 15.976.366
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.	(#) Cuñas radiales	30	\$8.829.000	\$ 8.829.000,00	15	50%	51%	\$ 11.744.750
		(#) periódicos locales y Redes Sociales	30	\$12.262.500	\$ 12.262.500,00	15	50%		
		(#) Pendón	6	\$1.798.500	\$ 1.798.500,00	4	67%		
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales	Numero	30	\$ 13.155.719,33	\$ 394.671.579,89	15	50%		\$ 197.335.790
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero (95 Urb.+86R)	181	\$ 944.020,52	\$ 170.867.714,80	78 (48 Urb.+ 30R)	43%		\$ 73.633.601
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	Numero	362	\$ 1.572.498,04	\$ 569.244.289,58	156	43%		\$ 245.309.694
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.	Numero	15	\$ 5.213.156,63	\$ 78.197.349,38	9	60%		\$ 46.918.410
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.	Unidades Urbanas 95 (11 Libros)	1045 (95*11)	115.816	\$ 121.027.480	528 (48*11Libros)	51%	46%	\$ 78.523.092
		Unidades Rurales 86 (5 Libros)	430R (86*5)	115.816	\$ 49.800.781	150 (30*5 Libros)	35%		
TOTAL	7						46,533%		\$ 669.441.702

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

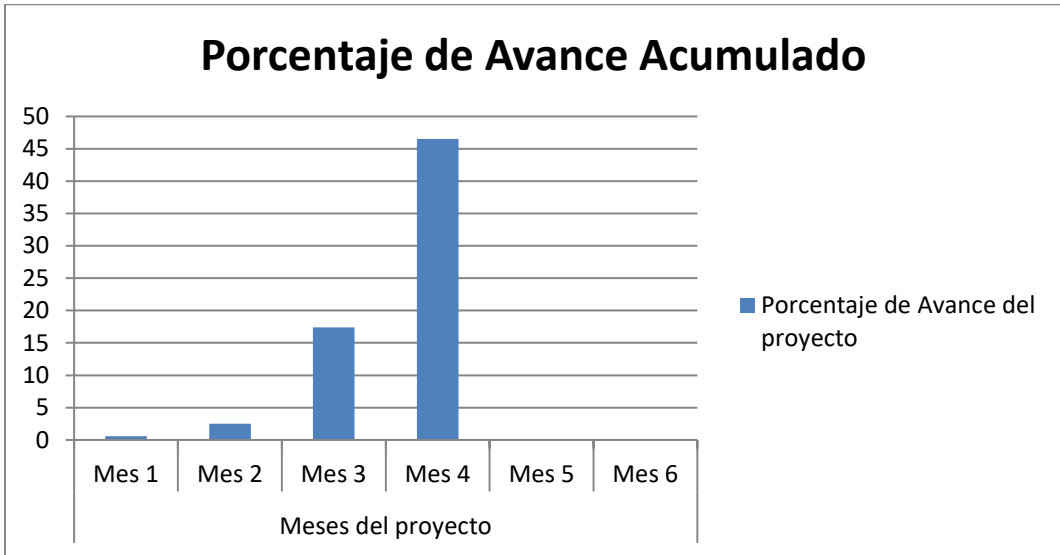


Figura 2. Avance del tercer mes de ejecución de actividades del contrato 001 de 2025.

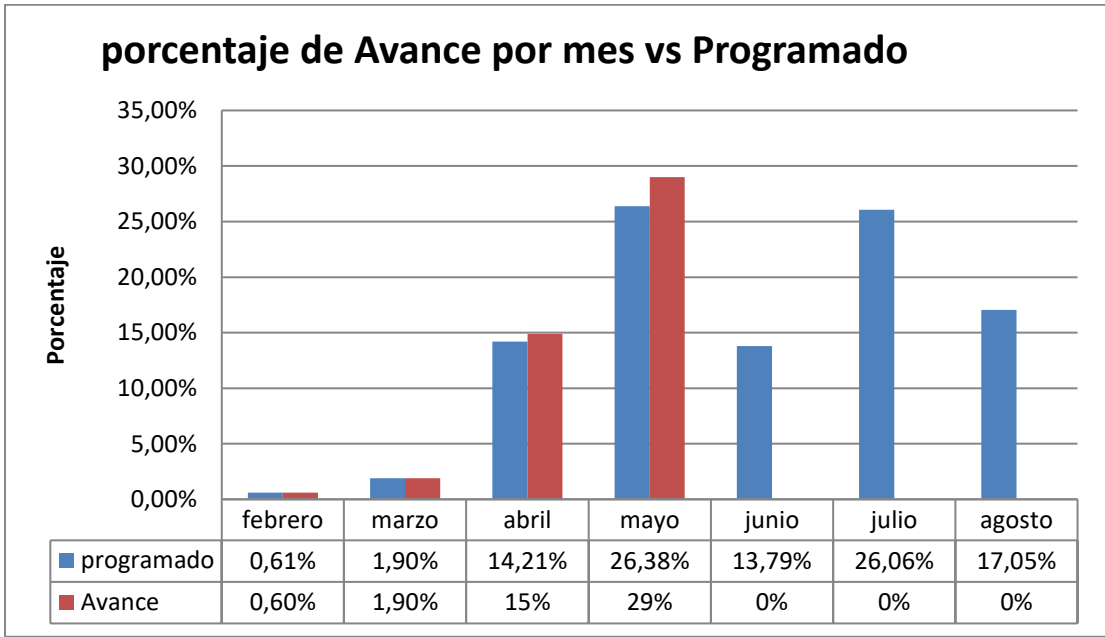


Figura 3. Avance por mes vs programado del contrato 001 de 2025.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se evidencia en el avance físico, el proyecto lleva un avance acumulado del 46,533%, desde el 17 de febrero cuando se inició hasta el 31 de mayo y lo programado fue del 43,1%, el contratista está cumpliendo. Se recomienda continuar con la actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, que son la ruta crítica del contrato debido a que se deben realizar en 181 instituciones (95 urbanas y 86 rurales), hay que considerar que las instituciones rurales se encuentran dispersas, distantes y algunas se encuentran ubicadas en la Alta Guajira.

7. ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

7.1 Actividades de carácter técnico

Durante el período que abarca el presente informe (1 al 31 de mayo de 2025) se desarrollaron las siguientes tareas de carácter técnico:

➤ Revisión de la metodología desarrollada por el consultor.

La interventoría realizó la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de las actividades propias del contrato de prestación de servicios objeto de interventoría, y verifíco que se cumplan todas las especificaciones Técnicas de las actividades 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos, 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira, 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. Se realizó seguimiento y se verificó que se convocará a la población del sector educativo, referentes ambientales. Además que contara con el talento humano necesario, el sitio adecuado y el mínimo requerido para realizar las actividades.

8. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

8.1 Avance financiero de las actividades

Con respecto a la ejecución financiera por parte del equipo técnico, administrativo y contable de esta interventoría, informamos que para el periodo comprendido entre 1 al 31 de mayo del 2025 se realizó una inversión parcial de **\$23.342.891,25**, para un acumulado de ejecución presupuestal de **\$79.199.095,3159**.

Tabla 8. Avance General de Ejecución Financiera

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO									
CONTRATO No.			001 DE 2025						
OBJETO			REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.						
CONTRATISTA			ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ						
SUPERVISOR			HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA						
VALOR CONTRATO			\$116.700.000,00 M/L						
VALOR ANTICIPO			58.350.000						
ITEM	DESCRIPCION		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTALES
	PERSONAL PROFESIONAL	SALARIO BASE/ DEDICACION	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	F.M.	
			1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1	
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 2.700.000	2.015.357,143	5.130.000	5.130.000	5.130.000			17.405.357,143
1,2	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 4.500.000	3.358.928,57	8.550.000	8.550.000	8.550.000			29.008.928,57
1,3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 800.000	597.142,857	1.520.000	1.520.000	1.520.000			5.157.142,857
	VALOR		5.971.428,57	15.200.000	15.200.000	15.200.000			51.571.428,57
	Papelería Para informes		216.071,43	550.000	550.000	550.000			1.866.071,43
	Transporte y/o vehículo y mantenimiento incluye conductor		1.518.736,61	3.865.875	3.865.875	3.865.875			13.116.361,61
	Subtotal		7.706.236,61	19.615.875	19.615.875	19.615.875			66.553.861,61
	IVA (19%)		1.464.184,956	3.727.016	3.727.016	3.727.016			12.645.232,956
	Total		9.170.421,5659	23.342.891,25	23.342.891,25	23.342.891,25			79.199.095,3159


9. SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA AL CONSULTOR DEL CONTRATO 001 DE 2025.

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

Durante este periodo del 1 al 31 del mes de mayo de 2025, se hicieron varias recomendaciones en la parte técnica para la ejecución de las actividades procurando optimizar los recursos logísticos y financieros.

- Se reiteró al consultor hacer la entrega a la interventoría el cronograma mensual de actividades en los primeros cinco días del mes sin que esta tenga que solicitárselo y enviárselo a la supervisión de tal manera que esta programe las actividades correspondientes.
- Ejecutar las actividades lo más ajustadas al cronograma de actividades.
- Se solicitó al contratista la seguridad social de los empleados y las pólizas de garantía.

Aprobado.



ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

Interventor

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 04		ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ 
CONTRATO DE OBRA No. PS 001 - 2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024	

10. ANEXOS

- ❖ **Anexo 1.** Oficio al consultor solicitando la programación de actividades para el periodo.
- ❖ **Anexo 2.** Oficio solicitando el cumplimiento de cronograma del proyecto en Ejecución del Contrato de prestación de servicio N° **PS-001-2025**.
- ❖ **Anexo 3.** Solicitud de la programación semanal de las actividades de Ejecución del Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.
- ❖ **Anexo 4.** Solicitud de los soportes de pago de la seguridad social de los empleados del Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.
- ❖ **Anexo 5.** Oficio de Recomendaciones en la toma de las evidencias y Solicitud de Realización de talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente del Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.
